



鹿児島東西道路だより 2023年12月号

【上荒田～武地区】

工事に関する問い合わせ先

番号	名称	TEL	担当者
①	大成・大豊JV 工事業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
②	九鉄工業(株) 東西道路作業所	099-285-1513 (FAX 099-285-1514)	久保、谷
	九州旅客鉄道(株) 建設工事部 土木3	092-626-1205	木野村、津田
	国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官	099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/	

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
11月27日より田上側へ向け、シールドトンネル掘進を開始しました。環境に配慮し安全第一で工事を進めてまいります。
曙陸橋北側地区では、中央町側(東側)の橋脚基礎撤去を進め、また、曙陸橋下の地盤改良を進めてまいります。
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

①中洲通り地区 【施工:大成・大豊JV】



工事の予定 中洲通りから田上側へ向かってトンネルの掘進・構築を進めます。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
中洲通り地区	シールドトンネル掘進	11月27日 ~ 2025年5月頃迄	昼間:8時~17時 ※ダンプ車運行:9時~19時 夜間:20時~翌5時

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真


シールドマシン
名称「シールドん」

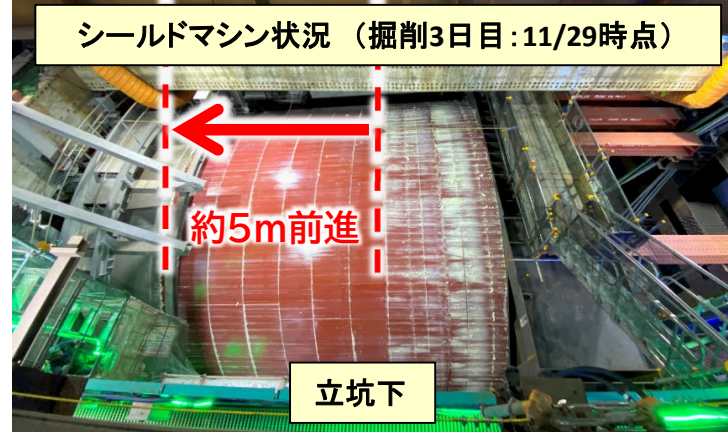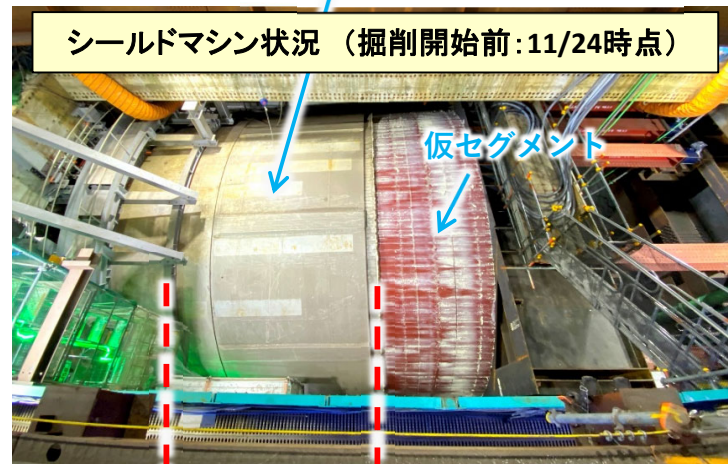

シールドマシン(名称:シールドん)の位置(トンネル掘進の進捗状況)は、鹿児島国道事務所ホームページ(下のQRコード)にてご覧いただくことができます。**【毎週更新】**



「シールドん」の位置



インフォメーションセンターへお気軽にお越し下さい。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30



②曙陸橋北側地区 【施工:九鉄工業(株)】

工事の予定 歩道橋の橋脚基礎杭撤去工事として、交通規制(9時~16時)の間、中央町側(東側)の通り抜けが12月下旬頃まで不可となります。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
曙陸橋北側地区	橋脚基礎撤去	10月10日 ~ 12月下旬頃迄 ※うち8日間、夜間で資機材搬入出を行います。	昼間、一部夜間
	JR地盤改良	12月1日 ~ 2024年3月上旬頃迄	夜間

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真



▲橋脚基礎杭撤去状況



▲橋脚基礎杭撤去部埋戻し状況



▲交通規制状況(9時~16時は中央町側の通り抜けができません)





鹿児島東西道路だより 2023年12月号

【武岡～田上地区】

2023年12月9日 発行

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
 武岡地区の東雲川調整池、西側では引き続き地盤改良の準備を進め、東側では今月より地盤改良に着手してまいります。
 田上地区のトンネル到達部では引き続き鋼管土留め杭の設置を、田上高架橋では工場で橋桁の製作を進めてまいります。
 皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工事に関する問い合わせ先

番号	名称	TEL	担当者
③ ④	大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
⑤	㈱日本ピーエス 現場事務所	090-7169-6397 (FAX 099-296-7510)	多田
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官		099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/	

③東雲川調整池(武岡地区)【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 調整池の底版にボーリングマシンで穴をあけた後、地中に薬剤を噴射して地盤改良を行います。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
東雲川調整池 (武岡地区)	地盤改良のための削孔	7月31日～2024年1月下旬頃迄 ※隣接道路の車線規制(9時～16時)を伴います	昼間
	東側の地盤改良	12月4日～2024年2月上旬頃迄	昼間

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真

東側

地盤改良

南側

削孔

地盤改良プラント設置状況

交通規制状況

④トンネル到達部(田上地区)【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 新しいトンネル入口部の工事を進めており、引き続き鋼管土留め杭の設置を行います。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
トンネル到達部 (田上地区)	鋼管土留め杭の設置	9月4日～2024年2月上旬頃迄 ※12月中に11日程度、夜間作業(21時～6時)を行います。(国道3号の車線規制22時～翌5時)	昼間、 一部夜間

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真

新トンネルの入口

土留め杭設置

武岡トンネル

鋼管杭の
圧入状況

⑤田上高架橋(田上地区)【施工:㈱日本ピーエス】

工事の予定 田上高架橋上部工の施工を行う、㈱日本ピーエスです。12月は現場での作業予定はありません。工場において、コンクリートの橋桁製作を行っています。

施工場所	工種	施工時期	施工時間
田上高架橋 (田上地区)	プレテンション桁製作工 (工場製作 福岡県久留米市)	12月は工場での桁製作のみ	—

施工状況写真

工場において、橋桁製作中

