

金田地区浸透対策(その2) 工事


施工： 龍南建設株式会社

工期： 平成29年12月 8日～平成30年 7月20日

監理技術者コメント: 今回の工事は施工ヤードが狭い現場でしたが、工事に携わった作業員と知恵を出し合いながら工事を進め、作業員が安全に対して真剣に向き合ったからこそ無事故で完成することができました。

工事内容： 浸透対策工事 L=531.2m

本工事では、堤防の田畑側に水を透しやすい**ドレーン(鉄線のカゴに石を詰めた構造)**を施工することにより、堤防内部に浸透してきた水を、堤防の外へ素早く安全に排水することで、**パイピングと堤防のスベリの発生を抑止**する工事です。

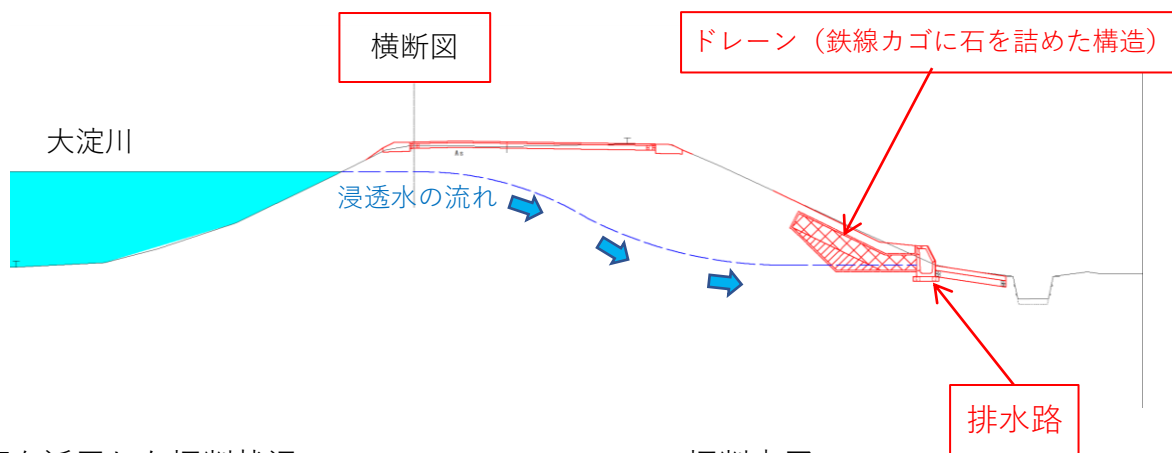

ICTを活用した掘削状況



掘削完了



かごマット完了



完了

