

歌舞伎橋下部工(A1,A2)受託工事

施工 : 吉原建設株式会社

工期 : 平成29年 10月12日 ~ 平成30年 8月31日

工事内容 : A1場所打ち杭 L=19.0m 径1200 8本 A1橋台 V= 284.0m³


: A2場所打ち杭 L=18.0m 径1200 6本 A2橋台 V=237.0m³

: 法覆護岸工 A=759.0m² 地盤改良工 1式 擁壁工 1式

監理技術者コメント:

今回の施工場所は、JRと旧歌舞伎橋と川の駅が近接しており、一般車両・通学自転車や第三者の通行が多いので、朝夕の通勤時間帯の工事車両出入りを制限して交通事故防止に努めました。

また、現場内の安全に対しても「安全の見える化」を実施し、安全に対する意識を全員で高めて行き、無事故で完成する事ができました。

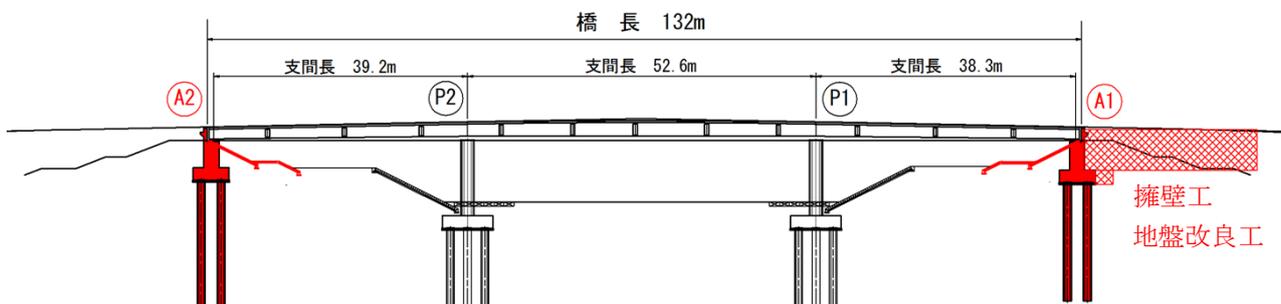

歌舞伎橋 完成



A1完成



A2完成



場所打ち杭施工状況



鋼矢板圧入施工状況



橋台工床掘り状況



橋台コンクリート打設状況



護岸工施工状況



スラリー揺動攪拌施工状況



工事関係者技術者の氏名
吉原建設(株) 西元 昌寛
長濱 祐太
