

# 鶴田ダム再開発事業 H29年2月工事進捗状況




①



(撮影:H28.04.22)



天端構台撤去完了

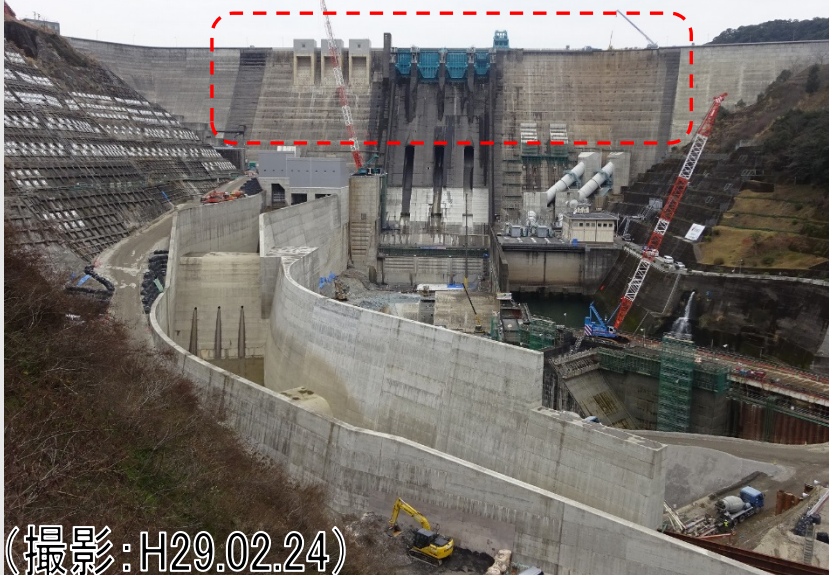

(撮影:H29.02.24)

## 天端仮設構台撤去

左岸側構台も撤去完了しました。現在、左岸側の高欄の復旧作業を行っています。

また、3月中旬から天端道路の舗装工事を行います。

ゆうゆう館から撮影






## 既設減勢工改造

既設副ダムの一部取り壊しも進んでおり、下流側で新たに造っている副ダムも形が見えてきました。

引き続き、掘削とコンクリート打設を行っていきます。

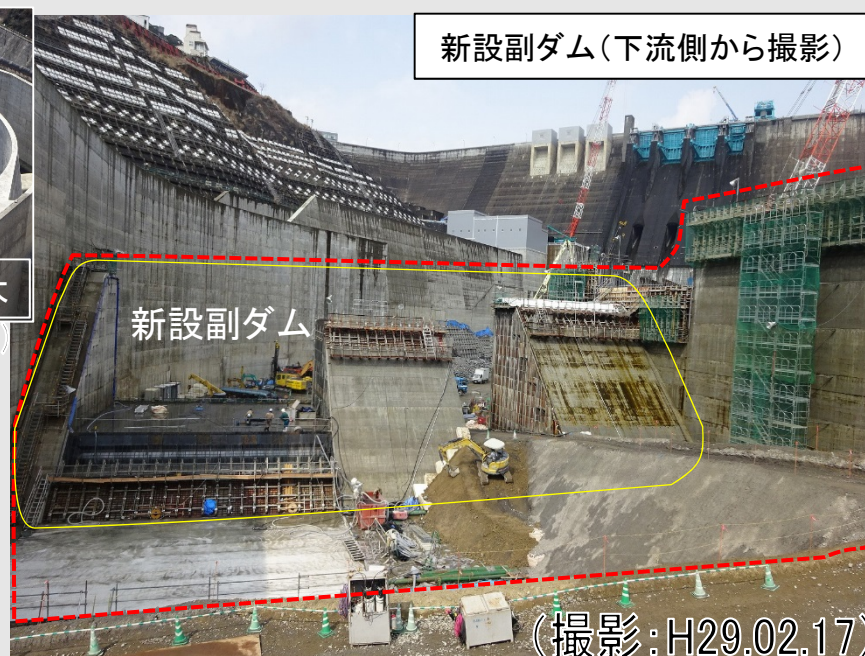

# 工事進捗状況(本体工事着手～現在)

ダム下流から撮影



ダム天端から撮影



ダム下流から撮影

