

## 現場紹介・工事進捗状況

①

天端仮設構台にて組立

型枠  
(1号用)



(撮影:H24.3.22)

### ● 台座コンクリート設置 (発電1号)

発電側の浚渫が完了し、3月中旬に台座コンクリート用の型枠を設置しました。

型枠設置後、水中コンクリート打設も行い発電1号の台座は完成に近づいています。

発電2号は型枠を設置出来るよう、準備中です。




(撮影:H24.3.22)

型枠

湖底へ

(イメージ図)

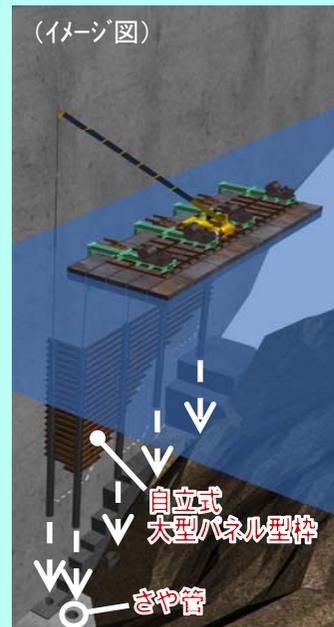

自立式  
大型パネル型枠

さや管
