


現場紹介・工事進捗状況

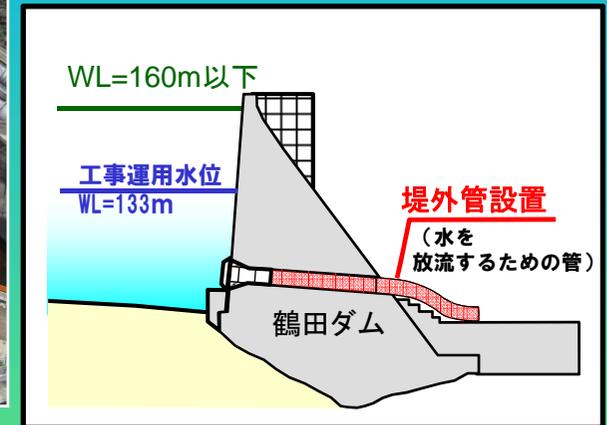

● 堤外管設置

6月より堤外に管を設置するために作業用構台を撤去しました。

その後、足場を組み増設
3号堤外管の設置を行いました。この後、管の周りをコンクリートで巻き立てて(埋めて)いきます。

