




## 放流(発電)管設置

増設1号・発電2号のベルマウスと制水ゲートの設置が完了したので、ダムにあけた穴の中に管を引き込む作業を行いました。

増設2,3号・発電1号と同様、ワイヤを用いて奥に引き込み、ダムの穴の中で溶接を行いました。

その後、ダム本体と管の周りにコンクリートを充填する(隙間を塞ぐ)作業を行いました。

増設1号放流管引き込み中・・・

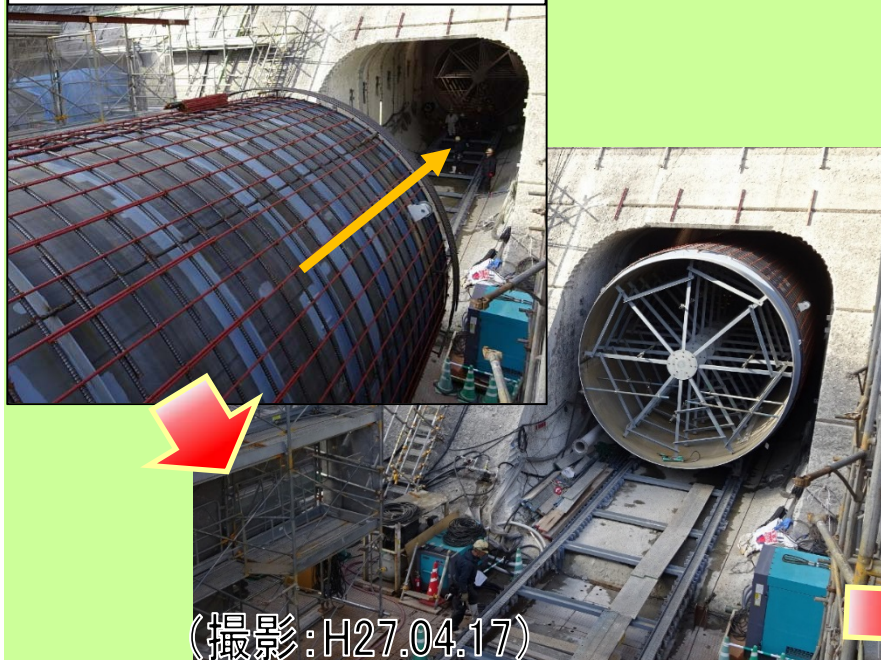

引き込み完了



コンクリート充填完了

