



## 現場紹介・工事進捗状況

⑤

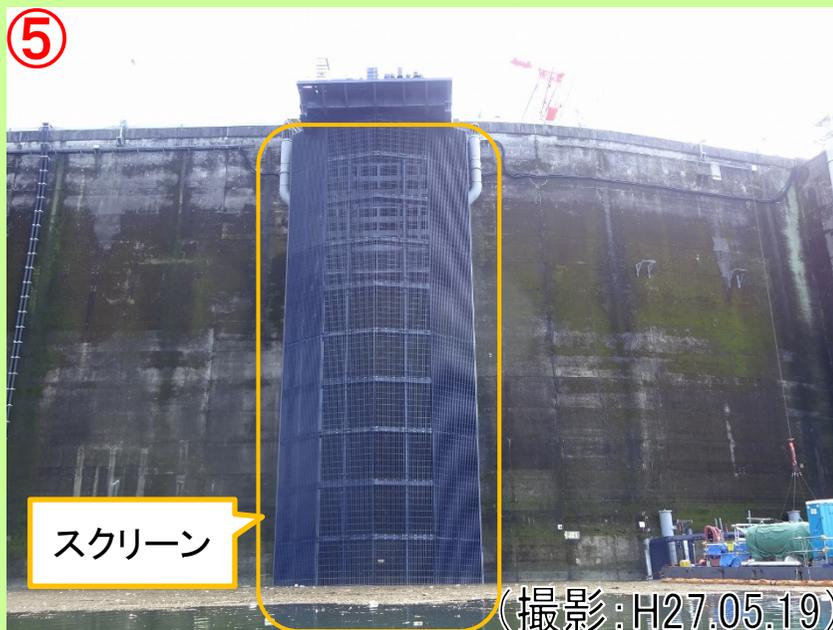

ダム上流(湖面)から撮影

(撮影:H27.05.19)

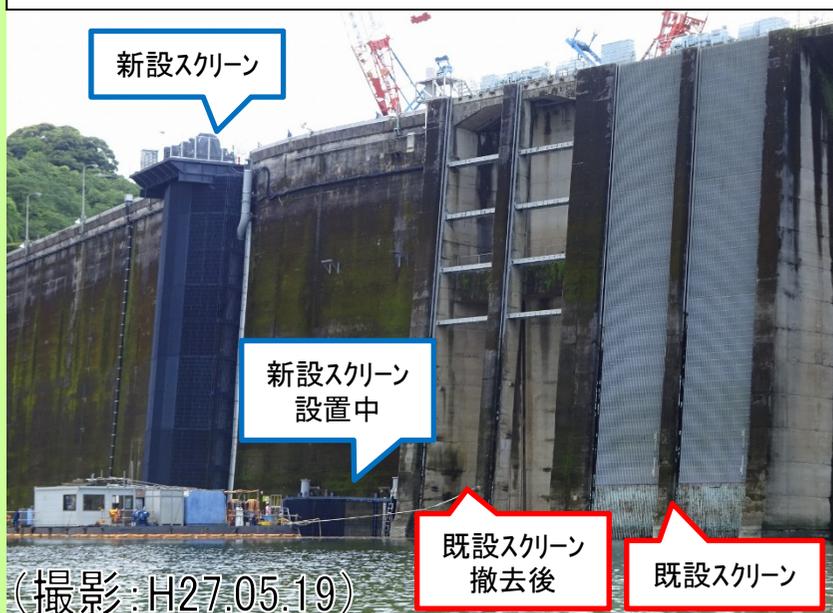

新設スクリーン

新設スクリーン  
設置中

既設スクリーン  
撤去後

既設スクリーン


(撮影:H27.05.19)

## 付替発電管スクリーン設置

発電管の上流側(ダム湖)にスクリーン(発電管内にゴミが流れ込むのを防ぐ柵)の設置を行っています。

現在1号が完成しており、2号の設置を行っています。

既設1号のスクリーンは必要なくなったため撤去しました。

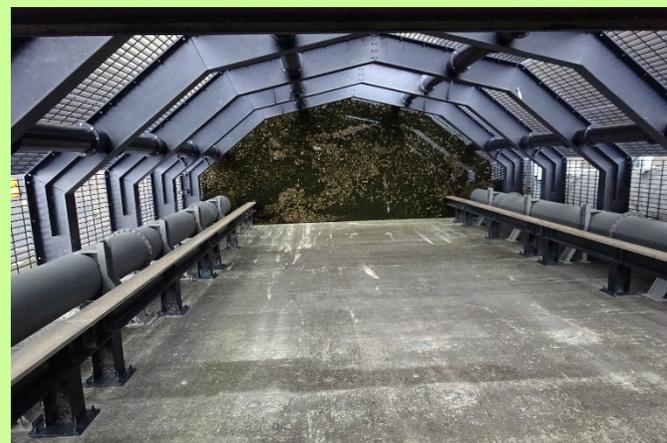

上から見た中の様子(1号スクリーン)
