



鹿児島東西道路だより 2025年2月号

【上荒田、上之園、中央、武地区】

2025年2月8日 発行

工事に関する問い合わせ先

番号	名称	TEL	担当者
①	大成・大豊JV 工事業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官		099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/	


平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
今月も引き続き、田上側へ向けてのシールドトンネル掘進を進めてまいります。
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

①中洲通り地区 【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 中洲通りから田上側へ向かってトンネルの掘進・構築を進めます。

2月上旬頃から、シールドトンネルは山岳部の掘進に入ります。

当工事では主に、南九州の特殊土である「シラス」(火砕流堆積物)が掘削対象土質となります(下図参照)。
シラス地質における大断面シールドトンネルの施工は、当工事が初めての事例となりますので、引き続き最新の知見や技術を取り入れながら安心・安全な施工に努めてまいります。

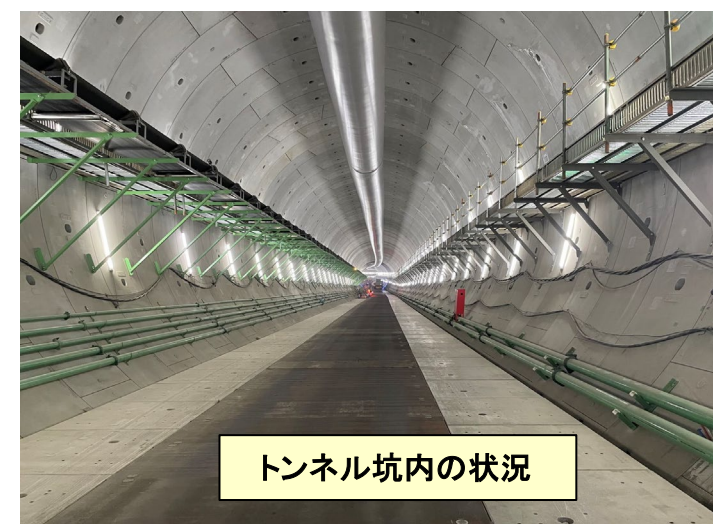

トンネル坑内の状況



掘削土を地上へ搬出している状況

インフォメーションセンターへお気軽にお越し下さい。

開館時間: 平日 9:00~12:00、13:30~16:30



シールドマシン(名称:シールドん)の位置




2月3日朝時点(発進立坑から765m)



シールドマシン(名称:シールドん)の位置などは、鹿児島国道事務所ホームページ(左のQRコード)からもご確認いただけます。(※毎週更新)

山岳側凡例			
地質時代	地層名	記号	層相
新生代 第四紀 更新世	入戸火砕流堆積物	Si-L	軟質シラス (指標硬度: 25未満) (N<30程度)
		Si-M	中硬質シラス (指標硬度: 25~30) (30≦N程度)

地質縦断面図

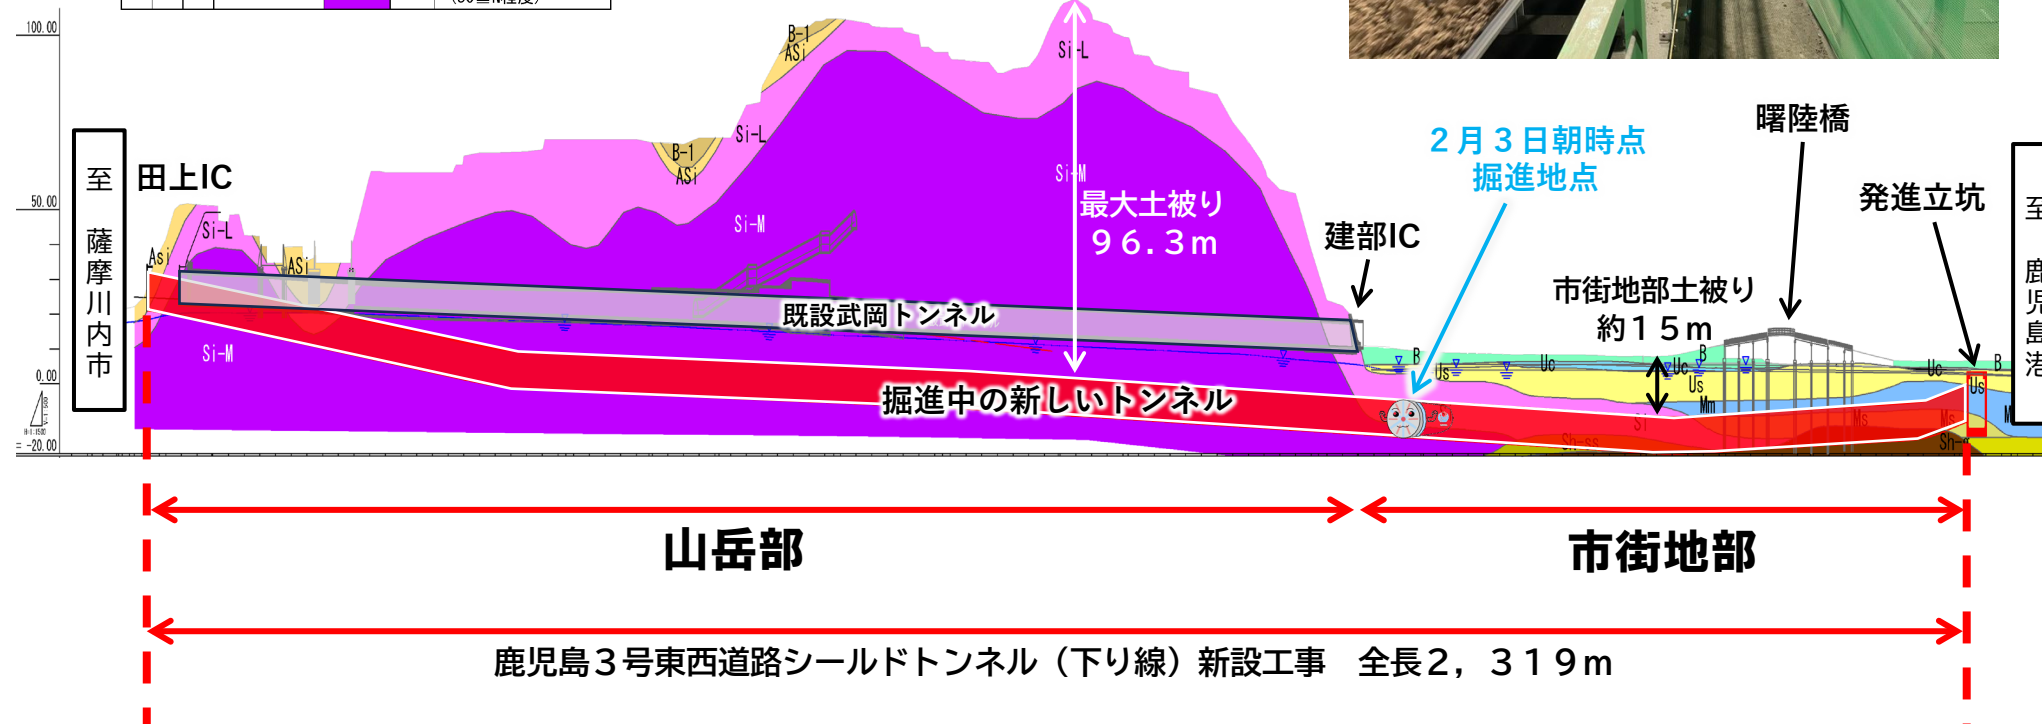



鹿児島東西道路だより

2025年2月号
【武岡、田上地区】

平素より鹿児島東西道路の工事にご理解とご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
今月は、武岡地区の東雲川調整池では、構台の撤去工事を進めてまいります。
また、田上地区のトンネル到達部では支持杭設置工事と覆工設置工事、田上高架橋では引き続き拡幅工事を行ってまいります。
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2025年2月8日 発行

工事に関する問い合わせ先

番号	名称	TEL	担当者
② ③	大成・大豊JV 工事作業所	099-298-1499 (FAX 099-298-1492)	常田、橋本
④	(株)日本ピーエス	090-7169-6397 (FAX099-296-7510)	多田
国土交通省 鹿児島国道事務所 建設監督官		099-216-3853	古寺

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL	東西だより(過去号含む)掲載ページ
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) https://www.qsr.mlit.go.jp/kakoku/ 	


②東雲川調整池(武岡地区)【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 地盤改良工事で使用した、調整池内に設けていた作業構台を撤去します。
2月は引き続き東側の作業構台の撤去作業を行った後、西側の撤去作業を行います。
3月は陸上に設けている作業構台の撤去作業に、東側から着手する予定です。

施工場所	工 種	施工時期	施工時間
東雲川調整池 (武岡地区)	作業構台解体 (覆工・支保工など撤去)	2024年12月9日 ~ 2025年3月上旬頃迄	昼間

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真

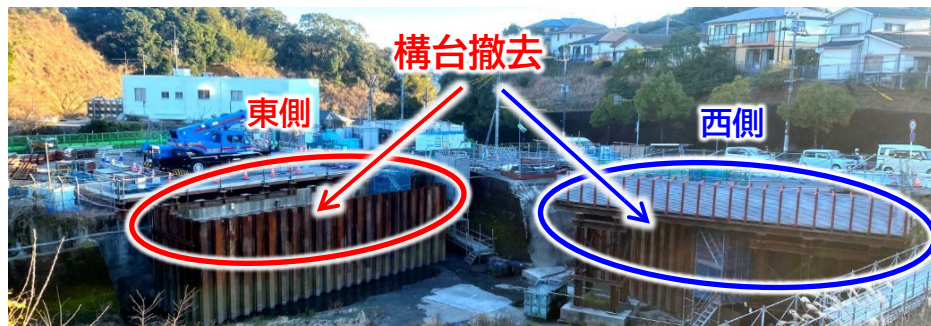

④田上高架橋上部工(P7~A2)拡幅工事(田上地区)【施工:㈱日本ピーエス】

工事の予定 2月は、既設橋と新設橋の間に、コンクリートを打設する作業を行います。
3月は、落橋防止装置の設置及び足場の解体作業を行う予定です。

施工場所	工 種	施工時期	施工時間
田上ランプ (田上地区)	床版・横組工	2025年1月6日 ~ 2月下旬 上部作業に伴い市道中園線・高原線の 片側交互通行規制実施	昼間
	床版補強工		

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真



2025年1月に主桁の間にコンクリートを打設しました。

③トンネル到達部(田上地区)【施工:大成・大豊JV】

工事の予定 2月から3月は新しいトンネル入口部の構築に向けて、覆工支持杭設置工事並びに覆工設置工事を行います。

施工場所	工 種	施工時期	施工時間
トンネル到達部 (田上地区)	覆工支持杭設置	2025年1月14日 ~ 2025年2月末頃迄	一部昼間、 夜間
	覆工設置	2025年2月下旬 ~ 2025年3月下旬頃迄	

※ 天候等により施工時期がずれる場合があります。

施工状況写真



支持杭設置作業状況



工事場所

