

令和7年8月27日
国土交通省
九州地方整備局
鹿児島国道事務所

記者発表資料 (第17報)

国道10号網掛橋^{あみかけばし}の復旧工事の状況について

令和7年8月27日 17時20分

- 令和7年8月7日から大雨による災害発生に伴い、網掛橋^{あみかけばし}の通行止めを実施しています。・・・被災状況等 [資料①](#)
- 交通解放までは、数カ月を要する可能性があるため、復旧工事の進捗状況等お知らせします。・・・復旧工程及び現在の進捗状況 [資料②-1](#) [資料②-2](#)
- 道路利用者の皆様には、ご不便をおかけしますが、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

【参考】

○国道10号の通行止めによる代替路である東九州道の隼人東IC～加治木IC間を利用する車両は無料で通行可能です。

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所

技術副所長 ^{ふたくち たかし} 二口 卓史

保全対策官 ^{たなか ひろみ} 田中 宏美

TEL: 099-216-3111 (代表)

位置図




写真①【被災状況】



写真②
【上流側護岸の被災状況】

令和7年8月10日撮影

側面図

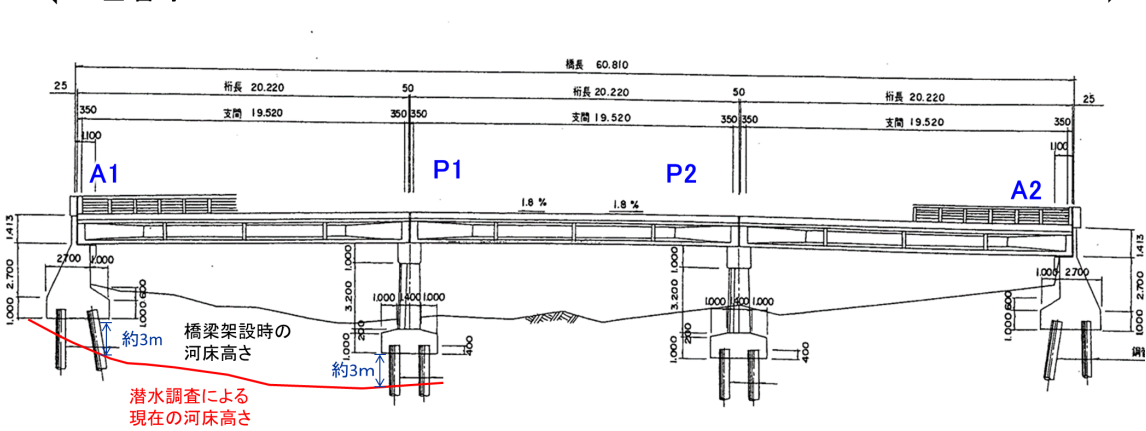

令和7年8月8日撮影

写真③
【下流側護岸の被災状況】



A1橋台背面の路面陥没

河川護岸崩落

令和7年8月10日撮影

国道 10 号網掛橋 復旧工程

R7.8.27 現在

8月8日～

大雨災害による通行止め開始

- ・河川洗掘による通行止め
- ・被害状況及び要因の整理

8月16日
～8月20日

被災状況調査と復旧方法の検討

- ・地質調査、洗掘状況調査⇒設計等

済

8月16日～
8月20日

8月21日～

復旧工事開始

実施中

8月21日～

準備工

がれき、根固めブロック等撤去（潜水作業を含む）

未実施

洗掘対策

【A I 橋台、P I 橋脚】

- ①仮締切（鋼矢板設置）
- ②充填材打設（水中コンクリート打設）
- ③防護コンクリート
- ④橋台背面復旧

交通解放

※作業完了： 済 現在作業中： 実施中 作業着手前： 未実施

潜水士による「がれき」撤去の状況

- ・潜水士ががれきにワイヤーをかけ、クレーンで吊り上げて撤去します（写真左）。
- ・根固めブロックは、水中リフターを用いて支障とならない場所に移動しています（写真右）。
- ・がれきは今後の工事（鋼矢板による仮締切）の支障となるため撤去が必要です。


【網掛橋上流側】



【網掛橋下流側】



～復旧工程～

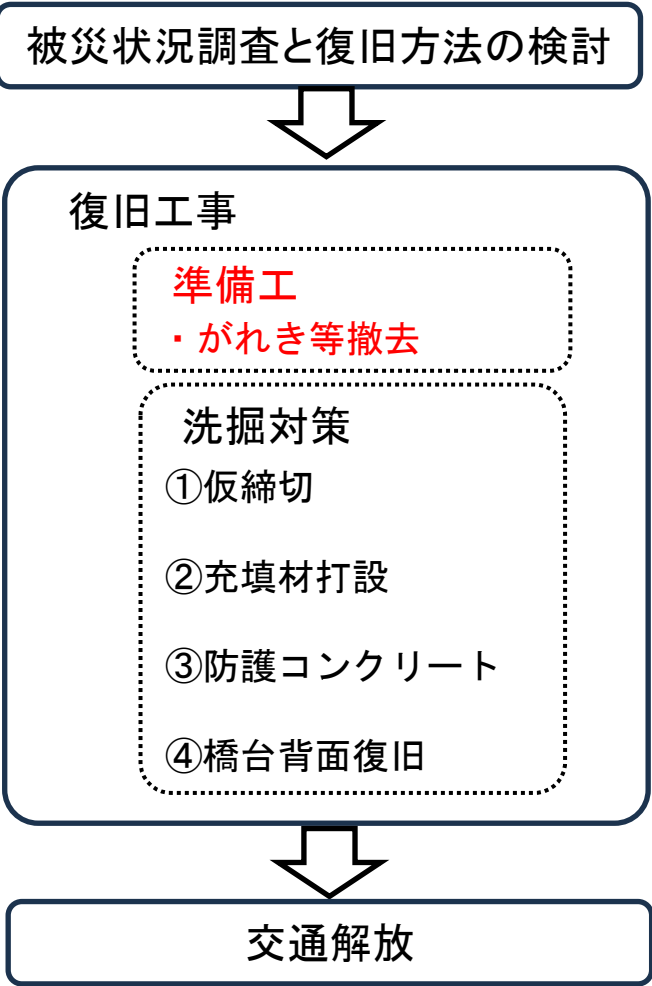

※朱書きは現在の作業内容を示しています。
