

国道10号 網掛橋(鹿児島県姶良市)復旧工事の進捗状況

◆鋼矢板設置の進捗状況のお知らせ

OP1橋脚は、鋼矢板の設置が終わり、補強材を設置中です。

OA1橋台は、鋼矢板設置中ですが、河床土砂に埋まった転石の影響で鋼矢板設置が中断することもあります。

・今回、潜水士と水陸両用バックホウが連携し、転石を除去しながら鋼矢板施工を継続しています。

～復旧工程～

被災状況調査と
復旧方法の検討

復旧工事

準備工

がれき等撤去

洗掘対策

①仮締切(鋼矢板設置)


9月15日から着手

②充填材打設

③防護コンクリート

④橋台背面復旧

交通解放

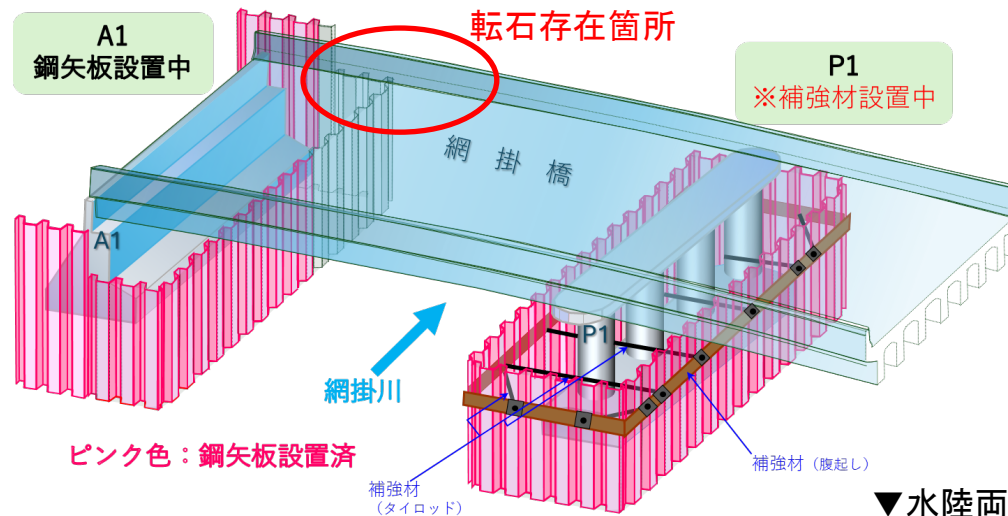

1～1.3m程の転石が
未だ多く存在

▼水陸両用バックホウの稼働状況



▼水陸両用バックホウによる転石除去の状況

