


国道10号 網掛橋(鹿児島県姶良市)復旧工事の進捗状況

～復旧工程～

被災状況調査と
復旧方法の検討



復旧工事

準備工

がれき等撤去


洗掘対策

①仮締切（鋼矢板設置）

②充填材打設


③防護コンクリート

④橋台背面復旧



交通解放

▼復旧計画

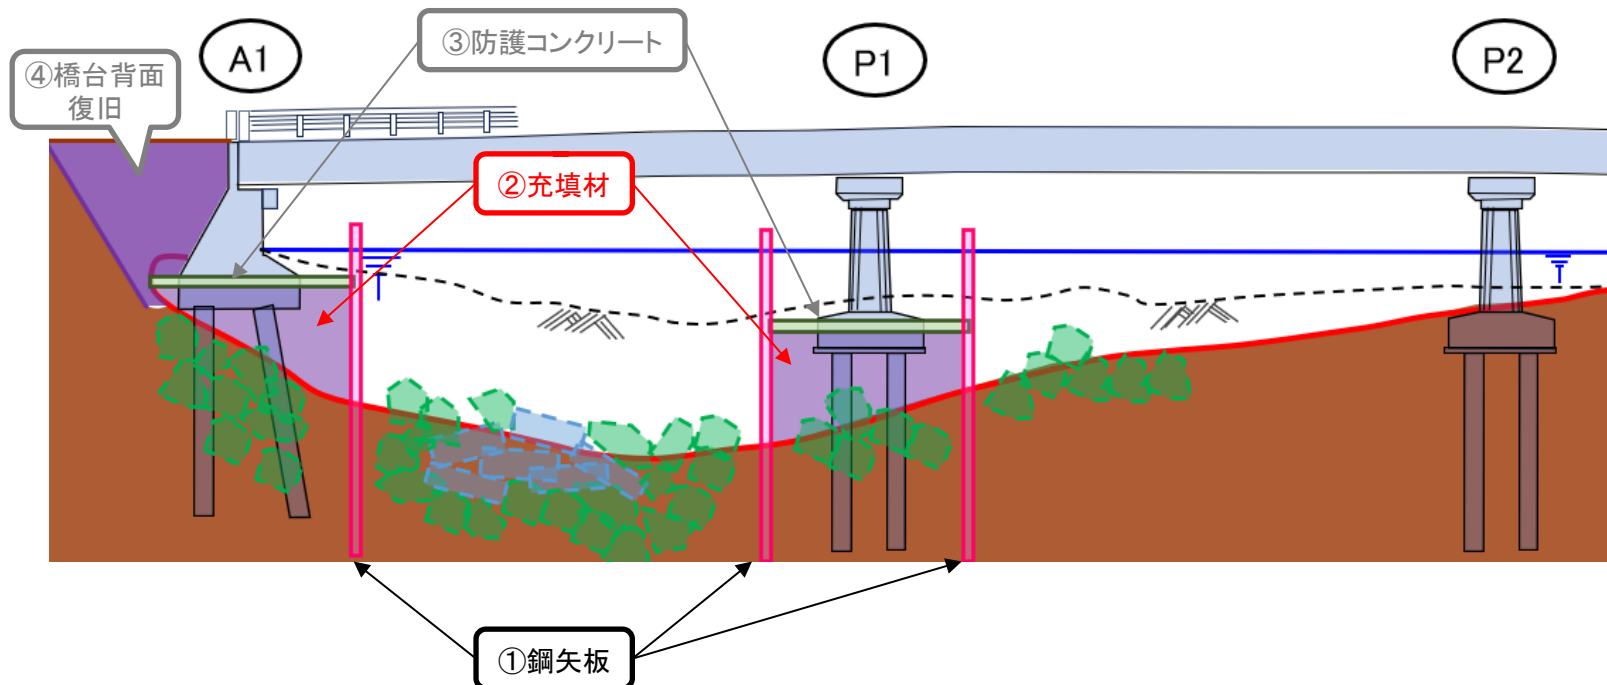

▼仮締切内への充填材打設状況（イメージ）



＜充填材（水中グラウト）＞

水中グラウトは、水中のコンクリート構造物の補修や補強に用いられる特殊なグラウト材です。

水中で材料分離が起きにくい、「水中不分離性」と高い流動性を持ち、水中でも隙間なく充填できることが特徴です。

※朱書きは、現在実施中の作業内容を示しています。
