

鹿児島東西道路だより 8月号

鹿児島3号東西道路(下り線)立坑設置工事

飛鳥建設(株)鹿児島立坑作業所

TEL: 099-204-9733 FAX: 099-204-9731

7月27日に地中連続壁工事が完了いたしました。工事へのご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

7月29日より鋼矢板撤去工を開始し、続いて路面覆工の設置を行っています。

8月11日～15日を夏季休暇とし、8月16日から地盤改良工の施工を開始する予定です。

これからも安全、環境面に配慮して施工してまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事の予定

工種	施工時期	施工時間
鋼矢板撤去、路面覆工	7月29日～8月中旬	昼間
地盤改良工	8月中旬～10月初旬	昼間
掘削工、土留支保工	10月初旬～	昼間



地盤改良工(上之園側作業帯での施工状況)

工事に関する問い合わせ先




名称	TEL	担当者
飛鳥建設(株) 鹿児島立坑作業所	099-204-9733	永井、掛水
国土交通省 鹿児島国道事務所 鹿児島建設監督官	099-220-6134	桑本

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/

路面覆工施工順序(3D)

*立坑上部に覆工板を設置することで立坑内部を掘削しても立坑上部に施工機械等を配置することができます。

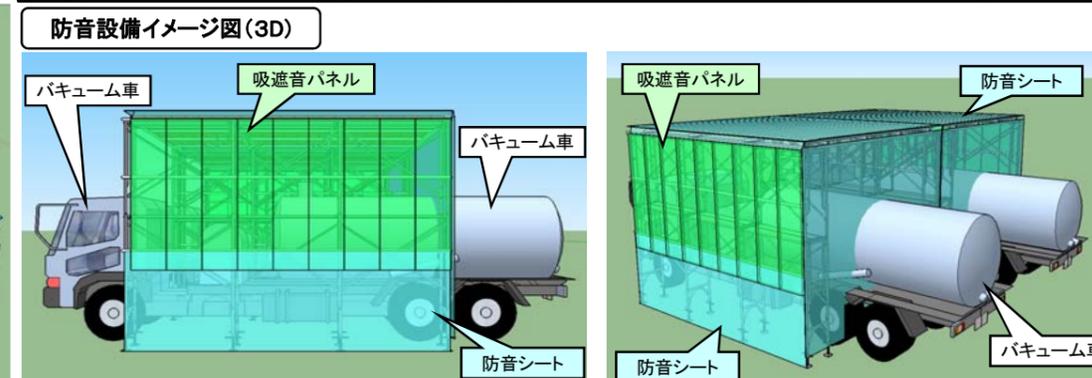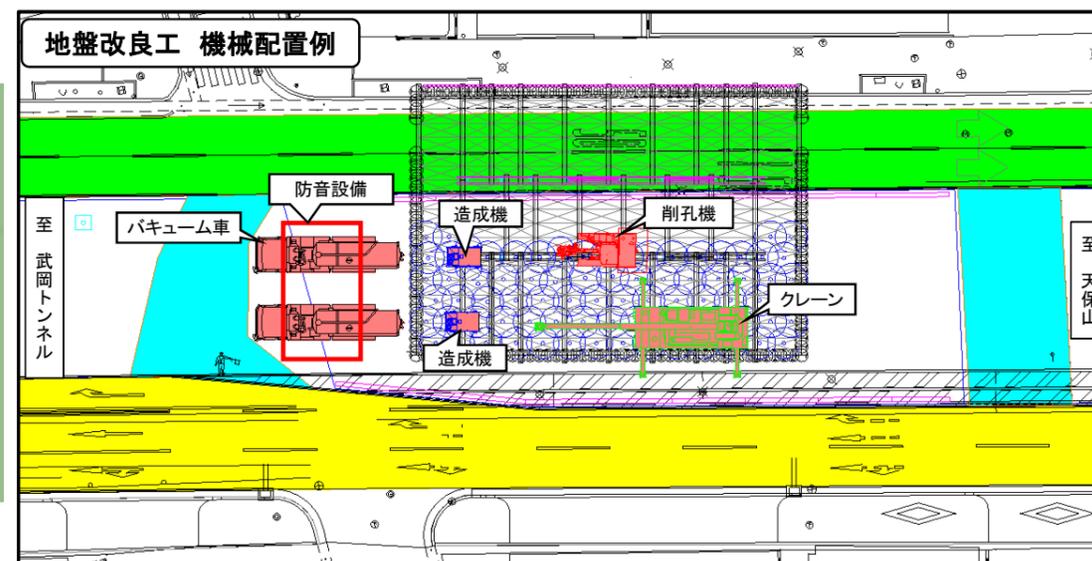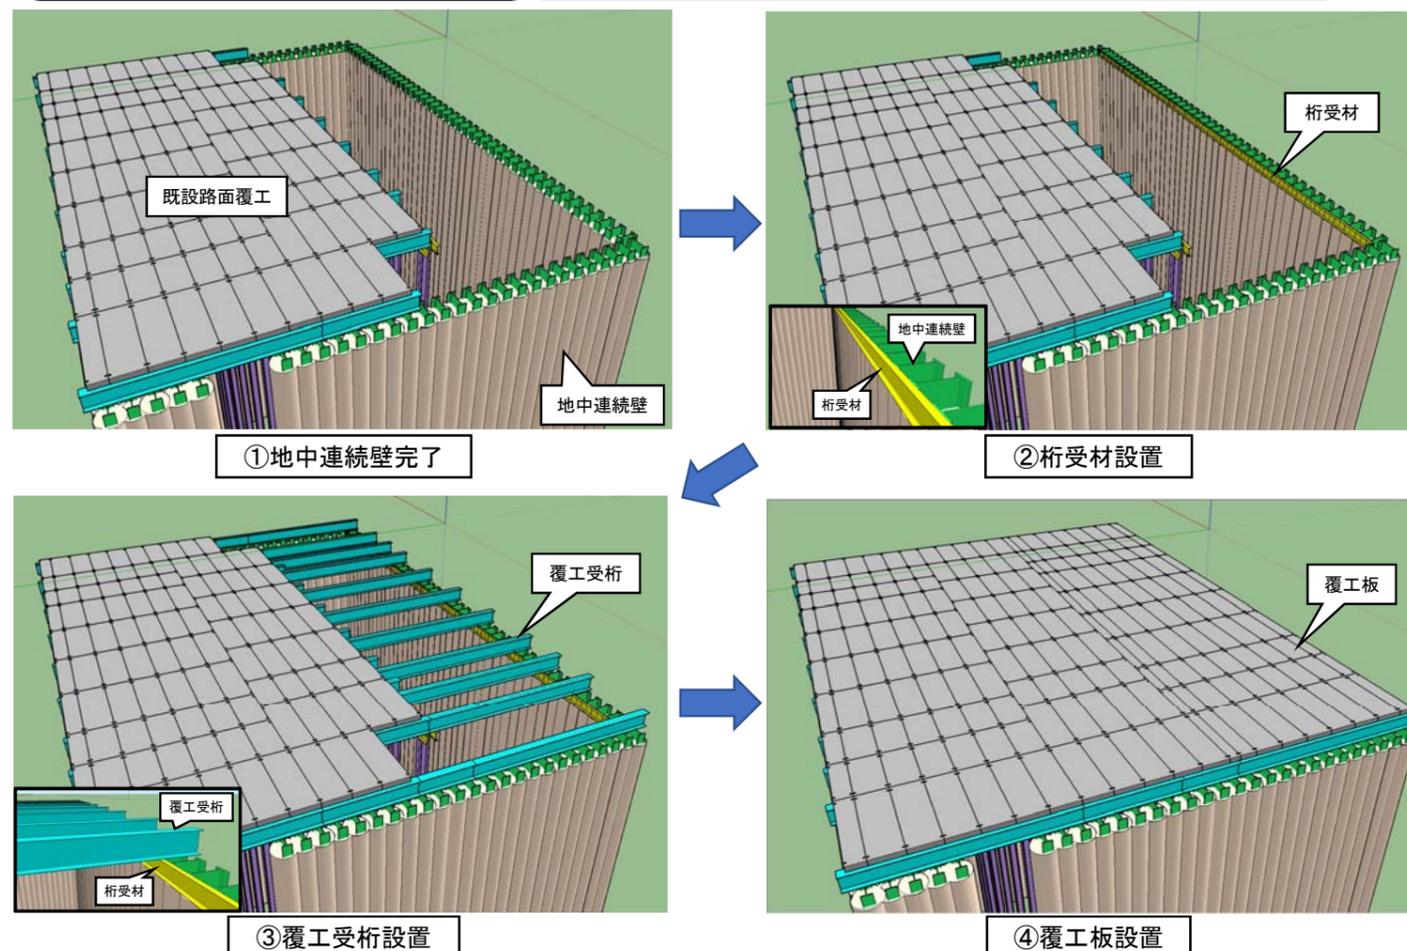

*バキューム車の音源を防音シートで囲むことで騒音を低減します。
