


鹿児島3号東西道路シールドトンネル（下り線）工事 地表面計測結果のお知らせ

【12月26日(火) シールドマシン位置図】

● 地表面計測位置

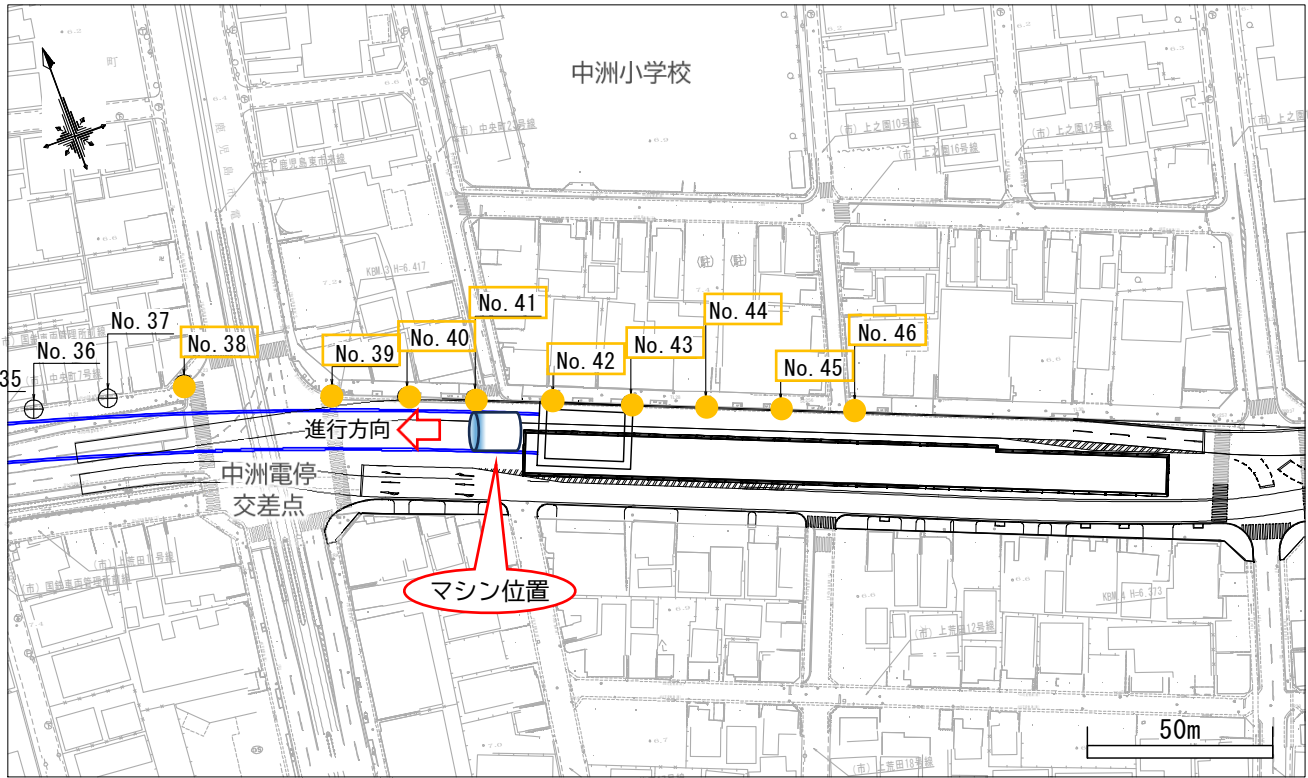

【12月26日(火) 地表面計測結果】

(大成・大豊特定建設工事共同企業体 計測値)

計測点	鉛直方向高さ (初期値)	鉛直方向高さ (計測値)	鉛直方向変位
No. 38	6.290 m	6.291 m	+ 1 mm
No. 39	6.193 m	6.195 m	+ 2 mm
No. 40	6.316 m	6.318 m	+ 2 mm
No. 41	6.337 m	6.337 m	± 0 mm
No. 42	6.405 m	6.406 m	+ 1 mm
No. 43	6.395 m	6.395 m	± 0 mm
No. 44	6.322 m	6.322 m	± 0 mm
No. 45	6.315 m	6.314 m	- 1 mm
No. 46	6.292 m	6.292 m	± 0 mm

※計測位置は、マシンの位置から前後30mの範囲を基本としています。
