


鹿児島3号東西道路シールドトンネル（下り線）工事 地表面計測結果のお知らせ

【5月22日（水） シールドマシン位置図】

● 地表面計測位置

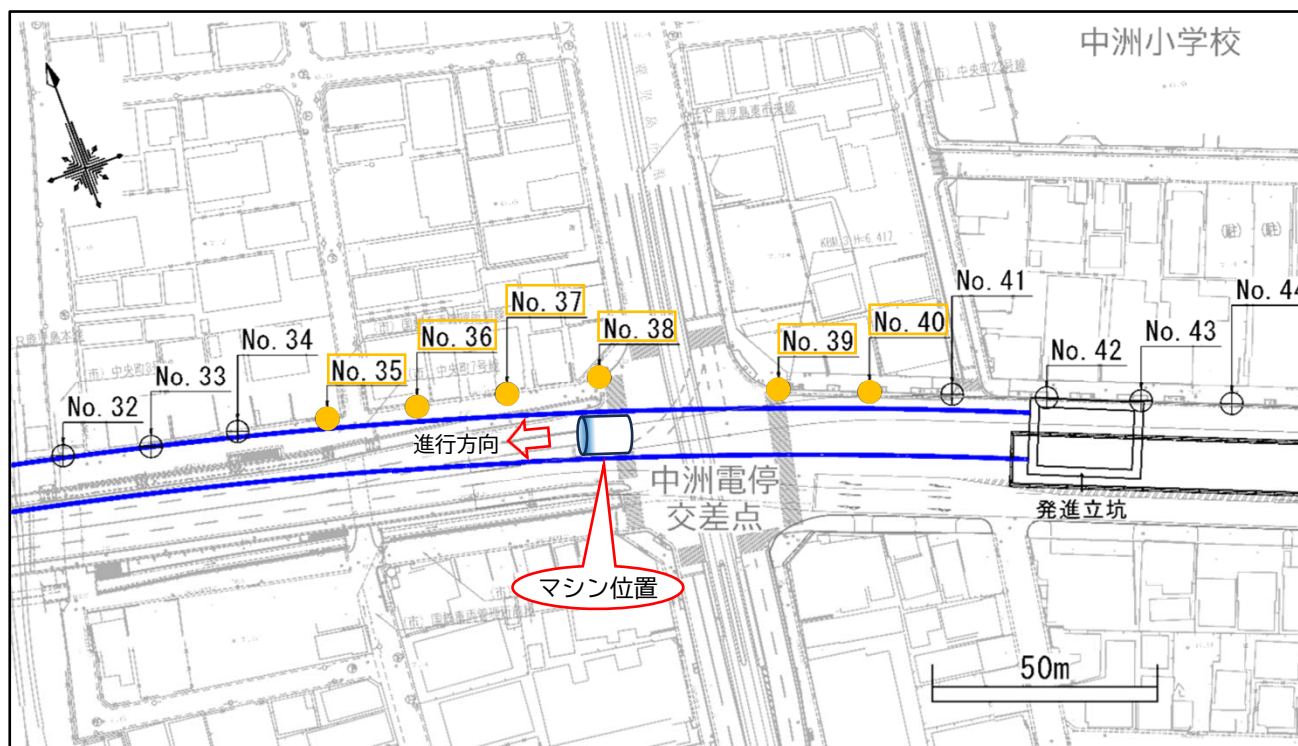

【5月22日（水） 地表面計測結果】

（大成・大豊特定建設工事共同企業体 計測値）

計測点	鉛直方向高さ (初期値)	鉛直方向高さ (計測値)	鉛直方向変位
No.35	6.879 m	6.878 m	- 1 mm
No.36	6.724 m	6.723 m	- 1 mm
No.37	6.460 m	6.460 m	± 0 mm
No.38	6.290 m	6.289 m	- 1 mm
No.39	6.193 m	6.192 m	- 1 mm
No.40	6.316 m	6.314 m	- 2 mm

※計測位置は、マシンの位置から前後30mの範囲を基本としています。
