


鹿児島3号東西道路シールドトンネル（下り線）工事 地表面計測結果のお知らせ

【9月12日(木) シールドマシン位置図】

● 地表面計測位置

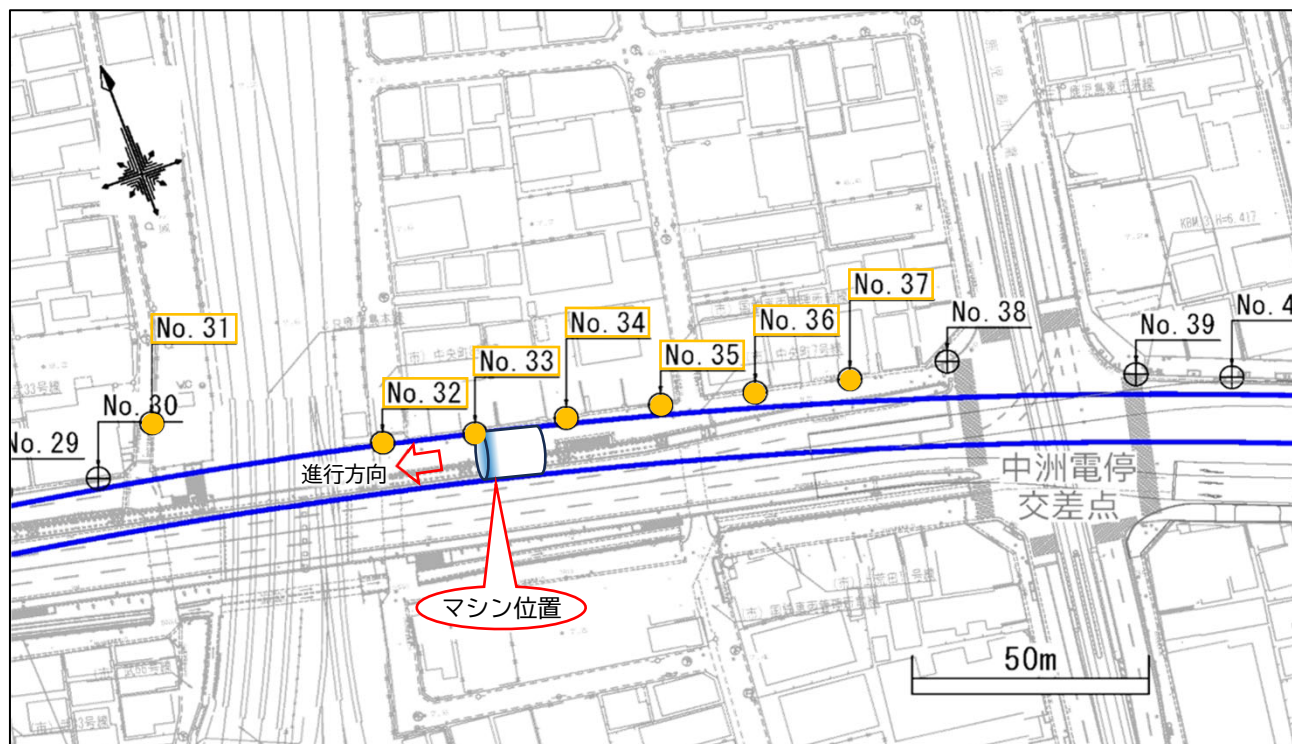

【9月12日(木) 地表面計測結果】

(大成・大豊特定建設工事共同企業体 計測値)

計測点	鉛直方向高さ (初期値)	鉛直方向高さ (計測値)	鉛直方向変位
No.31	7.324 m	7.325 m	+ 1 mm
No.32	7.178 m	7.180 m	+ 2 mm
No.33	7.024 m	7.026 m	+ 2 mm
No.34	6.940 m	6.938 m	- 2 mm
No.35	6.879 m	6.880 m	+ 1 mm
No.36	6.724 m	6.724 m	± 0 mm
No.37	6.460 m	6.462 m	+ 2 mm

※計測位置は、マシンの位置から前後30mの範囲を基本としています。
