


鹿児島3号東西道路シールドトンネル（下り線）工事 地表面計測結果のお知らせ

【10月24日(木) シールドマシン位置図】

● 地表面計測位置

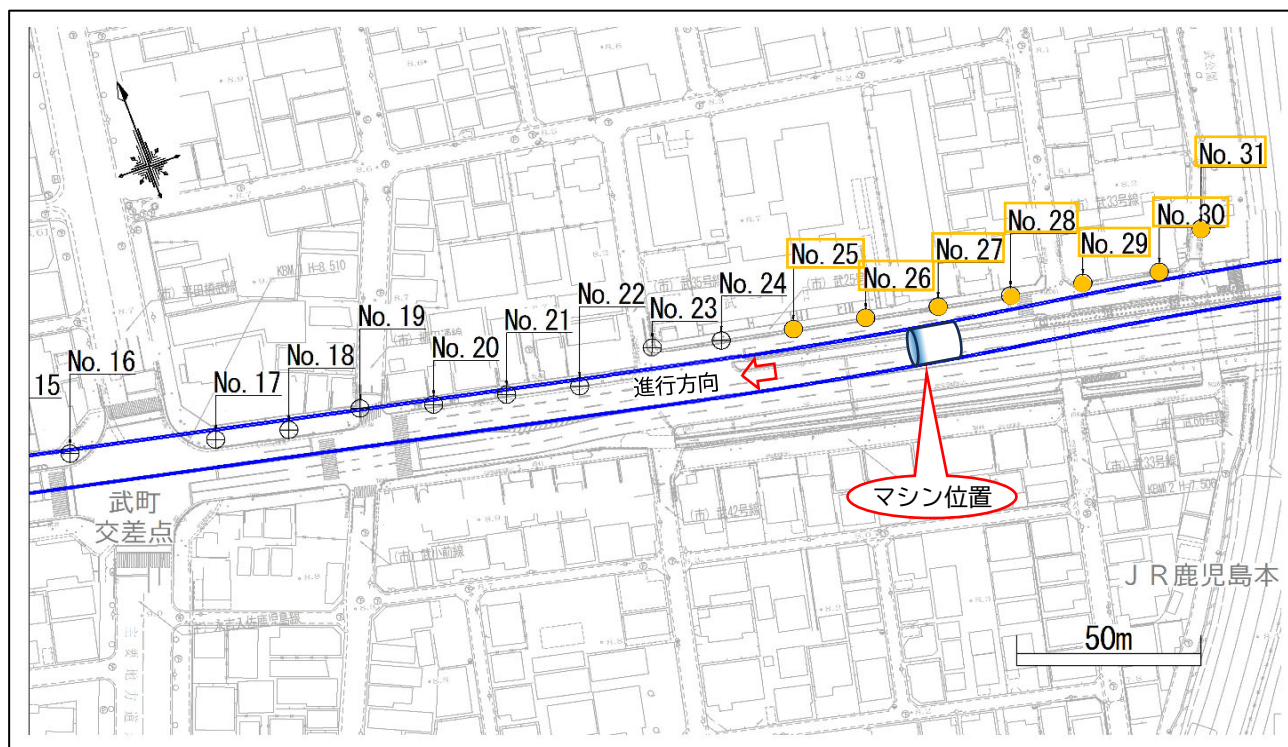

【10月24日(木) 地表面計測結果】

(大成・大豊特定建設工事共同企業体 計測値)

計測点	鉛直方向高さ (初期値)	鉛直方向高さ (計測値)	鉛直方向変位
No.25	7.796 m	7.797 m	+ 1 mm
No.26	7.681 m	7.683 m	+ 2 mm
No.27	7.748 m	7.749 m	+ 1 mm
No.28	7.641 m	7.640 m	- 1 mm
No.29	7.508 m	7.505 m	- 3 mm
No.30	7.488 m	7.480 m	- 8 mm
No.31	7.324 m	7.324 m	± 0 mm

※計測位置は、マシンの位置から前後30mの範囲を基本としています。
