


鹿児島3号東西道路シールドトンネル（下り線）工事 地表面計測結果のお知らせ

【11月12日(火) シールドマシン位置図】

● 地表面計測位置

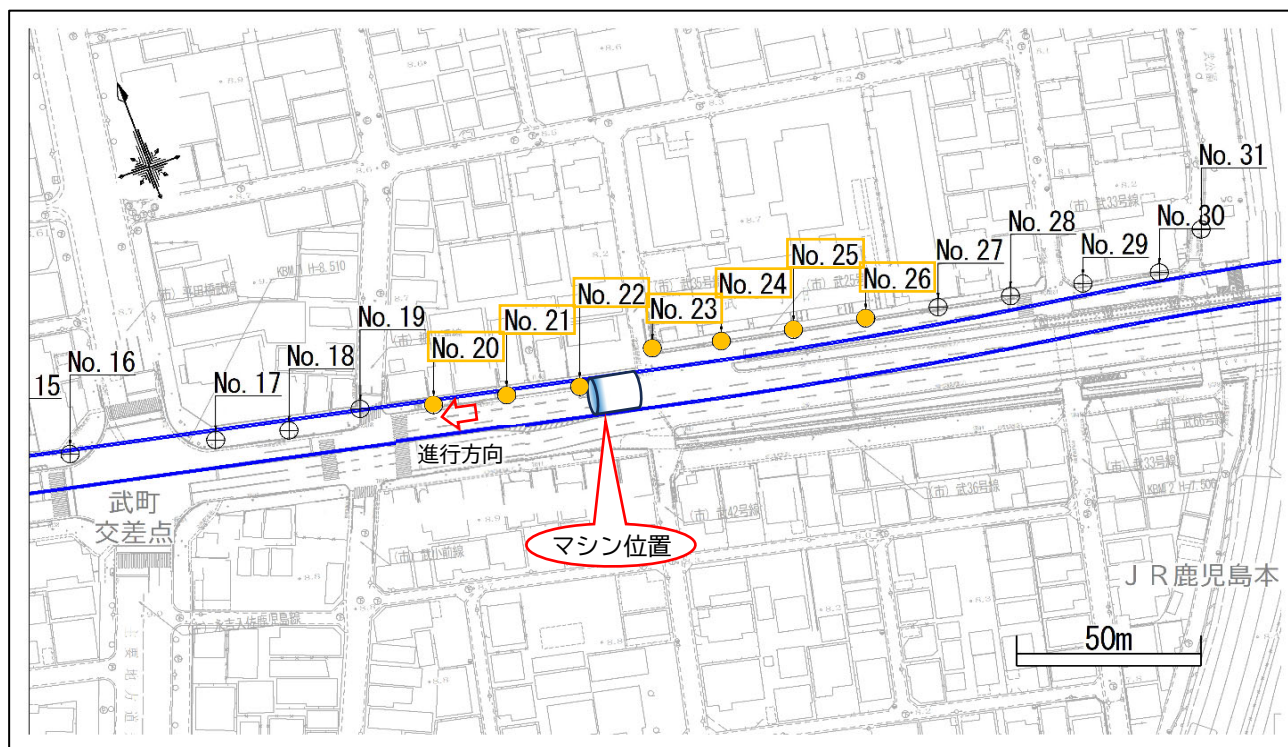

【11月12日(火) 地表面計測結果】

(大成・大豊特定建設工事共同企業体 計測値)

計測点	鉛直方向高さ (初期値)	鉛直方向高さ (計測値)	鉛直方向変位
No.20	8.036 m	8.035 m	- 1 mm
No.21	8.064 m	8.064 m	± 0 mm
No.22	7.835 m	7.837 m	+ 2 mm
No.23	7.747 m	7.746 m	- 1 mm
No.24	7.850 m	7.850 m	± 0 mm
No.25	7.796 m	7.795 m	- 1 mm
No.26	7.681 m	7.680 m	- 1 mm

※計測位置は、マシンの位置から前後30mの範囲を基本としています。
