


鹿児島3号東西道路シールドトンネル（下り線）工事  
 地表面計測結果のお知らせ

【1月14日(火) シールドマシン位置図】

● 地表面計測位置

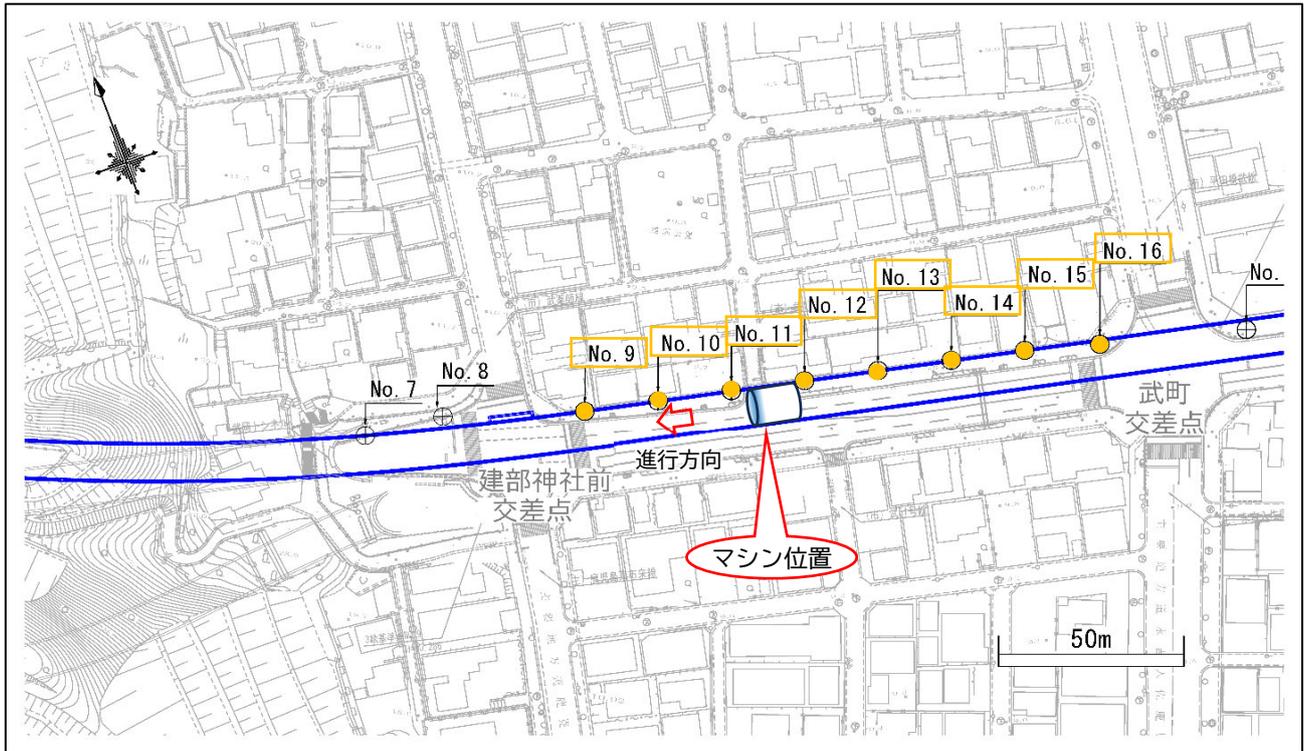

【1月14日(火) 地表面計測結果】

(大成・大豊特定建設工事共同企業体 計測値)

計測点	鉛直方向高さ (初期値)	鉛直方向高さ (計測値)	鉛直方向変位
No.9	9.885 m	9.884 m	- 1 mm
No.10	9.575 m	9.572 m	- 3 mm
No.11	9.213 m	9.210 m	- 3 mm
No.12	9.135 m	9.135 m	± 0 mm
No.13	9.048 m	9.049 m	+ 1 mm
No.14	8.918 m	8.919 m	+ 1 mm
No.15	8.790 m	8.789 m	- 1 mm
No.16	8.732 m	8.730 m	- 2 mm

※計測位置は、マシンの位置から前後30mの範囲を基本としています。
