

工事名：高野川第2砂防堰堤(2期)工事  
工期：令和2年4月1日～令和3年6月30日  
施工業者：株式会社 技建日本



右岸側より



左岸側より


2月の施工内容  
盛土工と床固め工

3月の施工内容  
床固め工の予定



高野川第2砂防堰堤 正面

工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤(1期)工事  
工期：令和2年4月1日～令和3年3月26日  
施工業者：三和建設(株)



福寿草が見頃です



三和建設さんより、福寿草を見に来られた方々へ砂防堰堤の広報活動をして頂いてます。ありがとうございます。




2月は砂防堰堤本体の型枠組立・コンクリート打設の繰返し作業をおこない、管理用道路ではガードレール設置を終了し法面工事をおこなっています。

3月からは堰堤の足場の撤去及び片付け、管理用道路では法面工事の完了と清掃をおこないます。現場作業は3月19日までを予定しています。

工事名：築切砂防堰堤（二期）工事  
 工期：令和2年5月1日～令和3年6月30日  
 施工業者：株式会社 技建日本

2月は本堰堤に鋼製枠を設置し、基礎部に根固めコンクリート打設をおこない、上流側では底版を盛土・コンクリート打設をし本堰堤まで水が流れやすくする工事をおこなっています。

3月は工事用道路において上旬に掘削・床掘の土砂を搬出し発泡スチロールにて盛土をおこない中旬頃からはコンクリート床版を打設しガードレールの基礎を設置する予定です。

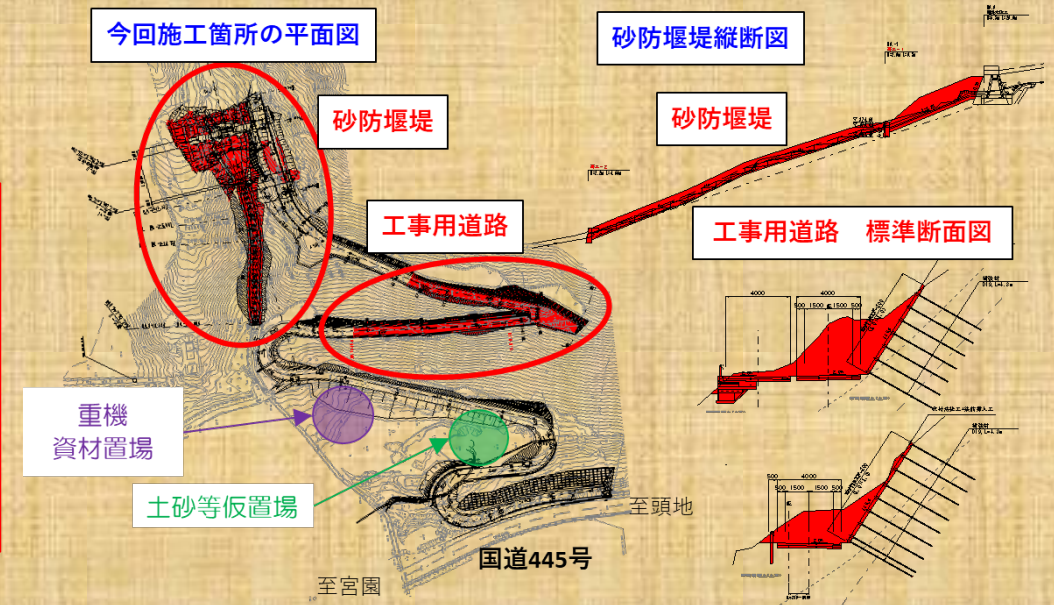

【1月】



砂防堰堤上流側



砂防堰堤下流側



工事用道路起点側より撮影




工事用道路終点側より撮影

【2月】




工事名：九折瀬第3砂防堰堤(3期)工事  
工期：令和2年11月16日～令和3年6月30日  
施工業者：丸昭建設株式会社

現場写真(令和2年12月撮影)

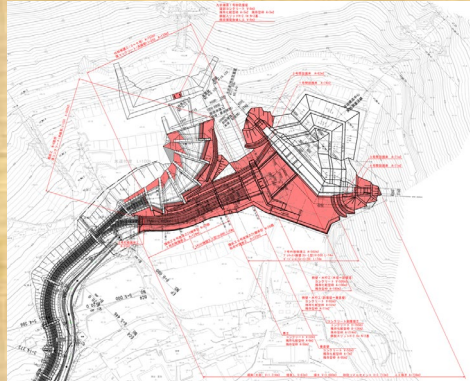

赤着色が今回の工事範囲

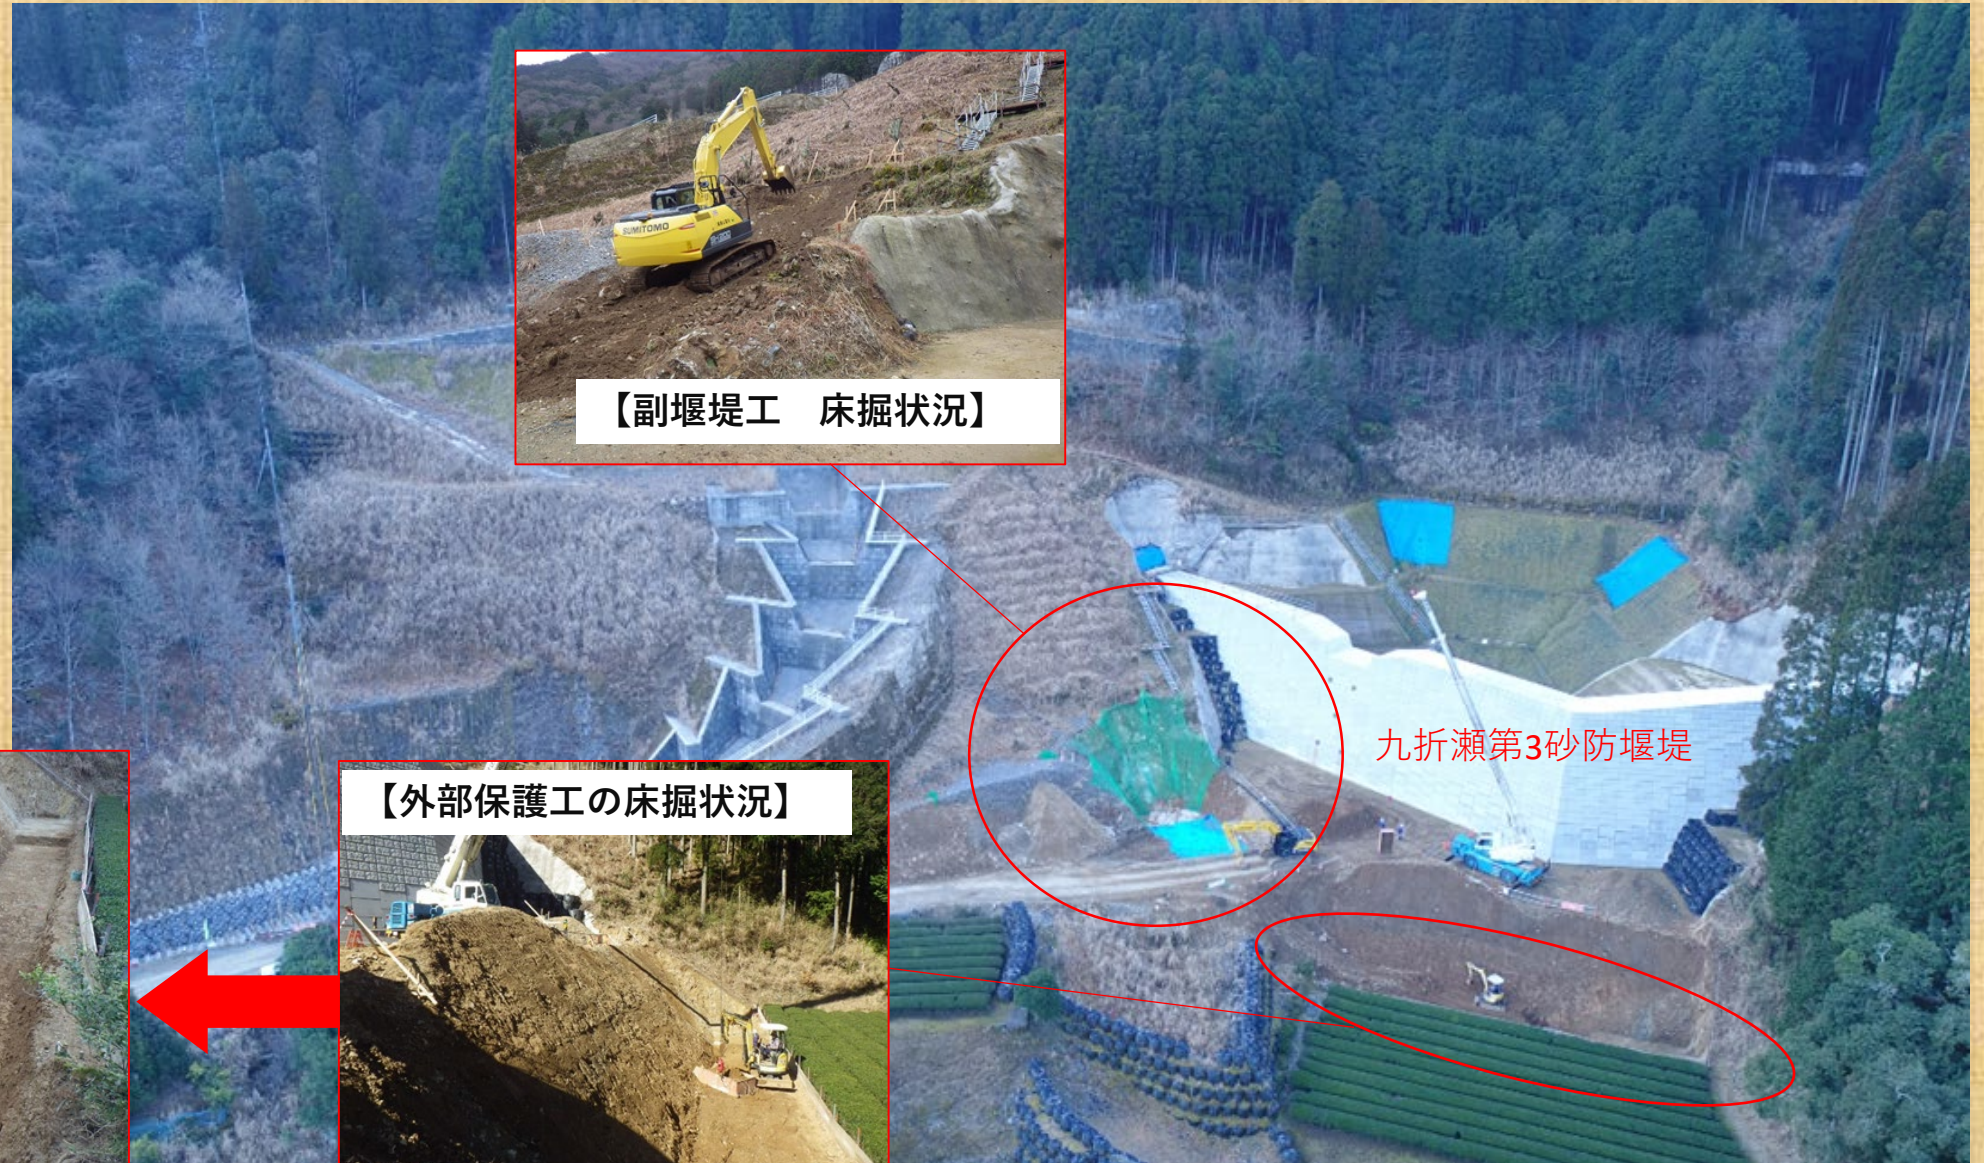

【副堰堤工 床掘状況】

九折瀬第3砂防堰堤

外部保護工床掘完了




【外部保護工の床掘状況】



2月は副堰堤工の床掘及び外部保護工の床掘の作業をおこない、外部保護工の床掘は完了しました。  
3月は副堰堤工の床掘作業と外部保護工の本体作業を予定しています。

工事名：縦木川砂防堰堤補修他工事  
工期：令和2年8月18日～令和3年3月31日  
施工業者：(株)土井組

縦木川砂防堰堤補修工事現場

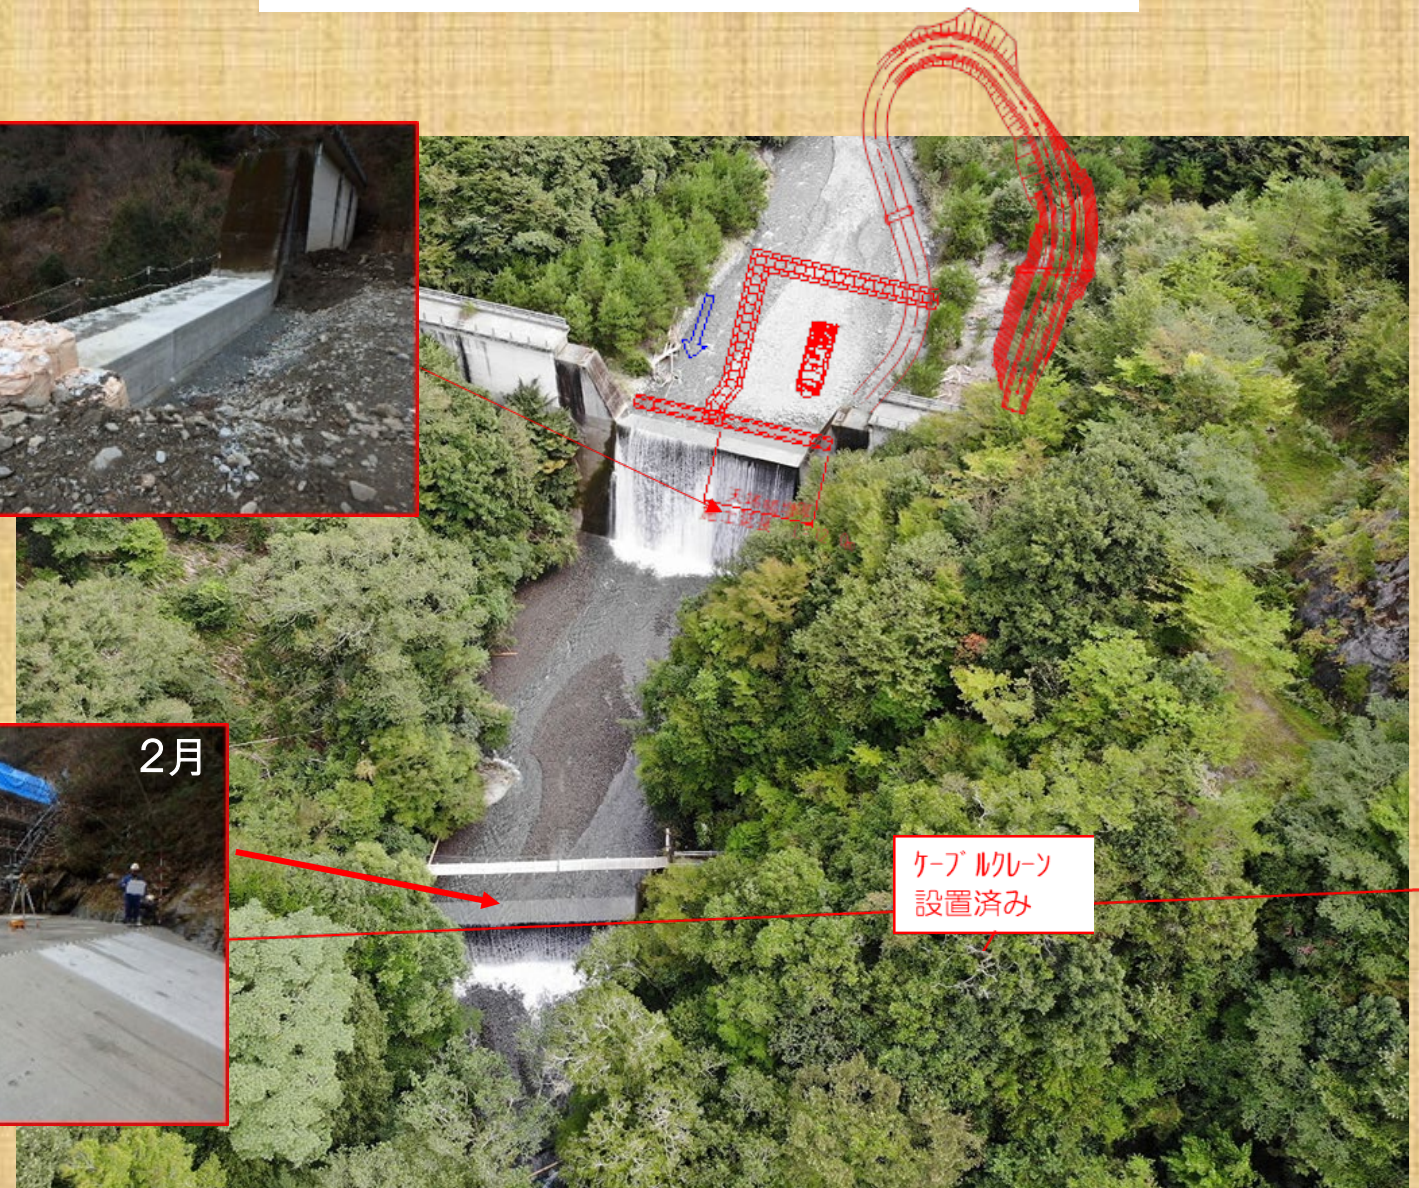


2月は副堰堤左岸側を1週間に2～3回のペースで生コン打設をおこない水叩きコンクリート施工を完了、腹付けコンクリートは残り2回の打設にて完了となります。  
3月は副堰堤の残り2回のコンクリート打設をおこない完了し、その後は河川内の資機材やケーブルクレーンの撤去をおこないすべて完了となります。

工事名：縦木川砂防堰堤補修他工事  
工期：令和2年8月18日～令和3年3月31日  
施工業者：(株)土井組

2月は仮水路を約80m整形し、  
掘った土砂(3000m<sup>3</sup>)を10t ダンプに  
て運搬をしています。  
3月も引き続き仮水路の整形及び土砂  
搬出をおこない、今月にて工事を完了  
する予定です。

宮目木川土砂撤去・仮水路作成現場

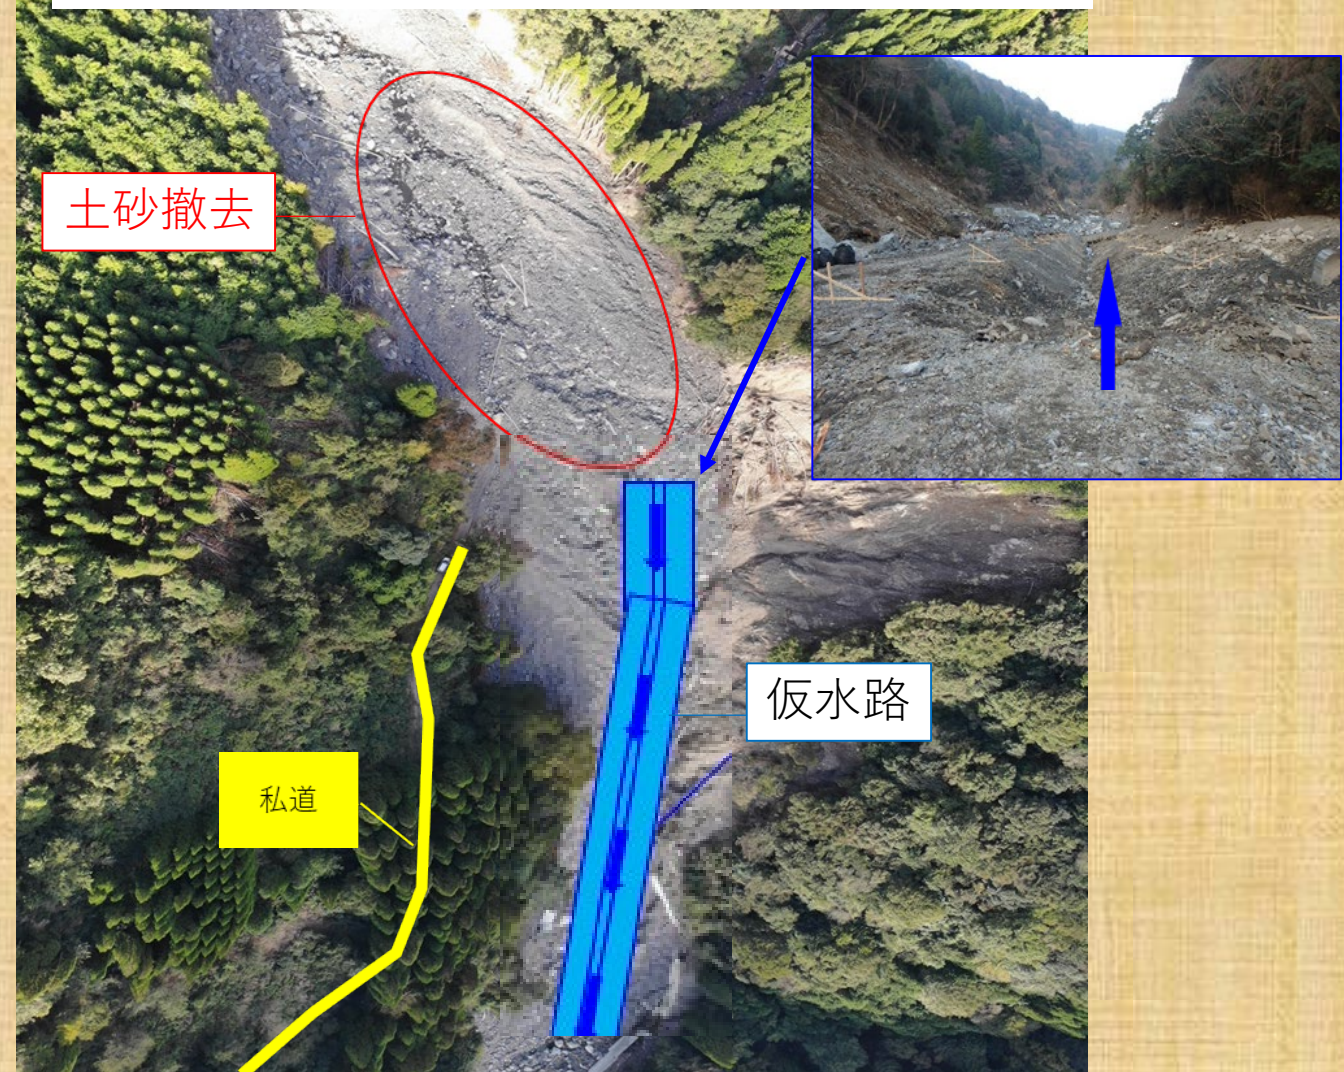

☑ 砂防建設監督官詰所より工事進捗情報をお届けいたします。  
3月に入り五木村は暖かい日が続き、山桜や菜の花が咲き“春”を感じております🌸 ただ、川辺川では3月1日より山女魚漁解禁でしたが去年の7月豪雨にて溜まった土砂の掘削・搬出がおこなわれており、例年より釣人が少なくチョットと寂しい気もします・・・  
今月も詰所管内の現場では工事関係者皆様のおかげで順調に工事は進んでおります。3月末にはホンノコウ谷川・縦木川の工事が完了予定です。年度末に向け事故等なく無事に工事が進むことを願っています！  
#五木村プチ情報 ヒストリアテラス五木谷に五右衛門風呂の体験施設があるのを知っていますか？  
無料で体験できるそうです。五木村の思い出に1回入ってみませんか？
