

工事進捗状況



令和3年7月5日現在


工事進捗率

九折瀬砂防堰堤（令和3年12月28日）


高野川砂防堰堤・築切砂防堰堤（令和4年3月31日）まで延期となりました。




進捗率




進捗率



進捗率



進捗率

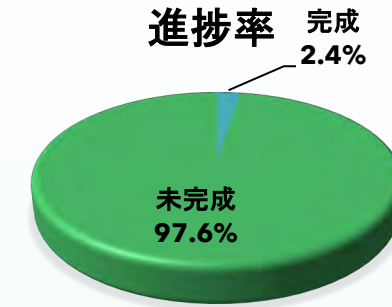

工事名：高野川第2砂防堰堤（2期）工事

工期：令和2年4月1日
～令和3年6月30日
工期延期 令和4年3月31日
施工業者：株式会社 技建日本

- 6月（今月）の施工内容
盛土工、護岸工
- 7月の施工内容
護岸工、工事用道路工



高野川第2砂防堰堤 正面



右岸側より左岸側



左岸側より右岸側

J-スリット堰堤

近年、全国各地で異常気象などによる土石流災害が頻発し、多大な被害をもたらしています。とりわけ、破壊力の大きな土石流による被害は甚大なものになります。このような土石流災害から安全で安心して生活できるように、さらに災害に強い国土づくりのために、「J-スリット堰堤」は全国に設置され、その効果を発揮しています。

安全・安心な構造

溪流環境の保全

土石流・流木の確実な捕捉



工事名：ホンノコウ谷川砂防堰堤（2期）外工事

工期：令和3年4月1日
～令和4年3月31日


施工業者：三和建设 株式会社

- 現在、掘削が終わり、湧水処理を行っています。
- これから堰堤の型枠組立・打設と続きます。
- また、久連子地区の堰堤背面の堆砂土砂撤去工事箇所については、梅雨明けから着工前測量を行います。



久連子地区

赤色で塗潰している箇所の土砂を撤去します。

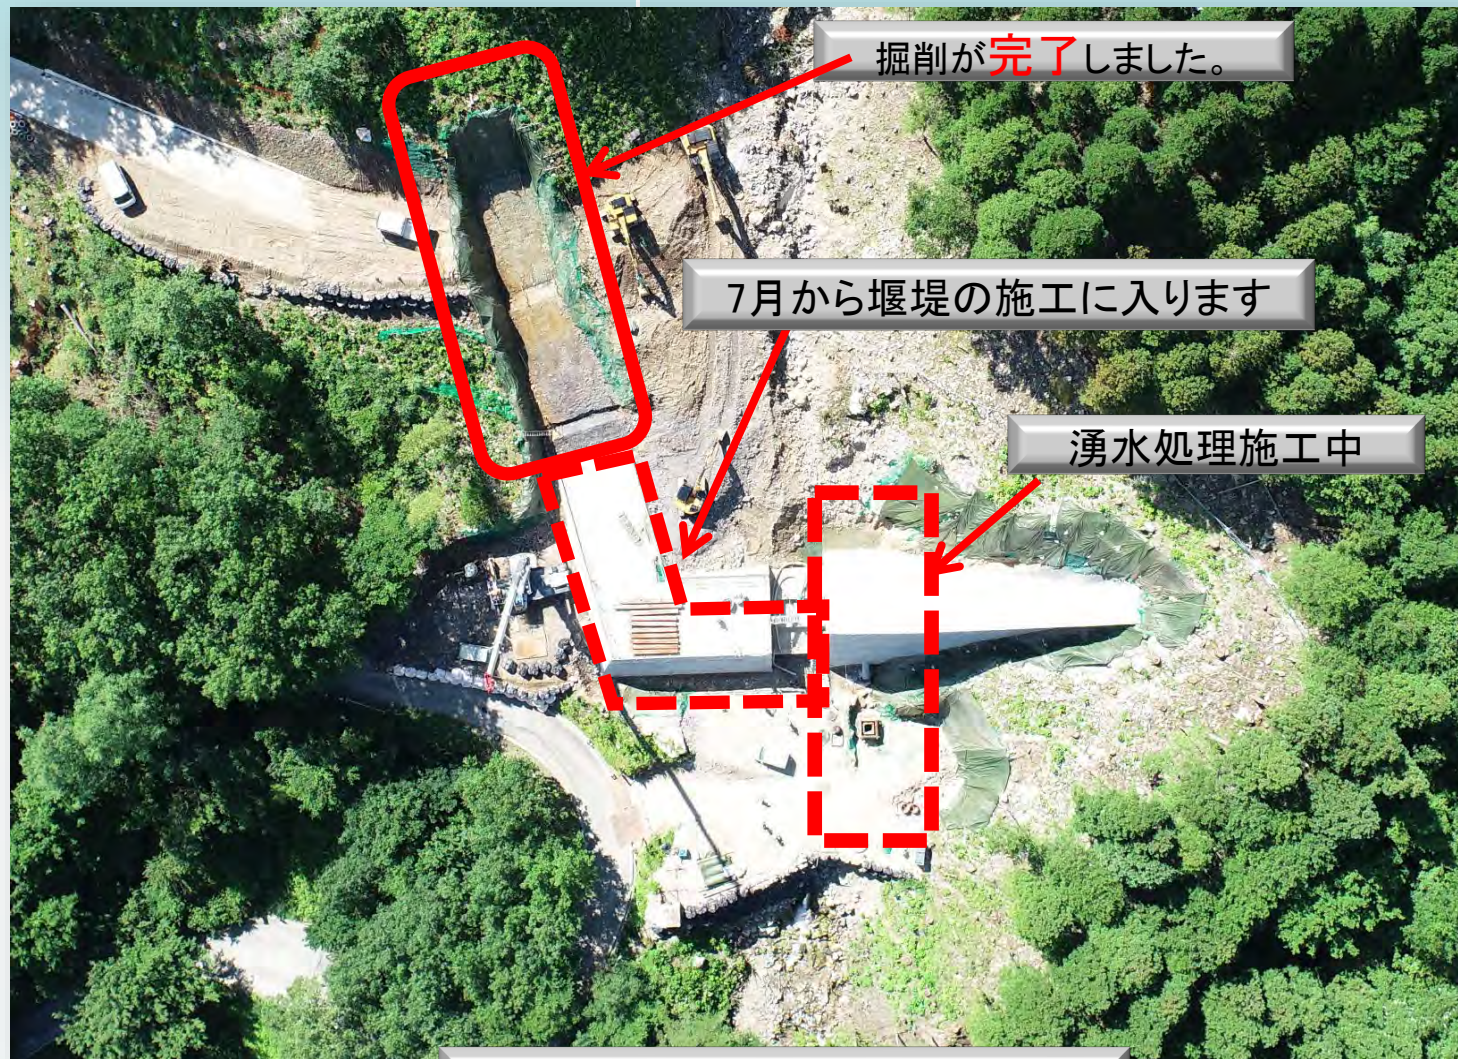

進捗状況写真 6月21日(空撮)

工期：令和2年11月16日
～令和3年6月30日

工期延期 令和3年12月28日

施工業者：丸昭建設 株式会社

工事名：九折瀬第3砂防堰堤（3期）工事



【鋼製堰堤工：九折瀬第1砂防堰堤】



【6号外部保護工】




【コンクリート副堰堤工】



【7号外部保護工】



【本堤上流側盛土】

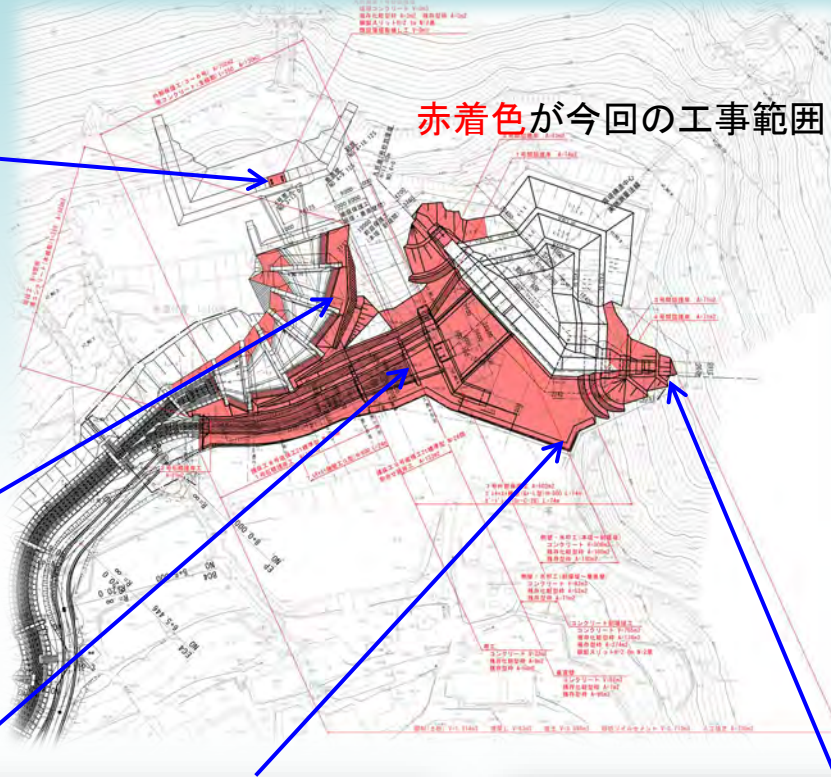

工事箇所（令和3年6月撮影）



工事名：築切砂防堰堤（二期）工事

工期：令和2年5月1日
 ～令和3年6月30日
 工期延期 令和4年3月31日
 施工業者：株式会社 技建日本



砂防堰堤上流側より撮影




工事用道路起点側より撮影



砂防堰堤下流側より撮影



工事用道路終点側撮影

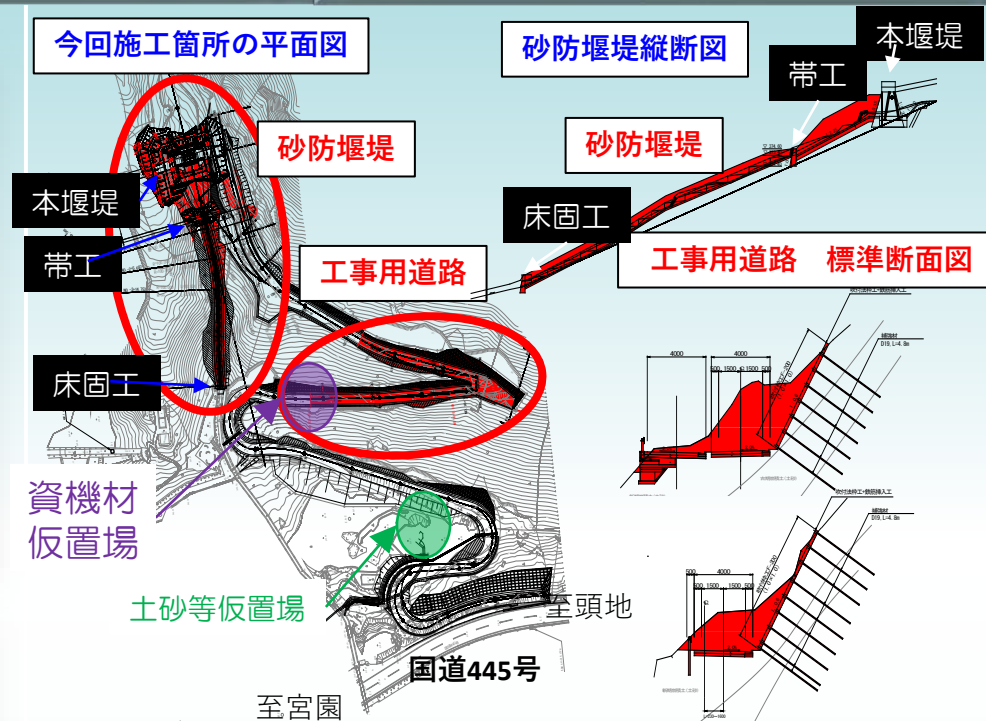

7月度の工事内容は、本堰堤下流の帯工の型枠・生コンクリート打設となりますが、約1週間に1回の生コンクリート打設となり7月下旬頃までの予定で帯工の構築を行います。1回の打設に生コン車約2台分が工事用道路を通行します。

また、帯工完了後、本堰堤と帯工の間を根固めブロック（2ト/個）にて積上げる作業となりますが、右岸側で139個必要なため、ブロック運搬車及び土砂運搬車が工事用道路を頻繁に通行することとなります。粉塵対策を行い作業をおこなってまいります。ご意見や苦情等がございましたら下記連絡先まで連絡をお願いします。

工事進捗裏情報

今回、初めて工事現場を**見学**させて頂きました。

狭い道、山を切り開いて造る工事用道路。

大きな岩を砕く作業など、大変な事ばかりで**驚きと感動**でした。

30℃を超える中での工事。（**熱中症対策**）

足下の悪い中での安全対策。それぞれの業者さんが工夫されておられました。

その中で、**三和建設さん**をご紹介致します。



水を引いて**熱中症対策**をされておられました。とても冷たいお水で涼しくなりました。頭も体も洗えますとお話されておられました。



二重ロック付き！



かわいいピンク色 ♡



工事現場にある**女性専用トイレ**！（男性使用禁止）左のリモコンには音を消す操作も付いていてビックリしました。芳香剤などこまめな**心遣い**も**素敵**でした。

五木村新情報



フキ



夏になるとたくさんの虫が多い五木村。五木村の為に頑張ってくれる虫もいます。川辺川のほとりで日本ミツバチが集めた五木村の恵みである「**地蜂蜜**」は全国から注文があるほどの人気商品です。蜂蜜には代謝をアップさせる成分があるそうです。ダイエット・健康の為にどうですか？（ちょっとお高いですが(^^;)）

川釣りの時期ですね。鮎、アブラメ釣りの方を見かけますが、**五木村では青いミミズで鰻が釣れます**。地元の方は仕掛けをされて、数日後に鰻を捕まえておられます。きれいな川で釣れる鰻は特別に美味しいです！！

五木村では青いミミズ（シーボルトミミズ）の事を**かんたろう**と読んでいますよ～(^^)

