

# 宮崎10号南横市地区改良外工事

施工 : 吉原建設株式会社

工期 : 平成30年 2月 6日 ~ 平成30年12月14日

工事内容 : 掘削工 V=19000m<sup>3</sup> 路体盛土 V=3000m<sup>3</sup> 残土処理 V=19000m<sup>3</sup>

: 置換工 V=2300m<sup>3</sup> 法枠工 A=3061m<sup>2</sup> カルバート工 1式


: 排水構造物工 1式 道路附属施設工 1式 標識工 1式

: CCTV設備工 1式 仮設工 1式 応急処理工 1式


監理技術者コメント:

施工場所が、住宅街で保育園・小学校・中学校・病院等が隣接しており一般通勤車両・通学者(自転車)等の第三者の通行が多い所での、土砂及び資機材運搬に伴う工事車両の交通事故防止に努めました。

また、多くの工事と輻輳し大変厳しい工程でしたが、現場に携わった全ての皆様のおかげで、来春予定の供用開始に向けて、早期に舗装・防護柵・電気通信業者さんへ、無事に引渡す事ができました。

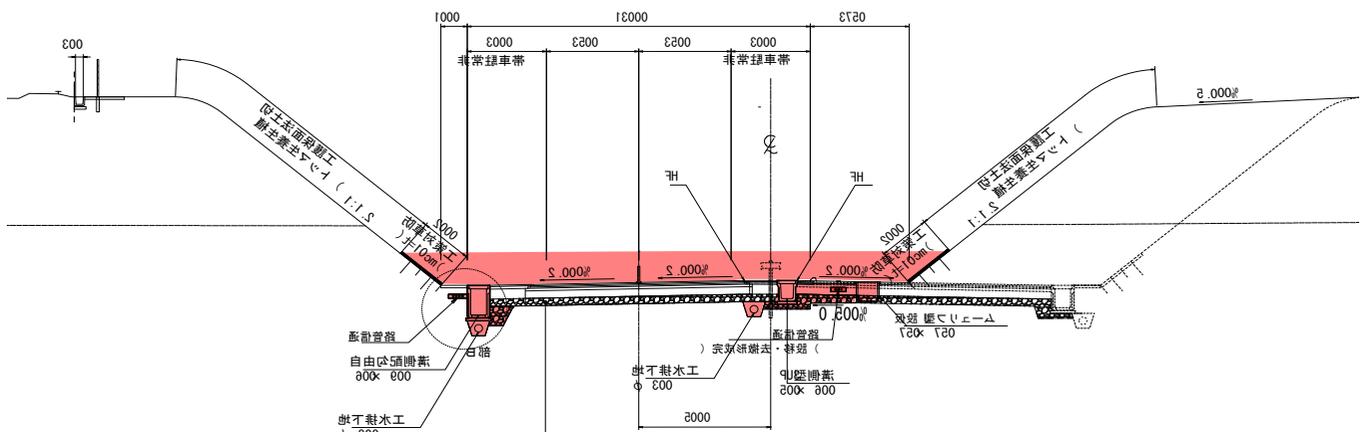

ICT土工マシンコントロールによる掘削状況

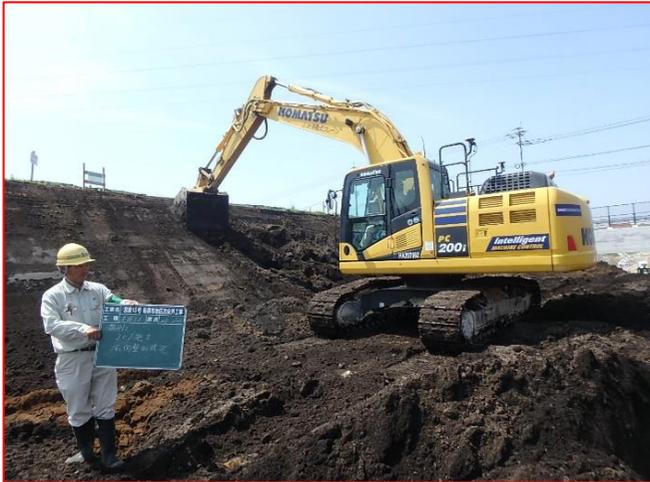

同左 バックホウ内モニター



中央地下排水設置状況



路床置換掘削完了状況



宮崎県産業開発青年隊ICT土工見学会



もちお保育園現場内散歩・働く車見学



工事関係技術者の氏名

吉原建設(株)	坂元 正和
	田之上 賢
	柿田 脩

井上 祐貴
甲斐 亜由夢
