

国道497号

伊万里松浦道路の進捗状況！ Vol. 1

■ 西九州自動車道(伊万里松浦道路)松浦1号橋の橋桁を架けました

国道204号部 架設状況



施工：JFEエンジニアリング(株)(H29年6月17日)

6月17日、18日及び7月1日、2日の夜間から朝方にかけて松浦市志佐町、国道204号線・別荘(べっそう)踏切交差点上空に、松浦1号橋の橋桁の架設を行いました。

松浦1号橋の桁架設は、国道204号と松浦鉄道をもたぐもので、重量約70tの橋桁を国土交通省施工工事と松浦鉄道(株)委託工事において、一晩で同時架設するものでした。

最初に国道204号上空にJFEエンジニアリング(株)が550tクレーンにて桁を架設し、次に松浦鉄道上空に宮地エンジニアリング(株)が650tクレーンにて桁架設を行いました。650tと550tの大型油圧クレーンを同時に使用し架設するのは珍しく、土曜日の深夜作業にも関わらず、松浦市長をはじめ市役所の方々など約30名が現場見学に訪れていました。



松浦鉄道部 架設状況


施工：宮地エンジニアリング(株)(H29年7月1日)



松浦市長と関係者の方々

■ 国道497号 伊万里松浦道路の取り組み状況

伊万里松浦道路のうち、今福IC～調川IC間につきましては平成29年度内の開通を目標に主に、舗装工、道路附属物工等を実施しています。また、調川IC～松浦IC間は平成30年度内の開通を目標に主に橋梁上部工、地盤改良工を実施しています。

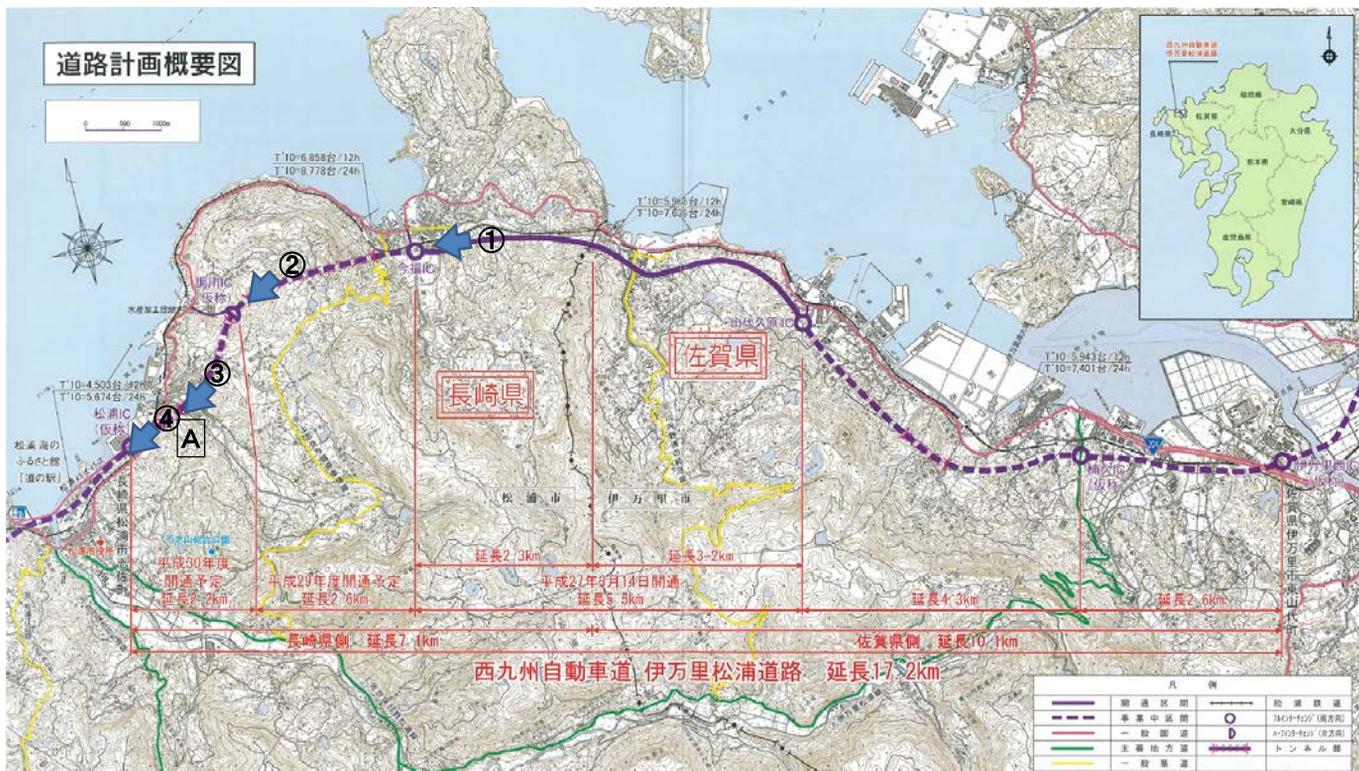

① 今福IC付近(舗装工、道路附属物工を実施中)



② 調川IC付近(舗装工、道路附属物工を実施中)



③ 調川1号トンネル付近(舗装工、道路附属物工を実施中)



④ 松浦IC付近(地盤改良工を実施中)

【この資料のお問い合わせ】

長崎県長崎市宿町316-1 国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所 工務課

TEL:095-839-9211
