
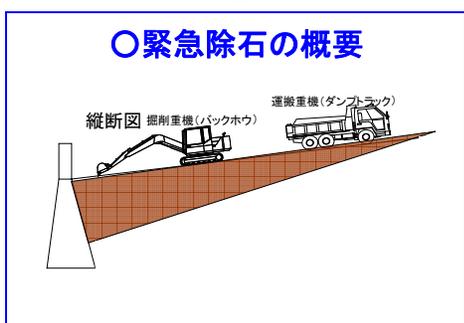


霧島山（新燃岳） 緊急的除石工事（高原町）

降雨等に伴い土石流が発生した際に土石流の氾濫を抑えるため、既設砂防堰堤上流の土砂を掘削除去しポケットを確保。（2月から継続的に工事を実施し、5月15日までに完了）

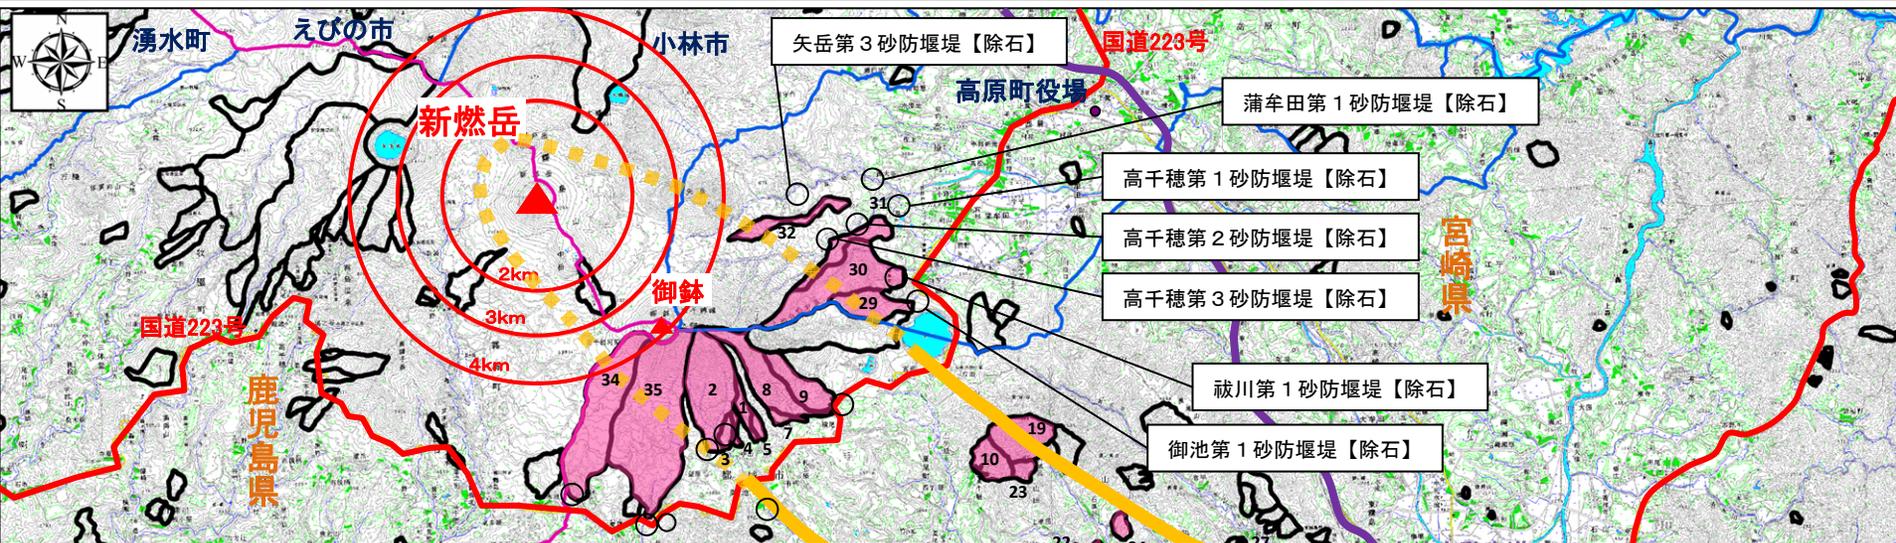

宮崎県西諸県郡高原町		施工実績					
河川名	砂防堰堤名	着手日	完了日	目標除石数量	除石数量	ブロック数量	土のう数量
祓川	祓川第1砂防堰堤	2月9日	2月25日	9,500m ³	10,900m ³	-	-
高千穂川	高千穂第1砂防堰堤	4月25日	5月15日	25,000m ³	25,200m ³	-	-
	高千穂第2砂防堰堤	2月7日	2月28日				
	高千穂第3砂防堰堤	2月8日	3月7日				
御池川	御池第1砂防堰堤	4月22日	5月9日	6,000m ³	4,100m ³	-	-
蒲牟田川	蒲牟田第1砂防堰堤	4月26日	5月6日	3,000m ³	1,700m ³	-	-
矢岳川	矢岳第3砂防堰堤	4月16日	5月9日	10,000m ³	10,400m ³	-	-
合計				52,300m ³	52,300m ³	-	-

霧島山（新燃岳） 緊急土石流対策工事（都城市）

特に大きな被害を及ぼす恐れのある宮崎県都城市の荒川内川・荒襲川において、国で緊急的に既設堰堤除石や仮設導流堤の工事を実施(2月から継続的に工事を実施し、5月31日までに完了)

