



令和5年5月17日
九州地方整備局
武雄河川事務所

河川の氾濫に備えて河川合同巡視を実施します。

～嘉瀬川水系・六角川水系・松浦川水系、総勢約100名で実施予定～

令和3年8月の前線に伴う大雨では、国土交通省武雄河川事務所の管理する六角川水系・松浦川水系において、氾濫危険水位を超える出水となり、六角川では河川の氾濫が発生しました。

これから出水期を迎えるにあたり、水防時に適切な対応が迅速に取れるよう、嘉瀬川水系（嘉瀬川、祇園川）、六角川水系（六角川、武雄川、牛津川）、松浦川水系（松浦川、徳須恵川、巖木川）の三水系において、水防管理団体である関係市町（5市3町）及び佐賀県の防災関係者、九州防災エキスパート会、佐賀県防災・砂防ボランティア協会、NPO法人技術交流フォーラムと河川合同巡視を実施します。

合同巡視では重要水防箇所等を巡視し、水防時の対応を確認します。

○実施日時

六角川水系

令和5年5月18日（木）～令和5年5月19日（金）

※詳細は別紙「合同巡視行程」参照

※嘉瀬川水系・松浦川水系は実施済み

「問い合わせ先」

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所

技術副所長 吉田 美幸

管理課長 永濱 一将

TEL 0954-23-5151（代表）

令和5年度 河川合同巡視計画書


水系名	六角川				備考
	5月18日(木)		5月19日(金)		
班名	朝日(出)班		牛津(出)班		
対象河川	六角川 武雄川	六角川 牛津川	六角川 牛津川	牛津川	
巡視区域	六角川 左岸 21/000付近 右岸 24/200付近 右岸 27/900付近 左岸 28/200付近 左岸 29/000付近 武雄川 左岸 0/800付近	六角川 左岸 5/300付近 左岸 5/800付近 右岸 10/400付近 左右岸 13/450~ 13/600 牛津川 右岸 1/000付近	六角川 右岸 3/000付近 右岸 3/800付近 牛津川 左岸 0/000付近	牛津川 左岸 0/000付近 左右岸 5/000付近 左岸 9/200付近 左岸 9/600付近 左岸 10/200付近	
関係市町名	武雄市 大町町	江北町 白石町	白石町	小城市	
関係 土木事務所名	杵藤土木	杵藤土木	杵藤土木	佐賀土木	
九州防災 エキスパート会	佐賀地区	佐賀地区	佐賀地区	佐賀地区	
集合場所 及び集合時間	朝日 出張所 9:30	六角川 河口堰 操作所 13:30	水防資材 備蓄箇所 (牛津川左岸 0/000付近) 9:30	牛津 出張所 13:30	

令和5年度合同巡視行程（朝日出張所管内）

	時間	市町名	説明場所	摘要及び説明要旨	備考
①	9:30	武雄市 大町町	朝日出張所	挨拶及び行程説明等	
②	9:40		高橋排水機場 (武雄川左岸0k800)	ポンプ増強概要及びR3年度浸水状況説明	
③	10:20		【危険箇所】六角川左岸29k000	越水危険箇所 R3年度越水箇所 堤防嵩上げ工事箇所	
④	10:40		六角川左岸28k200	備蓄資材(普通土嚢)配備	
⑤	11:00		鐘撞川排水樋管 (六角川右岸27k900)	内水被害常襲箇所(排水ポンプ車)	
⑥	11:20		六角川右岸24k200	湛水池施工箇所	
⑦	11:40		【危険箇所】六角川左岸21k000	大町町区間危険箇所	午前の部解散
⑧	13:30	江北町 白石町	河口堰操作所	挨拶及び行程説明等	
⑨	13:50		六角川左岸5k300	備蓄資材(普通土嚢)配備	
⑩	14:10		牛津川右岸1k000	湛水池施工箇所	
⑪	14:30		新渡大橋高架下 (六角川左岸5k800)	車両通行危険箇所	
⑫	14:50		六角川右岸10k400	矢板護岸設置箇所(高水敷狭小)	
⑬	15:20		【重要水防区域Bランク】 JR橋 左岸(六角川左岸13/450)	・HWL高の堤防 ・備蓄資材(普通土嚢)配備	
⑭	15:40		【重要水防区域Bランク】 JR橋 右岸(六角川右岸13/600)	・HWL高の堤防 ・備蓄資材(普通土嚢)配備	午後の部解散

※巡視状況・質問等において予定時間の変更があり得ます。

R5年 河川合同巡視箇所図 (六角川:朝日出張所管内)

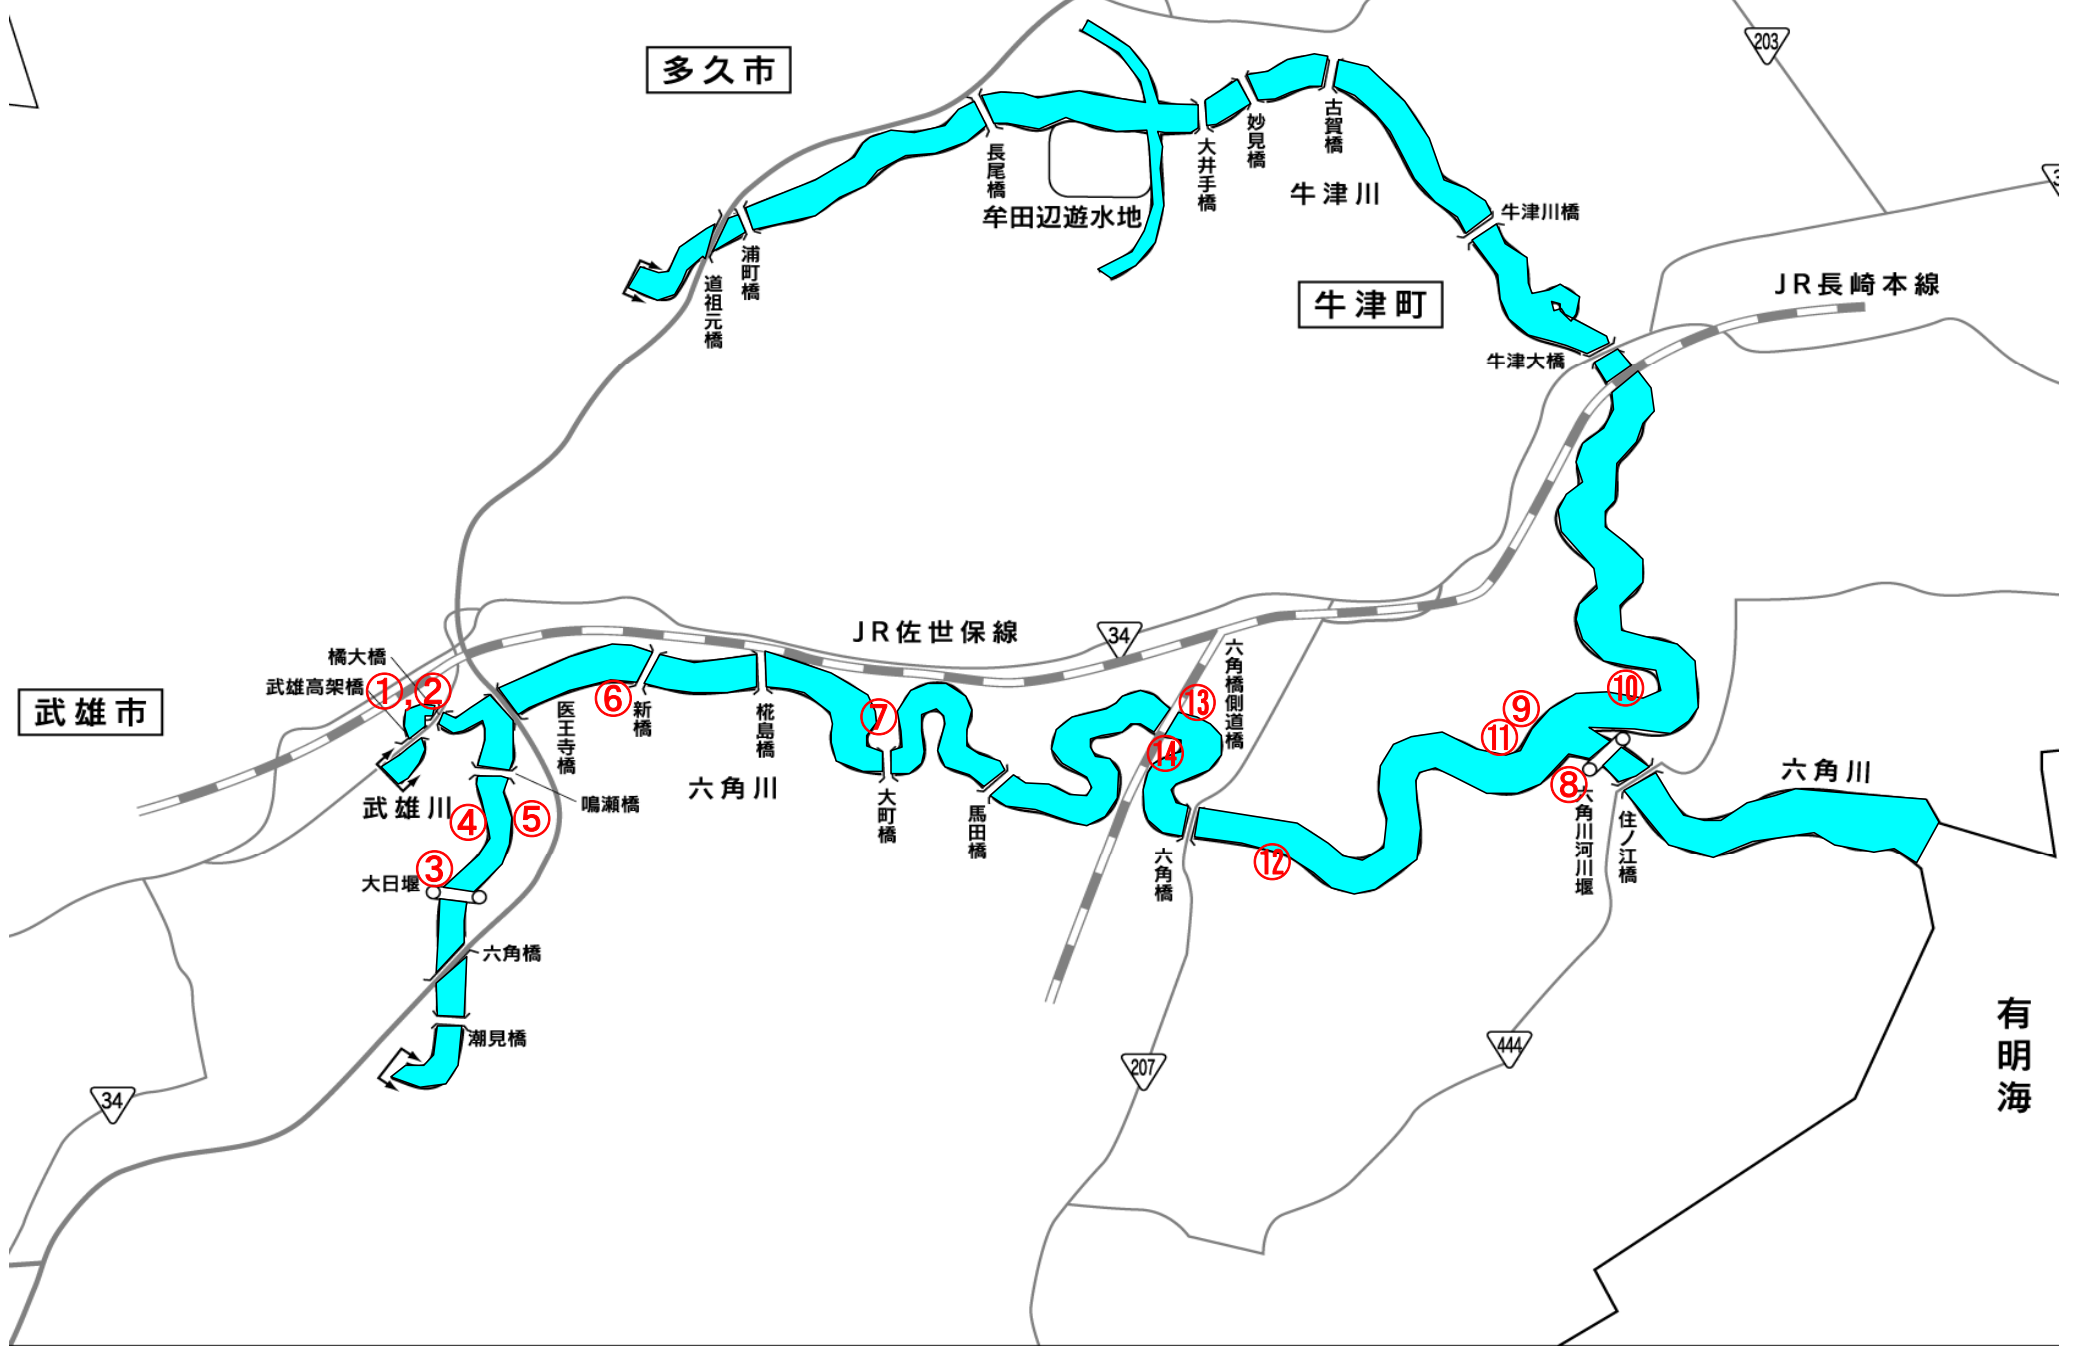


令和5年度合同巡視行程（牛津出張所管内）

	時間	市町名	事項	説明場所	摘要及び説明要旨
①	9:30	白石町	現地集合 水防資材備蓄箇所	牛津川(左岸)0k000付近	挨拶及び行程等の説明(25分) 水防資材備蓄の説明 ・根固めブロック(5t型) N= 230個 ・根固めブロック(2t型) N= 1,000個 ・袋詰め玉石(2t型) N= 650個 ・大型土のう N= 300個
②	10:00		重要水防構造物(要注意)	住之江橋	高潮特殊堤(15分)
③	10:20		重要水防構造物(要注意)	六府方陸閘	高潮時開閉操作必要場所(10分)
	10:30	意見交換会(10:30~10:40)			
①	13:30	小城市	牛津出張所集合	牛津出張所1F会議室	挨拶及び行程等の説明(30分)
②	14:10		改修進捗箇所	牛津川遊水地予定箇所	工事進捗状況の説明(15分)
③	14:25		危険箇所(越水)	牛津川(左岸)9k600付近	危険箇所の説明(5分)
④	14:35		改修進捗箇所	牛津川(左岸)9k200付近	ヨシ繁茂抑制湛水池(5分)
⑤	15:05		危険箇所(越水)	牛津川(左右岸)5k000付近	危険箇所の説明(5分)
⑥	15:20		改修進捗箇所	牛津川(左岸)0k000付近	水防資材備蓄基地の整備(10分)
	15:30			意見交換会(15:30~15:40)	

※巡視状況・質問等において予定時間の変更があり得ます。

白石町管内巡視ルート

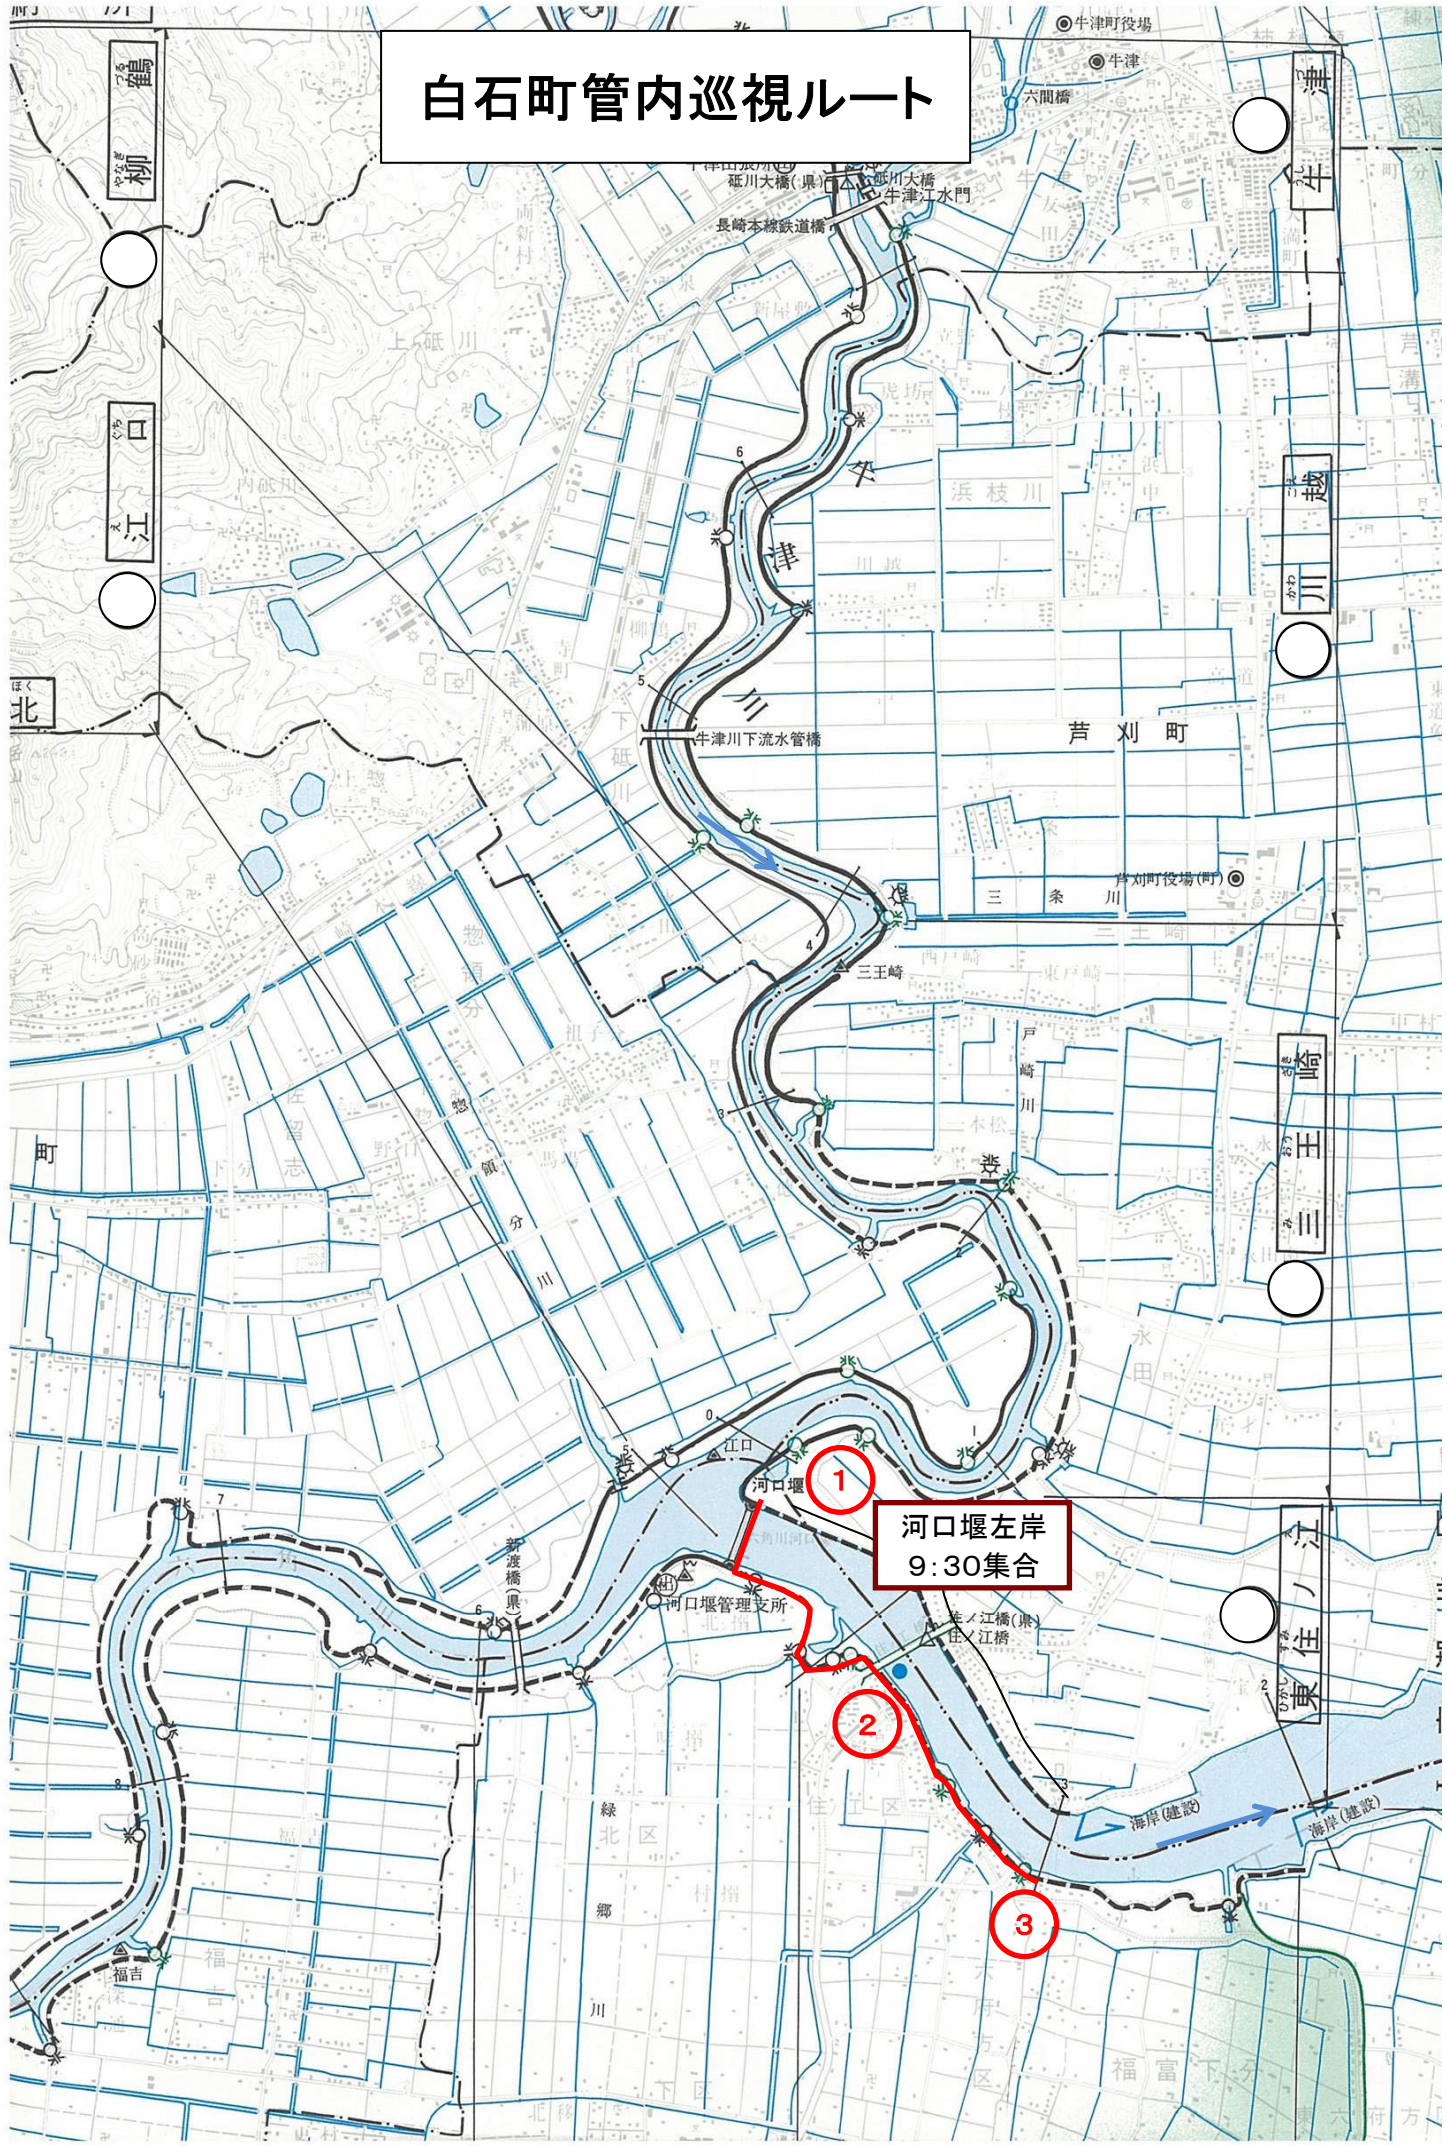

河口堰左岸
9:30集合

1

2

3

小城市 管内巡視ルート

