

激特事業の進捗状況（佐賀県）

令和4年11月29日


佐賀県 県土整備部 河川砂防課

六角川水系緊急治水対策プロジェクト（河川における対策）

佐賀県

○国・県が連携し、六角川水系において、築堤、河道掘削、遊水地整備、排水ポンプ増強等の治水対策を概ね5年で実施します。

- 全体事業費 約418億円
- 事業種別
- 河川激甚災害対策特別緊急事業
 - 国：六角川・牛津川
 - 全体事業費 約350億円
 - 事業期間 令和元年度から令和6年度
 - 県：武雄川・広田川・山犬原川
 - 全体事業費 約34億円
 - 事業期間 令和元年度から令和6年度
- 河川大規模災害関連事業
 - 国：牛津川
 - 全体事業費 約17億円
 - 事業期間 令和元年度から令和5年度
- 河川等災害復旧事業
 - 国：六角川・牛津川
 - 全体事業費 約2億円
 - 事業期間 令和元年度から令和2年度
 - 県：六角川水系
 - 全体事業費 約15億円
 - 事業期間 令和元年度から令和3年度

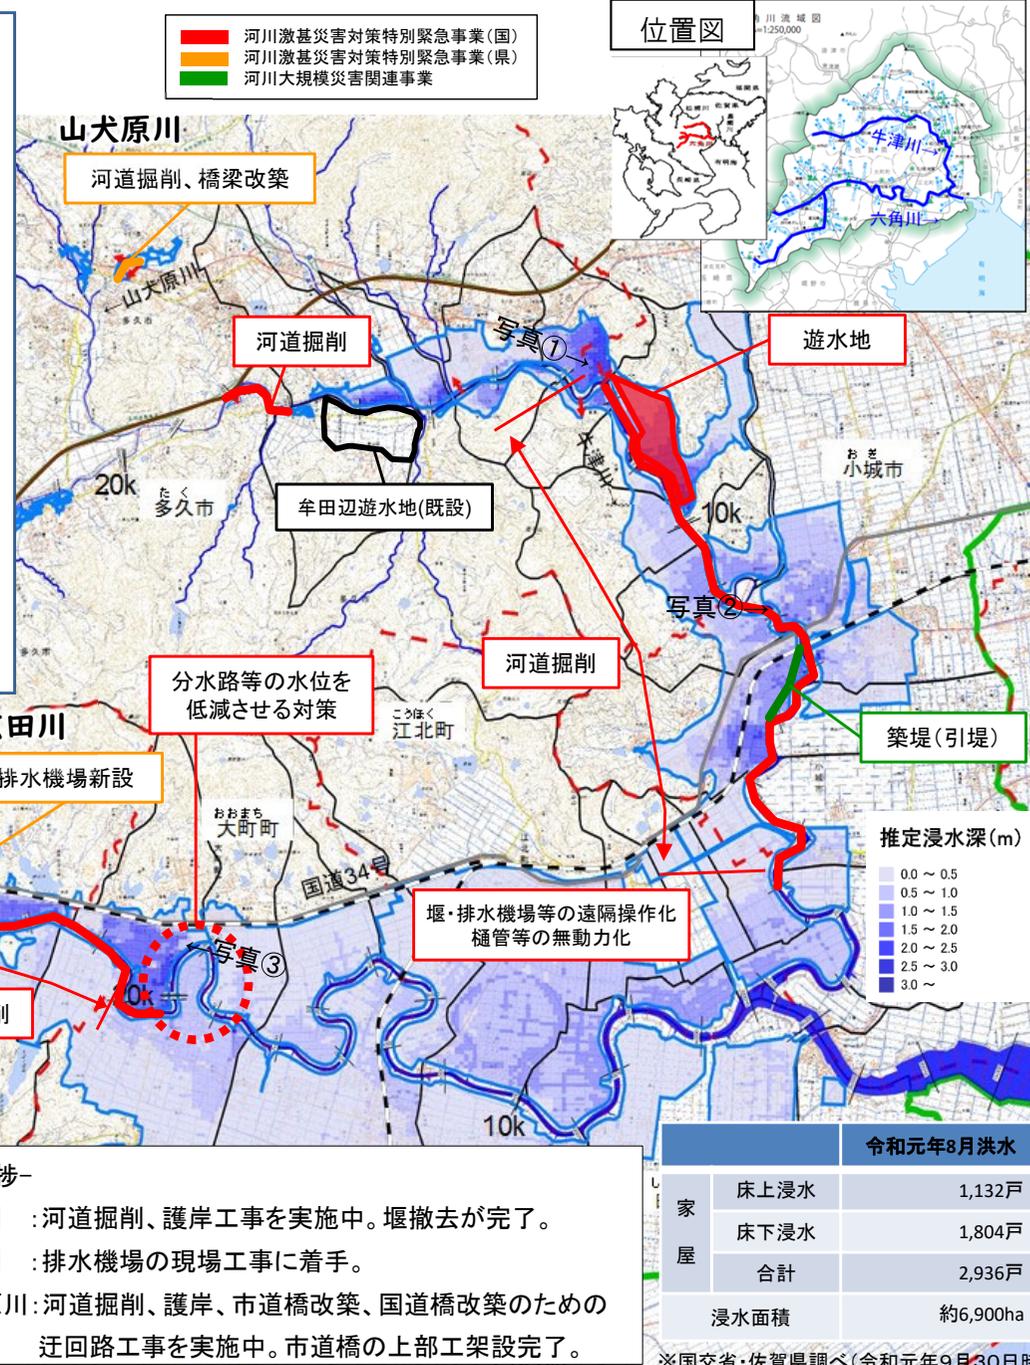

～主たる進捗～

- 武雄川：河道掘削、護岸工事を実施中。堰撤去が完了。
- 広田川：排水機場の現場工事に着手。
- 山犬原川：河道掘削、護岸、市道橋改築、国道橋改築のための迂回路工事を実施中。市道橋の上部工架設完了。

※国交省・佐賀県調べ(令和元年9月30日時点)
