

令和2年度 山国川災害用資機材保有箇所

令和2年度 山国川重要水防箇所

重要水防箇所一覧表（重点区間）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町多志田	右岸	18k700~18k900	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
2	大分県	山国川	中津市耶馬溪町大字戸原	右岸	21k300~21k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
3	大分県	山国川	中津市耶馬溪町柿坂	右岸	26k300~26k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
計					3	1,000		
福岡県				左岸	0	0		
大分県				右岸	0	0		
計				左岸	0	0		
計				右岸	3	1,000		
合計				左岸	0	0		
合計				右岸	3	1,000		

重要水防箇所一覧表（A）（堤防）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	福岡県	山国川	築上郡吉富町幸子	左岸	3k250~3k290	50	無堤で河岸が低く溢水する。(越水A)	積み土のう
2	福岡県	山国川	築上郡上毛町下唐原	左岸	5k000~5k040	40	無堤で河岸が低く溢水する。(越水A)	積み土のう
3	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町穂田	右岸	15k500~15k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
4	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町多志田	右岸	18k700~18k900	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
5	大分県	山国川	中津市耶馬溪町大字戸原	右岸	21k300~21k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
6	大分県	山国川	中津市耶馬溪町柿坂	右岸	26k300~26k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水A)	積み土のう
計					6	1,290		
福岡県				左岸	2	90		
大分県				右岸	0	0		
計				左岸	0	0		
計				右岸	4	1,200		
合計				左岸	2	90		
合計				右岸	4	1,200		

土砂及び根固めブロック備蓄箇所


番号	水系名 河川名	位置	備蓄量 (土砂m ³)	根固めブロック(個)	備考
1	山国川水系 山国川	左岸 3k300付近		2 t 六脚ブロック 723個	(第2種側溝)
2	山国川水系 山国川	左岸 6k600付近		①袋詰玉石 128袋 ②2 t 六脚ブロック 100個	(第2種側溝)
3	山国川水系 山国川	左岸 6k850付近 (上毛町留地箇所)		①2 t 六脚ブロック 100個 ②2 t 六脚ブロック 400個 ③溝床ブロック(998×998×350) 620個(620 m ²) ④溝床ブロック(998×449×350) 114個(57 m ²) ⑤溝床金具 1029個は下宮永排水機場に保管	
4	山国川水系 山国川	左岸 6k900付近	300		(第2種側溝)
5	山国川水系 山国川	右岸 5k400付近	200		(第2種側溝)
6	山国川水系 中津川	右岸 0k200付近	750		(第2種側溝)
計			1,250		

水防備蓄資材

番号	品目	出庫所倉庫	下宮永排水	耶馬溪ダム
1	土のう袋	5,400	0	
2	大型土のう袋	50	138	
3	耐水性大型土のう袋	150	50	
4	水のう	0	0	
5	袋詰根固め(2 t)	559	27	
6	木杭	438	0	
7	金杭(メガネピン)	4	65	
8	丸鋼	0	65	
9	鉄線	1	0	
10	スコップ	10	36	
11	ブルハシ	12	0	
12	指先	8	6	
13	大ハンマー	0	5	
14	ハンマー	3	0	
15	ペンチ	1	0	
16	鍬	16	0	
17	鋤	1	0	
18	斧	3	0	
19	鋸	4	0	
20	鹿	3	0	
21	バール	3	0	
22	エンジン刈払機	3	0	
23	次ばさみ	131	0	
24	フェール	4	0	
25	竹製てみ(えびじょうげ)	2	0	
26	一輪車	9	4	
27	鋸歯器具	0	0	
28	A型バリケード	20	0	160m
29	オイルファン	1	4	30m
30	ブルーシート(3.6×5.4m)	90	0	350m
31	ひしやく	4	0	690m
32	救命胴衣	20	12	180m
33	脚立	1	0	240m
34	レベル	0	0	300m
35	スタッフ	1	0	
36	エンジンポンプ	1	0	
37	ゴムボート	2	0	
38	ボルトカッター	1	0	
39	ロープ	10	0	
40	光ケーブル SM4C-SSD			160m
41	光ケーブル SM6C-SSD			30m
42	光ケーブル DSF20C+SM140C			269m
43	光ケーブル SM4C-SSF			690m
44	光ケーブル SM2C			180m
45	光ケーブル SM140C+DSF20C			240m
46	光ケーブル SM140C			300m

大型土のう備蓄資材

番号	水系名 河川名	位置	数量	耐水性 10袋 普通 24袋
1	山国川水系 山国川	磐石野地区 18k400 付近	34袋	
2	山国川水系 山国川	多志田地区 19k800 付近	50袋	
3	山国川水系 山国川	戸原地区 21k100 付近	50袋	
4	山国川水系 山移川	耶馬溪ダム	51袋	
計			185袋	

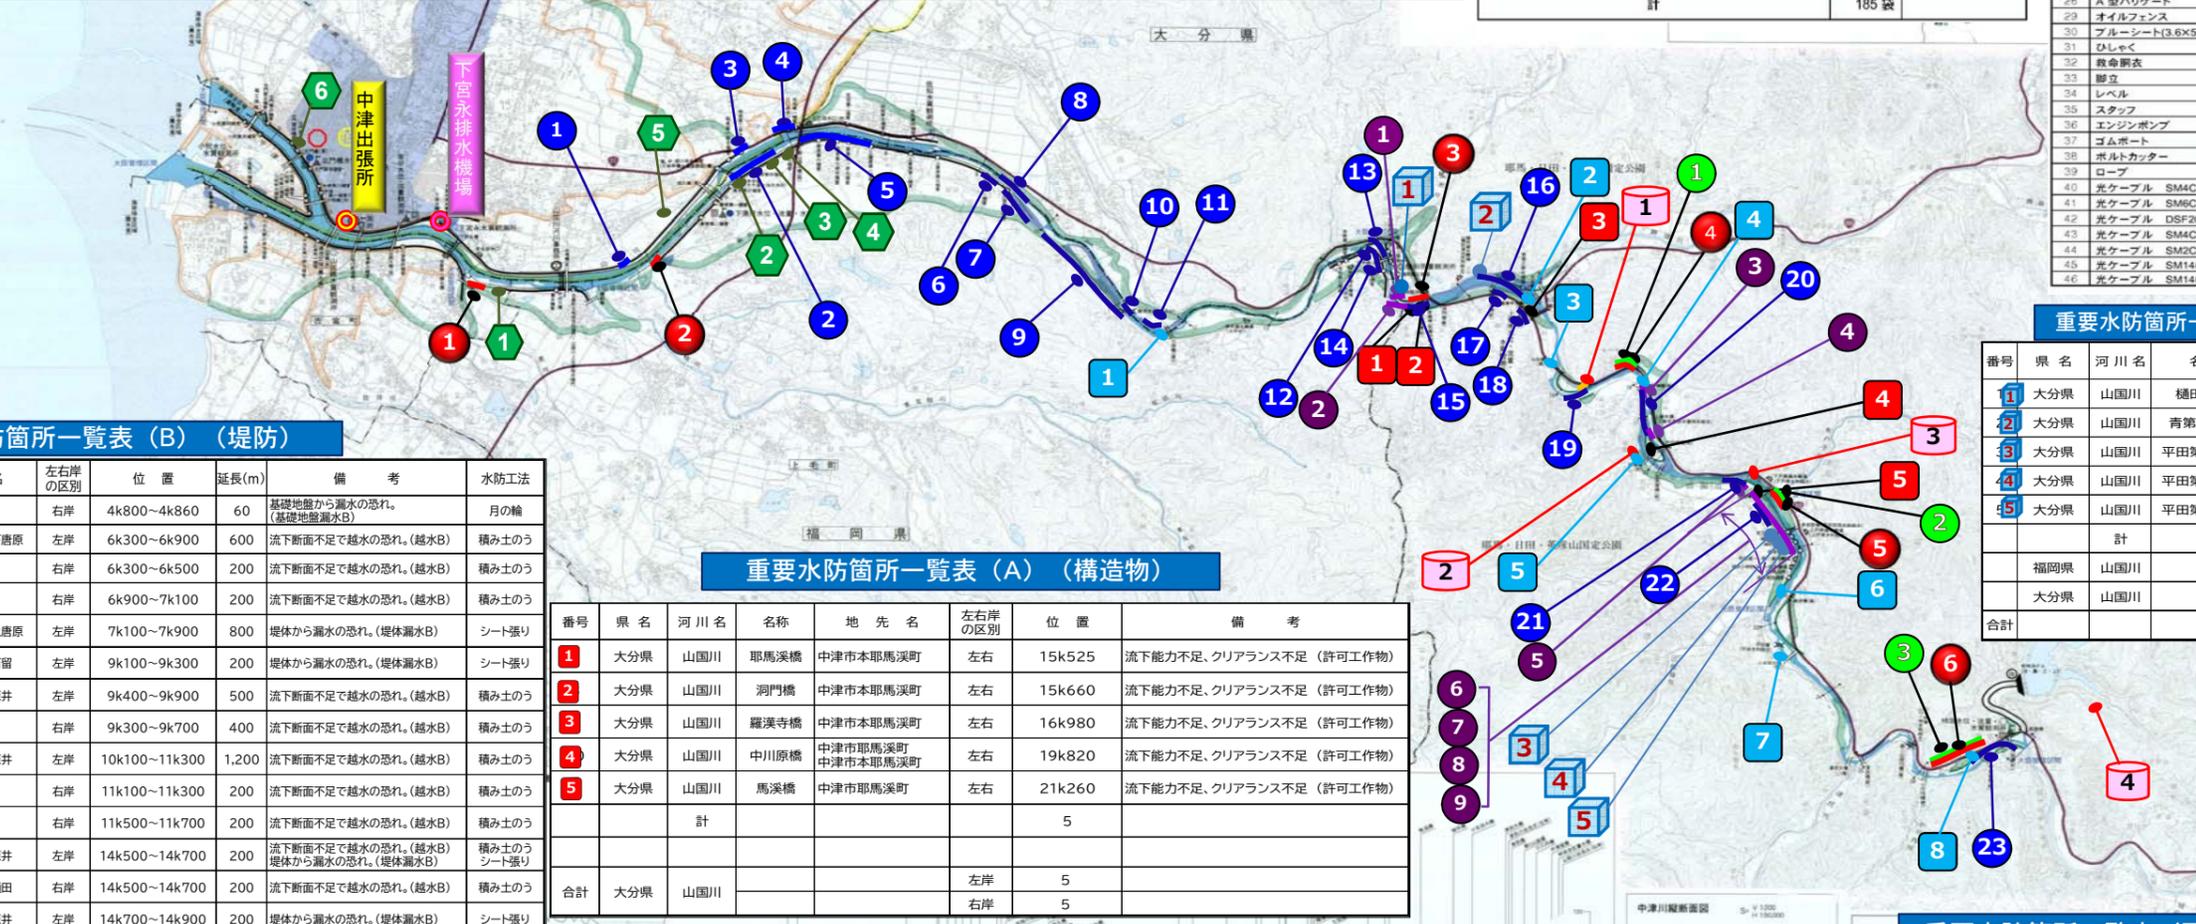

重要水防箇所一覧表（B）（堤防）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	大分県	山国川	中津市大字高瀬	右岸	4k800~4k860	60	基礎地盤から漏水の恐れ。(基礎地盤漏水B)	月の輪
2	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字下唐原	左岸	6k300~6k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
3	大分県	山国川	中津市大字相原	右岸	6k300~6k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
4	大分県	山国川	中津市三光佐知	右岸	6k900~7k100	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
5	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字上唐原	左岸	7k100~7k900	800	堤体から漏水の恐れ。(堤体漏水B)	シート張り
6	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字百留	左岸	9k100~9k300	200	堤体から漏水の恐れ。(堤体漏水B)	シート張り
7	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字原井	左岸	9k400~9k900	500	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
8	大分県	山国川	中津市三光土田	右岸	9k300~9k700	400	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
9	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字原井	左岸	10k100~11k300	1,200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
10	大分県	山国川	中津市三光牛ノ首	右岸	11k100~11k300	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
11	大分県	山国川	中津市三光土田	右岸	11k500~11k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
12	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字原井	左岸	14k500~14k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B) 堤体から漏水の恐れ。(堤体漏水B)	積み土のう シート張り
13	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町穂田	右岸	14k500~14k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
14	福岡県	山国川	築上郡上毛町大字原井	左岸	14k700~14k900	200	堤体から漏水の恐れ。(堤体漏水B)	シート張り
15	福岡県	山国川	中津市本耶馬溪町穂田	左岸	15k500~15k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
16	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町曾木	右岸	16k300~16k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
17	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町曾木	左岸	16k500~16k700	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
18	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町曾木	左岸	16k900~17k100	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
19	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町冠石野	左岸	18k300~18k500	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
20	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町多志田	右岸	19k300~19k900	600	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
21	大分県	山国川	中津市耶馬溪町大字平田	左岸	20k900~21k100	200	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
22	大分県	山国川	中津市耶馬溪町大字平田	左岸	21k300~21k700	400	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
23	大分県	山国川	中津市耶馬溪町中鶴	左岸	26k750~27k400	650	流下断面不足で越水の恐れ。(越水B)	積み土のう
計					23	8,410		
大分県				左岸	6	1,850		
大分県				右岸	9	2,660		
福岡県				左岸	8	3,900		
福岡県				右岸	0	0		
合計				左岸	14	5,750		
合計				右岸	9	2,660		

重要水防箇所一覧表（A）（構造物）

番号	県名	河川名	名称	地先名	左右岸の区別	位置	備考
1	大分県	山国川	耶馬溪橋	中津市本耶馬溪町	左右	15k525	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
2	大分県	山国川	洞門橋	中津市本耶馬溪町	左右	15k660	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
3	大分県	山国川	羅漢寺橋	中津市本耶馬溪町	左右	16k980	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
4	大分県	山国川	中川原橋	中津市耶馬溪町 中津市本耶馬溪町	左右	19k820	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
5	大分県	山国川	馬溪橋	中津市耶馬溪町	左右	21k260	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
計						5	
合計				左岸	5		
合計				右岸	5		

重要水防箇所一覧表（B）（構造物）

番号	県名	河川名	名称	地先名	左右岸の区別	位置	備考
1	福岡県	山国川	三原橋	上毛町大字原井 中津市三光土田	左右	11k870	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
2	大分県	山国川	榊海橋	中津市本耶馬溪町	左右	16k840	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
3	大分県	山国川	七仙橋	中津市本耶馬溪町	左右	17k700	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
4	大分県	山国川	早瀬橋	中津市本耶馬溪町	左右	19k040	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
5	大分県	山国川	岩屋橋	中津市耶馬溪町	左右	19k890	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
6	大分県	山国川	城井橋	中津市耶馬溪町	左右	22k630	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
7	大分県	山国川	小友田橋	中津市耶馬溪町	左右	23k400	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
8	大分県	山国川	中津留橋	中津市耶馬溪町	左右	26k765	流下能力不足、クリアランス不足(許可工作物)
計						8	
合計				左岸	7		
合計				右岸	7		
合計				左岸	1		
合計				右岸	1		

重要水防箇所一覧表（要注意区間）（構造物）

番号	県名	河川名	名称	地先名	左右岸の区別	位置
1	大分県	山国川	穂田陸間	中津市本耶馬溪町穂田	右岸	15k515
2	大分県	山国川	青第一陸間	中津市本耶馬溪町青	右岸	16k300
3	大分県	山国川	平田第一陸間	中津市耶馬溪町平田	左岸	21k750
4	大分県	山国川	平田第二陸間	中津市耶馬溪町平田	左岸	22k150
5	大分県	山国川	平田第三陸間	中津市耶馬溪町平田	左岸	22k340
計						5
福岡県				左岸	0	
福岡県				右岸	0	
大分県				左岸	3	
大分県				右岸	2	
合計				左岸	3	
合計				右岸	2	

重要水防箇所一覧表（要注意）

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の区別	位置	延長(m)	備考
1	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町穂田	右岸	15k460~15k510	50	新設堤防のため。(平成29年4月完成)
2	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町曾木	左岸	15k525~15k685	160	新設堤防のため。(平成30年6月完成)
3	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町多志田	右岸	19k040~19k225	200	新設堤防のため。(平成30年3月完成)
4	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町多志田	右岸	19k675~19k725	50	新設堤防のため。(平成30年3月完成)
5	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21k050~21k250	200	新設堤防のため。(平成29年5月完成)
6	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21k265~21k450	180	新設堤防のため。(平成30年6月完成)
7	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21k450~21k775	325	新設堤防のため。(平成30年2月完成)
8	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21k775~21k900	95	新設堤防のため。(平成30年6月完成)
9	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21k900~22k160	2	
