

球磨川流域復旧桥梁通信

Vol.4 令和6年9月
国土交通省 九州地方整備局
八代復興事務所
〒866-0824
熊本県八代市上日置町4478-1
Tel: 0965-39-5101 (代表)
URL: www.qsr.mlit.go.jp/yatsushiro_r/

令和2年7月豪雨で流失した桥梁については、令和4年度から本格的に工事に着手しています。
工事期間中は大変ご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い致します。

沖鶴橋・大瀬橋 上部工架設中

沖鶴橋は令和6年6月5日に上部工（送出し工法）を着手。

同年9月14日に橋桁がA2橋台に到達しました。


また、大瀬橋も令和6年9月16日に上部工（送出し工法）を着手し
手延べ機がP1橋脚に到達しました。

その他の桥梁も完成に向けて着々と工事が進行中です。

沖鶴橋



大瀬橋

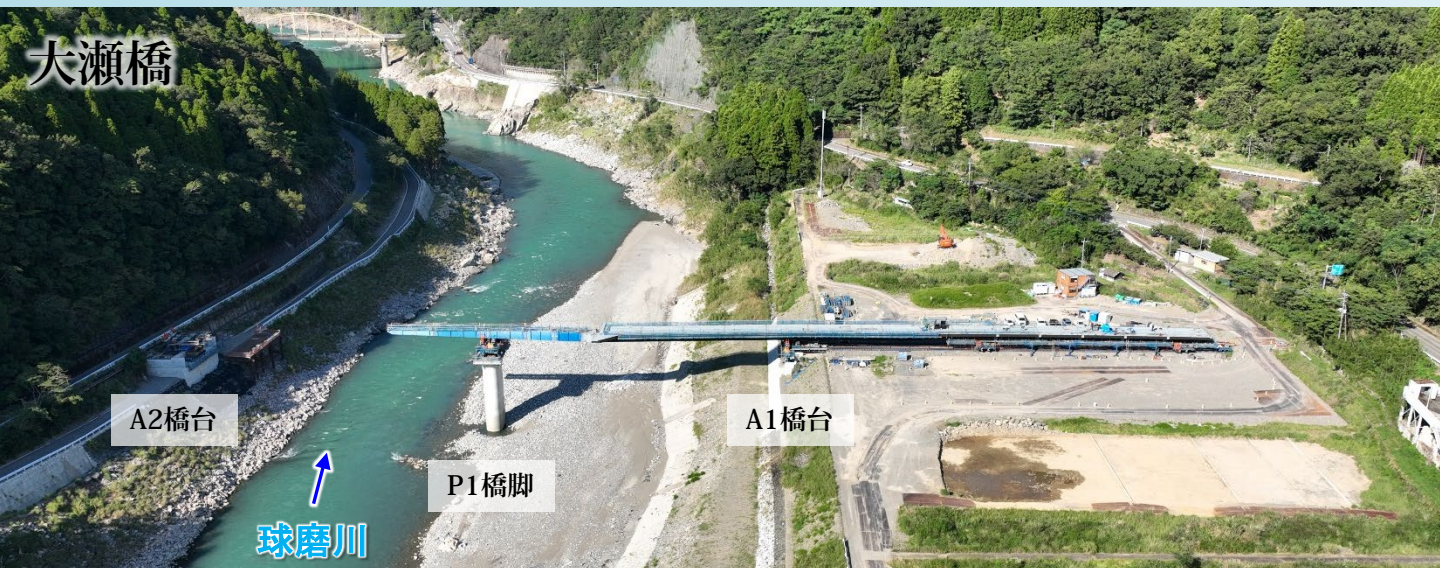

工事進捗状況 令和6年9月現在



八代市



球磨村



芦北町



球磨村

深水橋

- ・橋種：鋼単純アーチ橋(ローゼ桁)
- ・橋長：165m



神瀬橋

- ・橋種：鋼単純アーチ橋(ローゼ桁)
- ・橋長：137m



松本橋

- ・橋種：鋼2径間連続鋼床版桁橋
- ・橋長：146m



坂本橋

- ・橋種：鋼2径間連続トラス橋
- ・橋長：156m



大瀬橋

- ・橋種：鋼2径間連続鋼床版桁橋
- ・橋長：131.5m



相良橋

- ・橋種：鋼2径間連続トラス橋
- ・橋長：235m



鎌瀬橋

- ・橋種：鋼単純アーチ橋(ニールセンローゼ桁)
- ・橋長：200m



人吉市

沖鶴橋

- ・橋種：鋼2径間連続鋼床版桁橋
- ・橋長：182m



天狗橋

- ・橋種：鋼単純ランガーアーチ橋+
鋼床版桁橋(2連)
- ・橋長：192m(うち復旧新設部53m)



錦町

球磨大橋

- ・橋種：鋼3径間連続トラス橋+
鋼単純鋼床版桁橋
- ・橋長：339m



西瀬橋 完工

- ・橋種：鋼4径間単純平行弦純ワーレントラス橋
- ・橋長：192m(うち復旧新設部53m)



過去の工事進捗状況は
八代復興事務所HP
にて掲載しています
詳しくは下記のURLで**CHECK!**
URL:www.qsr.mlit.go.jp/yatsushiro_r/

