



鹿児島東西道路だより 9月号

鹿児島3号東西道路(下り線)立坑設置工事

飛島建設(株)鹿児島立坑作業所


TEL: 099-204-9733 FAX: 099-204-9731

鋼矢板撤去工が8月1日、路面覆工の設置が8月10日に完了しました。ご協力いただきありがとうございました。
 8月16日から地盤改良工の準備を開始、8月21日より本施工を開始しております。本施工は10月上旬完了予定です。
 追加の安全対策として、中洲電停交差点に「逆走注意看板の設置、矢印板・クッションドラムの追加」、甲南高校南西角交差点に「ガードパイプ」を設置しました。
 これからも安全、環境面に配慮して施工してまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事の予定

工種	施工時期	施工時間
地盤改良工	8月16日~10月上旬	昼間
掘削工、土留支保工	10月上旬~3月下旬	昼間
立坑本体工	3月下旬~	昼間

施工状況写真

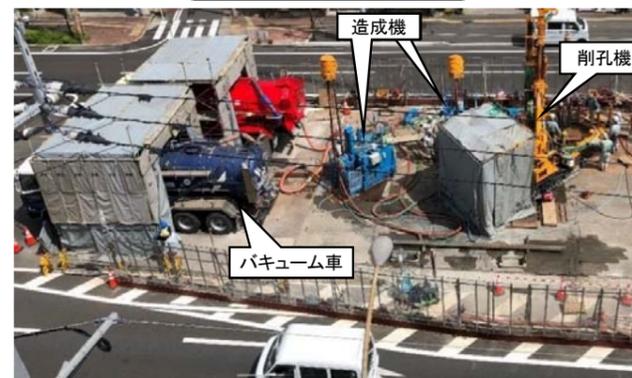

騒音対策について

大型発電機(エンジン付き、4台)に替えて高圧受電設備を使用することでエンジン音による騒音がゼロになっています。

防音シートで覆うことで削孔機エンジンによる騒音を抑制しています。

吸音パネルと防音シートで覆うことでバキュームポンプ音による騒音を抑制しています。

防音シートで覆うことでプラント機械による騒音を抑制しています。


工事に関する問い合わせ先

名称	TEL	担当者
飛島建設(株) 鹿児島立坑作業所	099-204-9733	永井、掛水
国土交通省 鹿児島国道事務所 鹿児島建設監督官	099-220-6134	桑本

鹿児島東西道路に関する問い合わせ先

名称	TEL、URL
国土交通省 鹿児島国道事務所 工務課	099-216-3853(直通) http://www.gsr.mlit.go.jp/kakoku/

「逆走注意看板 他」設置

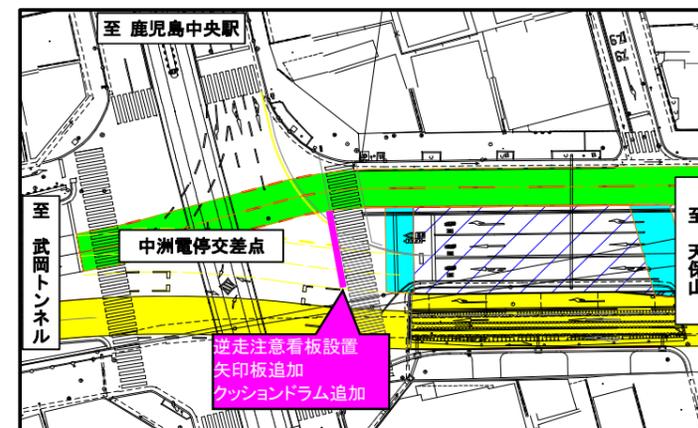

「ガードパイプ」設置

