


事例の名称	埋設管の路面表示	整理番号	切断等	39
分類	<input type="checkbox"/> 1 安全教育・講習会の工夫	<input type="checkbox"/> 7 建設機械等		
	<input type="checkbox"/> 2 パトロールの工夫	<input type="checkbox"/> 8 飛来・落下		
	<input type="checkbox"/> 3 作業環境(粉塵対策、水質汚濁防止、職場環境等)	<input type="checkbox"/> 9 転倒		
	<input type="checkbox"/> 4 交通事故	<input type="checkbox"/> 10 工具等取扱		
	<input type="checkbox"/> 5 墜落・転落	<input type="checkbox"/> 11 運搬関連(資機材運搬等)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 6 切断等	<input type="checkbox"/> 12 その他		
対策の内容(説明)	<p>車道部伸縮装置の撤去のみの予定であったので、歩道部の埋設管の周知を徹底していなかったことにより、次回予定の歩道部の伸縮装置も撤去しようとして情報BOXの鋼管が出てきた。対策は、現場施工範囲にある埋設管の位置を全員が一目で分かるように、スプレー・ペンキではっきりと路面表示をする。</p>			

(添付図、写真)



ヒヤリ箇所

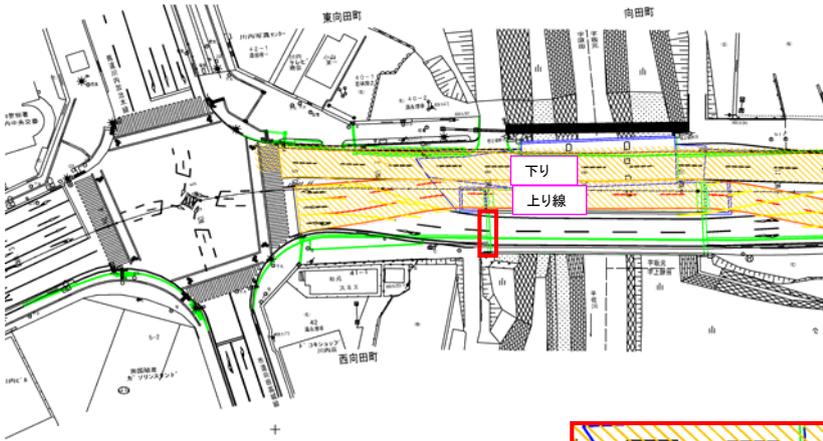
