



直方市内における重要水防箇所

令和8年度遠賀川水防情報図(直方市域抜粋)

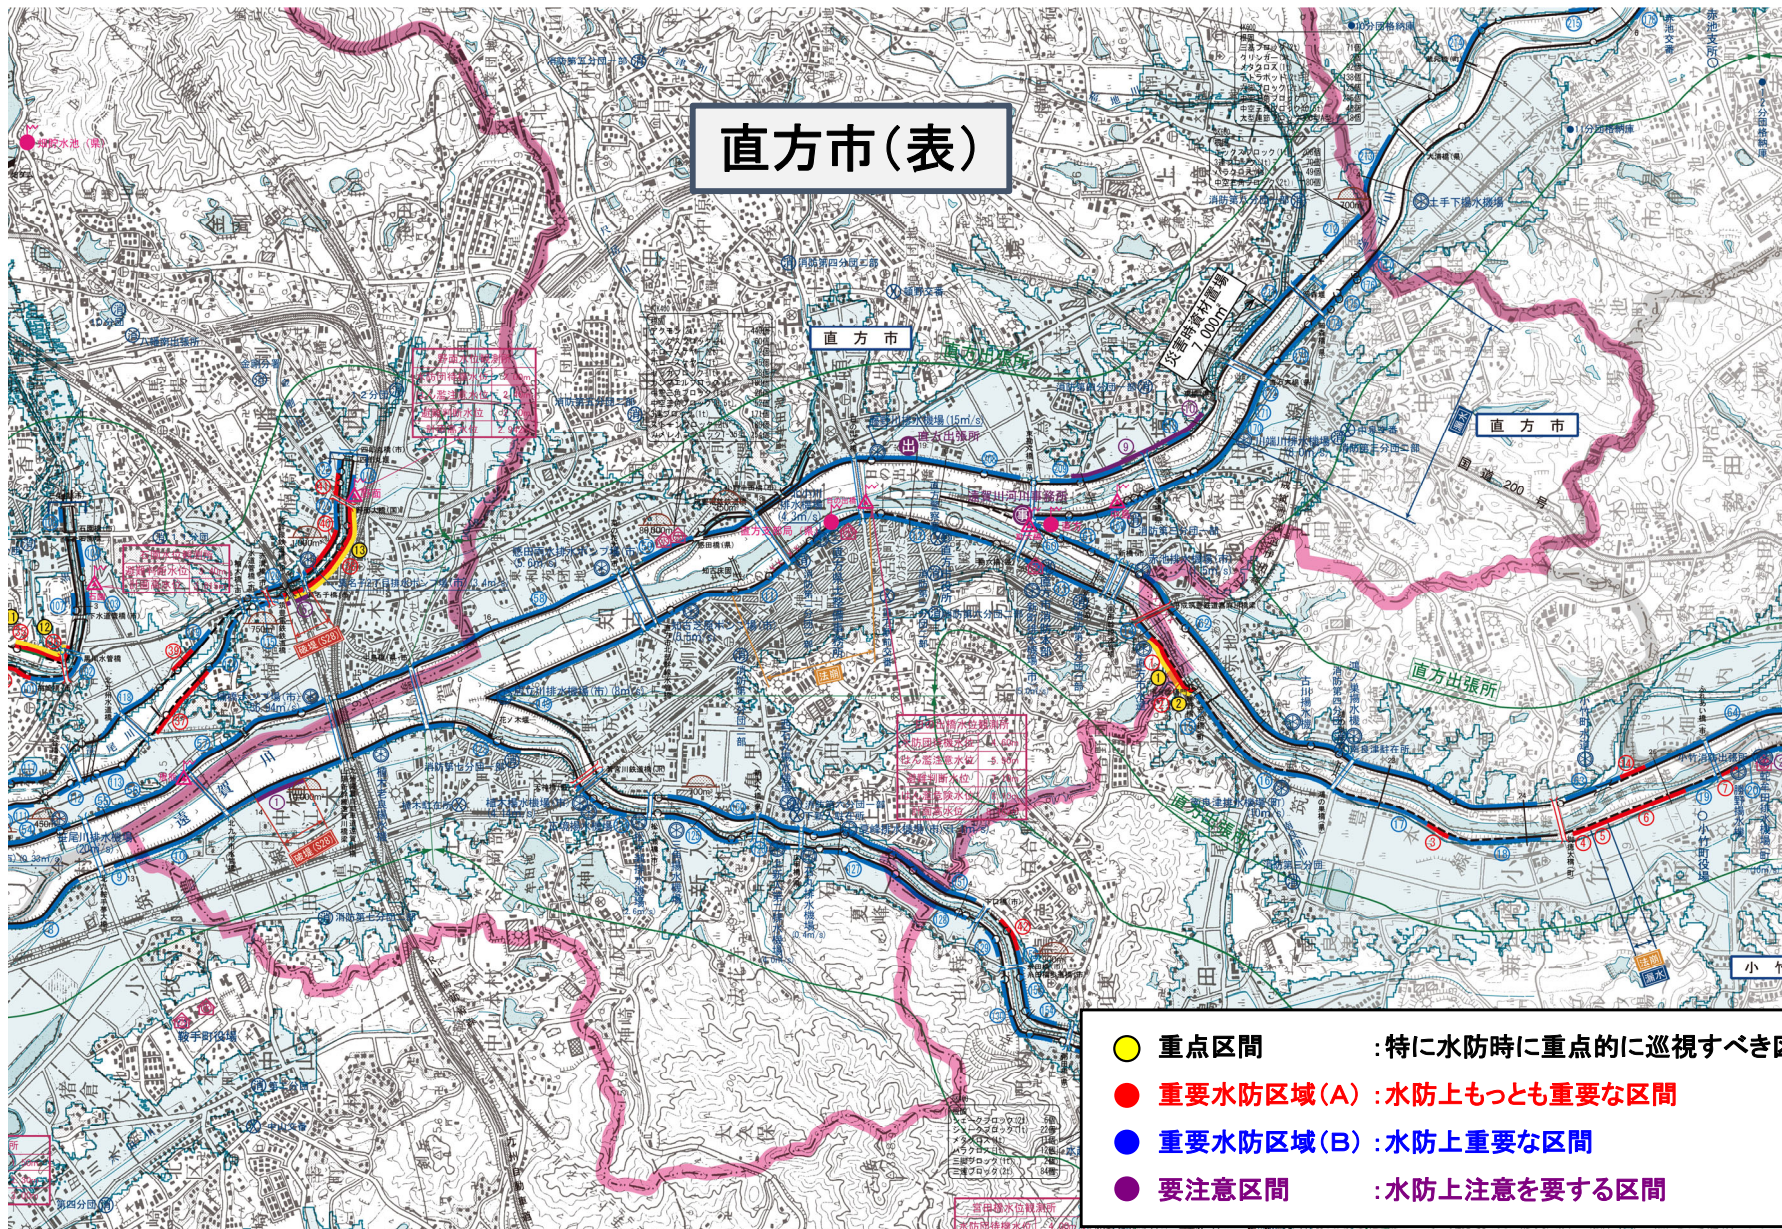

直方市内における重要水防箇所

令和8年度遠賀川水防情報図(直方市域抜粋)

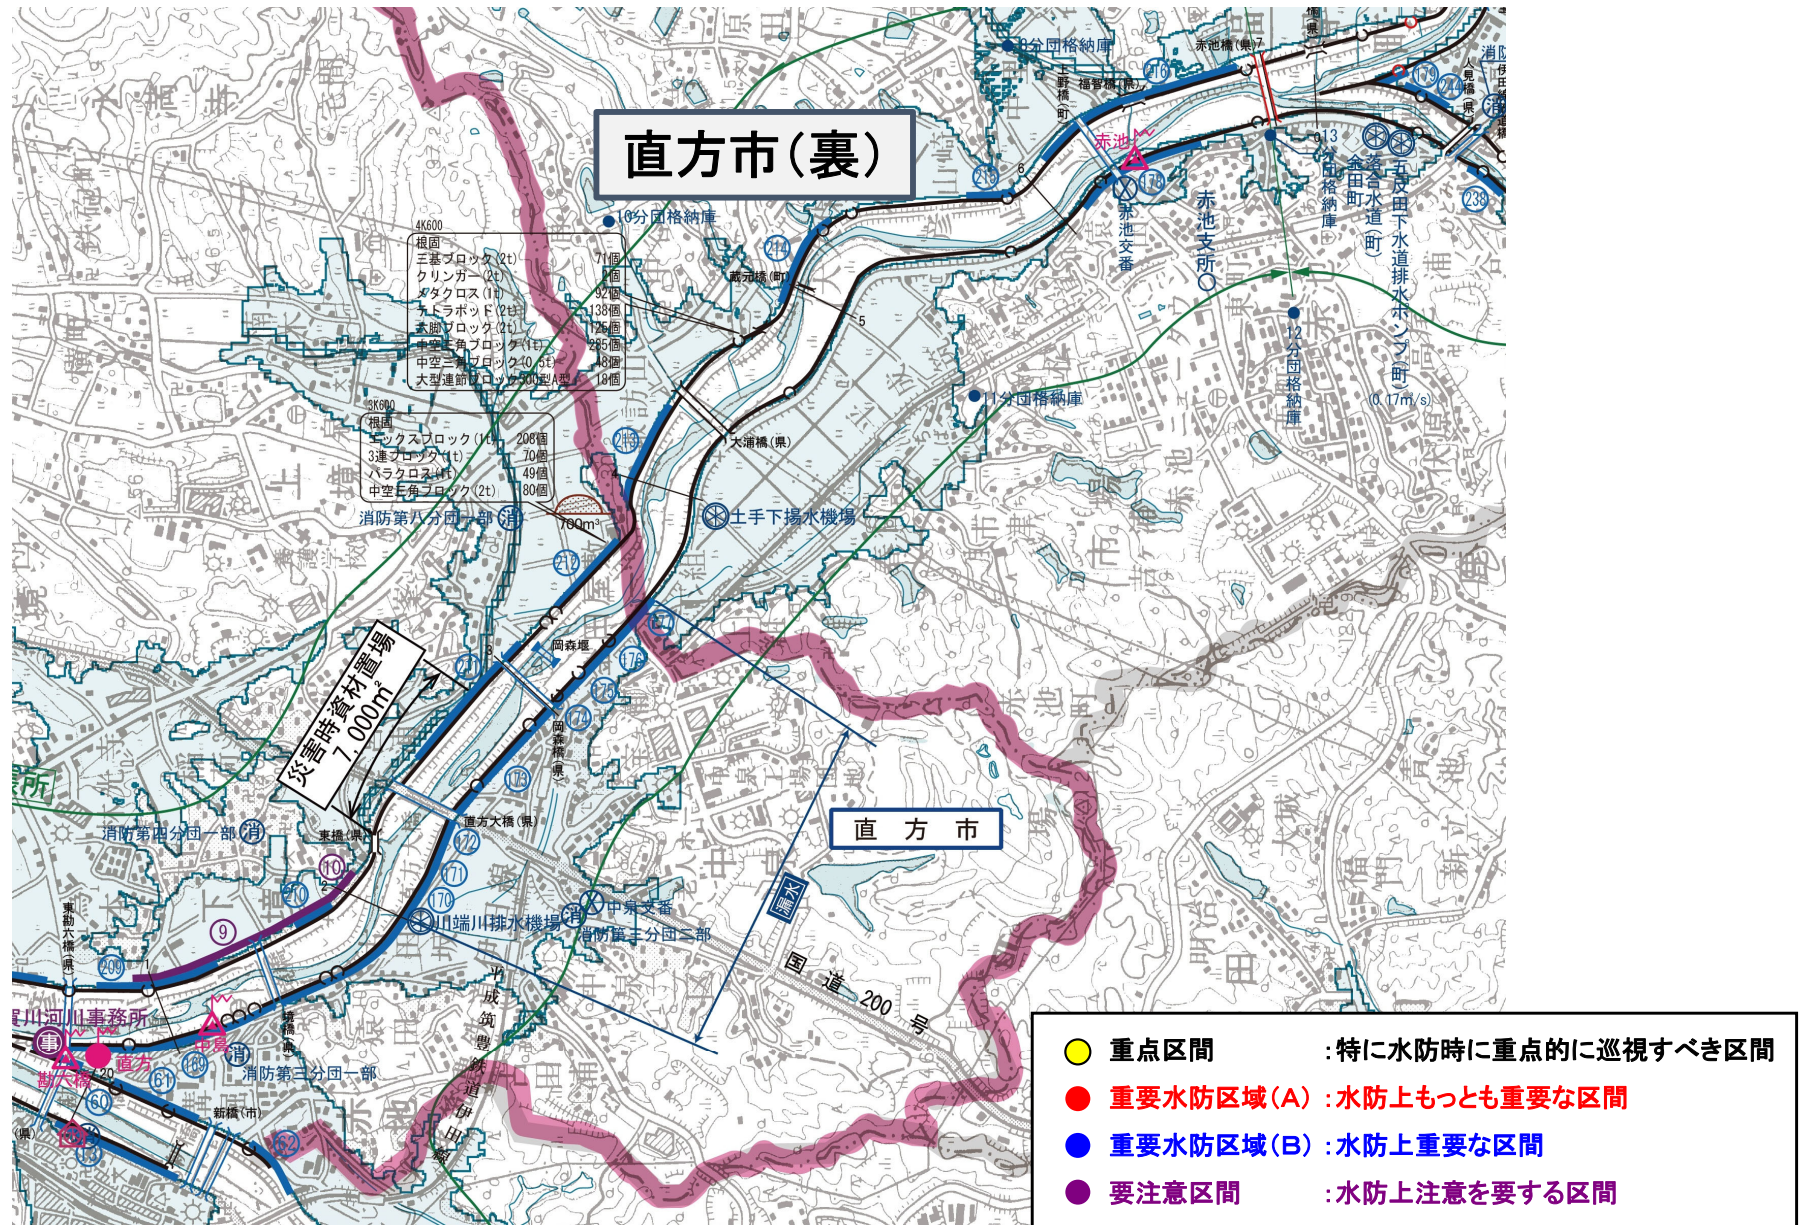

重要水防箇所一覧表(重点区間)<堤防>

遠賀川水系

様式-3

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の 区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	福岡県	遠賀川	直方市山部地先	左	21/100 ~ 21/320	220	越水A	積み土俵
		計			(1ヶ所)	220		

重要水防区域一覧表(A)〈堤防〉

様式-3

遠賀川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	福岡県	遠賀川	直方市山部地先	左	21/100 ~ 21/320	220	越水A	積み土俵
		計			(1ヶ所)	220		

重要水防区域一覧表(B)〈堤防〉

様式-3

遠賀川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
10	福岡県	遠賀川	直方市植木地先・感田地先・知古地先	左	13/140 ~ 17/600	4,460	越水B	積み土俵
11	福岡県	遠賀川	直方市知古地先・日吉町地先・津田町地先	左	17/600 ~ 18/800	1,200	越水B 堤体漏水B(法崩れ)	積み土俵・シート張り
12	福岡県	遠賀川	直方市津田町地先・殿町地先	左	18/800 ~ 19/700	900	越水B	積み土俵
13	福岡県	遠賀川	直方市新町地先・丸山町地先	左	19/900 ~ 20/500	600	越水B	積み土俵
14	福岡県	遠賀川	直方市山部地先	左	20/900 ~ 21/100	200	越水B	積み土俵
58	福岡県	遠賀川	直方市感田地先	右	15/780 ~ 16/900	1,120	越水B	積み土俵
59	福岡県	遠賀川	直方市感田地先・知古地先・頓野地先・下境地先	右	17/100 ~ 19/300	2,200	越水B	積み土俵
60	福岡県	遠賀川	直方市溝堀地先	右	19/700 ~ 19/900	200	越水B	積み土俵
61	福岡県	遠賀川	直方市溝堀地先	右	20/100 ~ 20/500	400	越水B	積み土俵
123	福岡県	犬鳴川	直方市植木地先	左	0/100 ~ 0/500	400	越水B	積み土俵
124	福岡県	犬鳴川	直方市植木地先・下新入地先	左	1/100 ~ 1/500	400	越水B	積み土俵
125	福岡県	犬鳴川	直方市下新入地先	左	1/700 ~ 2/300	600	越水B	積み土俵
126	福岡県	犬鳴川	直方市下新入地先・上新入地先	左	2/500 ~ 2/700	200	越水B	積み土俵
127	福岡県	犬鳴川	直方市上新入地先	左	2/900 ~ 3/500	600	越水B	積み土俵
149	福岡県	犬鳴川	直方市下新入地先	右	0/100 ~ 0/300	200	越水B	積み土俵
150	福岡県	犬鳴川	直方市下新入地先・上新入地先	右	1/700 ~ 3/540	1,840	越水B	積み土俵
169	福岡県	彦山川	直方市溝堀地先・下境地先	左	0/500 2/000	1,500	越水B	積み土俵
170	福岡県	彦山川	直方市下境地先	左	2/000 ~ 2/100	100	越水B 基礎地盤漏水B	積み土俵・釜段工
171	福岡県	彦山川	直方市下境地先・中泉地先	左	2/100 ~ 2/300	200	越水B 基礎地盤漏水B	積み土俵・釜段工
172	福岡県	彦山川	直方市中泉地先	左	2/300 ~ 2/500	200	基礎地盤漏水B	釜段工

重要水防区域一覧表(B)〈堤防〉

様式-3

遠賀川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
173	福岡県	彦山川	直方市中泉地先	左	2/500 ~ 2/900	400	越水B 基礎地盤漏水B	積み土俵・釜段工
174	福岡県	彦山川	直方市中泉地先	左	2/900 ~ 3/100	200	基礎地盤漏水B	釜段工
175	福岡県	彦山川	直方市中泉地先	左	3/100 ~ 3/300	200	越水B 基礎地盤漏水B	積み土俵・釜段工
176	福岡県	彦山川	直方市中泉地先	左	3/300 ~ 3/540	240	基礎地盤漏水B	釜段工
208	福岡県	彦山川	直方市下境地先	右	0/100 ~ 0/500	400	越水B	積み土俵
209	福岡県	彦山川	直方市下境地先	右	0/700 ~ 1/300	600	越水B	積み土俵
210	福岡県	彦山川	直方市下境地先	右	1/700 ~ 1/900	200	越水B	積み土俵
211	福岡県	彦山川	直方市上境地先	右	2/500 ~ 3/100	600	越水B	積み土俵
212	福岡県	彦山川	直方市上境地先	右	3/300 ~ 3/700	400	越水B	積み土俵
		計			(29ヶ所)	20,760		

重要水防区域一覧表(要注意)〈堤防〉

様式-3

遠賀川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸 の区別	位置	延長(m)	備考	水防工法
1	福岡県	遠賀川	直方市植木地先	左	14/000 ~ 14/200	200	破堤履歴	積み土俵
9	福岡県	彦山川	直方市下境地先	右	0/900 ~ 1/900	1,000	新堤防(令和5年度施工)	シート張り
10	福岡県	彦山川	直方市下境地先	右	1/900 ~ 2/100	200	新堤防(令和6年度施工)	シート張り
		計			(3ヶ所)	1,400		

重要水防区域一覧表(A)〈構造物〉

様式-3

遠賀川水系

番号	県名	河川名	名称	地先名	左右岸 の区別	位置	備考
1	福岡県	遠賀川	平成筑豊鉄道嘉麻川橋梁(下流)	直方市	—	20/900	許可工作物
2	福岡県	遠賀川	平成筑豊鉄道嘉麻川橋梁(上流)	直方市	—	20/910	許可工作物
20	福岡県	犬鳴川	天神橋	直方市	—	1/080	許可工作物

重要水防区域一覧表(B)〈構造物〉

様式-3

遠賀川水系

番号	県名	河川名	名称	地先名	左右岸 の区別	位置	備考
10	福岡県	遠賀川	北九州市水管橋	直方市・北九州市八幡西区	—	13/730	許可工作物
11	福岡県	遠賀川	山陽新幹線遠賀川橋梁	直方市・北九州市八幡西区	—	14/700	許可工作物
12	福岡県	遠賀川	中島橋	直方市・北九州市八幡西区	—	15/320	許可工作物
13	福岡県	遠賀川	なのはな大橋	直方市	—	16/900	許可工作物
14	福岡県	遠賀川	直方市北部幹線水管橋	直方市	—	17/000	許可工作物
15	福岡県	遠賀川	筑豊電鉄鉄道橋	直方市	—	17/970	許可工作物
16	福岡県	遠賀川	日の出大橋	直方市	—	18/650	許可工作物
17	福岡県	遠賀川	勘六橋	直方市	—	19/840	許可工作物
18	福岡県	遠賀川	新橋	直方市	—	20/550	許可工作物
19	福岡県	遠賀川	南部幹線水管橋	直方市	—	20/610	許可工作物
62	福岡県	犬鳴川	若宮川鉄道橋	直方市	—	1/130	許可工作物
63	福岡県	犬鳴川	松ヶ瀬橋	直方市	—	1/600	許可工作物
64	福岡県	犬鳴川	新入大橋	直方市	—	2/400	許可工作物
65	福岡県	犬鳴川	広甲橋	直方市	—	2/800	許可工作物
81	福岡県	彦山川	東勘六橋	直方市	—	0/650	許可工作物
82	福岡県	彦山川	境橋	直方市	—	1/455	許可工作物
83	福岡県	彦山川	直方大橋	直方市	—	2/400	許可工作物
84	福岡県	彦山川	岡森橋	直方市	—	3/000	許可工作物
85	福岡県	彦山川	岡森堰	直方市	—	3/180	許可工作物
