国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

平成 29 年9月１２日
筑 後 川 河 川 事 務 所

筑後川水系赤谷川応急復旧工事の進捗状況について（権限代行工事）

- 赤谷川下流東林田地区の河道掘削が進み、流路の確保が完了。
- 赤谷川及び乙石川中・下流部、大山川の流木撤去が概ね完了。
- 赤谷川に近接している二次災害の危険がある施設や住家周辺の河岸防護が概ね完了。

平成 29 年 7 月九州北部豪雨により、筑後川水系赤谷川、乙石川、大山川では、上流で山腹崩壊が多数発生したことに伴い、大量の土砂や流木が流出し、河道埋塞や家屋等を倒壊させるなど甚大な被害が発生しました。このため、出水により二次災害が発生するおそれが極めて高いことから、緊急的に流路の安定化や土砂、流木の除去を実施しています。

このたび、赤谷川下流部の東林田地区で河道が完全に埋塞した区間の掘削が進み、一定の流路整備が完了し流水を流せるようになりました。

また、赤谷川及び乙石川中・下流部、大山川で実施している危険と思われる流木の除去と赤谷川に近接している二次災害の危険がある施設や住家周辺の河岸防護が概ね完了しました。

今後は、現在進めている流路確保のための対策等を今月末までを目標に継続実施するとともに、上流からの土砂流出を捕捉する土砂止め工（仮設）等を実施して参ります。

≪問い合わせ先≫
【現地工事に関すること】九州地方整備局　筑後川河川事務所
副所長　寺下　進一
担当課長　藤岡　慎介
担当課長　原田　隆二
代表0942-33-9131 FAX0942-35-0164

赤谷川応急復旧のポイント

九州地方整備局
Kyushu Regional Development Bureau

①河川内または周辺にある危険な流木の撤去

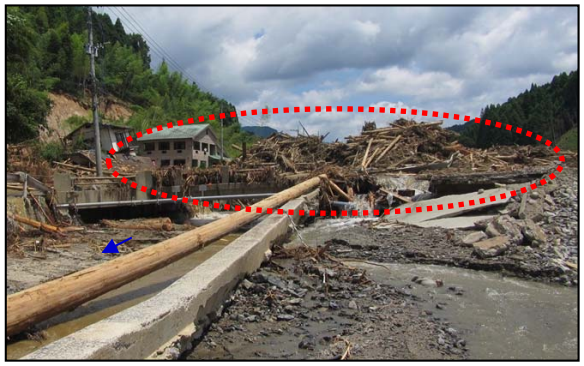

②水の流れによって、被害拡大する恐れのある施設や住居等の保護

③出水のたびに変化しうる不安定な河川（流路）の安定化

①危険な流木の撤去

■東林田地区周辺［①－(1)］

■真竹地区周辺［①－(2)］

②流水により被害拡大のおそれがある施設や住居等の保護

■赤谷川下流部（東林田地区周辺）　[②－(1)]

■高速道路上流エリア　[②－(2)]

②流水により被害拡大のおそれがある施設や住居等の保護

■赤谷川（松末小学校下流エリア）　[②－(3)]

■乙石川（松末小学校付近）　[②－(4)]

③不安定な河川の安定化【河道埋塞対応】

■杷木浄水場付近［③－(1)］

■東林田地区周辺［③－(2)］

③不安定な河川の安定化【河道埋塞対応】

■乙石川松末小学校付近［③－(3)］

■赤谷川上流［③－(4)］

③不安定な河川の安定化【不安定な河川・流路の解消】

■高速下流エリア［③－(5)］

■星丸住宅周辺［③－(6)］

赤谷川応急復旧工事　今後実施内容

九州地方整備局
Kyushu Regional Development Bureau

①河岸崩壊箇所の応急措置（赤谷川上流部・大山川等）

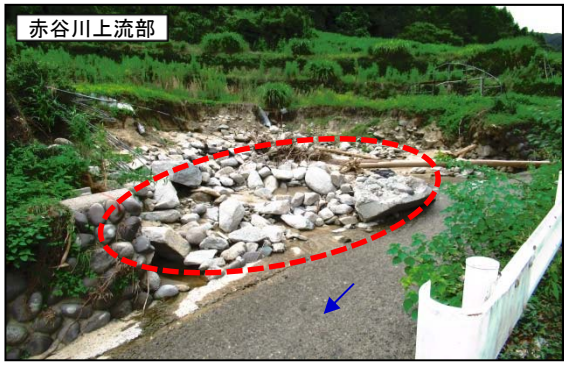

②大山川下流部（河道埋塞区間）の流路確保

③上流からの土砂移動の緩和措置（赤谷川中流域での土砂止め工）

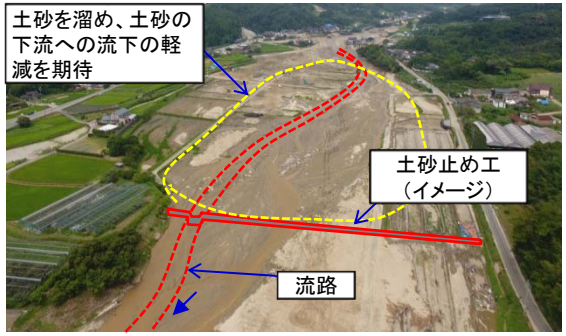

赤谷川・乙石川・大山川
応急復旧説明写真位置
N
1:16,000
乙石川
③－(4)
①－(2)
②－(4)、③－(3)
②－(3)
赤谷川
上流からの土砂移動の緩和措置（赤谷川中流域での土砂止めエ）
（今後実施）
③－(6)
流路確保予定箇所
大分自動車道
②－(2)
大山川
③－(2)
③－(5)
東林田地区流路確保範囲
①－(1)
②－(1)
③－(1)
筑後川
凡　例
対策実施箇所
流路確保箇所
流路確保予定箇所
土砂止め工設置予定箇所
撮影年月日：平成29年7月13日～7月16日
0
0.5
1
2
km
