国道10号 網掛橋（鹿児島県姶良市）　本復旧工事の進捗状況

◆護岸工・河川土工に着手

・壊れた河川護岸を復旧する工事（②護岸工）と河川の川底が削り取られる現象（洗掘）を防ぐ④根固めブロックを設置するための工事（③河川土工）に着手しました。

～本復旧工程～

準備工
①仮設ヤード造成

本復旧
②護岸工
③河川土工
④護床工
（根固めブロック）
（鋼矢板工）

⇩

本復旧完了

⇩

後片付け
⑤仮設ヤード撤去

※朱書きは施工中の
作業内容を示しています。
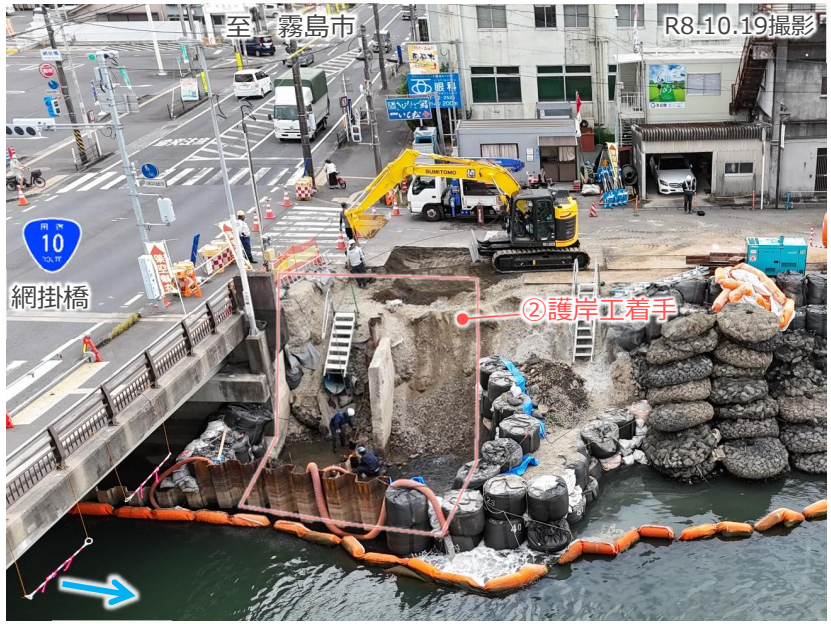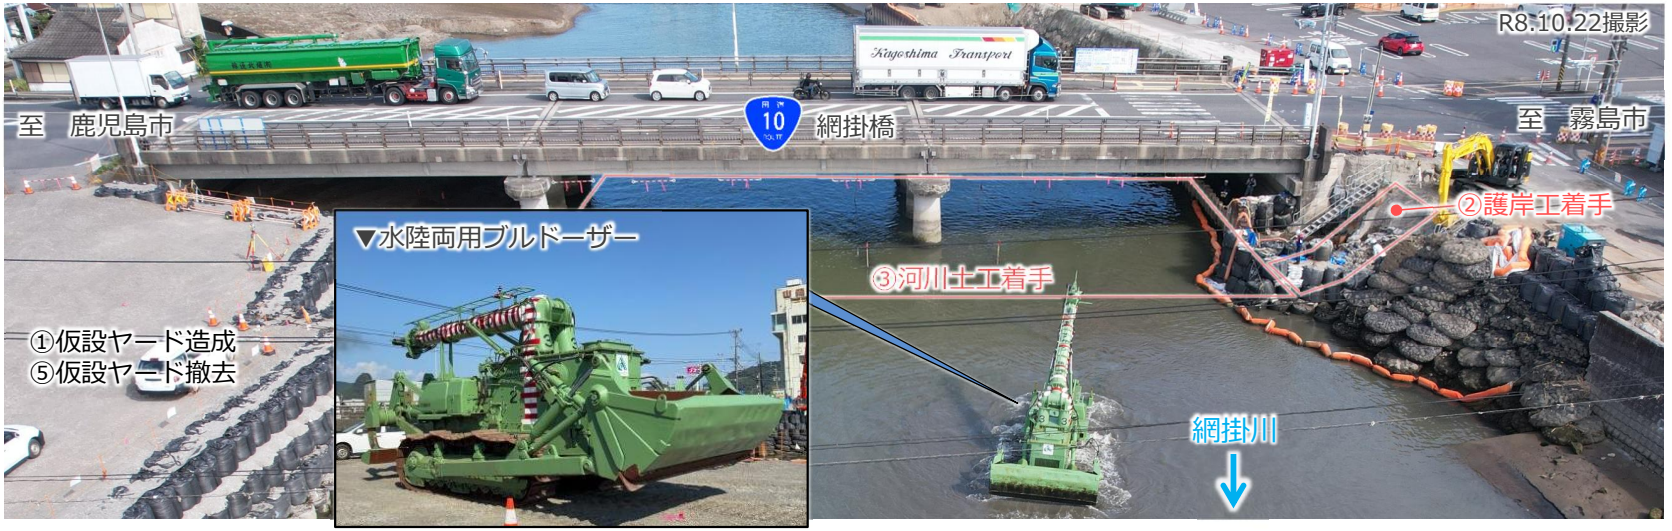
[本復旧内容イメージ]
