参考資料1

宮崎海岸侵食対策検討委員会　第６回効果検証分科会

指標設定及び分析すべき指標の洗い出し並びに分析に関する資料集

国土交通省・宮崎県

平成２９年　８月３０日

本資料は、「資料６－Ⅲ(1) 平成 28 年度に実施した調査結果に基づく効果検証」の参考として、指標設定及び分析すべき指標の洗い出し並びに分析に関する各種図表をとりまとめた資料集である。

『洗い出し作業』資料の基本構成イメージ

【1枚目】

調査結果で確認する指標と現象

設定範囲の検討

調査位置

調査時期

調査結果の整理方法

≪参考≫
・指標に設定した範囲の妥当性を補足する資料

【2枚目】

調査結果と設定範囲の比較結果

≪参考≫
・指標に設定した範囲の妥当性を補足する資料

『分析』資料の基本構成イメージ

調査項目				
要分析指標				
評価単位	対策検討の前提条件	養浜	突堤	埋設護岸

分析内容

≪参考≫
・全国的な傾向を示す分析の補足資料

分析に用いた図表

分析結果

要観察	
要注視	
要処置	

※効果検証を進める中で変更になった項目は赤字で記載している

目　次

第１章 洗い出し作業に向けて指標に設定する範囲 1-1
1.1 海象・漂砂観測 1-2
1.2 測量 1-4
1.3 環境調査 1-8
1.4 利用調査 1-14
1.5 目視点検 1-16

第２章 海象・漂砂における指標設定及び分析すべき指標の洗い出し 2-1
2.1 外力関係 2-2
2.1.1 潮位観測 2-2
2.1.2 波浪観測 2-6
2.1.3 風向・風速観測 2-14
2.1.4 流向・流速観測 2-18
2.2 漂砂関係 2-24
2.2.1 漂砂捕捉調査(トレーサー調査) 2-24
2.2.2 沖合流出土砂調査 2-28
2.2.3 飛砂調査 2-30
2.2.4 流砂量観測 2-32

第３章 測量における指標設定及び分析すべき指標の洗い出し 3-1
3.1 地形測量 3-2
3.1.1 汀線変化 3-2
3.1.2 目標浜幅 3-8
3.1.3 土砂量変化 3-14
3.1.4 波による地形変化の限界水深 3-26
3.1.5 浜崖形状の変化 3-32
3.1.6 前浜勾配 3-40
3.1.7 等深線の変化 3-46
3.2 カメラ観測 3-52
3.2.1 汀線変化 3-52
3.2.2 汀線の短期変動量 3-56
3.3 施設点検 3-62
3.3.1 離岸堤 3-62
3.3.2 突堤 3-68
3.3.3 埋設護岸 3-74

本検討資料は、今後新たな知見・情報、検討手法等によって、
変更の可能性がある数値情報を含みます。

第 4 章 環境・利用における指標設定及び分析すべき指標の洗い出し 4-1
4.1 水　質 4-3
4.1.1 水質調査(汀線部・海中部) 4-3
4.1.2 水質調査(カメラ監視) 4-8
4.2 底　質 4-12
4.2.1 底質調査（粒度試験） 4-12
4.2.2 底質調査（有機物調査） 4-32
4.2.3 養浜材調査 4-36
4.3 浮遊生物、付着生物、幼稚仔 4-40
4.3.1 浮遊生物調査 4-40
4.3.2 付着生物調査 4-44
4.3.3 幼稚仔調査 4-60
4.4 底生生物 4-68
4.4.1 沿岸全域 4-68
4.4.2 石崎川河口域 4-96
4.5 魚介類 4-98
4.5.1 魚介類調査（地元漁法による採取） 4-98
4.5.2 魚介類調査（大型サーフネットによる採取） 4-118
4.5.3 潜水目視観察 4-128
4.5.4 漁獲調査 4-132
4.6 植　物 4-134
4.6.1 植生断面調査 4-134
4.6.2 植物相調査・植生図作成調査 4-138
4.7 昆　虫 4-142
4.8 鳥　類 4-144
4.8.1 鳥類調査 4-144
4.8.2 コアジサシ利用実態調査 4-146
4.9 アカウミガメ 4-150
4.9.1 アカウミガメ上陸実態調査 4-150
4.9.2 固結調査 4-155
4.10 利用 4-157
4.10.1 漁船による操船調査 4-157
4.10.2 海岸巡視 4-159
4.10.3 利用調査 4-164
4.11 景　観 4-166
4.11.1 視点場からの目視および写真撮影 4-164
4.11.2 ヒアリング・アンケート等 4-172
4.12 市民意見 4-184

第 5 章 目視点検における指標設定及び分析すべき指標の洗い出し 5-1

第 6 章 分析 6-1
6.1 海象・漂砂 6-3
6.2 測量 6-15
6.3 環境・利用 6-51
6.4 目視点検 6-89

第1章　洗い出し作業に向けて指標に設定する範囲

1.1 海象・漂砂観測 1-2

1.2 測量 1-4

1.3 環境調査 1-8

1.4 利用調査 1-14

1.5 目視点検 1-16

- 「宮崎海岸の侵食対策」の効果検証の体系に基づき、洗い出し作業に向けて指標に設定する範囲の検討を実施した。
- 調査項目毎の指標、調査結果の整理方法及び指標に設定する範囲の検討概要の一覧を次ページ以降に示し、詳細資料を第 2 章～第 5 章に示す。

1.1 海象・漂砂観測

表－ 1.1 調査項目毎の指標、調査結果の整理方法及び指標に設定する範囲の検討概要（海象・漂砂観測）

調査項目	指標及び調査結果の整理方法	
	指標	調査結果の整理方法
潮位観測	・潮位の計画値	・宮崎港で観測された潮位（海抜(T.P.)）データを用いて、最高潮位、朔望平均満潮位、平均潮位、朔望平均干潮位を整理し、設定範囲と比較
波浪観測 （①高波浪）	・波高の計画値	・年間の高波浪上位 5 波の波高の時系列を整理し、設定範囲と比較 ・当該年の年数回波の波高(年間上位 5 波の平均値)を整理し、設定範囲と比較
波浪観測 （②エネルギー平均波）	・波高・周期・波向の計画値	・当該年のエネルギー平均波の各諸元(波高，周期，波向)を整理し、設定範囲と比較 ※各諸元は計画に合わせて宮崎港防波堤沖波浪観測地点の値に換算
風向・風速観測	・風向・風速の出現頻度	・気象庁赤江の観測データを用いて、飛砂を発生させる可能性のある強風の来襲頻度を整理し、設定範囲と比較
流向・流速観測 （①沿岸流）	・流向・流速	・自記式の流速計を調査地点に設置して観測 ・観測された流向・流速値から沿岸流の速さを整理し、設定範囲と比較
流向・流速観測 （②離岸流）	・突堤に沿った流れ	・離岸流の速さをフロート、染料等で観測 ・観測された離岸流の速さを整理し、設定範囲と比較 ・突堤周辺及び自然海浜での離岸流の速さも併せて観測し、突堤の影響を確認
漂砂関係 （①漂砂捕捉）	・突堤周辺の土砂移動	・突堤の北側基部に漂砂トレーサーを投入し、一時化に着目して突堤の南北陸上部で追跡し、トレーサーの移動状況を整理 ・越波の頻度等を CCTV カメラで監視し、突堤の天端を越える波の状況を整理
漂砂関係 （②沖合流出土砂）	・水深 T.P.-10～－12mより深い場所の土砂移動、地形変化、底質の変化	・沖合の地形変化状況等を踏まえて検討・設定
飛砂調査	・飛砂量	・巡視点検や市民意見、宮崎県道路公社へのヒアリングにより、護岸や自転車道の天端への飛砂の堆砂状況、その背後の一ツ葉有料道路における飛砂による通行止めの有無、実態を整理 ・問題箇所において、複数の風条件で飛砂トラップ調査及び風速調査を実施し、年間の飛砂による背後地への消失土砂量を算出し、宮崎海岸の土砂収支に対して有意な変化となるかを検討
流砂量観測	・河川からの流出土砂量	・「宮崎県中部流砂系検討委員会」における小丸川・一ツ瀬川から海域への流出土砂量の検討状況、関連要因の変化状況を整理

指標に設定する範囲の検討概要		
指標ﾀｲﾌﾟ	基準とする値	振れ幅
基準値 ±標準偏差	・計画潮位 最高潮位：T.P.+2.42m 朔望平均満潮位：T.P.+1.09m 平均潮位：T.P.+0.15m 朔望平均干潮位：T.P.−0.98m	最高潮位：なし それ以外：0.08m （1983.1～2011.12 のデータより）
基準値 ±標準偏差	・計画波浪 30 年確率波：11.62m 年数回波：5.04m	30 年確率波：なし 年数回波：1.11m （2005.1～2011.5 のデータより）
基準値 ±標準偏差	・エネルギー平均波 波高 1.28m 周期 7.7s 波向 15°	波高：0.12m 周期：0.23s 波向：6.8° （2005.1～2011.5 のデータより）
基準値 ±標準偏差	・日平均風速 8m/s 以上の出現日数 5.2 日/年	3.6 日/年
基準値	・年数回波条件での海浜流計算結果による T.P.−5m 地点での沿岸流速最大値 南向 2.7m/s、北向 1.8m/s	・なし
基準値	・有義波高 0.5m 以下の時の離岸流速最大値 0.2～0.3m/s 以下	・なし
定性評価	・突堤基部を通過する土砂の有無 ・突堤の天端を越える波の有無	・なし
未設定	・未設定	・未設定
未設定	・未設定	・未設定
基準値	・河床変動計算による推定値 一ツ瀬川：0.5 万 m^3/年以上 小丸川：5 万 m^3/年以上	・なし

1.2 測量

表－ 1.2(1) 調査項目毎の指標、調査結果の整理方法及び指標に設定する範囲の検討概要
（地形測量）

調査項目	指標及び調査結果の整理方法	
	指標	調査結果の整理方法
地形測量 (①汀線変化)	・汀線変化	・直轄海岸事業以降及び当該年度に実施された測量より、ブロック毎の平均汀線変化量データ(1 年当りの変化量に換算)を整理し、設定範囲と比較
地形測量 (②目標浜幅)	・浜幅	・直轄海岸事業以降及び当該年度に実施された測量より、ブロック毎の平均浜幅データを整理し、設定範囲と比較
地形測量 (③ブロック区分毎の土砂量変化)	・土砂量変化	・直轄海岸事業以降及び当該年度に実施された測量より、ブロック毎の土砂変化量データ(1 年当りの変化量に換算)を整理し、設定範囲と比較
地形測量 (④土砂収支区分毎の土砂量変化)	・土砂量変化	・当該年度に実施された測量より、土砂収支区分毎の土砂変化量データ(1 年当りの変化量に換算)を整理し、設定範囲と比較
地形測量 (⑤波による地形変化の限界水深)	・水深 T.P.-10～－12mより深い場所の地形変化	・直轄海岸事業以降及び当該年度に実施された測量データによる海抜(T.P.)-10m よりも深い場所の水深方向の標準偏差を整理し、設定範囲と比較
地形測量 (⑥浜崖形状の変化)	・浜崖形状の変化	・当該年度に実施された測量より、前年度より浜崖位置(+5m 等深線の位置)の後退が生じていないか、浜崖頂部高に低下が生じていないかを整理し、設定範囲と比較
地形測量 (⑦前浜勾配)	・前浜勾配の変化	・既往の測量成果(1983.3～2011.12)より、背後地状況等を踏まえて区切ったブロック毎の平均前浜勾配データ(T.P.－1m～＋1m)を整理し、設定範囲と比較
地形測量 (⑧等深線変化 T.P.-2m、-5m、-8m)	・等深線の変化	・直轄海岸事業以降及び当該年度に実施された測量より、ブロック毎の平均等深線変化量データ(1 年当りの変化量に換算)を整理し、設定範囲と比較

指標に設定する範囲の検討概要		
指標ﾀｲﾌﾟ	基準とする値	振れ幅
予測値 ±標準偏差	・地形変化予測計算により算定した対象年のブロック毎の平均汀線変化予測値	・前回測量時との比較によるブロック毎の平均汀線変化量を用いた標準偏差を振れ幅として設定 (1983.3～2007.1 の冬季測量データ)
予測値 ±標準偏差	・地形変化予測計算により算定した対象年のブロック毎の平均浜幅予測値	・各測量時のブロック毎の平均浜幅 A を用いて、回帰直線解析により期待値浜幅 B を算定し、浜幅の一様な変化傾向を除去した残差データ(浜幅 A－浜幅 B)を算定し、その残差データの標準偏差を振れ幅として設定 (1983.3～2007.1 の冬季測量データ)
予測値 ±標準偏差	・地形変化予測計算により算定した対象年のブロック毎の土砂変化量予測値	・前回測量時との比較によるブロック毎の土砂変化量を用いた標準偏差を振れ幅として設定 (1983.3～2007.1 の冬季測量データ)
予測値 ±標準偏差	・地形変化予測計算により算定した対象年の土砂収支区分毎の土砂変化量予測値	・前回測量時との比較によるブロック毎の土砂変化量を用いた標準偏差を振れ幅として設定 (1983.3～2007.1 の冬季測量データ)
基準値	・1982.9～2008.1 における 32 時期の測線 No.-41～No.O19 における海抜(T.P.)-10m 以深の地盤高変化の標準偏差	・なし
定性評価	・浜崖面位置の後退の有無 ・浜崖頂部高の低下の有無	・なし
基準値 ±標準偏差	・1983.3～2011.12 における 13 時期の測線 No.-41～No.-75 における海抜(T.P.)+1m と-1m の距離より算定したブロック毎の平均勾配	・1983.3～2011.12 の測量回毎のブロック平均勾配を用いた標準偏差を振れ幅として設定
予測値 ±標準偏差	・地形変化予測計算により算定した対象年のブロック毎の平均等深線変化予測値	・前回測量時との比較によるブロック毎の平均等深線変化量を用いた標準偏差を振れ幅として設定 (1983.3～2007.1 の冬季測量データ)

表－ 1.2(2) 調査項目毎の指標、調査結果の整理方法及び指標に設定する範囲の検討概要
（カメラ観測、施設点検）

調査項目	指標及び調査結果の整理方法	
	指標	調査結果の整理方法
カメラ観測 （①汀線変化）	・汀線変化	・当該年度に実施されたカメラ観測より年平均汀線位置を算定し、前年度の年平均汀線位置との差分により 1 年当りの汀線変化量を整理し、設定範囲と比較
カメラ観測 （②汀線の短期変動量）	・汀線変化	・直轄海岸事業以降及び当該年度に実施されたカメラ観測より、各観測地点の各年について、年平均・最少・最大浜幅を算定し、年平均と最小及び最大の差分から後退量及び前進量の年短期変動量を算定 ・その年短期変動量について、地点・期間を通じた平均を整理し、設定範囲と比較
施設点検 （①離岸堤）	・離岸堤天端高さの変化 ・離岸堤前面水深の変化	・離岸堤の高さ及び周辺の測量結果より、各離岸堤の平均高さ、前面水深を整理し、設定範囲と比較
施設点検 （②突堤）	・堤体の天端高さの変化 ・被覆ブロック及び捨石の移動	・突堤の高さの測量結果より、施工後の突堤平均高さを整理し、設定範囲と比較
施設点検 （③埋設護岸）	・浜崖形状の変化 ・護岸越波 ・埋設護岸の状態	・サンドパック天端高：当該年度に実施された測量を用いて、サンドパック上段の天端高（海抜(T.P.)+4m)が低下（沈下）していないかを整理し、指標範囲と比較 ・背後養浜盛土形状：当該年度に実施された測量を用いて、サンドパック背後の養浜盛土形状を整理し、指標範囲と比較 ・巡視時の定点撮影写真から、①サンドパック露出，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)，③アスファルトマット露出，④サンドパック変状状況を整理し、指標範囲と比較

指標に設定する範囲の検討概要		
指標ﾀｲﾌﾟ	基準とする値	振れ幅
予測値 ±標準偏差	・地形変化予測計算により算定した対象年のブロック毎の平均汀線変化予測値	・観測地点毎の年平均汀線変化量データを用いて標準偏差を算定し、その標準偏差を観測地点毎の基準とする汀線変化の振れ幅として設定
基準値	・2006.1～2007.12 の観測結果より、各観測地点、各年について年平均・最少浜幅位置を算定し、年平均からの後退量について 3 地点・2 年間を通じて平均した値	・なし
基準値	・離岸堤の高さ:天端高計画値 ・前面水深:既往の地形変化の範囲	・離岸堤の高さ:なし ・前面水深:既往の地形変化の範囲
基準値	・天端高計画値	・なし
基準値	・サンドパック上段の天端高計画値である海抜(T.P.)+4.0m 及び前年の計測値	・なし
定性評価	・サンドパックを越波しても浜崖への作用を防止する計画上の背後養浜盛土形状(サンドパック上段中心線を基点として浜崖側に 1/6 勾配で立ち上げた断面地形)が、天然の浜崖よりも海側で確保できているか	・なし
	・計画上の背後養浜盛土形状の陸端部の浜崖の高さが、越波対策上必要な高さ(海抜(T.P.)+7m)よりも高いか	・なし
定性評価	・①サンドパック露出の有無，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)の有無，③アスファルトマット露出の有無，④サンドパック変状の有無	・なし

1.3 環境調査

表－ 1.3(1) 調査項目毎の指標、調査結果の整理方法及び指標に設定する範囲の検討概要
（水質・底質）

調査項目	指標及び調査結果の整理方法	
	指標	調査結果の整理方法
水質 （①汀線・海中）	・水質(濁度、SS)	・陸上養浜施工箇所周辺において、工事前(11 月～12 月上旬)、工事実施日と翌日朝(波高が異なる条件で 2 回実施)、工事後(3 月)に汀線際バケツ採水、分析(SS、濁度)を実施する。その結果を整理し、設定範囲と比較 ・海中部施工箇所において、工事中、採水器による海中養浜周囲の採水、分析(SS、濁度)を実施する。その結果を整理し、設定範囲と比較
水質 （②カメラ監視）	・水質(海色)	・一ツ葉ライブカメラ画像から海水面の色調を確認し、既往調査結果と比較
底質 （①底質調査、粒度）	・底質(粒度組成、粒度)	・底質調査結果からブロック・水深毎の中央粒径 D50 及びふるいわけ係数 S0 を整理し、設定範囲と比較 ・底質調査結果から粒径加積曲線を整理し、設定範囲と比較
底質 （②底質調査 有機物）	・化学的酸素要求量 (CODsed) ・硫化物(T-S)	・底生生物調査実施箇所において底質を採取し、粒度組成のほか密度・含水比・化学的酸素要求量(CODsed)、硫化物(T-S)の分析を実施し、その結果を整理し、設定範囲と比較
底質 （③養浜材調査）	・底質の有害物質の有無	・新規養浜材の有害物質の溶質量、含有量を整理し、設定範囲と比較 ・新規養浜材の粒度試験を実施し、既往の宮崎海岸の粒度試験結果と比較

指標に設定する範囲の検討概要		
指標ﾀｲﾌﾟ	基準とする値	振れ幅
最大・最小	・既往調査の最大値	・なし
定性評価	・設定範囲は設定せずに、画像を蓄積し必要に応じて検討に使用	・なし
最大・最小	・ブロック毎に中央粒径及びふるい分け係数の平均値、最大値、最小値を算出して設定 ・ブロック毎の粒径加積曲線の最大値、最小値を設定	・なし
基準値	・「水産用水基準,社団法人日本水産資源保護協会」による化学的酸素要求量(CODsed)と硫化物(T-S)の基準値	・なし
基準値	・「浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針,国土交通省港湾局(平成 18 年 6 月)」に規定されている、「水底土砂に係る判定基準」の基準値	・なし

表－ 1.3(2) 調査項目毎の指標、調査結果の整理方法及び指標に設定する範囲の検討概要
（浮遊生物調査、付着生物調査、幼稚子、底生生物、魚介類）

調査項目	指標及び調査結果の整理方法	
	指標	調査結果の整理方法
浮遊生物調査	・浮遊生物の出現状況	・採水及びネットを用いたプランクトンの採取・調査結果と設定範囲の比較結果から動物プランクトン及び植物プランクトンの出現状況を整理し、設定範囲と比較 ・出現数の変動状況を既往の調査結果の最大値、最小値と比較して時系列で確認 ※砂浜海岸や砂浜生息生物に対して、門や種別の大きな特色はないため、整理は動物プランクトン及び植物プランクトンの総量とする。 ※整理単位は、動物プランクトン：個体数/m^3、植物プランクトン：細胞数/L とする。また、種数についても整理する。
付着生物調査	・付着生物の出現状況	・潜水目視視察及び枠内採取・調査結果と設定範囲の比較結果から門・類別の出現状況を整理し、設定範囲と比較 ・出現数の変動状況を既往の調査結果の最大値、最小値と比較して時系列で確認 ※付着動物は出現個体数、付着植物は湿重量の整理とする。また、種の多様性の確認のため、出現種数も合わせて整理する。
幼稚仔	・幼稚仔の出現状況	・サーフネットを用いた幼稚仔の採取・調査結果と設定範囲の比較結果から 1km 程度に区分したブロックに対応する地点毎に、門別の出現状況を整理し、設定範囲と比較 ・出現数の変動状況を既往の調査結果の最大値、最小値と比較して時系列で確認 ※幼稚仔は門毎に大枠の生息特性が異なるため、門毎に整理する。 ※幼稚仔は種別の個体重量の差が小さいため、出現重量ではなく出現個体数の整理とした。また、種の多様性の確認のため、出現種数も合わせて整理する。
底生生物（①沿岸全域）	・底生生物の出現状況	・定点での採泥器、ソリネットによる底質採取、調査結果と設定範囲の比較結果から 1km 程度に区分したブロックに対応する地点毎に、門別の出現状況を整理し、設定範囲と比較 ・出現数の変動状況を既往の調査結果の最大値、最小値と比較して時系列で確認 ※地点別・岸沖方向(汀線付近、砕波帯)の調査結果について、門毎に出現個体数及び出現種数、湿重量を整理する。
底生生物（②石崎川河口）	・底生生物の出現状況	・D フレームネット等を用いた定性採取法による底生生物の採取・分析を実施 ・調査結果と設定範囲の比較結果から、出現種数を整理し、設定範囲と比較
魚介類（①魚介類調査：地元漁法）	・魚介類の出現状況	・定点での地元漁法(ケタ網漁法、底曳網漁法、まき刺網漁法)により採取し、その調査結果と設定範囲の比較結果から 1km 程度に区分したブロックに対応する地点毎に、門別の出現状況を整理し、設定範囲と比較 ・出現数の変動状況を既往の調査結果の最大値、最小値と比較して時系列で確認
魚介類（②魚介類調査：大型サーフネット）	・魚介類の出現状況	・出現種数、出現個体数およびその組成、出現湿重量およびその組成と、代表種を整理して示す。
魚介類（③潜水目視調査）	・魚介類の出現状況	・突堤施工箇所の北側側面において、潜水目視観察により消波ブロック周辺に生息する魚介類の出現種数を整理し、指標範囲と比較する。 ・出現種数の変動状況を、既設離岸堤地点での調査結果より設定した指標範囲と比較して時系列で確認する。
魚介類（④漁獲調査）	・魚介類の出現状況	・統計データから漁獲量を整理し、過去の変動範囲内であるか確認

指標に設定する範囲の検討概要		
指標ﾀｲﾌﾟ	基準とする値	振れ幅
最大・最小	・2008～2011 年の浮遊生物調査結果から、動物プランクトン及び植物プランクトンの出現個体数(細胞数)及び出現種数の最大値、最小値及び平均値を算定し、設定	・なし
最大・最小	・2008～2011 年の付着生物調査結果から、門・網別の出現個体数、出現種数の最大値、最小値及び平均値を算定し、設定	・なし
最大・最小	・2008～2011 年の幼稚仔調査結果から、地点毎に門別の出現個体数及び出現種数の最大値、最小値及び平均値を算定し、設定	・なし
最大・最小	・既往の定点調査結果から、地点別・岸沖方向(汀線付近、砕波帯)の調査結果について、門毎に出現個体数及び出現種数、質重量を整理し、出現数の最大値、最小値及び平均値を算定し、設定	・なし
最大・最小	・過去の定性採取法による石崎川河口の底生生物調査結果より、出現種数を整理し、出現数の最大値、最小値及び平均値を算定し、設定	・なし
最大・最小	・過去の魚介類調査から、地点別の調査結果について、門毎に出現個体数及び出現種数を整理し、出現数の最大値、最小値及び平均値を算定し、設定	・なし
未設定	・未設定	・未設定
最大・最小	・既設離岸堤地点の潜水目視観察結果(2008(H20)年～2013(H25)年実施)から、出現種数を整理し、出現数の最大値、最小値及び平均値を算定し、設定	・なし
定性評価	・変更傾向を定性的に確認	・なし

表－ 1.3(3) 調査項目毎の指標、調査結果の整理方法及び指標に設定する範囲の検討概要
（植物、昆虫、鳥類、アカウミガメ）

調査項目	指標及び調査結果の整理方法	
	指標	調査結果の整理方法
植物 （①植生断面調査）	・植生の分布特性	・断面調査結果から植物相と横断形状(植生前線位置)を整理 ・整理結果の植生前線位置を既往調査結果と比較 ・整理結果の植生前線位置と地形・汀線の関係を確認 ・整理結果の植物相を既往調査結果と比較
植物 （②植物相調査）	・植生の分布特性	・空中写真をもとに、踏査により目視記録し、調査結果から植物相・植生分布を整理 ・整理結果の植生図をもとに、ブロック毎の植生状況を既往調査結果と比較して確認
昆虫	・昆虫の重要種、分布特性	・任意採集法、ライトトラップ法、ベイトトラップ法による調査を実施し、出現種を整理 ・既往調査結果から整理した「宮崎海岸に存在する重要種」が出現していたかどうか確認
鳥類 （①鳥類調査）	・鳥類の出現状況	・定点観察法及び任意踏査による観察を実施し、調査地点(定点及び踏査ルート)毎に出現種数を整理 ・河口部等の地形特性及び背後地の海岸保安林の連続性を考慮して設定した定点及び踏査ルート毎に調査・整理 ・整理結果の出現傾向が既往調査結果と異なっていないか確認
鳥類 （②コアジサシ調査）	・コアジサシ繁殖状況	・定点観察法、任意踏査による観察により、コアジサシの繁殖状況の観察結果を営巣・繁殖に大きな影響をおよぼす台風の来襲等を踏まえて整理し、既往調査結果と比較 ・近隣の営巣地での繁殖状況に関して情報収集を実施
アカウミガメ （①上陸実態調査）	・アカウミガメの上陸・産卵数	・アカウミガメの上陸・産卵痕跡の確認・記録を実施 ・上陸・産卵頭数を背後地の構造物状況により分割した区間毎に整理し、既往調査結果と比較
アカウミガメ （②固結調査）	・砂浜の固結状況	・養浜施工個所及び突堤周辺において、可搬型測定器を用いた貫入調査を実施し貫入量(cm)を測定 ・既往調査結果から得られた産卵可能な軟度の基準と貫入量を比較し、範囲内に収まっているか確認

指標に設定する範囲の検討概要		
指標ﾀｲﾌﾟ	基準とする値	振れ幅
最大・最小	・2008～2011 年の調査結果から、植生帯幅の最大値及び最小値を整理し、設定	・なし
最大・最小	・変更傾向を定性的に確認	・なし
最大・最小	・昆虫類重要種	・なし
最大・最小	・鳥類の目名別確認種数	・なし
基準値	・営巣・繁殖の有無	・なし
最大・最小	・2008～2011 年のアカウミガメ調査結果から、区間毎に上陸頭数及び産卵頭数の最小値を算定し、設定	・なし
最大・最小	・平成 22 年度養浜前の調査結果より、産卵可能な貫入量を設定	・なし

1.4 利用調査

表－ 1.4 調査項目毎の指標、調査結果の整理方法及び指標に設定する範囲の検討概要（利用、景観、市民意見）

調査項目	指標及び調査結果の整理方法	
	指標	調査結果の整理方法
利用 （①操船調査）	・操船への影響	・漁業者の協力を得て、突堤周辺で操船調査を実施 ・現況と突堤延伸予定地点を迂回した場合に複数の漁業者による操船を実施し、影響についてヒアリング
利用 （②海岸巡視）	・利用状況、市民意見	・海岸巡視の際、利用状況を観察し、事業実施に伴う状況変化を把握 ・状況変化が認められた際には、適宜、利用の快適性、安全性について、聞き取り調査を実施し、結果を整理
利用 （③利用調査）	・市民意見、利用状況	・分布・聞き取り調査を実施し、利用形態ごとの利用者数(1 日の延べ人数)を整理して、事業実施前の利用形態と比較 ・利用形態の整理は、事業実施前の調査に倣い背後地状況や砂浜の連続性を考慮したエリアごとに調査・整理を実施 ・海岸利用の快適性について聞き取り調査を実施し、結果を整理
景観	・突堤の被覆材の色彩、材料、形状、寸法、堤体と地形形状のすり付けのなめらかさ ・埋設護岸の埋没の有無、材料の色彩、性質、形状	・侵食対策の構造物(突堤と埋設護岸)等の設置にあたり、模型製作・試験施工等を実施し、現地見学会、宮崎海岸市民談義所等により、景観形成に関する方向性を把握
市民意見	・市民意見	・市民談義所、よろず相談所、個別ヒアリング等で聞き取り調査、書面等の確認を実施し、意見や質疑を一覧表として整理

設定範囲の設定概要		
指標ﾀｲﾌﾟ	基準とする値	振れ幅
未設定	・未設定	・未設定
最大・最小	・巡視結果を、1km 程度に区分したブロック毎に整理	・なし
定性評価	・利用状況の傾向を把握	・なし
定性評価	・『宮崎海岸らしい』景観づくりに向けて、宮崎海岸の景観特性を整理 ・別途開催されている景観検討委員会の結果も参考にする	・なし
定性評価	―	・なし

1.5 目視点検

表－ 1.5 調査項目毎の指標、調査結果の整理方法及び指標に設定する範囲の検討概要

調査項目	指標及び調査結果の整理方法	
	指標	調査結果の整理方法
目視点検	・養浜形状の変化 ・突堤の被覆ブロック及び捨石の移動 ・埋設護岸の覆土地形の変化 ・埋設護岸及び既設護岸の破損及び変状 ・埋設護岸及び既設護岸の越波	・月 2 回以上、宮崎海岸出張所職員による巡視を実施 ・変状を確認した場合には、一覧表に整理

設定範囲の設定概要		
指標ﾀｲﾌﾟ	基準とする値	振れ幅(期間)
定性評価	—	・未設定

第2章　海象・漂砂における指標設定及び分析すべき指標の洗い出し

2.1 外力関係 2-2

2.1.1 潮位観測 2-2

2.1.2 波浪観測 2-6

2.1.3 風向・風速観測 2-14

2.1.4 流向・流速観測 2-18

2.2 漂砂関係 2-24

2.2.1 漂砂捕捉調査(トレーサー調査) 2-24

2.2.2 沖合流出土砂調査 2-28

2.2.3 飛砂調査 2-30

2.2.4 流砂量観測 2-32

2.1 外力関係

2.1.1 潮位観測

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 潮位の計画値

(B) 現象

- 潮位の観測値が計画値と異なっていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象	計画変更の必要がある理由
潮位の観測値及び観測統計値(5～10年程度)が、計画値と異なる。	・計画潮位を用いて設定している目標浜幅では不足する可能性がある。 ・計画潮位を用いて設定している施設の性能・安定性が確保できない。

2) 調査位置

- 近隣で潮位の連続観測を実施している宮崎港検潮所(宮崎港湾・空港整備事務所実施)とする。

3) 調査時期

- 通年(1～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 宮崎港で観測された潮位（海抜(T.P.)）データを用いて、最高潮位、朔望平均満潮位、平均潮位、朔望平均干潮位を整理して指標範囲と比較する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、“周辺海岸・港湾の潮位条件を収集し、国土交通省としての連携を図るために宮崎港湾・空港整備事務所で設定されている潮位条件を適用すること（出典：平成 20 年度宮崎海岸侵食対策検討業務報告書)”とされており、これを用いる。

表－ 2.1 宮崎海岸周辺の潮位条件一覧（単位：T.P.m）

項目	直轄宮崎海岸
既往最高潮位(計画高潮位) H.H.W.L.	2.42 (1980(S55).9.11 生起)
朔望平均満潮位 H.W.L.	1.09
平均潮位 M.W.L.	0.15
朔望平均干潮位 L.W.L.	-0.98
備考	新標高
出典	国土交通省宮崎港湾空港整備事務所の 港湾工事用水準面

※新標高：2000 年度測量成果

出典：宮崎海岸侵食対策検討業務　報告書，平成 21 年 3 月((株)アイ・エヌ・エー)

- 振れ幅は宮崎港における 1983(S58)年～2011(H23)年までの潮位観測記録より年平均潮位の標準偏差を算出し、それを基準値に対する振れ幅とする。

表－ 2.2 年平均潮位の振れ幅（標準偏差）

観測地点	期間	振れ幅（標準偏差）
宮崎港	1983.1～2011.12	0.08m

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年は、範囲外となる潮位は観測されず、計画変更につながる現象は認められなかった。
- なお、過去 2 年間の 2014(H26)、2015(H27)年も範囲内であった。

表－ 2.3 潮位に関する指標範囲との比較結果

指標	指標に設定する変動範囲及び振れ幅			観測値(T.P.m)			調査結果と指標範囲の比較結果
	計画値 (T.P.m)	振れ幅 (標準偏差,m)	指標範囲 (計画値±振れ幅,T.P.m)	【2014(H26)】 2014.1 ～2014.12	【2015(H27)】 2015.1 ～2015.12	【2016(H28)】 2016.1 ～2016.12	
既往最高潮位 (H.H.W.L.)	2.42 (1980(S55). 9.11 生起)	ー	2.42	1.66	1.29	1.38	範囲内
朔望平均満潮位 (H.W.L.)	1.09	0.08	1.01～1.17	1.09	1.08	1.13	範囲内
平均潮位 (M.W.L.)	0.15		0.07～0.23	0.18	0.16	0.21	範囲内
朔望平均干潮位 (L.W.L.)	-0.98		-1.06～-0.90	-0.97	-1.02	-0.98	範囲内

≪参　考　年平均潮位の経年変化（近隣験潮所データとの比較）≫

- 宮崎港における潮位観測記録のふれ幅は、近隣の油津港検潮所、土佐清水港検潮所の同期間(2003～2011 年)における年平均潮位の振れ幅と同様である(表－ 2.4)。
- 年変動の傾向も類似しており、2016(H28)年はいずれの地点においても前年に比べて潮位が高く、2012(H24)年と同水準であった(図－ 2.1)。
- 以上より、2016(H28)年に宮崎港検潮所で観測されている潮位は、特異な傾向を示したものではないと考えられる。

表－ 2.4　年平均潮位の振れ幅の近隣検潮所との比較

観測地点	期間	振れ幅（標準偏差）
宮崎港	2003.1～2011.12	0.03m
（参考）油津	2003.1～2011.12	0.03m
（参考）土佐清水	2003.1～2011.12	0.03m

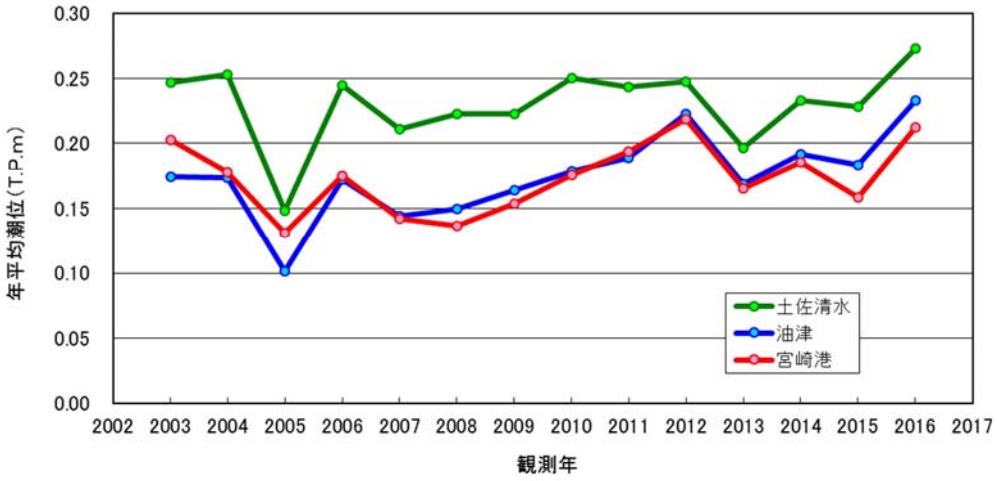

図－ 2.1　年平均潮位の近隣検潮所との比較

2.1.2 波浪観測

(1) 高波浪

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 波高の計画値(計画波、年数回波)

(B) 現象

- 高波浪の出現状況が計画値と異なっていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象	計画変更の必要がある理由
波高・周期の観測値及び観測統計値(5～10年程度)が、計画値より大きい。波高・周期の出現頻度が既往調査の傾向と異なる。	・計画波を用いて設定している目標浜幅では所定の機能を満足しない可能性がある。 ・計画波を用いて設計している施設の性能・安定性が確保できない可能性がある。

2) 調査位置

- 宮崎海岸での波浪観測は、宮崎海岸(ネダノ瀬)波浪観測地点で行われているが、観測は 2010(H22)年から開始しており、データの蓄積が少なく、基準値及び振れ幅の設定は困難である。
- 宮崎海岸(ネダノ瀬)波浪観測地点で観測が開始される以前のデータとしては、宮崎港防波堤沖波浪観測地点(2004(H16)年 12 月～2011(H23)年 5 月)の観測データがある。
- 以上のことから、解析に用いる観測地点は下記のとおりとする。
- ①解析に用いる観測地点は、宮崎海岸(ネダノ瀬)波浪観測地点とする。
- ②振れ幅は、6 年間程度のデータが蓄積されている宮崎港防波堤沖波浪観測地点のデータにより設定したものを用いる。なお、宮崎海岸(ネダノ瀬)波浪観測地点のデータが 5 年程度蓄積された段階で見直す。

3) 調査時期

- 通年(1～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 当該年の年数回波の波高※(年間上位 5 波の平均値)を整理し、指標範囲と比較する。

※波高は観測値を浅水係数で割り戻した換算沖波波高を用いている。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、宮崎海岸で計画策定時に用いている波浪の統計値である 30 年確率波及び年数回波とする。
- 計画では、「確率波高処理システム,国土交通省九州地方整備局 下関港湾空港技術調査事務所(平成 14 年度)」を用いて換算沖波波高を算出し、30 年確率波、年数回波を設定している。なお、それぞれの設定値は沿岸方向に分布を有しているが本解析では最大値を用いる。
- 30 年確率波は上限として決められる計画値であるため振れ幅は設定しない。
- 年数回波の振れ幅は、宮崎港防波堤沖観測地点で観測年毎の年数回波の平均値及び標準偏差を算出し、それを計画値に対する振れ幅とする。

表－ 2.5　高波浪に関する指標範囲及び振れ幅

指標	指標に設定する変動範囲及び振れ幅		
	計画値 (m)	振れ幅 (標準偏差,m)	指標範囲 (計画値±振れ幅,m)
計画波高 (30 年確率波)	11.62	－	11.62
年数回波	5.04	1.11	3.93～6.15

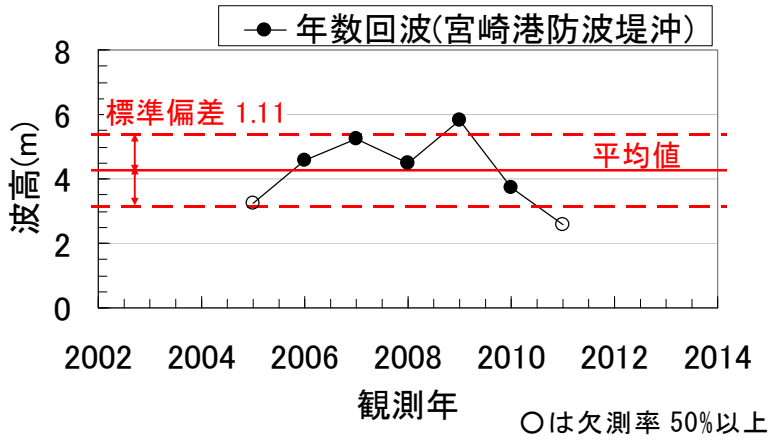

図－ 2.2　年数回波の振れ幅の算定結果

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年は範囲内であった。
- なお、2014(H26)年は年数回波が範囲外↑、2015(H27)年は範囲内であった。

表－ 2.6　高波浪に関する指標範囲との比較結果

指標	指標に設定する変動範囲及び振れ幅			観測値 H_0(m)　H_0＝H／Ks				調査結果と指標範囲の比較結果
	計画値 (m)	振れ幅 (標準偏差,m)	指標範囲 (計画値±振れ幅,m)		【2014(H26)】 2014.1 ～2014.12	【2015(H27)】 2015.1 ～2015.12	【2016(H28)】 2016.1 ～2016.12	
計画波高 (30 年確率波)	11.62	－	11.62	年最大有義波高	9.19	7.87	7.87	範囲内
年数回波	5.04	1.11	3.93～6.15	年上位 5 波平均	7.11	5.36	4.31	範囲内

≪参　考　計画値に採用している宮崎港防波堤沖波浪観測地点の観測記録について≫

- 宮崎港防波堤沖波浪観測地点における年数回波の波高の振れ幅(標準偏差)は、近隣の細島地点、志布志湾、高知西部沖地点の振れ幅と比較し、同じオーダーである。
- 以上より、宮崎港防波堤沖波浪観測地点で観測されている波浪は、特異な傾向を示していないと考えられる。

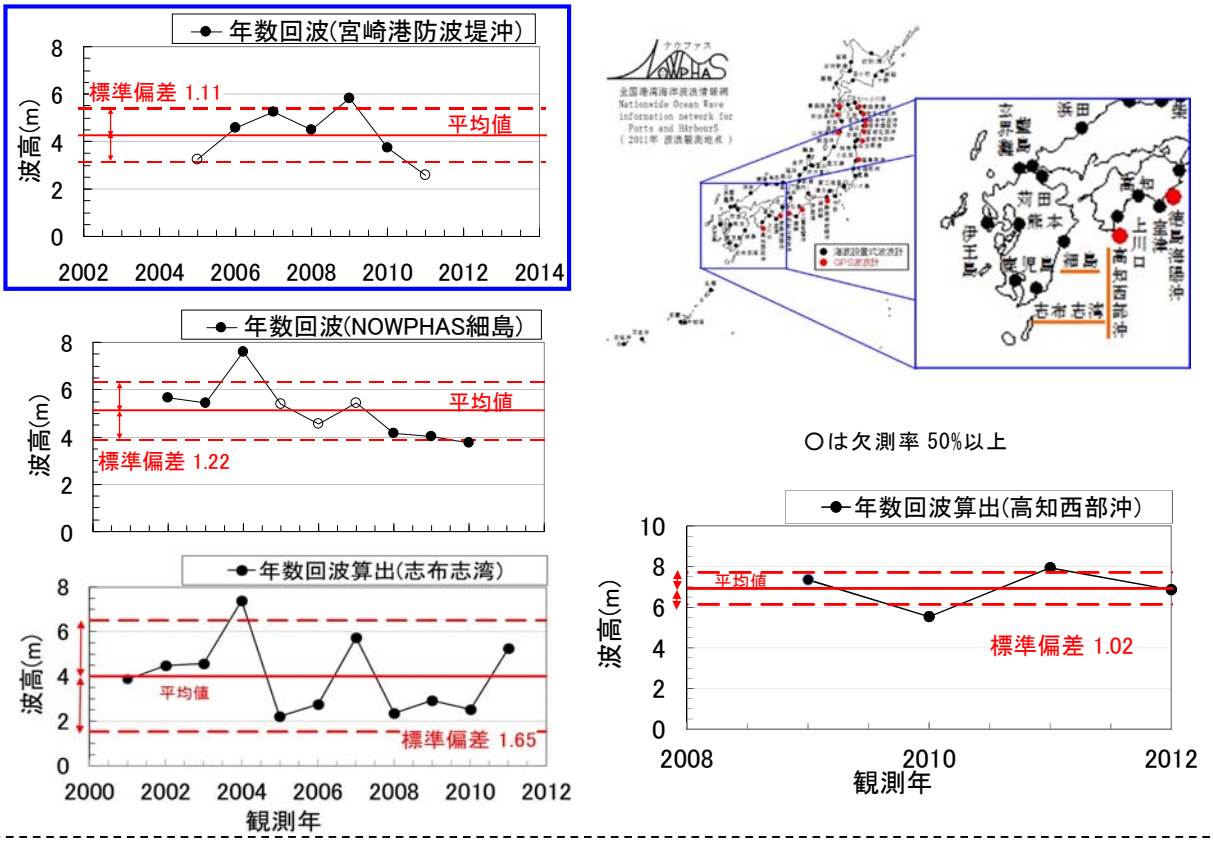

図－ 2.3　他の波浪観測所の年数回波の観測結果との比較

≪参　考　30 年確率波及び 10 年確率波≫

➢ 2005(H17)年から 2016(H28)年までの 12 年間の宮崎港防波堤沖及びネダノ瀬観測波浪観測結果より年別上位 5 波を整理した結果を図－ 2.4 に示す。この結果によると、2016(H28)年の年最大有義波高は H_0=7.87m であり、10 年確率波(H_0=9.85m)よりも小さかった。

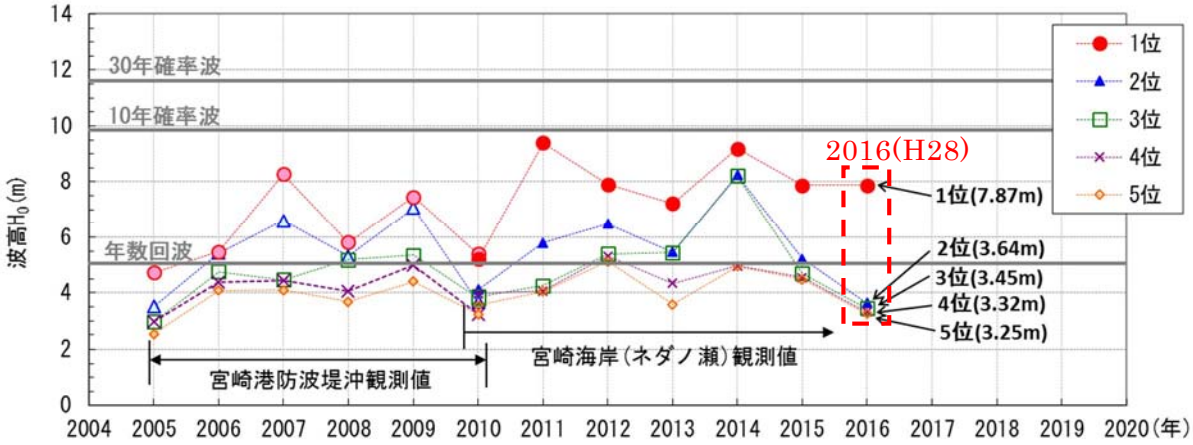

図－ 2.4　近年の上位 5 波と 30 年確率波及び 10 年確率波の比較

表－ 2.7　ネダノ瀬(2010～2016 年)観測データ(年上位 3 波)を用いた極値解析結果

分布関数	2014年検証						2015年検証					2016年検証				
	1年確率波高H_0(m)	10年確率波高H_0(m)	30年確率波高H_0(m)	相関係数	MIR	判定採否	10年確率波高H_0(m)	30年確率波高H_0(m)	相関係数	MIR	判定採否	10年確率波高H_0(m)	30年確率波高H_0(m)	相関係数	MIR	判定採否
極値－Ⅰ型	6.92	10.58	12.21	0.966	1.107		10.32	11.89	0.966	1.236		10.32	11.97	0.962	1.485	
ワイブル分布(K=0.75)	6.35	10.84	13.44	0.873	3.192	棄却	10.56	13.05	0.875	3.343	棄却	10.49	13.05	0.859	3.992	棄却
ワイブル分布(K=1.00)	6.60	10.85	12.88	0.928	2.116		10.59	12.54	0.930	2.241		10.57	12.59	0.920	2.788	棄却
ワイブル分布(K=1.40)	6.86	10.63	12.13	0.964	1.232		10.38	11.83	0.965	1.337		10.39	11.90	0.960	1.677	
ワイブル分布(K=2.00)	7.06	10.30	11.42	0.979	0.813	○	10.06	11.14	0.978	0.967	○	10.07	11.21	0.977	1.100	○
極値－Ⅱ型(K=2.50)	6.33	10.15	13.55	0.836	2.938	棄却	9.86	13.06	0.833	3.069	棄却	9.73	12.98	0.814	3.498	棄却
極値－Ⅱ型(K=3.30)	6.45	10.52	13.58	0.883	2.483		10.23	13.14	0.882	2.606	棄却	10.15	13.14	0.868	3.035	棄却
極値－Ⅱ型(K=5.00)	6.60	10.70	13.30	0.921	1.967		10.42	12.91	0.921	2.081		10.38	12.95	0.910	2.480	
極値－Ⅱ型(K=10.00)	6.77	10.70	12.81	0.948	1.483		10.44	12.46	0.948	1.597		10.43	12.53	0.942	1.935	

※宮崎海岸計画波高：10年確率波高H_0=9.85m、30年確率波高H_0=11.62m

※相関係数の残差の平均値に対する相関係数の残差の比率を示すMIR基準（MInimun Ratio of residual correlation coefficient）が最小となる分布関数が、適合する分布関数として採択される

≪参　考　年数回波≫

➢ 2010(H22)年から 2016(H28)年までの宮崎海岸(ネダノ瀬)観測波浪観測結果より、年別上位 5 波を平均して年別年数回波高を算定した結果を図－ 2.5 に示す。この結果によると、2016(H28)年は範囲内であった。

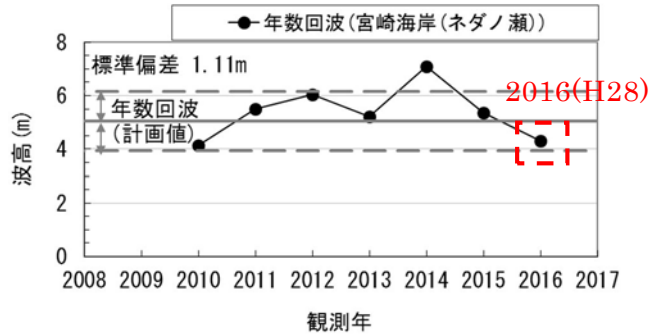

図－ 2.5　近年の年数回波

(2) エネルギー平均波

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 波高・周期・波向の計画値

(B) 現象

- 波高・周期・波向の出現頻度が計画値の傾向と異なっていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象	計画変更の必要がある理由
波向の観測統計値(5～10年程度)が計画値と異なる。波向の出現頻度が既往調査の傾向と異なる。	・計画のエネルギー平均波を用いて予測している将来地形が現実と異なる可能性がある。 ・計画のエネルギー平均波を用いて検討している「宮崎海岸の侵食対策」の機能①、②、③では背後地の安全性が確保できない可能性がある。

2) 調査位置

- 宮崎海岸での波浪観測は、宮崎海岸(ネダノ瀬)波浪観測地点で行われているが、観測は 2010(H22)年から開始しており、データの蓄積が少なく、基準値及び振れ幅の設定は困難である。
- また、現在の計画値は、宮崎港防波堤沖波浪観測地点(2011(H23)年 5 月に観測終了)の観測データにより設定されている。以上のことから、解析に用いる観測地点は下記のとおりとする。
  - ①解析に用いる観測地点は、宮崎海岸(ネダノ瀬)波浪観測地点とする。
  - ②基準値及び振れ幅は、現在の計画値の設定に用いた宮崎港防波堤沖波浪観測地点とする。

3) 調査時期

- 通年(1～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 当該年のエネルギー平均波の各諸元(波高, 周期, 波向)を整理し、指標範囲と比較する。
- なお、各諸元は計画に合わせて宮崎港防波堤沖波浪観測地点の値に換算する。換算は既往検討の回帰式(表－ 2.8)を使用する。

表－ 2.8 波向・波高の補正式（出典：平成 23 年度　宮崎海岸海象流況観測・分析業務報告書 p.7-38）

1) 波向の補正式（回帰式）

$y=0.94x + 4.81$ （$x \leq 108.0$）

$y=1.71x - 78.19$ （$x>108.0$）

ここに、x：宮崎港防波堤沖の波向(°)、y：宮崎海岸（ネダノ瀬）の波向(°)である。

2) 波高の補正式（回帰式）

$y=1.01x + 0.07$ （波向 NE）

$y=0.92x + 0.14$ （波向 ENE）

$y=0.96x + 0.05$ （波向 E）

$y=0.95x + 0.08$ （$x \leqq 2.4$、波向 ESE）

$y=0.70x + 0.69$ （$x>2.4$、波向 ESE）

$y=0.98x + 0.12$ （波向 SE）

ここに、x：宮崎港防波堤沖の波高(m)、y：宮崎海岸（ネダノ瀬）の波高(m)、波向は宮崎海岸（ネダノ瀬）における波向である。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、計画で設定しているエネルギー平均波の各諸元(波高，周期，波向)とする。宮崎港防波堤沖観測地点で観測年毎のエネルギー平均波及び標準偏差を算出し、その標準偏差をエネルギー平均波の振れ幅として設定する。

表－ 2.9　エネルギー平均波の算定結果

	出現回数	波高(m)	周期(s)	波向(°)
NE	371	1.29	5.6	55.0
ENE	6277	1.41	7.4	31.7
E	14204	1.22	7.9	17.7
ESE	4397	1.24	7.6	-6.4
SE	670	1.41	8.0	-24.0
全体	25919	1.28	7.7	15.0

波向の定義



2006(H18)年～2008(H20)年の宮崎港防波堤沖波浪観測データを用いて設定

表－ 2.10　エネルギー平均波に関する指標範囲及び振れ幅

指標 (ｴﾈﾙｷﾞｰ平均波)	指標に設定する変動範囲及び振れ幅		
	計画値	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (計画値±振れ幅)
波高	1.28 m	0.12 m	1.16～1.40 m
周期	7.7 s	0.23 s	7.47～7.93 s
波向	15 °	6.8 °	8.2～21.8 °

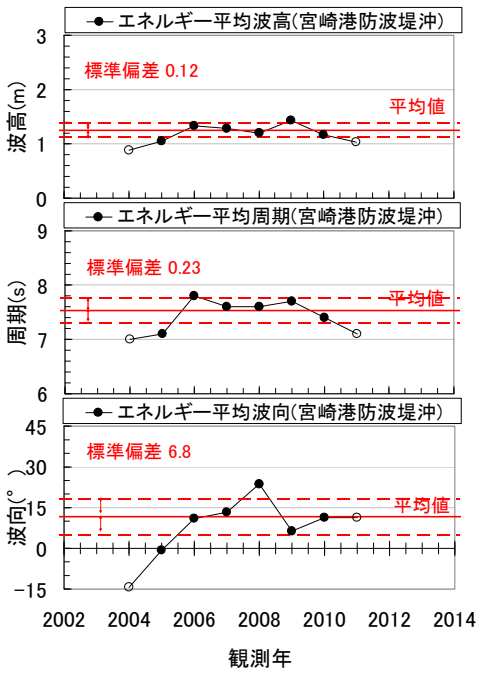

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年は、波高は小さく、周期は短く、波向は南よりからと、全ての項目において範囲外↓であった。
- なお、2014(H26)年は、波高が大きく範囲外↑であり、周期と波向は 2013(H25)年と同様で範囲外↓であった。2015(H27)年は、波高と周期は範囲内であったが、波向は南よりからの範囲外↓であった。

表－ 2.11　エネルギー平均波に関する指標範囲との比較結果

指標（ｴﾈﾙｷﾞｰ平均波）	指標に設定する変動範囲及び振れ幅			観測値から算定したエネルギー平均波(m)			調査結果と指標範囲の比較結果
	計画値	振れ幅（標準偏差）	指標範囲（計画値±振れ幅）	【2014(H26)】2014.1～2014.12	【2015(H27)】2015.1～2015.12	【2016(H28)】2016.1～2016.12	
波高	1.28 m	0.12 m	1.16～1.40 m	1.57m	1.39m	1.09m	範囲外↓
周期	7.7 s	0.23 s	7.47～7.93 s	7.3s	7.7s	7.3s	範囲外↓
波向	15 °	6.8 °	8.2～21.8 °	4.3°	0.9°	7.2°	範囲外↓

≪参　考　計画値に採用している宮崎港防波堤沖波浪観測地点の観測記録について≫

- 宮崎港防波堤沖波浪観測地点における年数回波の波高の振れ幅(標準偏差)は、近隣の細島地点の振れ幅と比較し、同じオーダーである（図－ 2.6)。
- 以上より、宮崎港防波堤沖波浪観測地点で観測されている波浪は、特異な傾向を示していないと考えられる。

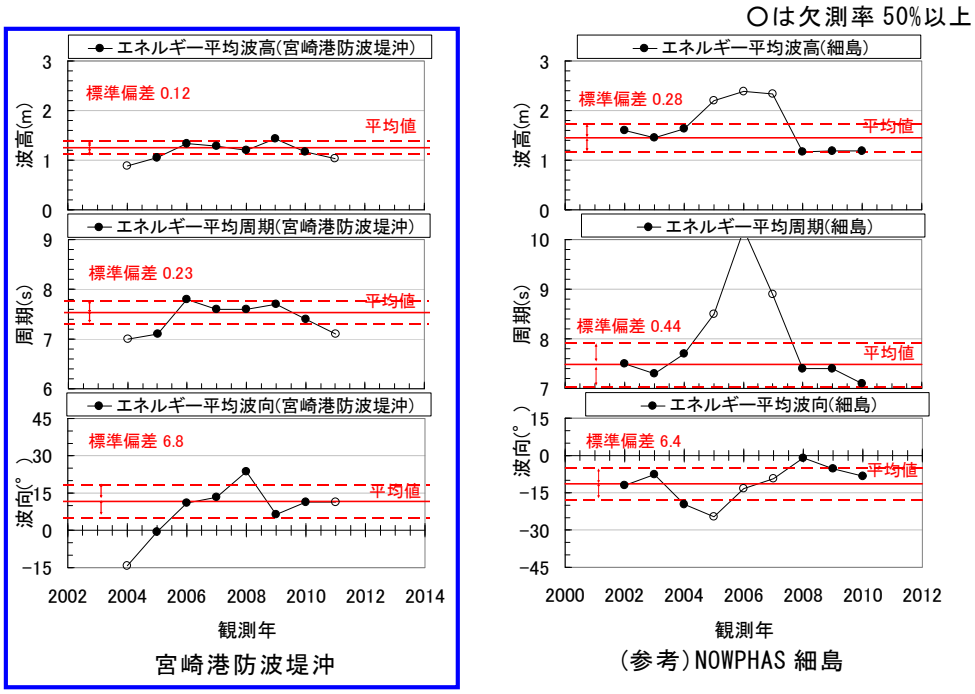

図－ 2.6　他の波浪観測所のエネルギー平均波の振れ幅(標準偏差)との比較

≪参　考　エネルギー平均波の経年変化傾向≫

➢ 宮崎海岸ネダノ瀬観測地点におけるエネルギー平均波の経年変化傾向を、近隣の NOWPHAS 細島、NOWPHAS 志布志、NOWPHAS 高知西部沖と比較した結果（図－ 2.7)、経年変化傾向に特異性は認められない。

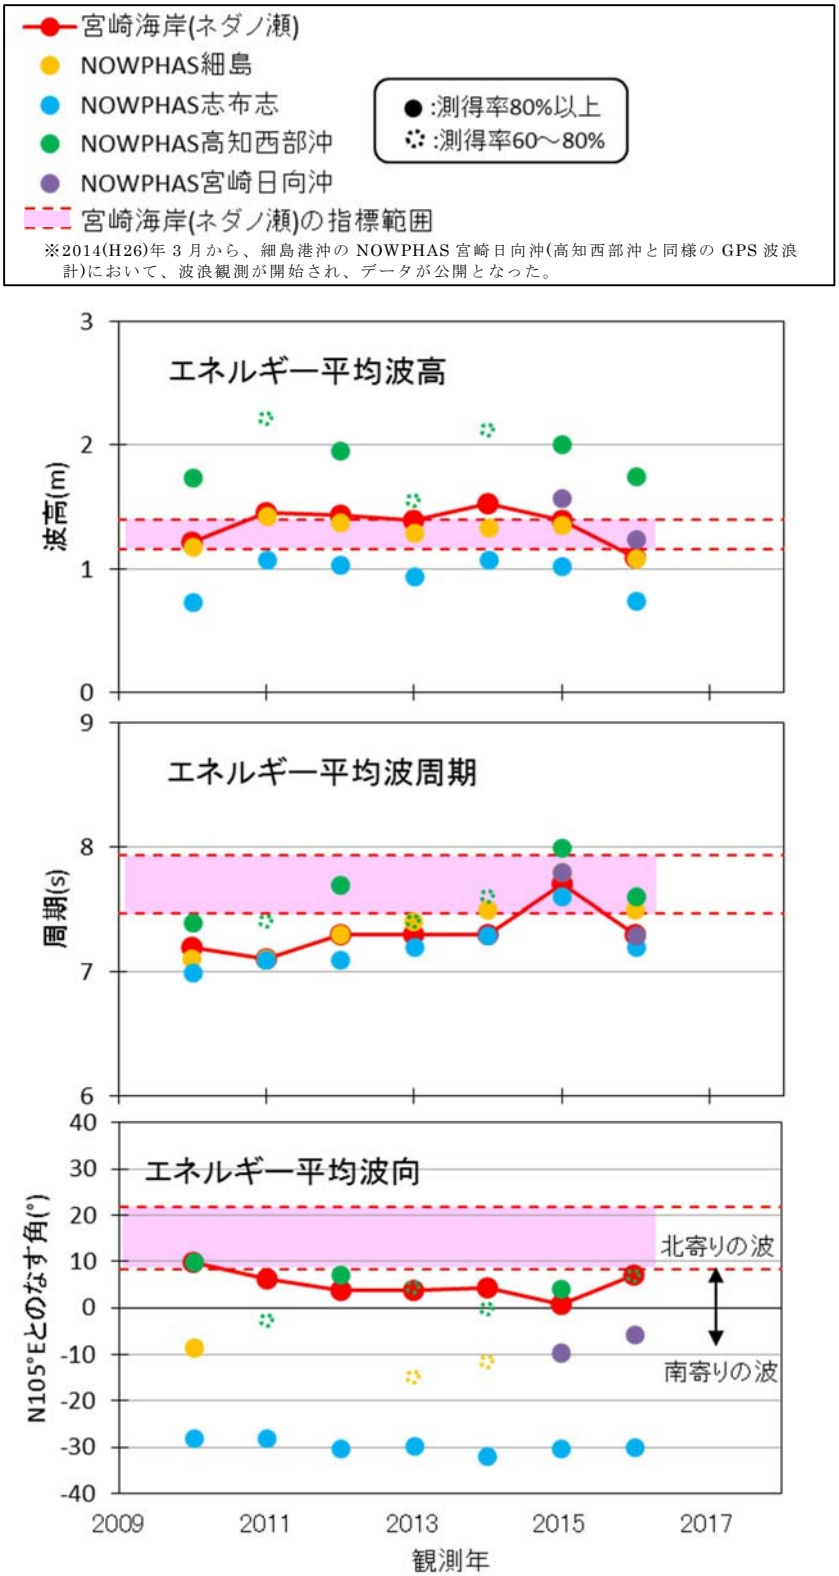

図－ 2.7　他の波浪観測所のエネルギー平均波の経年変化の比較

2.1.3 風向・風速観測

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 風向・風速の出現頻度

(B) 現象

- 飛砂発生の外力となる風向・風速が既往の統計値より大きくなっていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象	計画変更の必要がある理由
飛砂量が、既往の推定値より大きい。	・宮崎海岸の侵食要因として飛砂が一定の割合を占めており、沿岸方向の流出入土砂の制御では侵食が止まらない可能性がある。

2) 調査位置

- 赤江(気象庁，宮崎空港)とする。

※今後の観測開始に向けて一ツ葉 PA 観測地点等への風向・風速計設置を計画中
(2011(H23)年度まで一ツ葉 PA 観測地点にて実施、現在撤去済み)

3) 調査時期

- 通年(1～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 現時点で侵食対策に対して飛砂は特に問題となっていないこと、一ツ葉 PA 観測地点の風向・風速計が撤去済みであることを踏まえ、近隣の海岸付近で風向・風速観測が実施されている気象庁赤江の観測データを用いて、飛砂を発生させる可能性のある強風の来襲頻度を整理し、指標範囲と比較する。

≪参　考　土砂収支における飛砂のとり扱い≫

- 風向・風速は飛砂の発生に関係するが、事業開始当初の検討では、一ツ葉 PA 地点で観測した風向・風速データ(2007(H19)年 1 月～2008(H20)年 12 月)を用いて約 0.5m^3/m/年と飛砂量が試算され、過去の侵食においては、飛砂による影響は大きくない(侵食土砂量の 1.8～2%)と推定している(第 3,4 回技術分科会資料より)。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、既往の知見(下表)によると、海岸における飛砂の発生は、風速 8m/s 程度から生じる可能性があることが指摘されていることから、海側から陸側に向かって吹く風速 8m/s 以上の風の発生日数(年あたり)を指標に設定する変動範囲とする。
- 2003(H15)年～2011(H23)年の観測記録から日平均風速 8m/s 以上の出現日数を抽出し、年あたりの出現日数が平均 5.2 日を算定し、これを指標に設定する変動範囲とする。
- また、同観測記録から日平均風速 8m/s 以上の出現日数の標準偏差 3.6 日/年を算定し、これを振れ幅として設定する。

表－ 2.12　風向・風速に関する指標範囲及び振れ幅

指標	指標に設定する変動範囲及び振れ幅		
	年平均出現日数	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (基準値±振れ幅)
日平均風速 8m/s の 年平均出現頻度	5.2 日/年	3.6 日/年	1.6～8.8 日/年

※赤江(気象庁，宮崎空港)2003(H15)～2011(H23)

表－ 2.13　飛砂発生風速に関する既往知見

◆既往知見１：静岡県遠州灘沿岸における飛砂発生風速

8m/ｓ：竜洋海岸(静岡県遠州灘沿岸)の冬季の飛砂発生風速

出典：「透過傾斜型株模型周辺における風場と飛砂発生特性に関する風洞実験」(海岸工学論文集,第 51 巻(2004)土木学会,556-560；田中・渡辺・城野・高木)

◆既往知見２：風速と飛砂の有無の関係

5 秒間平均風速と飛砂の有無の関係

5 秒間平均風速（m/s）	6.4	7.5	8.6	9.7	10.8	11.9	14.1	計
有飛砂回数	2	6	9	15	6	2	1	41
無飛砂回数	2	6	7	4	1	0	0	19
計	4	12	16	19	7	2	1	60

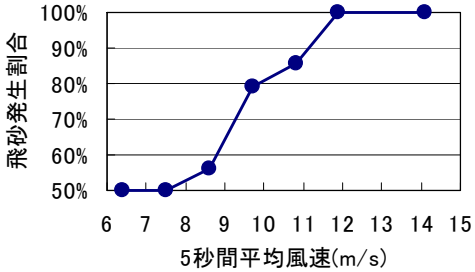

※この結果によると、短時間での平均風速でも、8m/s 程度を境に飛砂が発生しやすくなるようである。

出典：「海岸砂防工に関する基礎的研究」(九州大学農学部演習林報告 43 p1-120;Bulletin of the Kyushu University Forest 43 p1-120(1968-03-30)；末,勝海)

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年は、海側から陸側に向かう NNE～S 方向の日平均風速 8m/s 以上の出現日数は 1 年間で 1 日も観測されておらず、範囲外↓であった。
- なお、2014(H26)年は範囲外↑であった。2015(H27)年は、2016(H28)年と同様 1 日も観測されておらず範囲外↓であった。

表－ 2.14　風向・風速に関する指標範囲との比較結果

指標	指標に設定する変動範囲及び振れ幅			出現日数			調査結果と指標範囲の比較結果
	年平均出現日数	振れ幅(標準偏差)	指標範囲(基準値±振れ幅)	【2014(H26)】2014.1～2014.12	【2015(H27)】2015.1～2015.12	【2016(H28)】2016.1～2016.12	
日平均風速 8m/s の年平均出現頻度	5.2 日/年	3.6 日/年	1.6～8.8 日/年	12 日/年	0 日/年	0 日/年	範囲外↓

表－ 2.15　宮崎(赤江)における日平均風速 8m/s 以上の出現日数と出現率(1 年あたり)

		北北東 NNE	北東 NE	東北東 ENE	東 E	東南東 ESE	東南 SE	南南東 SSE	南 S	計
日数(2003～2011年)	平均	2.1	0.8	0.6	0.6	0.4	0.6	0.2	0.0	5.2
	標準偏差	1.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.4	0.0	3.6
出現率(2003～2011年)	平均	0.6%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	1.4%
	標準偏差	0.4%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.0%	1.0%
2016(H28)年	日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出現率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

※　気象庁の観測記録(2003(H15)年1月1日～2016(H28)年12月31日:正常値)より作成

参照項目：
2.2.3　飛砂調査

2.1.4 流向・流速観測

(1) 海岸全体の沿岸流観測

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 高波浪時の流向・流速

(B) 現象

- 海岸全体の沿岸流の傾向が変化していないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象	計画変更の必要がある理由
突堤周辺、県離岸堤区域の沿岸流の傾向が突堤の設置により変化する。	・想定外の侵食が発生し、既設構造物の安定性に問題が生じる可能性がある。 ・突堤周辺にとどまることを想定している土砂が流出し、突堤が効果を発揮しない可能性がある。
海岸全体の沿岸流の傾向が変化する。	・計画波から想定される沿岸流を用いて予測している将来地形が現実と異なる可能性がある。 ・計画波から想定される沿岸流を用いて検討している「宮崎海岸の侵食対策」の機能①、②、③では背後地の安全が確保できない可能性がある。

2) 調査位置

- 宮崎海岸全体を対象とするが、調査ポイントとしては、突堤周辺，動物園東，大炊田海岸とする。

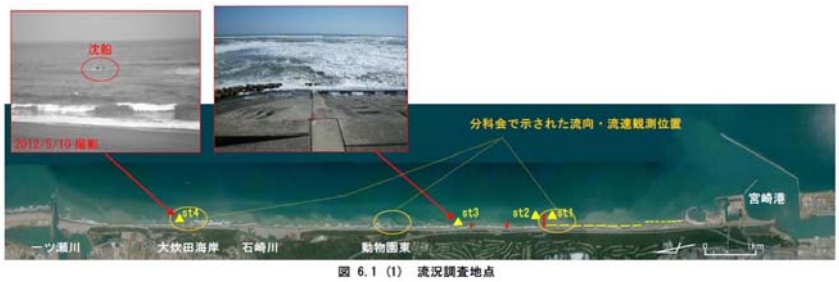

図 6.1 (1) 流況調査地点



図－ 2.8 流況調査地点

3) 調査時期

- 流速は波浪条件に応じて変化するため、1ヶ月程度以上/年の連続観測を基本とする。

4) 調査結果の整理方法

- 自記式の流速計を調査地点に設置して観測する。
- 観測された流向・流速値から沿岸流の速さを整理し、指標範囲と比較する。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、年数回波(H=5m，T=11s，波向：NE(45°)～SE(135°))条件での海浜流計算を実施し、T.P.-5m 地点での沿岸流速の沿岸方向分布を抽出した。その結果より、南向沿岸流速 2.7m/s 以下、北向沿岸流速 1.8m/s 以下を指標に設定する変動範囲とする。

表－ 2.16　流向・流速に関する指標範囲

指標	指標に設定する変動範囲	
	南向	北向
沿岸流速	2.7m/s	1.8m/s

※ネダノ瀬波浪観測地点で有義波高 5m 以下の時の T.P.-5m 地点での沿岸流速最大値(計算値)

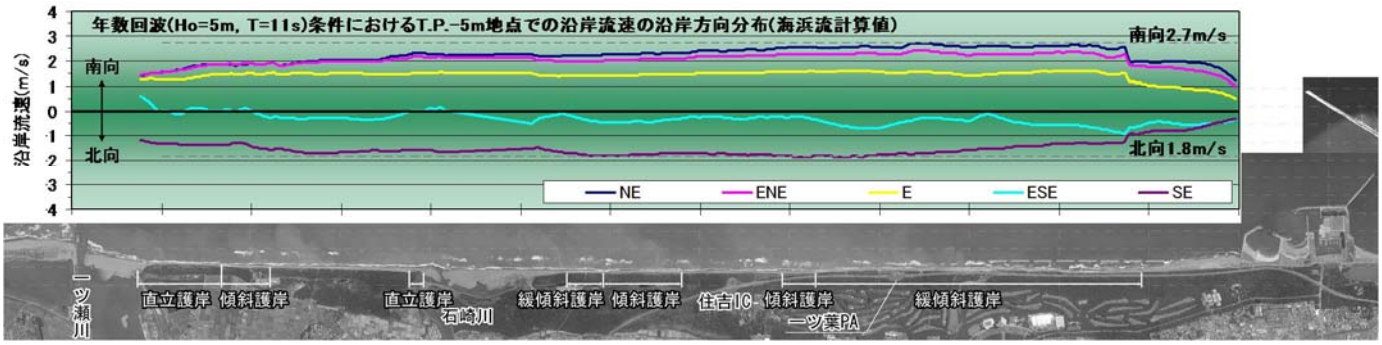

図－ 2.9　海浜流計算による沿岸流速の計算結果

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年は、St.3(動物園東)、St.4(大炊田海岸)ともに範囲内であった。(表－2.17)。

表－ 2.17　流向・流速に関する指標範囲との比較結果

沿岸流	調査位置 (設置水深)	調査実施状況 (10 分毎の 流向・流速観測)	沿岸流速最大値※ (m/s)		指標範囲 (m/s)		調査結果と 指標範囲の 比較結果
			南向	北向	南向	北向	
2016(H28)	St.3 (-1.8m) 動物園東	2016/6/26 ～2016/12/31	1.40 (2016/10/24 $H_{1/3}$=2.19m, 波向 82°)	0.94 (2016/12/13 $H_{1/3}$=1.72m, 波向 127°)	2.7	1.8	範囲内
	St.4 (-3.0m) 大炊田海岸	2016/1/1～3/27 2016/4/20～11/5	1.61 (2016/6/6 $H_{1/3}$=2.42m, 波向 69°)	1.39 (2016/10/3 $H_{1/3}$=1.47m, 波向 135°)	2.7	1.8	範囲内

※ネダノ瀬波浪観測地点で有義波高 5m 以下の時の沿岸流速最大値

≪参　考　2015(H27)年までの調査結果≫

- 2015(H27)年は、St.4(大炊田海岸)は範囲内であった。St.3 動物園東)は、南向きは範囲内であったが、北向きは 2015(H27)年 8 月 25 日に範囲外↑を観測した（表－ 2.18)。
- 2014(H26)年に実施した St.4(大炊田海岸)の流況観測結果によると、2014(H26)年 7 月 9 日に範囲外↑の北向きの沿岸流速を観測した（表－ 2.18)。
- 2013(H25)年は、St.1～3 の地点は範囲内であった。St.4(大炊田海岸)は、南向きの沿岸流速最大値は範囲内であったが、北向きの沿岸流速最大値は、2014(H26)年 3 月 13 日に指標範囲の範囲外↑を観測した（表－ 2.18)。

表－ 2.18　流向・流速に関する指標範囲との比較結果(2015(H27)年までの結果)

沿岸流	調査位置 (設置水深)	調査実施状況 (10 分毎の 流向・流速観測)	沿岸流速最大値※ (m/s)		指標範囲 (m/s)		調査結果と 指標範囲の 比較結果
			南向	北向	南向	北向	
2015(H27)	St.3 (-1.8m) 動物園東	2015/6/12 ～2015/11/20	1.19 (2015/10/7 $H_{1/3}$=3.34m, 波向 93°)	1.85 (2015/8/25 $H_{1/3}$=4.44m, 波向 126°)	2.7	1.8	範囲外↑
	St.4 (-3.0m) 大炊田海岸	2015/4/26 ～2016/2/16	1.17 (2015/8/20 $H_{1/3}$=1.46m, 波向 128°)	1.41 (2015/10/7 $H_{1/3}$=3.24m, 波向 95°)			範囲内
2014(H26)	St.4 (-3.0m) 大炊田海岸	2014/4/1 ～2015/1/8	2.53 ($H_{1/3}$=5.05m, 波向 65°)	2.96 ($H_{1/3}$=3.68m, 波向 148°)			範囲外↑
2013(H25)	St.1 (-4.3m) 8 号離岸堤	2013/5/23 ～11/6	1.42	1.66			範囲内
	St.2 (-3.4m) 突堤周辺	2013/5/23 ～10/31	0.68	0.96 ($H_{1/3}$=5.3m)			範囲内
	St.3 (-1.8m) 動物園東	2013/5/23 ～10/31	0.89	1.41 ($H_{1/3}$=5.3m)			範囲内
	St.4 (-3.0m) 大炊田海岸	2013/5/24 ～2014/3/31	2.05	2.11 ($H_{1/3}$=3.8m, 波向 138°)			範囲外↑ (北向)

※ネダノ瀬波浪観測地点で有義波高 5m 以下の時の沿岸流速最大値

(2) 突堤周辺の離岸流観測

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 突堤に沿った流れ

(B) 現象

- 宮崎海岸は遊泳禁止区域であるが、現状でサーフィンや釣り等で浅海域の利用がある。今後、突堤を設置することにより突堤に沿う流れ（離岸流）が生じることが想定されるため、サーフィンや釣り等の利用時の安全性に問題が生じていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象	計画変更の必要がある理由
突堤に沿う流れ(離岸流)が大きい。	・離岸流により、重大な事故が発生する可能性がある。

2) 調査位置

- 突堤周辺及び自然海浜(対照地点)とする。

3) 調査時期

- 波高 0.5m 程度の条件で観測を実施する。

4) 調査結果の整理方法

- 離岸流の速さをフロート、染料等で観測する
- 観測された離岸流の速さを整理し、指標範囲と比較する。
- 突堤周辺及び自然海浜での離岸流の速さも併せて観測し､突堤の影響を確認する。

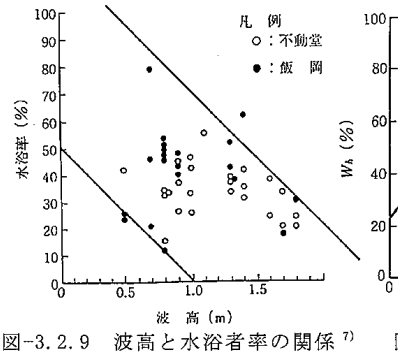

図-3.2.9 波高と水浴者率の関係 [7)]

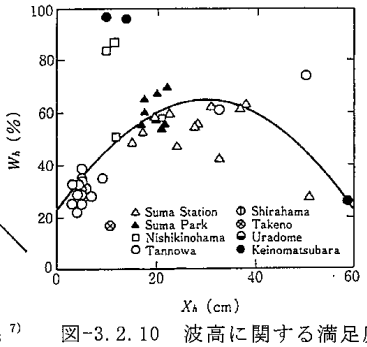

図-3.2.10 波高に関する満足度 [8)]

表-3.2.5 柏崎市の波に関する遊泳基準 [12)]

	波の状況
遊泳可 （白旗）	さざまみ～0.5m以下
遊泳注意（黄旗）	0.5～1.0m以下
遊泳禁止（赤旗）	1.0m以上

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、海浜利用に危険な流速について基準書究等に明確な指標範囲は示されていない。
- 一方、「ビーチ計画・設計マニュアル改訂版」(2005.10.31) p.44～46 においては、遊泳可能波高は 0.5m 程度であり、水浴利用可能流速は 0.2～0.3m/s 以下という目安の値が示されている。
- 上記は限られたデータからの解釈のため決定的なものではないが、現状では他に明確な指標範囲は存在しないため、宮崎海岸においては、ネダノ瀬波浪観測地点で有義波高 0.5m 以下の時に離岸流速 0.2～0.3m/s 以下を指標に設定する変動範囲とする。
- 今後実施される観測結果、現地の状況、最新の知見等を踏まえて、適宜見直しをしていく。

表－ 2.19　流向・流速に関する指標範囲

項目	指標範囲
離岸流	0.2～0.3m/s 以下※

※ネダノ瀬波浪観測地点で有義波高 0.5m 以下の時の離岸流速最大値

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は調査非実施である。

表-3.2.6　遊泳禁止等発令時の流速 [7]

流　　速	注意	部分禁止
～10 cm/s	3	4
11～20 cm/s	2	4
21～25 cm/s	6	2
26～30 cm/s	5	1
31～35 cm/s	8	5
36～　cm/s	5	1

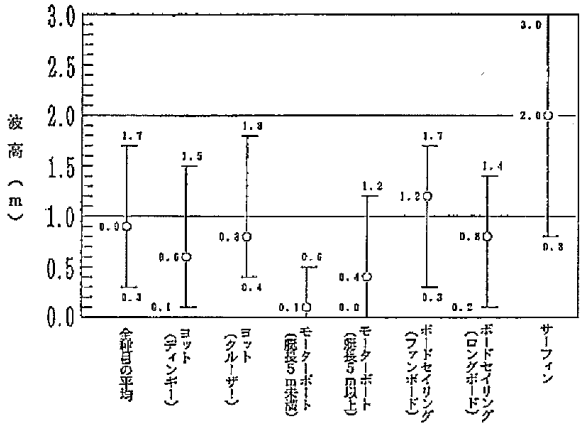

図-3.2.11　活動内容別の波高の最適値と活動可能範囲 [11]

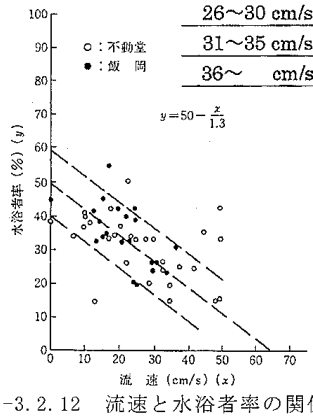

図-3.2.12　流速と水浴者率の関係 [7]

図－ 2.10　海水浴場に関する基準

（出典：ビーチ計画・設計マニュアル改訂版，2005.10.31）

2.2 漂砂関係

2.2.1 漂砂捕捉調査(トレーサー調査)

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 突堤周辺の土砂移動

(B) 現象

- 「突堤天端上を漂砂が通過する」、「突堤の南北両側で汀線位置や断面形状に差異が認められない」など、突堤の堆砂効果が認められない場合、突堤陸上部の不透過構造が確保されているかを確認する。
- なお、地形変化状況の把握に当たっては、飛砂の要因による土砂通過と区別する必要があることに留意する。

計画変更につながる可能性がある現象	計画変更の必要がある理由
突堤基部(陸上部)で土砂が突堤を越えて移動し、不透過構造になっていない。	・不透過構造を前提に設定している突堤の性能が確保できない。

2) 調査位置

- 突堤、補助突堤①，補助突堤②を調査位置とする。

図－ 2.11 調査イメージ

- 2016(H28)年は、本突堤の北側 110m 地点および補助突堤①の北側 200m 地点の汀線部に各 2m³ トレーサー用の着色砂を投入して、100m 間隔の汀線付近で底質を 400ml 採取した。

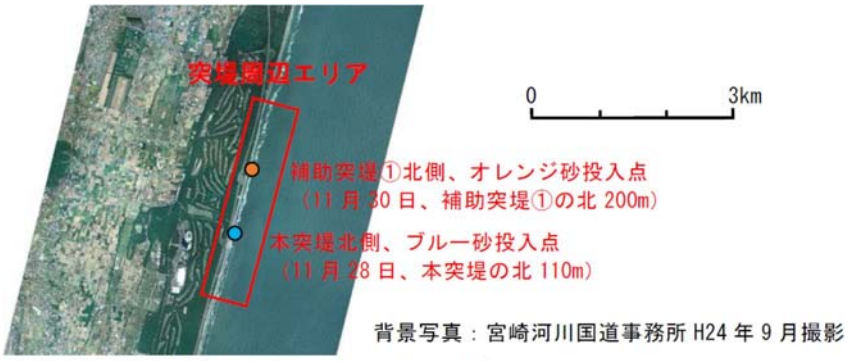

図 2-7.1-1 トレーサー調査エリア

3) 調査時期

- 具体的な調査時期は地形変化状況等を踏まえて検討・設定する。

- 2016(H28)年は、11 月 28～30 日に投入して、約 1 週間後（12 月 5 日)、約 2 週間後（12 月 12 日)、約 1 ヵ月後（12 月 27 日)、約 2 ヵ月後（2017(H29)年 1 月 25 日）の計 4 回、底質を採取した。

4) 調査結果の整理方法

- 突堤の北側基部にトレーサー(着色砂等)を投入し、一時化に着目して突堤の南北陸上部で追跡し、トレーサーの移動状況を整理する（漂砂の捕捉状況等の定量的な評価は測量で解析することとし、ここでは波の遡上等の影響による突堤基部での漂砂捕捉状況を把握する)。
- トレーサー調査以外に、越波の頻度等を CCTV カメラで監視することなども考えられる。

- 2016(H28)年は、現地で採取した底質について、室内分析により含まれる着色砂を計数して、移動状況を整理した。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは定性評価とする。
- 突堤は不透過構造を想定しているため、突堤基部の通過土砂の有無を指標に設定する変動範囲とする。
- また、土砂は突堤の天端を越えて移動することも想定されるため、突堤の天端を越える波の有無についても指標に設定する変動範囲とする。

表－ 2.20　漂砂捕捉調査(トレーサー調査)に関する指標範囲

指標	指標に設定する変動範囲
突堤周辺の土砂移動	突堤基部を通過する土砂の有無
	突堤の天端を越える波の有無

6) 調査結果

- 2016(H28)年 12～1 月の 2 ヶ月間における本突堤および補助突堤①周辺のトレーサー調査結果によると、以下のとおりである。
- 本突堤北側に投入した着色砂は、本突堤を越えた南側で検出された（通過土砂有り）。
- 補助突堤①北側に投入した着色砂は、補助突堤①の南側では検出されなかった（通過土砂無し）。

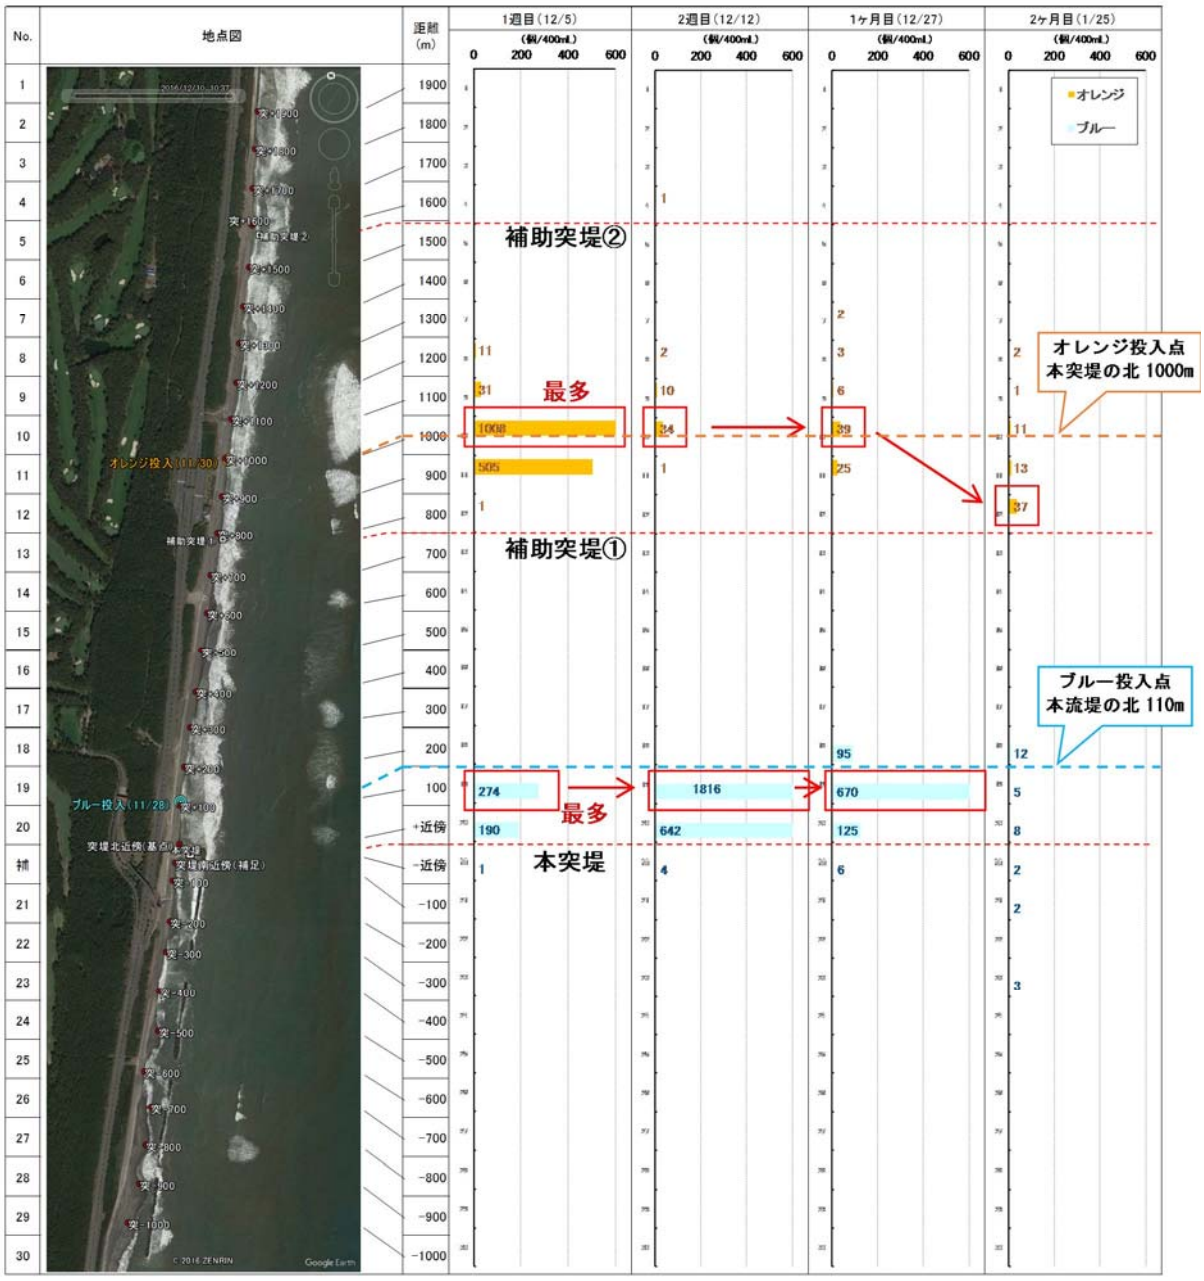

※岸沖方向は「干潮時の波打ち際」を基本とした。

（参考　調査期間中の海象状況）

- ネダノ瀬の波浪観測値及び動物園東の流況観測値によると、12 月 13 日、22 日には南寄りの有義波高 2m 前後が、1 月 5 日～9 日には北寄りの有義波高 2m 前後が観測されている。

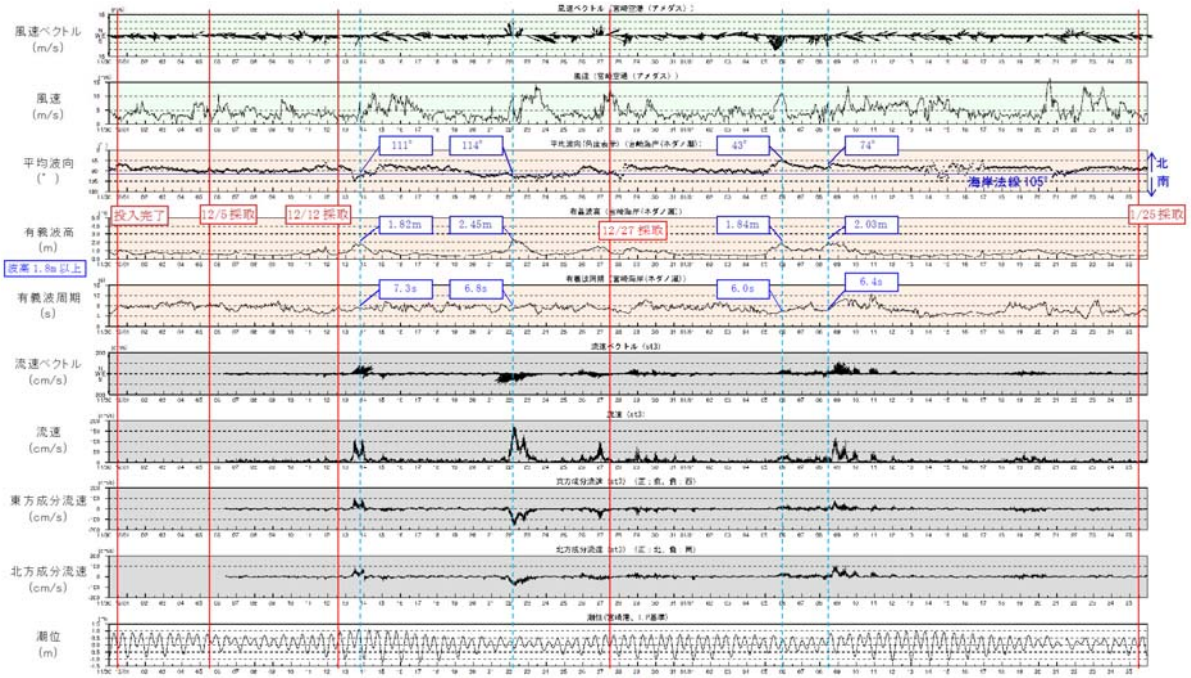

図 2-7.2-9　期間中の海象状況

参照項目：
2.2.3　飛砂調査
3.1　地形測量

2.2.2 沖合流出土砂調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 海抜(T.P.)-10～-12m より深い場所の土砂移動、地形変化、底質の変化

(B) 現象

- 測量成果を用いた波による地形変化の限界水深において、指標範囲を超える変化が確認された場合又は海岸全体の土砂収支の解析において指標範囲を超える変化が確認された場合に、沖合への土砂流出の実態と海岸侵食の関係について確認する。

計画変更につながる可能性がある現象	計画変更の必要がある理由
水深T.P.−10～−12mより深い場所の地形変化が、既往の調査結果より大きい。	・宮崎海岸の侵食要因として沖合への土砂流出が一定の割合を占めており、沿岸方向の流出入土砂の制御では侵食が止まらない可能性がある。

2) 調査位置

- 計画上の移動限界水深よりも沖側の調査が必要となるため、海抜(T.P.)-10～-12m よりも深い場所とする。
- 具体的な調査位置は、地形変化状況等を踏まえて検討・設定する。

3) 調査時期

- 具体的な調査時期は地形変化状況等を踏まえて検討・設定する。

4) 調査結果の整理方法

- 具体的な調査結果の整理方法は沖合の地形変化状況等を踏まえて検討・設定するが、現時点で想定される調査結果の整理方法を下記に示す。

①着色砂等を用いた砂の追跡移動調査：

トレーサー調査結果より、海抜(T.P.)-10～-12mより浅い場所から深い場所への土砂移動の有無を確認する。

②ダイバーによる海底ビデオ撮影：

台風前後の海底ビデオ撮影画像より、地形(トレーサー投入地点周辺)の変動を確認する。

③底質の鉛直方向の採取と放射年代測定等による堆積速度分析：

表層から鉛直方向 2m 程度の底質の鉛直方向コアサンプリング試料より、Cs134 等を用いた放射年代測定を実施し、海抜(T.P.)-10～-12mより深い場所の堆積状況を確認する。

④その他：

砂面計設置による砂面変動観測等も地形変化状況等に応じて実施の可否を検討する。

5) 指標範囲の検討

- 現況では、波による地形変化の限界水深（海抜(T.P.)-10～-12m）より深い場所の地形変化（海抜(T.P.)-10～-12mより浅い場所から深い場所への土砂移動）は、ほとんどないものとして考えており、土砂収支上は沖合への土砂流出は考慮していない。
- 沖合への土砂流出に関しては、基準書等に明確な指標範囲は示されていない。
- 以上より、宮崎海岸の沖合流出土砂調査においては、指標に設定する変動範囲を設定する段階にはないため現時点では指標範囲は設定しない。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は調査非実施である。

参照項目：
3.1.3　土砂量変化
3.1.4　波による地形変化の限界水深

2.2.3 飛砂調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 飛砂量

(B) 現象

- 養浜や突堤の対策効果により砂浜が拡幅し、護岸や太平洋自転車道の天端への堆砂やその背後の一ツ葉有料道路地点において飛砂による通行止めが生じる等あきらかな陸域への飛砂の発生、拡大の兆候が確認されたときに、飛砂量が計画時の推定値より大きくなっていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象	計画変更の必要がある理由
飛砂量が、既往の推定値より大きい。	・宮崎海岸の侵食要因として飛砂が一定の割合を占めており、沿岸方向の流出入土砂の制御では侵食が止まらない可能性がある。

2) 調査位置

- 砂浜が回復し、飛砂が問題となる可能性が生じた箇所を調査位置とする。
- 突堤の漂砂上手側などの砂浜幅が広くなる箇所が調査位置として想定される。

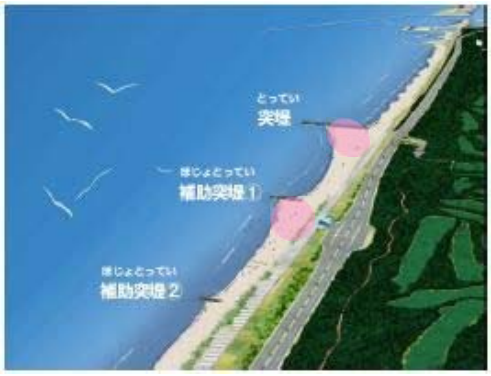

図－ 2.12 飛砂調査位置のイメージ

3) 調査時期

- 砂浜が回復した際に飛砂が問題となる時期に実施する。

4) 調査結果の整理方法

- 巡視点検や市民意見、宮崎県道路公社へのヒアリングにより、護岸や太平洋自転車道の天端への飛砂の堆砂状況、その背後の一ツ葉有料道路における飛砂による通行止めの有無、実態を整理する。
- 複数の風条件で飛砂トラップ調査及び風速調査を実施し、年間の飛砂による背後地への消失土砂量を算出し、宮崎海岸の土砂収支に対して有意な変化となるかどうか検討する

5) 指標範囲の検討

- 現時点では現象が発生しておらず、指標に設定する変動範囲を設定する段階にはないため現時点では指標範囲は設定しない。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は調査非実施である。

参照項目：
2.1.3　風向・風速観測
3.1.3　土砂量変化

≪参　考　土砂収支における飛砂のとり扱い≫

- 事業開始当初の検討では、一ツ葉 PA 地点で観測した風向・風速データ(2007(H19)年 1 月～2008(H20)年 12 月)を用いて約 0.5m³/m/年と飛砂量が試算され、過去の侵食においては、飛砂による影響は大きくない(侵食土砂量の 1.8～2%)と推定している(第 3,4 回技術分科会資料より)。

≪参　考　台風通過時の飛砂量の規模について≫

- 一ツ葉有料道路では、過去、台風が宮崎県近傍を通過した後(特に宮崎県の西側を台風が通過する場合)に、道路内に最大 4cm 程度堆積して通行止めになったことがある(2013(H27)年　宮崎県道路公社ヒアリングより)。
- 飛砂による通行止めは、表－ 2.21 に示すとおり有料道路に面した砂浜が消失した後（例えば 2007(H19)年）にも実施されているため、西風により保安林中の土砂が飛砂として道路上に堆積することも考えられる。
- なお、2008(H8)年以降は、飛砂による通行止めは生じていない。

表－ 2.21　一ツ葉有料道路の飛砂による通行止め実績(1974(S49)～2016(H28)年)

平成28年7月(宮崎県道路公社提出資料に一部加筆)

年 度	月 日	飛砂による通行止めの実績	根 拠
S49	8月26日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
S51	9月21日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
S56	7月31日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
S57	8月27日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
S60	9月13日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
S62	9月8日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
H元	9月14日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H2	－	通行止め無し	飛砂除去工事未実施
H3	10月15日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H4	8月8日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H5	8月9日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
〃	9月3日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H6	7月24日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H7	－	通行止め無し	飛砂除去工事未実施
H8	7月18日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
〃	8月14日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H9	9月16日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H10	10月17日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H11	7月27日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
〃	9月24日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H12	不明		
H13	不明		
H14	不明		
H15	不明		

年 度	月 日	飛砂による通行止めの実績	根 拠
H16	8月30日	通行止め有り	飛砂
〃	9月17日	通行止め有り	飛砂
〃	9月30日	通行止め有り	飛砂
〃	10月20日	通行止め有り	飛砂
H17	9月5日	通行止め有り	飛砂
H18	－	通行止め無し	－
H19	7月14日	通行止め有り	飛砂
H20	－	通行止め無し	－
H21	－	通行止め無し	－
H22	－	通行止め無し	－
H23	－	通行止め無し	－
H24	－	通行止め無し	－
H25	－	通行止め無し	－
H26	－	通行止め無し	－
H27	－	通行止め無し	－
H28	－	通行止め無し	－

※H11以前は工事台帳からの抽出しており、通行止めの実績は不明。
ただし、当時を知る公社内職員への聞き取りによれば、すくなくとも昭和年代は料金を償還する観点から、飛砂による通行止めを行っていなかったとのこと。
※H12～H15は工事台帳からの判断が不明。
※H16以降は飛砂による通行止めの実績。H20以降は飛砂による通行止めの実績無し。

2.2.4 流砂量観測

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 河川からの流出土砂量

(B) 現象

- 侵食対策の計画条件としている小丸川・一ツ瀬川から海域への流出土砂量が、既往の想定値と異なっていないか確認する。
- なお、現時点では「宮崎県中部流砂系検討委員会」において検討がなされており、その検討結果を踏まえて、調査の実施の必要性も含めて検討する。

計画変更につながる可能性がある現象	計画変更の必要がある理由
小丸川・一ツ瀬川から海域への流出土砂量が、既往の想定値より多い・少ない。	・計画の流出土砂量を用いて予測している将来地形が現実と異なる可能性がある。 ・計画の流出土砂量を用いて検討している「宮崎海岸の侵食対策」の機能①、②、③では背後地の安全性が確保できない可能性がある、または養浜として投入する土砂量を削減できる可能性がある。

2) 調査位置

- 宮崎海岸へ土砂を供給している河川である小丸川及び一ツ瀬川とする。

3) 調査時期

- 出水期等が想定されるが具体的な調査時期は「宮崎県中部流砂系検討委員会」の検討結果を踏まえて再度検討・設定する。

4) 調査結果の整理方法

- 「宮崎県中部流砂系検討委員会」における小丸川・一ツ瀬川から海域への流出土砂量の検討状況、関連要因の変化状況を整理し、指標範囲と比較する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、宮崎海岸で現在推定している土砂収支で用いている下記数値を使用し、指標に設定する範囲とする。

表－ 2.22　流砂量観測に関する指標範囲

項　目	指標に設定する変動範囲
河川からの流出土砂量	一ツ瀬川：0.5 万 m^3/年※ 小丸川：5 万 m^3/年※

※河床変動計算による推定値(出典：平成 18 年度大淀川・小丸川総合土砂管理計画検討業務報告書)

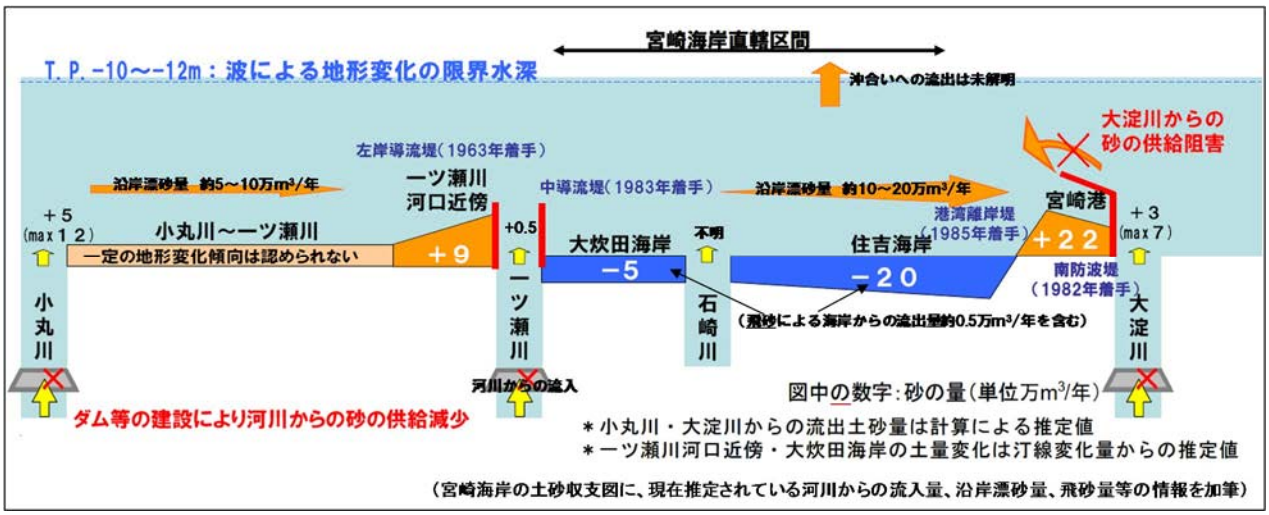

(出典：第 1 回効果検証分科会資料 1-Ⅲp.27，平成 24 年 7 月 22 日(第 6 回技術分科会資料 6-2(H23.7.17)の内容を整理加筆))

図－ 2.13　宮崎海岸を含む一連の海岸の土砂収支

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は調査非実施である。

参照項目：
3.1.3　土砂量変化

第3章　測量における指標設定及び分析すべき指標の洗い出し

3.1 地形測量 3-2

3.1.1 汀線変化 3-2

3.1.2 目標浜幅 3-8

3.1.3 土砂量変化 3-14

3.1.4 波による地形変化の限界水深 3-26

3.1.5 浜崖形状の変化 3-32

3.1.6 前浜勾配 3-40

3.1.7 等深線の変化 3-46

3.2 カメラ観測 3-52

3.2.1 汀線変化 3-52

3.2.2 汀線の短期変動量 3-56

3.3 施設点検 3-62

3.3.1 離岸堤 3-62

3.3.2 突堤 3-68

3.3.3 埋設護岸 3-74

3.1 地形測量

3.1.1 汀線変化

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 汀線変化

(B) 現象

- 汀線変化が地形変化予測計算による汀線予測値に合致しているかを確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
浜幅の前進速度が早い・遅い。

2) 調査位置

- 宮崎港港湾離岸堤区域～小丸川までの区間とする。
- なお、侵食対策の効果影響が顕著に生じると考えられる宮崎港港湾離岸堤区域～一ツ瀬川までの区間については、1km 程度のブロックに区分してブロック毎に解析する。

3) 調査時期

- 前年度対策の効果・影響が年間の波浪を受けて均された状態を評価するため、当該年度の対策本格化前(11～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 直轄海岸事業以降及び当該年度に実施された測量を用いてブロック毎の平均汀線変化量を整理し、指標範囲と比較する。
- 指標に設定する変動範囲は、等深線変化モデルによる地形変化予測値より設定する。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは予測値±振れ幅とする。
- 地形変化予測計算により算定したブロック毎の平均汀線変化予測値を用いる。
- 直轄海岸事業開始（2008(H20)年 4 月）以前の 1983(S58)年 3 月～2007(H19)年 1 月の冬季の測量データから汀線位置を抽出し、前回測量時との比較による汀線変化量を算定する。その結果による標準偏差をブロック毎の振れ幅として設定する。
- なお、振れ幅は表－ 3.1 に設定した値を用いるが、汀線変化の予測値は年度毎に変化するため、指標に設定する変動範囲（予測値±振れ幅）は年度毎に変化することになる。

表－ 3.1　汀線変化に関する指標範囲及び振れ幅

振れ幅は毎年度この値を使用する

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲		
		汀線変化予測値（2012.12）	振れ幅（標準偏差）	指標範囲（予測値±振れ幅）
1	小丸川～一ツ瀬川	0.4	79.2	-78.8 ～ 79.6
2	一ッ瀬川左岸	1.9	100.6	-98.7 ～ 102.5
3	一ッ瀬川右岸	0.4	157.7	-157.3 ～ 158.2
4	二ツ立海岸	-2.0	76.5	-78.5 ～ 74.6
5	大炊田海岸③	0.8	55.1	-54.4 ～ 55.9
6	大炊田海岸②	2.5	40.1	-37.6 ～ 42.6
7	大炊田海岸①	2.0	58.6	-56.6 ～ 60.6
8	石崎川	0.3	20.5	-20.2 ～ 20.9
9	石崎浜②	-1.8	16.7	-18.5 ～ 14.9
10	石崎浜①	-2.0	8.4	-10.4 ～ 6.3
11	動物園東②	0.0	20.6	-20.7 ～ 20.6
12	動物園東①	0.4	8.0	-7.6 ～ 8.4
13	補助突堤②北	0.0	20.4	-20.4 ～ 20.4
14	補助突堤①北	-0.1	6.2	-6.2 ～ 6.1
15	突堤北	-0.5	10.1	-10.6 ～ 9.6
16	県管理区間	1.4	9.0	-7.6 ～ 10.4
17	港湾離岸堤	-0.8	10.1	-10.9 ～ 9.2

前進傾向　後退傾向

毎年度の予測計算結果により変化する

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年は、No.1（小丸川～一ツ瀬川）および No.17（港湾離岸堤）ブロックで範囲外↑、No.14（補助突堤①北）ブロックで範囲外↓の汀線変化が確認された。
- 複数ブロックで汀線予測計算と逆の変化傾向が確認された。

表－ 3.2　汀線変化に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2016(H28)	宮崎港港湾離岸堤区域 ～小丸川までの区間	2016(H28)年 12 月	下表参照

表－ 3.3　汀線変化に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2016年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		汀線変化予測値 (2016. 12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
1	小丸川～一ツ瀬川	0. 4	11. 9	-11. 5 ～ 12. 3	14. 4	無し	範囲外↑
2	一ッ瀬川左岸	1. 4	81. 0	-79. 6 ～ 82. 4	12. 1	無し	範囲内
3	一ッ瀬川右岸	0. 5	112. 6	-112. 0 ～ 113. 1	35. 2	無し	範囲内
4	二ツ立海岸	-0. 5	64. 8	-65. 3 ～ 64. 2	3. 8	傾向逆転	範囲内
5	大炊田海岸③	4. 6	45. 5	-40. 9 ～ 50. 1	-3. 6	傾向逆転	範囲内
6	大炊田海岸②	1. 1	40. 4	-39. 3 ～ 41. 5	-0. 8	傾向逆転	範囲内
7	大炊田海岸①	0. 2	33. 7	-33. 4 ～ 33. 9	5. 4	無し	範囲内
8	石崎川	0. 8	13. 9	-13. 1 ～ 14. 7	6. 8	無し	範囲内
9	石崎浜②	-2. 0	16. 7	-18. 7 ～ 14. 7	-0. 4	無し	範囲内
10	石崎浜①	-0. 8	8. 4	-9. 2 ～ 7. 6	1. 7	傾向逆転	範囲内
11	動物園東②	-1. 6	20. 6	-22. 2 ～ 19. 1	-4. 2	無し	範囲内
12	動物園東①	-1. 4	8. 0	-9. 4 ～ 6. 6	2. 6	傾向逆転	範囲内
13	補助突堤②北	1. 0	10. 5	-9. 4 ～ 11. 5	8. 1	無し	範囲内
14	補助突堤①北	6. 4	6. 2	0. 2 ～ 12. 6	-2. 6	傾向逆転	範囲外↓
15	突堤北	1. 0	10. 1	-9. 1 ～ 11. 0	-7. 6	傾向逆転	範囲内
16	県管理区間	0. 0	9. 0	-9. 0 ～ 9. 0	0. 5	無し	範囲内
17	港湾離岸堤	-3. 1	10. 1	-13. 1 ～ 7. 0	16. 3	傾向逆転	範囲外↑

前進傾向　後退傾向



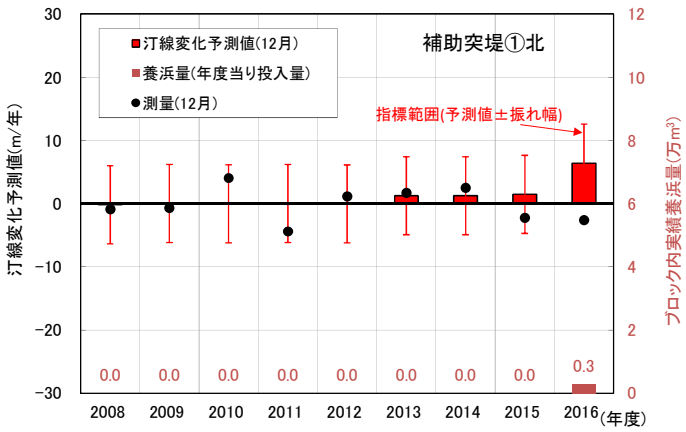

図－ 3.1　地形変化予測計算による汀線変化予測値と測量による汀線変化と指標範囲の比較結果例（補助突堤①北ブロック）

≪参考：2015(H27)年度の汀線変化≫

- 2015(H27)年は、動物園東①で範囲外↓の汀線変化が確認された。
- 複数ブロックで汀線予測計算と逆の変化傾向（北側の二ツ立ブロックで顕著な前進、南側のブロックで後退）が確認された。

表－ 3.2　汀線変化に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2015(H27)	宮崎港港湾離岸堤区域～小丸川までの区間	2015(H27)年 12 月	下表参照

表－ 3.3　汀線変化に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2015年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		汀線変化予測値 (2015.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
1	小丸川～一ツ瀬川	0.4	11.9	-11.5 ～ 12.3	1.2	無し	範囲内
2	一ッ瀬川左岸	1.5	81.0	-79.5 ～ 82.5	-7.0	傾向逆転	範囲内
3	一ッ瀬川右岸	0.7	112.6	-111.8 ～ 113.3	-0.3	傾向逆転	範囲内
4	二ツ立海岸	-0.6	64.8	-65.3 ～ 64.2	15.3	傾向逆転	範囲内
5	大炊田海岸③	0.5	45.5	-44.9 ～ 46.0	1.2	無し	範囲内
6	大炊田海岸②	1.0	40.4	-39.4 ～ 41.3	6.7	無し	範囲内
7	大炊田海岸①	1.0	33.7	-32.6 ～ 34.7	6.2	無し	範囲内
8	石崎川	0.6	13.9	-13.4 ～ 14.5	-3.4	傾向逆転	範囲内
9	石崎浜②	0.9	16.7	-15.8 ～ 17.6	-3.6	傾向逆転	範囲内
10	石崎浜①	0.6	8.4	-7.8 ～ 9.0	0.1	無し	範囲内
11	動物園東②	2.1	20.6	-18.6 ～ 22.7	2.1	無し	範囲内
12	動物園東①	2.6	8.0	-5.4 ～ 10.6	-7.9	傾向逆転	範囲外↓
13	補助突堤②北	2.0	20.4	-18.4 ～ 22.3	-10.1	傾向逆転	範囲内
14	補助突堤①北	1.5	6.2	-4.7 ～ 7.6	-2.3	傾向逆転	範囲内
15	突堤北	5.8	10.1	-4.2 ～ 15.9	-3.1	傾向逆転	範囲内
16	県管理区間	0.1	9.0	-8.9 ～ 9.1	2.1	無し	範囲内
17	港湾離岸堤	-4.2	10.1	-14.2 ～ 5.9	-5.9	無し	範囲内

前進傾向　後退傾向



図－ 3.2　地形変化予測計算による汀線変化予測値と測量による汀線変化

≪参考：2014(H26)年度の汀線変化≫

- 2014(H26)年は、範囲外の汀線変化は確認されなかった。
- 複数ブロックで汀線予測計算と逆の変化傾向（いずれも汀線後退傾向）が確認された。

表－ 3.4　汀線変化に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2014(H26)	宮崎港港湾離岸堤区域～小丸川までの区間	2014(H26)年 12 月	下表参照

表－ 3.5　汀線変化に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2014年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		汀線変化予測値 (2014. 12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
1	小丸川～一ツ瀬川	0. 4	79. 2	-78. 8 ～ 79. 6	-2. 3	傾向逆転	範囲内
2	一ツ瀬川左岸	1. 6	100. 6	-99. 0 ～ 102. 3	8. 3	無し	範囲内
3	一ツ瀬川右岸	1. 0	157. 7	-156. 8 ～ 158. 7	3. 3	無し	範囲内
4	二ツ立海岸	1. 1	76. 5	-75. 5 ～ 77. 6	-5. 7	傾向逆転	範囲内
5	大炊田海岸③	1. 5	55. 1	-53. 6 ～ 56. 7	10. 3	無し	範囲内
6	大炊田海岸②	4. 5	40. 1	-35. 6 ～ 44. 6	9. 5	無し	範囲内
7	大炊田海岸①	4. 5	58. 6	-54. 2 ～ 63. 1	-4. 6	傾向逆転	範囲内
8	石崎川	1. 1	20. 5	-19. 5 ～ 21. 6	-6. 2	傾向逆転	範囲内
9	石崎浜②	2. 3	16. 7	-14. 3 ～ 19. 0	2. 8	無し	範囲内
10	石崎浜①	1. 2	8. 4	-7. 2 ～ 9. 5	-5. 1	傾向逆転	範囲内
11	動物園東②	3. 4	20. 6	-17. 3 ～ 24. 0	-10. 7	傾向逆転	範囲内
12	動物園東①	4. 2	8. 0	-3. 8 ～ 12. 2	-0. 8	傾向逆転	範囲内
13	補助突堤②北	2. 2	20. 4	-18. 2 ～ 22. 6	-1. 4	傾向逆転	範囲内
14	補助突堤①北	1. 2	6. 2	-4. 9 ～ 7. 4	2. 5	無し	範囲内
15	突堤北	10. 0	10. 1	-0. 1 ～ 20. 0	7. 8	無し	範囲内
16	県管理区間	-0. 4	9. 0	-9. 4 ～ 8. 6	-2. 7	無し	範囲内
17	港湾離岸堤	-6. 3	10. 1	-16. 3 ～ 3. 8	-3. 7	無し	範囲内

前進傾向　後退傾向



図－ 3.3　地形変化予測計算による汀線変化予測値と測量による汀線変化

3.1.2　目標浜幅

1)　調査結果で確認する指標と現象

(A)　指標

- 浜幅

(B)　現象

- 浜幅が地形変化予測計算による目標浜幅予測値に合致しているかを確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
区間平均浜幅の前進速度が早い・遅い。 ※区間:宮崎港～一ツ瀬川までの範囲を1km程度に区切る。

2)　調査位置

- 宮崎港港湾離岸堤区域～二ツ立海岸までの区間とする。
- 汀線変化と同様に 1km 程度のブロックに区分してブロック毎に解析する。

3)　調査時期

- 前年度対策の効果・影響が年間の波浪を受けて均された状態を評価するため、当該年度の対策本格化前(11～12 月)とする。

4)　調査結果の整理方法

- 直轄海岸事業以降及び当該年度に実施された測量を用いてブロック毎の平均浜幅を整理し、指標範囲と比較する。
- 指標に設定する変動範囲は、等深線変化モデルによる地形変化予測値より設定する。

【浜幅の定義】
② 既設コンクリート護岸設置箇所：護岸法肩より汀線までの距離
②自然浜区間：宮崎海岸直轄化後最初の調査である、2008(H20)年測量成果から読み取った浜崖の肩より汀線までの距離

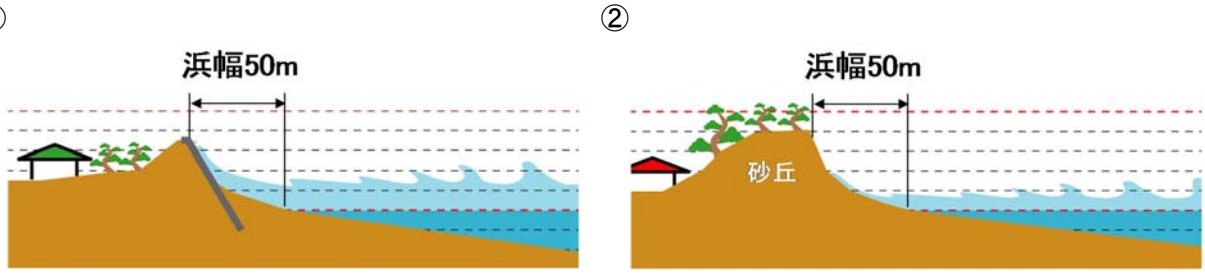

図－ 3.4　浜幅の定義イメージ

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは予測値±振れ幅とする。
- 浜幅の予測値は、それまでに実施した対策の実施状況を計算条件とした地形変化予測計算を用いて算定する。分析する年のブロック毎の平均浜幅予測値を地形変化予測計算により算定し、浜幅の予測値として設定する。
- 振れ幅は、測量成果を用いて下記の手順で算定する。

①直轄海岸事業開始（2008(H20)年 4 月）以前の 1983(S58)年 3 月～2007(H19)年 1 月の冬季の測量データから汀線位置を読み取り、浜幅を算定する。

②そのデータを用いて、背後地状況等を踏まえて区切ったブロック毎の平均浜幅 A を算定する。

③長期的な侵食・堆積傾向は振れ幅として考慮しないため、これを除去するために、浜幅の一様な変化傾向について、平均浜幅 A を用いて回帰直線解析により期待値浜幅 B を算定する。

④③で求めた浜幅の一様な変化傾向を除去した残差データ(浜幅 A－浜幅 B)を算定する。

⑤その残差データの標準偏差を算定し、その標準偏差をブロック毎の振れ幅として設定する。

- なお、振れ幅は表－ 3.8 を用いるが、浜幅の予測値は年度毎に変化するため、指標に設定する変動範囲（予測値±振れ幅）は年度毎に変化することになる。

表－ 3.8　目標浜幅に関する指標範囲及び振れ幅

振れ幅は毎年度この値を使用する

効果検証評価ブロック区分		浜幅予測値 (2012.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)
4	二ツ立海岸	12.5	46.3	-33.8※ ～ 58.8
5	大炊田海岸③	30.4	32.8	-2.4※ ～ 63.2
6	大炊田海岸②	42.1	18.3	23.7 ～ 60.4
7	大炊田海岸①	46.8	46.9	0.0 ～ 93.7
9	石崎浜②	63.3	15.6	47.7 ～ 78.9
10	石崎浜①	45.9	6.0	39.9 ～ 51.9
11	動物園東②	48.5	12.5	36.0 ～ 61.0
12	動物園東①	48.6	5.4	43.3 ～ 54.0
13	補助突堤②北	38.7	13.5	25.2 ～ 52.2
14	補助突堤①北	0.0	5.7	-5.7※ ～ 5.7
15	突堤北	22.7	7.5	15.2 ～ 30.1
16	県管理区間	43.9	10.3	33.6 ～ 54.3
17	港湾離岸堤	109.4	11.9	97.5 ～ 121.3

指標に設定する設定範囲

浜幅50m未満

毎年度の予測計算結果により変化する

※護岸区間であり浜幅は 0m 未満にはならないため指標範囲は事実上 0m 以上となる。

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年は、No.9～15（石崎浜②～突堤北）ブロックで範囲外↓、No.17（港湾離岸堤）ブロックで範囲外↑の浜幅が確認された。
- また、No.7～15（大炊田海岸①～突堤北）ブロックで、浜幅が予測値よりも狭い結果であった。

表－ 3.9　目標浜幅に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2016(H28)	宮崎港港湾離岸堤区域～二ツ立海岸までの区間	2016(H28)年 12 月	下表参照

表－ 3.10　目標浜幅に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

（単位：m）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲 浜幅予測値 (2016.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)	検証対象 2016年12月	調査結果と指標範囲の比較結果 予測値との比較	
4	二ツ立海岸	12.2	39.5	-27.2 ～ 51.7	42.3	予測値よりも広い	範囲内
5	大炊田海岸③	36.7	23.7	13.1 ～ 60.4	39.0	予測値よりも広い	範囲内
6	大炊田海岸②	48.5	18.6	29.9 ～ 67.1	48.5		範囲内
7	大炊田海岸①	53.2	15.5	37.6 ～ 68.7	47.4	予測値よりも狭い	範囲内
9	石崎浜②	62.6	15.6	47.0 ～ 78.2	39.5	予測値よりも狭い	範囲外↓
10	石崎浜①	44.3	6.0	38.3 ～ 50.3	23.0	予測値よりも狭い	範囲外↓
11	動物園東②	52.4	12.5	39.9 ～ 64.8	17.8	予測値よりも狭い	範囲外↓
12	動物園東①	55.9	5.4	50.6 ～ 61.3	23.0	予測値よりも狭い	範囲外↓
13	補助突堤②北	47.8	7.4	40.4 ～ 55.2	23.0	予測値よりも狭い	範囲外↓
14	補助突堤①北	30.3	5.7	24.6 ～ 36.0		砂浜無し	範囲外↓
15	突堤北	42.7	7.5	35.2 ～ 50.2	22.0	予測値よりも狭い	範囲外↓
16	県管理区間	43.7	10.3	33.4 ～ 54.1	46.4	予測値よりも広い	範囲内
17	港湾離岸堤	85.0	11.9	73.1 ～ 97.0	142.0	予測値よりも広い	範囲外↑

浜幅50m未満　護岸設置区間で砂浜なし



≪参考：2015(H27)年度の浜幅変化≫

- 2015(H27)年は、No.9～13（石崎浜②～補助突堤②北）および No.15（突堤北）ブロックで範囲外↓、No.17（港湾離岸堤）ブロックで範囲外↑の浜幅が確認された。
- また、No.7～15（大炊田海岸①～突堤北）ブロックで、浜幅が予測値よりも狭い結果であった。

表－ 3.9　目標浜幅に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2015(H27)	宮崎港港湾離岸堤区域～二ツ立海岸までの区間	2015(H27)年 12 月	下表参照

表－ 3.10　目標浜幅に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

（単位：m）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲 浜幅予測値 (2015. 12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)	検証対象 2015年12月	調査結果と指標範囲の比較結果 予測値との比較	範囲内
4	二ツ立海岸	12. 8	39. 5	-26. 7 ～ 52. 2	38. 5	予測値よりも広い	範囲内
5	大炊田海岸③	32. 1	23. 7	8. 4 ～ 55. 8	42. 5	予測値よりも広い	範囲内
6	大炊田海岸②	47. 4	18. 6	28. 8 ～ 66. 1	49. 3	予測値よりも広い	範囲内
7	大炊田海岸①	53. 3	15. 5	37. 7 ～ 68. 8	42. 1	予測値よりも狭い	範囲内
9	石崎浜②	64. 6	15. 6	49. 0 ～ 80. 2	39. 9	予測値よりも狭い	範囲外↓
10	石崎浜①	45. 1	6. 0	39. 1 ～ 51. 1	21. 3	予測値よりも狭い	範囲外↓
11	動物園東②	53. 9	12. 5	41. 4 ～ 66. 4	22. 0	予測値よりも狭い	範囲外↓
12	動物園東①	57. 3	5. 4	52. 0 ～ 62. 7	20. 4	予測値よりも狭い	範囲外↓
13	補助突堤②北	46. 8	13. 5	33. 2 ～ 60. 3		砂浜無し	範囲外↓
14	補助突堤①北	23. 9	5. 7	18. 2 ～ 29. 6	21. 1	予測値よりも狭い	範囲内
15	突堤北	41. 7	7. 5	34. 3 ～ 49. 2	29. 5	予測値よりも狭い	範囲外↓
16	県管理区間	43. 7	10. 3	33. 4 ～ 54. 1	45. 9	予測値よりも広い	範囲内
17	港湾離岸堤	88. 1	11. 9	76. 2 ～ 100. 1	125. 8	予測値よりも広い	範囲外↑

浜幅50m未満　護岸設置区間で砂浜なし



≪参考：2014(H26)年度の浜幅変化≫

- 2014(H26)年は、No.9～13（石崎浜②～補助突堤②北）ブロックで範囲外↓、No.17（港湾離岸堤）ブロックで範囲外↑の浜幅が確認された。
- また、No.6～13（大炊田海岸②～補助突堤②北）及び No.15(突堤北)ブロックで、浜幅が予測値よりも狭い結果であった。

表－ 3.11　目標浜幅に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2014(H26)	宮崎港港湾離岸堤区域～二ツ立海岸までの区間	2014(H26)年 12 月	下表参照

表－ 3.12　目標浜幅に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

（単位：m）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲 浜幅予測値 (2014.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)	検証対象 2014年12月	調査結果と指標範囲の比較結果 予測値との比較	
4	二ツ立海岸	13.4	46.3	-32.9 ～ 59.7	23.2	予測値よりも広い	範囲内
5	大炊田海岸③	31.6	32.8	-1.2 ～ 64.4	41.3	予測値よりも広い	範囲内
6	大炊田海岸②	46.5	18.3	28.1 ～ 64.8	42.6	予測値よりも狭い	範囲内
7	大炊田海岸①	52.2	46.9	5.4 ～ 99.1	35.9	予測値よりも狭い	範囲内
9	石崎浜②	63.7	15.6	48.1 ～ 79.2	43.5	予測値よりも狭い	範囲外↓
10	石崎浜①	44.5	6.0	38.5 ～ 50.5	21.2	予測値よりも狭い	範囲外↓
11	動物園東②	51.8	12.5	39.3 ～ 64.3	19.9	予測値よりも狭い	範囲外↓
12	動物園東①	54.7	5.4	49.4 ～ 60.1	28.3	予測値よりも狭い	範囲外↓
13	補助突堤②北	44.8	13.5	31.3 ～ 58.3	24.9	予測値よりも狭い	範囲外↓
14	補助突堤①北	22.4	5.7	16.8 ～ 28.1	23.4	予測値よりも広い	範囲内
15	突堤北	35.9	7.5	28.4 ～ 43.4	32.6	予測値よりも狭い	範囲内
16	県管理区間	43.7	10.3	33.3 ～ 54.0	43.8	予測値よりも広い	範囲内
17	港湾離岸堤	92.3	11.9	80.4 ～ 104.2	131.6	予測値よりも広い	範囲外↑

浜幅50m未満　護岸設置区間で砂浜なし



3.1.3 土砂量変化

(1) ブロック区分毎の土砂量変化

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 土砂量変化

(B) 現象

- 土砂量変化が地形変化予測計算による土砂変化量予測値に合致しているかを確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
蓄積した測量データ(5～10年程度)から得られる地形変化量が、既往の土砂変化量の速度より大きい・小さい。

2) 調査位置

- 宮崎港港湾離岸堤区域～小丸川までの区間とする。
- 汀線変化等と同様に、1km 程度のブロックに区分してブロック毎に解析する。

3) 調査時期

- 前年度対策の効果・影響が年間の波浪を受けて均された状態を評価するため、当該年度の対策本格化前(11～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 直轄海岸事業以降及び当該年度に実施された測量を用いてブロック毎の土砂変化量を整理し、指標範囲と比較する。
- 指標に設定する変動範囲は、等深線変化モデルによる地形変化予測値より設定する。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは予測値±振れ幅とする。
- 土砂量変化の予測値は、それまでに実施した対策の実施状況を計算条件とした地形変化予測計算を用いて算定する。分析する年のブロック毎の土砂量変化の予測値を地形変化予測計算により算定し、土砂量変化の予測値として設定する。
- 振れ幅は、測量成果を用いて下記の手順で算定する。

①直轄海岸事業開始（2008(H20)年 4 月）以前の 1983(S58)年 3 月～2007(H19)年 1 月の冬季の測量データから前回測量時との比較による土砂量変化を算定する。

②算定した土砂量変化より標準偏差を算定し、その標準偏差をブロック毎の振れ幅として設定する。

- なお、振れ幅は表－ 3.15 を用いるが、土砂量変化の予測値は年度毎に変化するため、指標に設定する変動範囲（予測値±振れ幅）は年度毎に変化することになる。

表－ 3.15　ブロック区分毎の土砂量変化に関する指標範囲及び振れ幅

振れ幅は毎年度この値を使用する

（単位：万m^3/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲		
		土量変化予測値（2012.12）	振れ幅（標準偏差）	指標範囲（予測値±振れ幅）
1	小丸川～一ツ瀬川	-2.5	136.8	-139.3 ～ 134.4
2	一ッ瀬川左岸	1.0	29.7	-28.7 ～ 30.7
3	一ッ瀬川右岸	-0.9	7.2	-8.1 ～ 6.4
4	二ツ立海岸	-0.3	14.9	-15.2 ～ 14.5
5	大炊田海岸③	-0.1	3.7	-3.8 ～ 3.6
6	大炊田海岸②	-0.3	7.4	-7.7 ～ 7.1
7	大炊田海岸①	-0.5	3.7	-4.2 ～ 3.2
8	石崎川	0.0	10.9	-10.9 ～ 10.9
9	石崎浜②	0.1	1.8	-1.7 ～ 1.9
10	石崎浜①	0.2	10.5	-10.3 ～ 10.7
11	動物園東②	-0.1	10.4	-10.4 ～ 10.3
12	動物園東①	-0.6	5.6	-6.2 ～ 5.0
13	補助突堤②北	-1.2	9.5	-10.7 ～ 8.3
14	補助突堤①北	-0.8	8.5	-9.3 ～ 7.7
15	突堤北	1.3	12.7	-11.4 ～ 14.0
16	県管理区間	-0.5	21.7	-22.1 ～ 21.2
	宮崎港※	25.4	54.6	-29.2 ～ 79.9

毎年度の予測計算結果により変化する

堆積傾向　侵食傾向

No.1～8ブロックの振れ幅(標準偏差)は、直轄事業前の測量データが十分ではないため、No.9～17の各ブロックの単位沿岸距離当たりの標準偏差の平均値(0.019万m3/年/m)にブロック延長をかけて設定

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年は、範囲外の土砂量変化は確認されなかった。
- 複数ブロックで汀線予測計算と逆の変化傾向が確認された。宮崎海岸北側に位置する大炊田海岸のブロックで侵食傾向、宮崎海岸南側に位置する動物園東①～補助突堤②北のブロックが堆積傾向となっているのが特徴として挙げられる。

表－ 3.16　ブロック区分毎の土砂量変化に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2016(H28)	宮崎港～小丸川までの区間	2016(H28)年 12 月	下表参照

表－ 3.17　土砂量変化に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

（単位：万m^3/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2016年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		土量変化予測値 (2016. 12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
1	小丸川～一ツ瀬川	-2. 2	136. 8	-139. 0 ～ 134. 6	22. 3	傾向逆転	範囲内
2	一ッ瀬川左岸	0. 2	29. 7	-29. 5 ～ 29. 9	15. 4	無し	範囲内
3	一ッ瀬川右岸	-0. 6	7. 2	-7. 8 ～ 6. 7	-4. 0	無し	範囲内
4	二ツ立海岸	-0. 5	14. 9	-15. 4 ～ 14. 3	-10. 6	無し	範囲内
5	大炊田海岸③	1. 0	3. 7	-2. 7 ～ 4. 7	-0. 7	傾向逆転	範囲内
6	大炊田海岸②	0. 3	7. 4	-7. 2 ～ 7. 7	-4. 9	傾向逆転	範囲内
7	大炊田海岸①	0. 0	3. 7	-3. 7 ～ 3. 7	-0. 7	傾向逆転	範囲内
8	石崎川	0. 4	10. 9	-10. 5 ～ 11. 3	-9. 3	傾向逆転	範囲内
9	石崎浜②	-0. 5	1. 8	-2. 3 ～ 1. 3	-1. 3	無し	範囲内
10	石崎浜①	-1. 2	10. 5	-11. 7 ～ 9. 3	-10. 3	無し	範囲内
11	動物園東②	-0. 6	10. 4	-11. 0 ～ 9. 8	-0. 3	無し	範囲内
12	動物園東①	-0. 8	5. 6	-6. 4 ～ 4. 8	4. 1	傾向逆転	範囲内
13	補助突堤②北	0. 0	9. 5	-9. 6 ～ 9. 5	3. 1	傾向逆転	範囲内
14	補助突堤①北	1. 3	8. 5	-7. 2 ～ 9. 8	-1. 5	傾向逆転	範囲内
15	突堤北	-2. 6	12. 7	-15. 3 ～ 10. 1	-0. 9	無し	範囲内
16	県管理区間	-1. 4	21. 7	-23. 1 ～ 20. 3	-12. 0	無し	範囲内
	宮崎港※	17. 7	54. 6	-36. 9 ～ 72. 2	5. 5	無し	範囲内

堆積傾向　侵食傾向

（※宮崎港は2016. 2～2017. 2）

No.1～8ブロックの振れ幅(標準偏差)は、直轄事業前の測量データが十分ではないため、No.9～17の各ブロックの単位沿岸距離当たりの標準偏差の平均値(0.019万m3/年/m)にブロック延長をかけて設定

≪参考：2015(H27)年度の土砂量変化≫

- No.6,7,9,10（大炊田海岸①,②、石崎浜①,②）で範囲外↑、宮崎港で範囲外↓の土砂量変化が確認された。
- 複数ブロックで汀線予測計算と逆の変化傾向が確認された。特に、No.2 一ツ瀬川左岸ブロックや、宮崎港など平年では堆積傾向のブロックで侵食傾向となっているのが特徴として挙げられる。

表－ 3.16　ブロック区分毎の土砂量変化に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2015(H27)	宮崎港～小丸川までの区間	2015(H27)年 12 月	下表参照

表－ 3.17　土砂量変化に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

（単位：万m^3/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2015年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		土量変化予測値 (2015.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
1	小丸川～一ツ瀬川	-2.2	136.8	-139.0 ～ 134.6	-11.9	無し	範囲内
2	一ッ瀬川左岸	0.4	29.7	-29.3 ～ 30.1	-22.2	傾向逆転	範囲内
3	一ッ瀬川右岸	-0.5	7.2	-7.8 ～ 6.7	2.1	傾向逆転	範囲内
4	二ツ立海岸	-0.6	14.9	-15.4 ～ 14.3	10.5	傾向逆転	範囲内
5	大炊田海岸③	0.0	3.7	-3.7 ～ 3.7	-1.1	無し	範囲内
6	大炊田海岸②	-0.3	7.4	-7.7 ～ 7.2	15.0	傾向逆転	範囲外↑
7	大炊田海岸①	-0.8	3.7	-4.5 ～ 2.9	14.5	傾向逆転	範囲外↑
8	石崎川	0.1	10.9	-10.8 ～ 11.0	4.4	無し	範囲内
9	石崎浜②	-0.4	1.8	-2.2 ～ 1.4	4.5	傾向逆転	範囲外↑
10	石崎浜①	-1.3	10.5	-11.8 ～ 9.2	13.0	傾向逆転	範囲外↑
11	動物園東②	-0.6	10.4	-11.0 ～ 9.8	-1.5	無し	範囲内
12	動物園東①	-0.8	5.6	-6.4 ～ 4.8	-2.6	無し	範囲内
13	補助突堤②北	-0.1	9.5	-9.6 ～ 9.4	3.8	傾向逆転	範囲内
14	補助突堤①北	-0.6	8.5	-9.1 ～ 7.9	6.6	傾向逆転	範囲内
15	突堤北	0.2	12.7	-12.5 ～ 12.9	-5.0	傾向逆転	範囲内
16	県管理区間	-1.5	21.7	-23.2 ～ 20.2	15.4	傾向逆転	範囲内
	宮崎港※	17.5	54.6	-37.1 ～ 72.0	-37.1	傾向逆転	範囲外↓

堆積傾向　侵食傾向

（※宮崎港は2015.1～2016.2）

No.1～8ブロックの振れ幅(標準偏差)は、直轄事業前の測量データが十分ではないため、No.9～17の各ブロックの単位沿岸距離当たりの標準偏差の平均値(0.019万m3/年/m)にブロック延長をかけて設定

≪参考：2014(H26)年度の土砂量変化≫

- 複数ブロックで範囲外となる土砂量変化が確認された。このうち、No.9（石崎浜②）ブロックは、範囲外↓の土砂量変化が確認された。
- 複数ブロックで汀線予測計算と逆の変化傾向が確認された。特に No.6～8（大炊田海岸②～石崎川）ブロックでは侵食傾向であった。なお、その北側に位置する No.3（一ツ瀬川右岸）ブロックは、堆積傾向かつ範囲外↑であった。

表－ 3.18　ブロック区分毎の土砂量変化に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2014(H26)	宮崎港～小丸川までの区間	2014(H26)年 12 月	下表参照

表－ 3.19　土砂量変化に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

（単位：万m^3/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2014年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		土量変化予測値 (2014.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
1	小丸川～一ツ瀬川	-2.4	136.8	-139.2 ～ 134.4	61.7	傾向逆転	範囲内
2	一ッ瀬川左岸	0.8	29.7	-28.9 ～ 30.5	12.7	無し	範囲内
3	一ッ瀬川右岸	-0.7	7.2	-7.9 ～ 6.5	17.0	傾向逆転	範囲外↑
4	二ツ立海岸	-0.1	14.9	-15.0 ～ 14.7	10.2	傾向逆転	範囲内
5	大炊田海岸③	0.1	3.7	-3.6 ～ 3.8	1.4	無し	範囲内
6	大炊田海岸②	0.1	7.4	-7.3 ～ 7.5	-0.3	傾向逆転	範囲内
7	大炊田海岸①	0.3	3.7	-3.4 ～ 4.0	-2.6	傾向逆転	範囲内
8	石崎川	0.1	10.9	-10.8 ～ 11.0	-0.8	傾向逆転	範囲内
9	石崎浜②	-0.1	1.8	-1.9 ～ 1.7	-2.6	無し	範囲外↓
10	石崎浜①	-0.8	10.5	-11.3 ～ 9.7	-1.6	無し	範囲内
11	動物園東②	-0.1	10.4	-10.5 ～ 10.3	-8.1	無し	範囲内
12	動物園東①	-0.3	5.6	-5.9 ～ 5.3	-2.6	無し	範囲内
13	補助突堤②北	-0.5	9.5	-10.0 ～ 9.0	-9.9	無し	範囲内
14	補助突堤①北	-0.7	8.5	-9.2 ～ 7.8	-1.4	無し	範囲内
15	突堤北	0.3	12.7	-12.4 ～ 12.9	-5.1	傾向逆転	範囲内
16	県管理区間	-0.9	21.7	-22.5 ～ 20.8	-7.0	無し	範囲内
	宮崎港※	22.8	54.6	-31.7 ～ 77.4	20.0	無し	範囲内

堆積傾向　侵食傾向

（※宮崎港は2013.12～2015.1）

No.1～8ブロックの振れ幅(標準偏差)は、直轄事業前の測量データが十分ではないため、No.9～17の各ブロックの単位沿岸距離当たりの標準偏差の平均値(0.019万m3/年/m)にブロック延長をかけて設定

(2) 土砂収支

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 土砂量変化

(B) 現象

- 海岸全体の土砂収支が地形変化予測計算による土砂変化量予測値に合致しているか、侵食・堆積の変化傾向が合致しているかを確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
蓄積した測量データ(5～10年程度)から得られる地形変化量が、既往の土砂変化量の速度より大きい・小さい。

2) 調査位置

- 宮崎港南防波堤～小丸川までの区間とする。

3) 調査時期

- 前年度対策の効果・影響が年間の波浪を受けて均された状態を評価するため、当該年度の対策本格化前(11～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 当該年度に実施された測量より、土砂収支区分毎の土砂変化量を整理し、指標範囲と比較する。

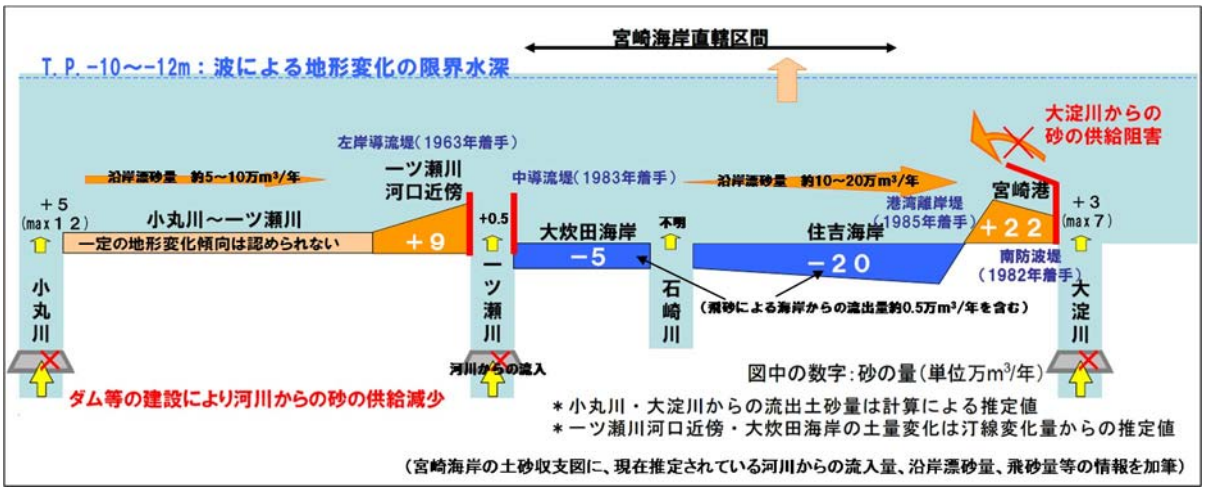

図－ 3.5 現在推定している宮崎海岸を含む一連の海岸の土砂収支

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは予測値±振れ幅とする。
- 土砂収支区分毎の土砂量変化の予測値は、それまでに実施した対策の実施状況を計算条件とした地形変化予測計算を用いて算定する。分析する年の土砂収支区分毎の土砂量変化の予測値を地形変化予測計算により算定し、土砂収支区分毎の土砂量変化の予測値として設定する。
- 振れ幅は、測量成果を用いて下記の手順で算定する。

①長期の測量データがある住吉海岸については、直轄海岸事業開始（2008(H20)年 4 月）以前の 1983(S58)年 3 月～2007(H19)年 1 月の冬季の測量データから前回測量時との比較により土砂量変化を算定する。

②算定した土砂量変化より標準偏差を算定し、その標準偏差を土砂収支区分毎の振れ幅として設定する。

③また、小丸川～大炊田海岸については、直轄事業開始前の測量データが十分ではないため、住吉海岸の単位沿岸距離当たりの標準偏差の平均値(0.009 万 m³/年/m)に土砂収支区分の延長を乗じることにより振れ幅を設定する。

- なお、振れ幅は表－ 3.22 を用いるが、土砂量変化の予測値は年度毎に変化するため、指標に設定する変動範囲（予測値±振れ幅）は年度毎に変化することになる。

表－ 3.22　土砂収支に関する指標範囲及び振れ幅

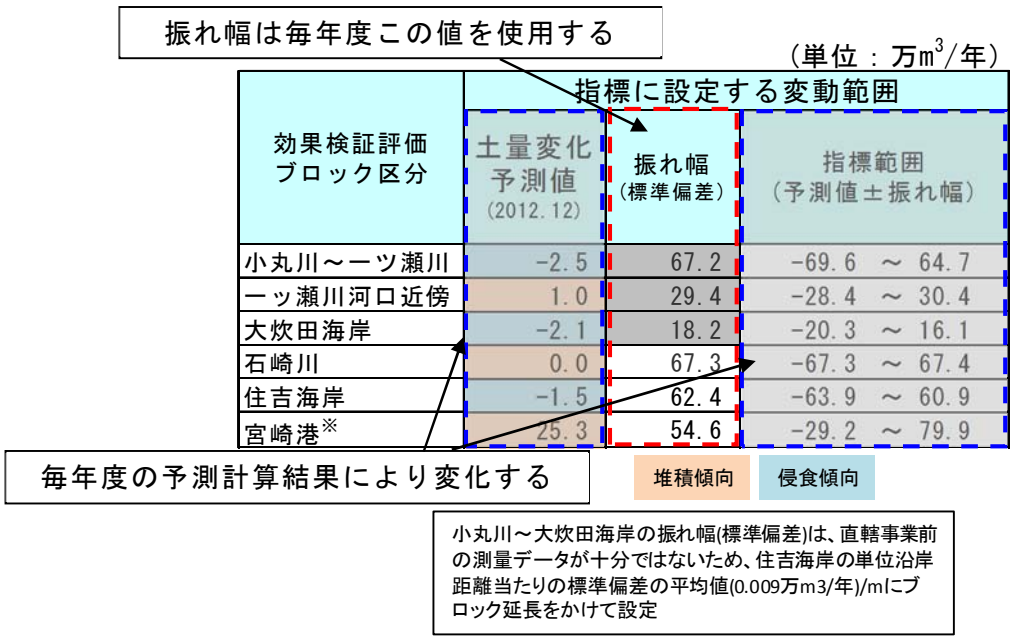

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年は、範囲外の土砂量変化は確認されなかった。
- 複数ブロックで汀線予測計算と逆の変化傾向が確認された。

表－ 3.23　土砂収支に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2016(H28)	宮崎港～小丸川までの区間	2016(H28)年 12 月	下表参照

表－ 3.24　土砂収支に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

（単位：万m^3/年）

効果検証評価ブロック区分	指標に設定する変動範囲			検証対象 2016年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
	土量変化予測値 (2016. 12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
小丸川～一ツ瀬川	-2. 2	67. 2	-69. 3 ～ 65. 0	22. 3	傾向逆転	範囲内
一ッ瀬川河口近傍	0. 2	29. 4	-29. 2 ～ 29. 7	0. 9	無し	範囲内
大炊田海岸	0. 2	18. 2	-18. 0 ～ 18. 4	-6. 4	傾向逆転	範囲内
石崎川	0. 4	67. 3	-67. 0 ～ 67. 7	-9. 3	傾向逆転	範囲内
住吉海岸	-5. 7	62. 4	-68. 1 ～ 56. 7	-19. 0	無し	範囲内
宮崎港※	17. 7	54. 6	-36. 9 ～ 72. 2	5. 5	無し	範囲内

（※宮崎港は2016. 2～2017. 2）

堆積傾向　侵食傾向

小丸川～大炊田海岸の振れ幅(標準偏差)は、直轄事業前の測量データが十分ではないため、住吉海岸の単位沿岸距離当たりの標準偏差の平均値(0.009万m3/年)/mにブロック延長をかけて設定



≪参考：2015(H27)年度の土砂量変化(土砂収支)≫

- 大炊田海岸で範囲外↑、宮崎港で範囲外↓の土砂量変化が確認された。
- 一ツ瀬川～宮崎港の範囲全体で予測計算と逆の変化傾向が確認された。

表－ 3.23　土砂収支に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2015(H27)	宮崎港～小丸川までの区間	2015(H27)年 12 月	下表参照

表－ 3.24　土砂収支に関する指標範囲との比較結果(ブロック毎)

(単位：万m^3/年)

効果検証評価ブロック区分	指標に設定する変動範囲			検証対象 2015年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
	土量変化予測値 (2015.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
小丸川～一ツ瀬川	-2.2	67.2	-69.4 ～ 64.9	-11.9	無し	範囲内
一ッ瀬川河口近傍	0.4	29.4	-29.1 ～ 29.8	-9.7	傾向逆転	範囲内
大炊田海岸	-2.2	18.2	-20.4 ～ 16.0	28.4	傾向逆転	範囲外↑
石崎川	0.1	67.3	-67.3 ～ 67.4	4.4	無し	範囲内
住吉海岸	-5.1	62.4	-67.5 ～ 57.3	34.3	傾向逆転	範囲内
宮崎港※	17.5	54.6	-37.1 ～ 72.0	-37.1	傾向逆転	範囲外↓

(※宮崎港は2015.1～2016.2)

堆積傾向　侵食傾向

小丸川～大炊田海岸の振れ幅(標準偏差)は、直轄事業前の測量データが十分ではないため、住吉海岸の単位沿岸距離当たりの標準偏差の平均値(0.009万m3/年)/mにブロック延長をかけて設定



≪参考：2014(H26)年度の土砂量変化(土砂収支)≫

- 一ツ瀬川河口近傍ブロックで範囲外↑の土砂量変化が確認された。
- 小丸川～一ツ瀬川ブロック及び石崎川ブロックで予測計算と逆の変化傾向が確認された。

表－ 3.25　土砂収支に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2014(H26)	宮崎港～小丸川までの区間	2014(H26)年 12 月	下表参照

表－ 3.26　土砂収支に関する指標範囲との比較結果(ブロック毎)

(単位：万m^3/年)

効果検証評価ブロック区分	指標に設定する変動範囲			検証対象 2014年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
	土量変化予測値 (2014.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
小丸川～一ツ瀬川	-2.4	67.2	-69.6 ～ 64.7	61.7	傾向逆転	範囲内
一ッ瀬川河口近傍	0.9	29.4	-28.6 ～ 30.3	39.9	無し	範囲外↑
大炊田海岸	-1.0	18.2	-19.2 ～ 17.2	-1.5	無し	範囲内
石崎川	0.1	67.3	-67.2 ～ 67.4	-0.8	傾向逆転	範囲内
住吉海岸	-1.7	62.4	-64.1 ～ 60.7	-38.3	無し	範囲内
宮崎港※	23.3	54.6	-31.3 ～ 77.8	20.0	無し	範囲内

堆積傾向　侵食傾向

(※宮崎港は2013.12～2015.1)

小丸川～大炊田海岸の振れ幅(標準偏差)は、直轄事業前の測量データが十分ではないため、住吉海岸の単位沿岸距離当たりの標準偏差の平均値(0.009万m3/年)/mにブロック延長をかけて設定



3.1.4 波による地形変化の限界水深

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 海抜(T.P.)-10～-12m より深い場所の地形変化

(B) 現象

- 波による地形変化の限界水深（海抜(T.P.)-10～-12m）より深い場所の地形変化が既往の調査結果より大きくなっていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
水深T.P.−10～−12mより深い場所の地形変化が、既往の調査結果より大きい。

2) 調査位置

- 計画上の移動限界水深よりも沖側の調査が必要となるため、海抜(T.P.)-10～-12m よりも深い場所での代表地点を調査位置とする。

3) 調査時期

- 前年度対策の効果・影響が年間の波浪を受けて均された状態を評価するため、当該年度の対策本格化前(11～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 直轄海岸事業以降及び当該年度に実施された測量データによる海抜(T.P.)-10m よりも深い場所の水深方向の標準偏差を整理し、指標範囲と比較する。
- 指標範囲を越える変化が確認された場合は沖合流出土砂調査の実施を検討する。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、直轄海岸事業開始（2008(H20)年 4 月）以前の 1982(S57)年 9 月～2008(H20)年 1 月までの 32 時期の測線 No.-41～No.O19 の測量成果を用いて水深方向の標準偏差分布を作成し、海抜(T.P.)-10m 以深の標準偏差を抽出する。その結果より、海抜（T.P.)-10m 以深の地盤高変化の標準偏差の平均値 0.17m 以下を指標に設定する変動範囲とする。

表－ 3.29　波による地形変化の限界水深に関する指標範囲

期間	調査位置	調査実施状況	指標範囲 (基準値)
1982(S57)～ 2008(H20) （26 年間）	No.-41～O19 T.P.-10m 以深	32 時期	0.17m

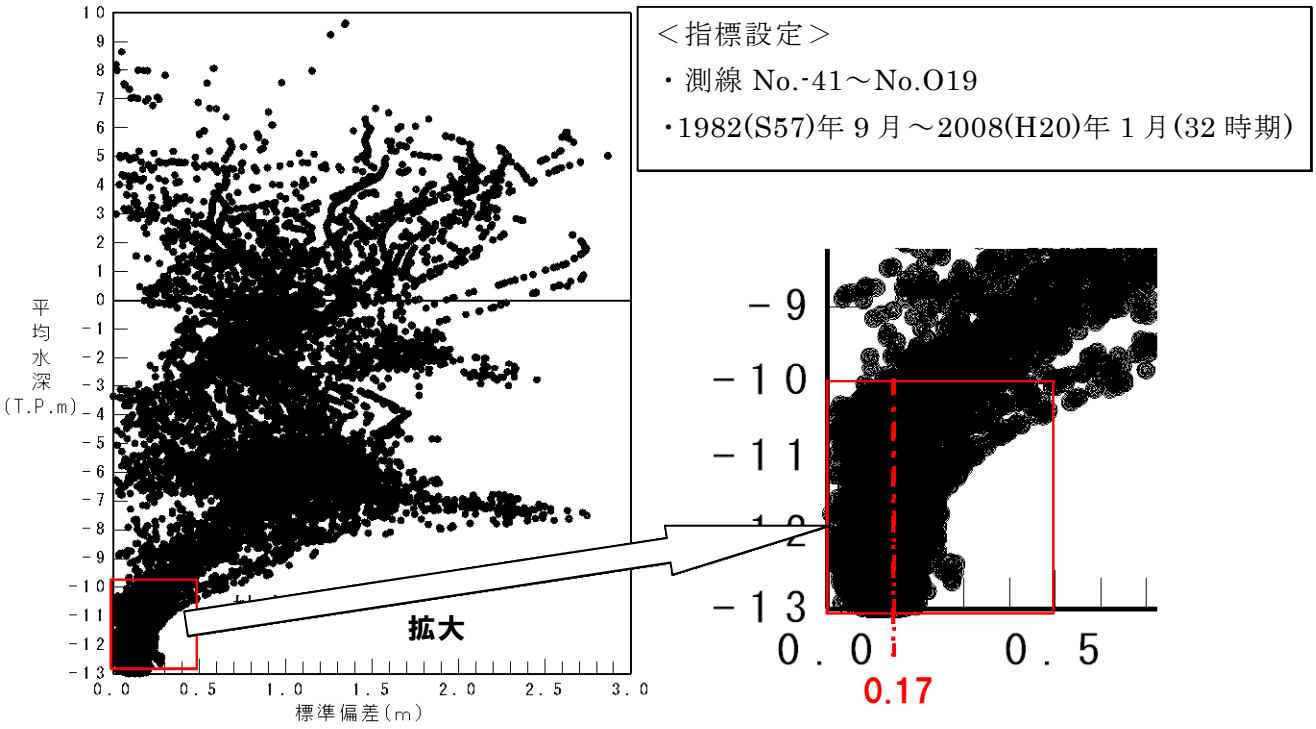

図－ 3.6　地形変化の標準偏差の水深方向分布



図－ 3.7　波による地形変化の限界水深の解析範囲

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 直轄海岸事業以降及び 2016(H28)年度ともに、範囲内であった。

表－ 3.30 波による地形変化の限界水深に関する指標範囲との比較結果

期間	調査位置	調査実施状況	地盤高変化の標準偏差	調査結果と指標範囲の比較結果
指標 1982(S57)～ 2008(H20) （26 年間）	No.-41～O19 T.P.-10m 以深	32 時期	0.17m （指標範囲(基準値)）	
2008(H20)～ (直轄化以降)	No.-41～ No.O19 T.P.-10m 以深	24 時期	0.08m	範囲内
2016(H28)		3 時期 (2015.12,2016.6,12)	0.07m	範囲内

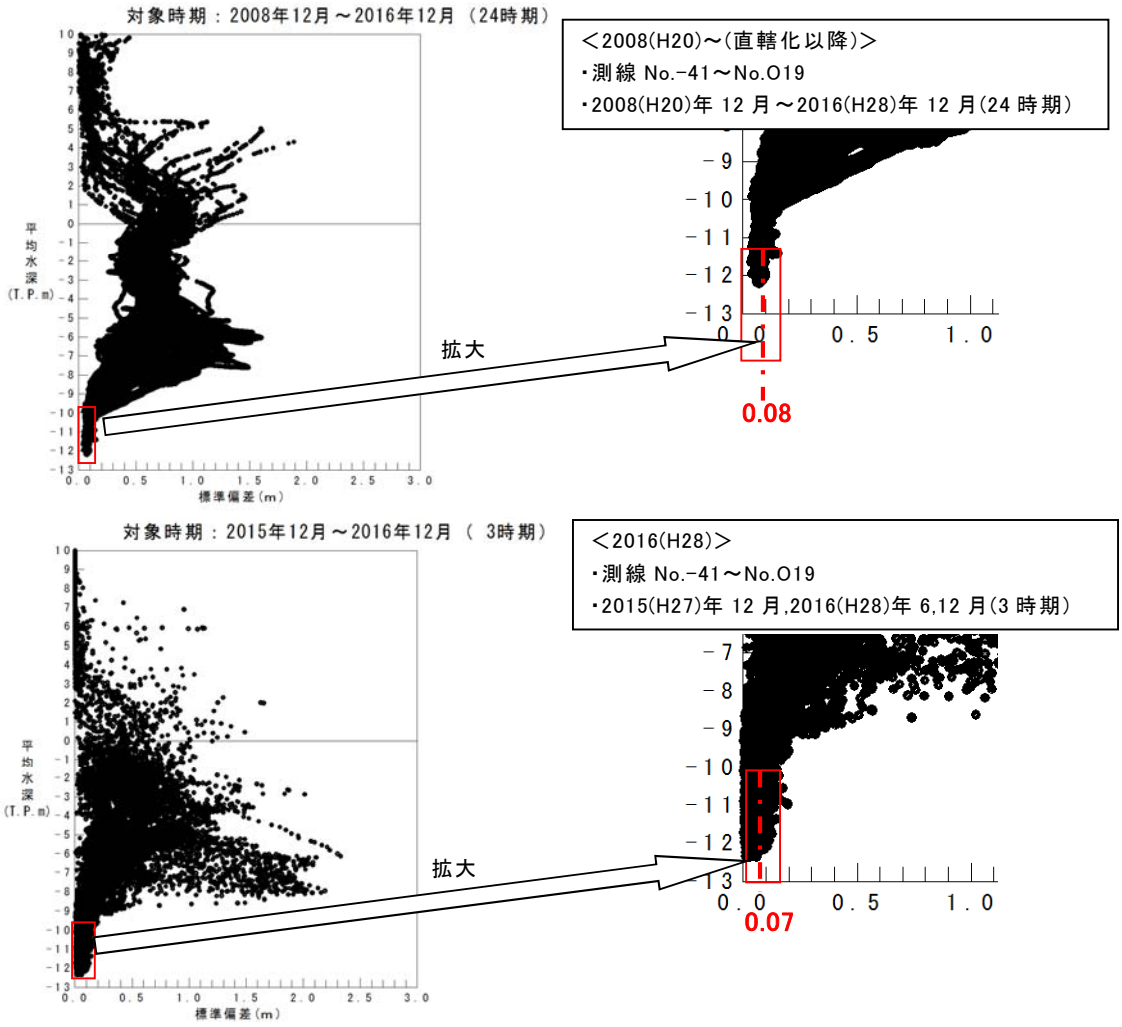

図－ 3.8 地形変化の標準偏差

≪参考：2015(H27)年度の波による地形変化の限界水深≫

- 直轄海岸事業以降及び2015(H27)年度ともに、範囲内であった。

表－ 3.32　波による地形変化の限界水深に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	地盤高変化の標準偏差	調査結果と指標範囲の比較結果
2008(H20)～(直轄化以降)	No.-41～No.O19 T.P.-10m 以深	22 時期	0.08m	範囲内
2015(H27)		3 時期 (2014.12,2015.6,12)	0.05m	範囲内

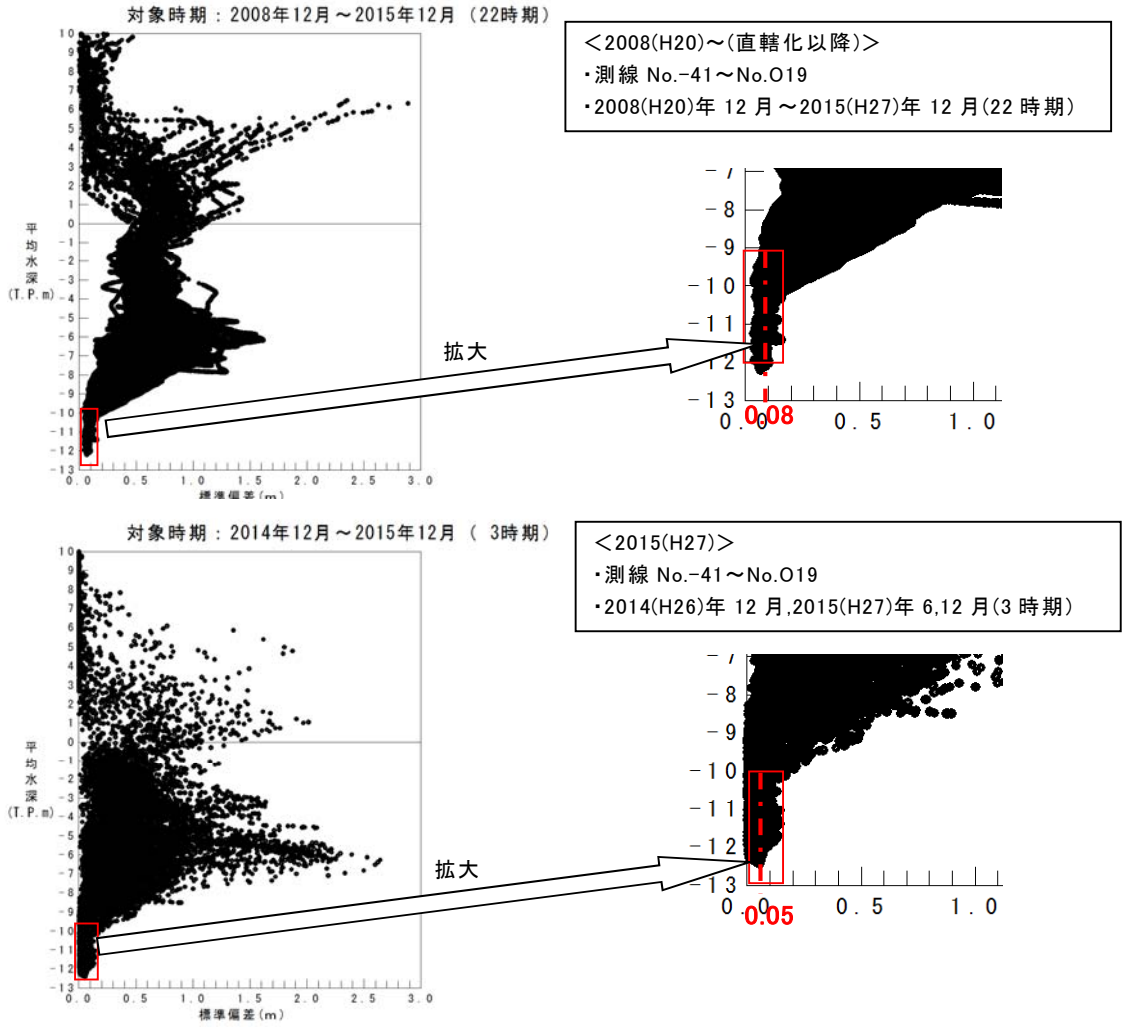

図－ 3.9　地形変化の標準偏差

≪参考：2014(H26)年度の波による地形変化の限界水深≫

- 直轄海岸事業以降及び2014(H26)年度ともに、範囲内であった。

表－ 3.31　波による地形変化の限界水深に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	地盤高変化の標準偏差	調査結果と指標範囲の比較結果
2008(H20)～(直轄化以降)	No.-41～No.O19 T.P.-10m 以深	20 時期	0.08m	範囲内
2014(H26)		3 時期 (2013.12,2014.6,12)	0.05m	範囲内

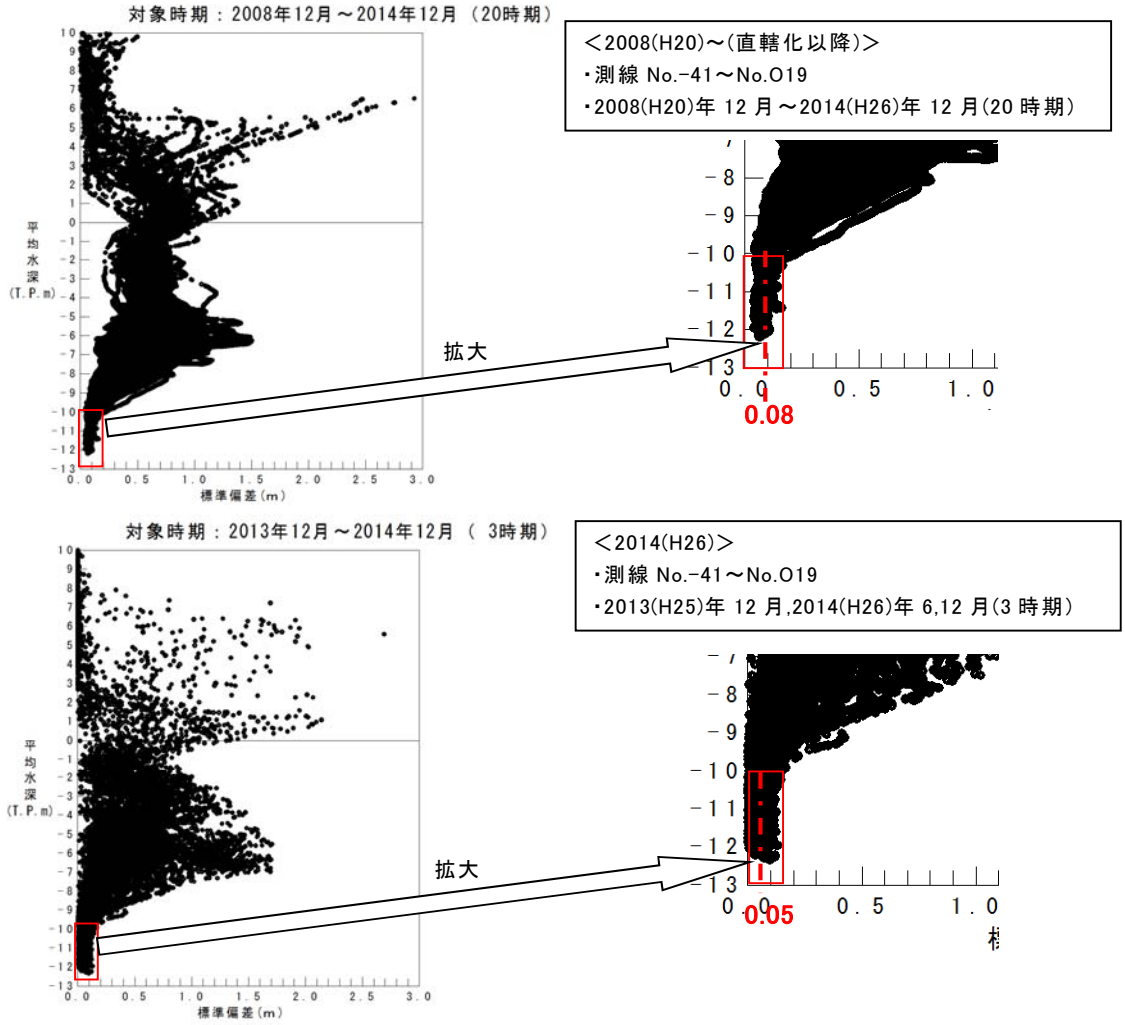

図－ 3.10　地形変化の標準偏差

3.1.5 浜崖形状の変化

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 浜崖形状の変化

(B) 現象

- 浜崖面の位置が後退していないか、浜崖頂部高さが低下していないかを確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
浜崖が後退する。浜崖頂部高さが低下する。

2) 調査位置

- 宮崎港港湾離岸堤区域～二ツ立海岸までの区間のうち自然海浜区間(大炊田①②, 動物園東①②）とする。1km 程度のブロックに区分したブロック毎に解析する。

3) 調査時期

- 前年度対策の効果・影響が年間の高波浪を受けた後の状態を評価するため、当該年度の対策本格化前(11～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 当該年度に実施された測量を用いて基準時期(2008.12)及び前年より浜崖位置(海抜(T.P.)+5m 等深線の位置)の後退が生じていないか、浜崖頂部高に低下が生じていないかを整理し、指標範囲と比較する。

5) 指標範囲の設定

- 指標タイプは定性評価とする。
- 浜崖後退の指標範囲は“後退しないこと”とする。
- 浜崖頂部高さの変化に対する指標範囲は“低下しないこと”とする。

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 大炊田海岸は、基準時期(2008.12)との比較では浜崖位置の後退及び浜崖頂部高の低下ともに範囲外↓であるが、前年との比較ではいずれも範囲内（後退・低下なし）であった。
- 動物園東は、浜崖位置の後退は、基準時期(2008.12)との比較では範囲外↓であるが、前年との比較では範囲内（後退なし）であった。浜崖頂部高の低下は、基準時期(2008.12)及び前年との比較ともに範囲外↓であった。

表－ 3.33　浜崖形状の変化に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果		
			比較時期	2008.12	前年
2016(H28)	大炊田海岸	2016(H28)年 6,12 月	浜崖位置	範囲外↓ (後退)	範囲内
			浜崖頂部高	範囲外↓ (低下)	範囲内
	動物園東		浜崖位置	範囲外↓ (後退)	範囲内
			浜崖頂部高	範囲外↓ (低下)	範囲外↓ (低下)

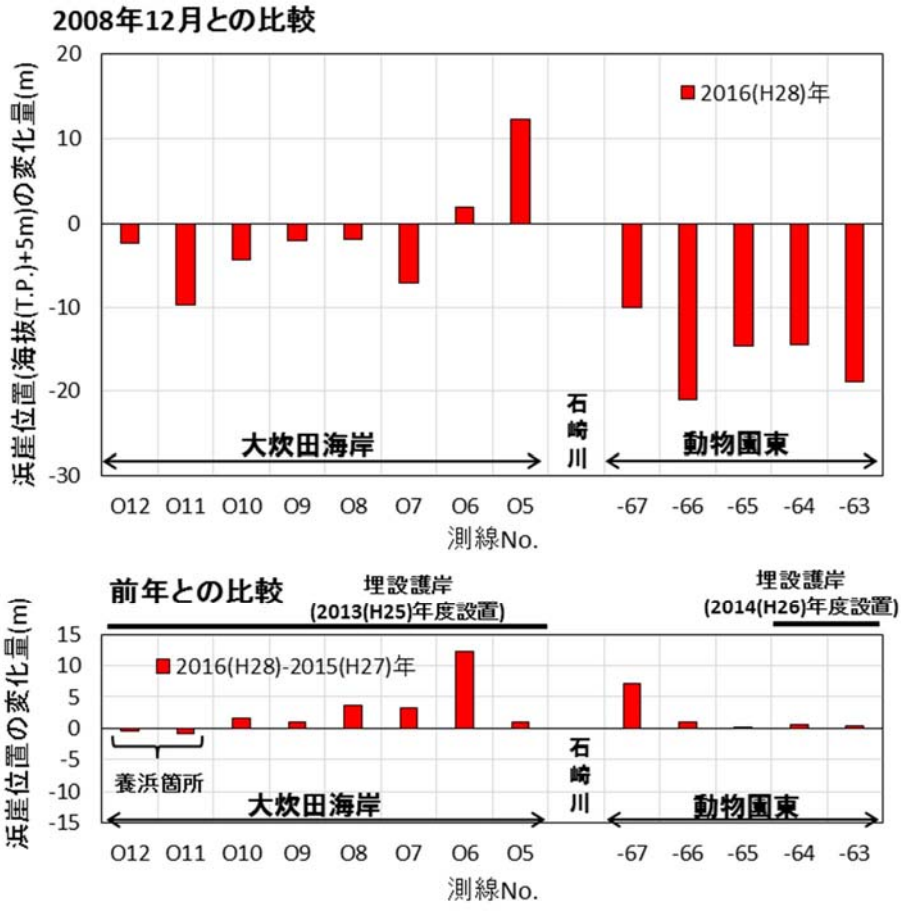

図－ 3.11　浜崖位置(海抜(T.P.)+5m)の変化状況

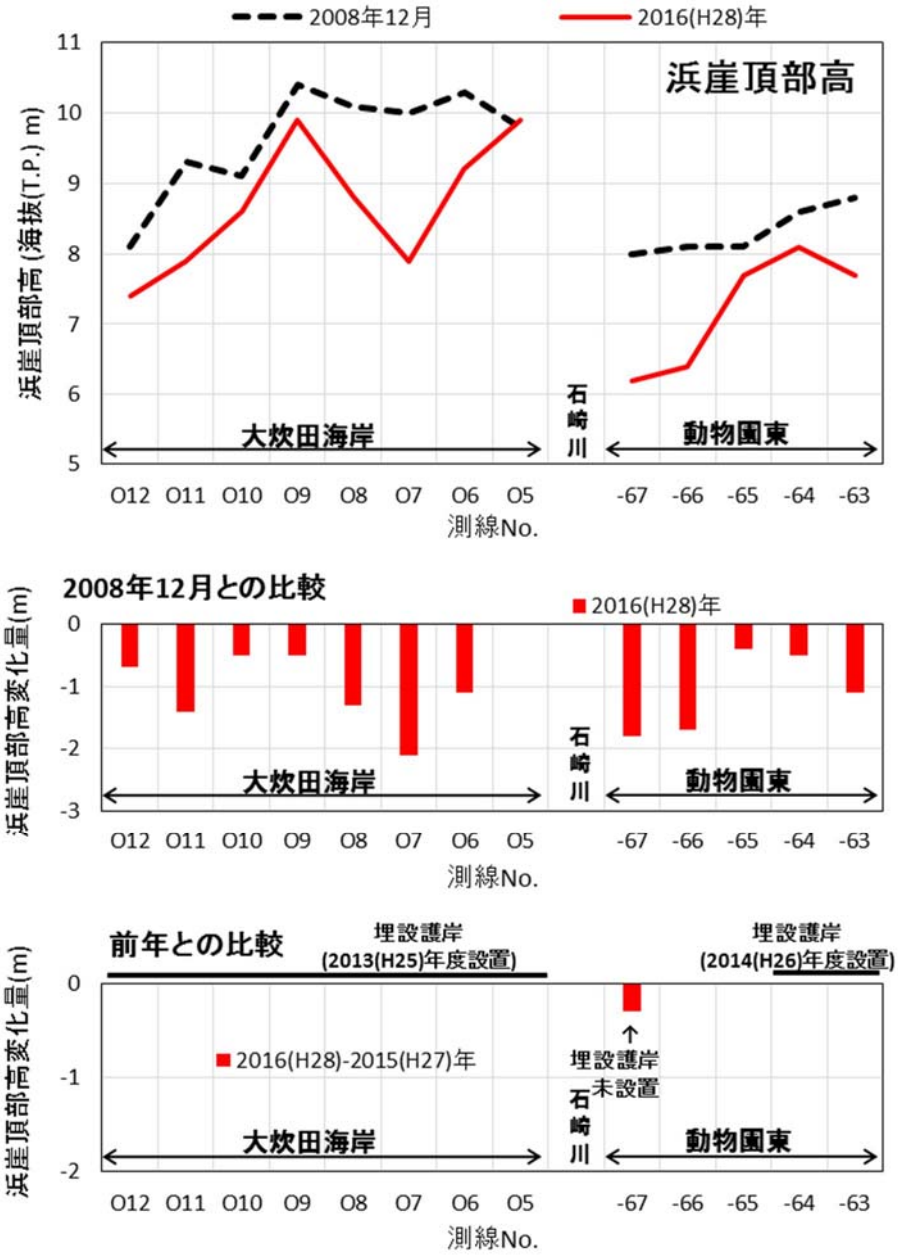

図－ 3.12　浜崖頂部高の変化

≪参考：2015(H27)年度の浜崖形状の変化≫

- 大炊田海岸は、基準時期(2008.12)との比較では、浜崖位置の後退及び浜崖頂部高の低下ともに範囲外↓であるが、前年との比較では範囲内（後退・低下なし）であった。
- 動物園東は、基準時期(2008.12)及び前年との比較ともに浜崖位置の後退及び浜崖頂部高の低下の範囲外↓であった。

表－ 3.35　浜崖形状の変化に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果		
			比較時期	2008.12	前年
2015(H27)	大炊田海岸	2015(H27)年 6,12 月	浜崖位置	範囲外↓ (後退)	範囲内
			浜崖頂部高	範囲外↓ (低下)	範囲内
	動物園東		浜崖位置	範囲外↓ (後退)	範囲外↓ (後退)
			浜崖頂部高	範囲外↓ (低下)	範囲外↓ (低下)

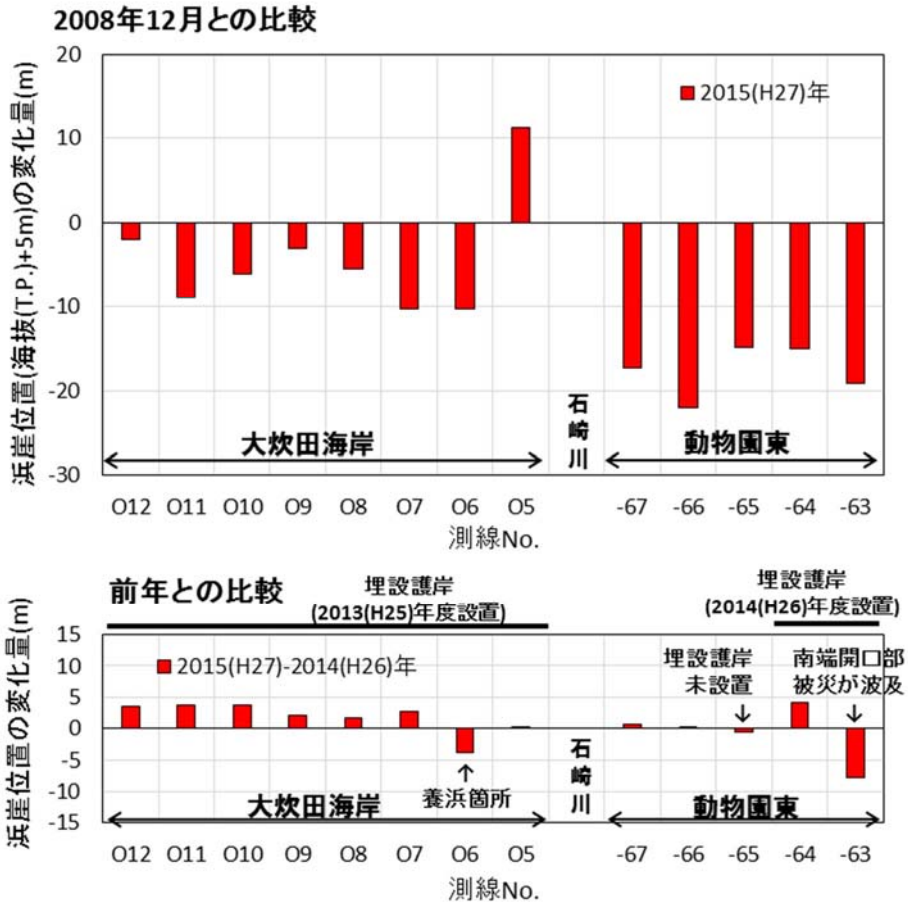

図－ 3.13　浜崖位置(海抜(T.P.)+5m)の変化状況

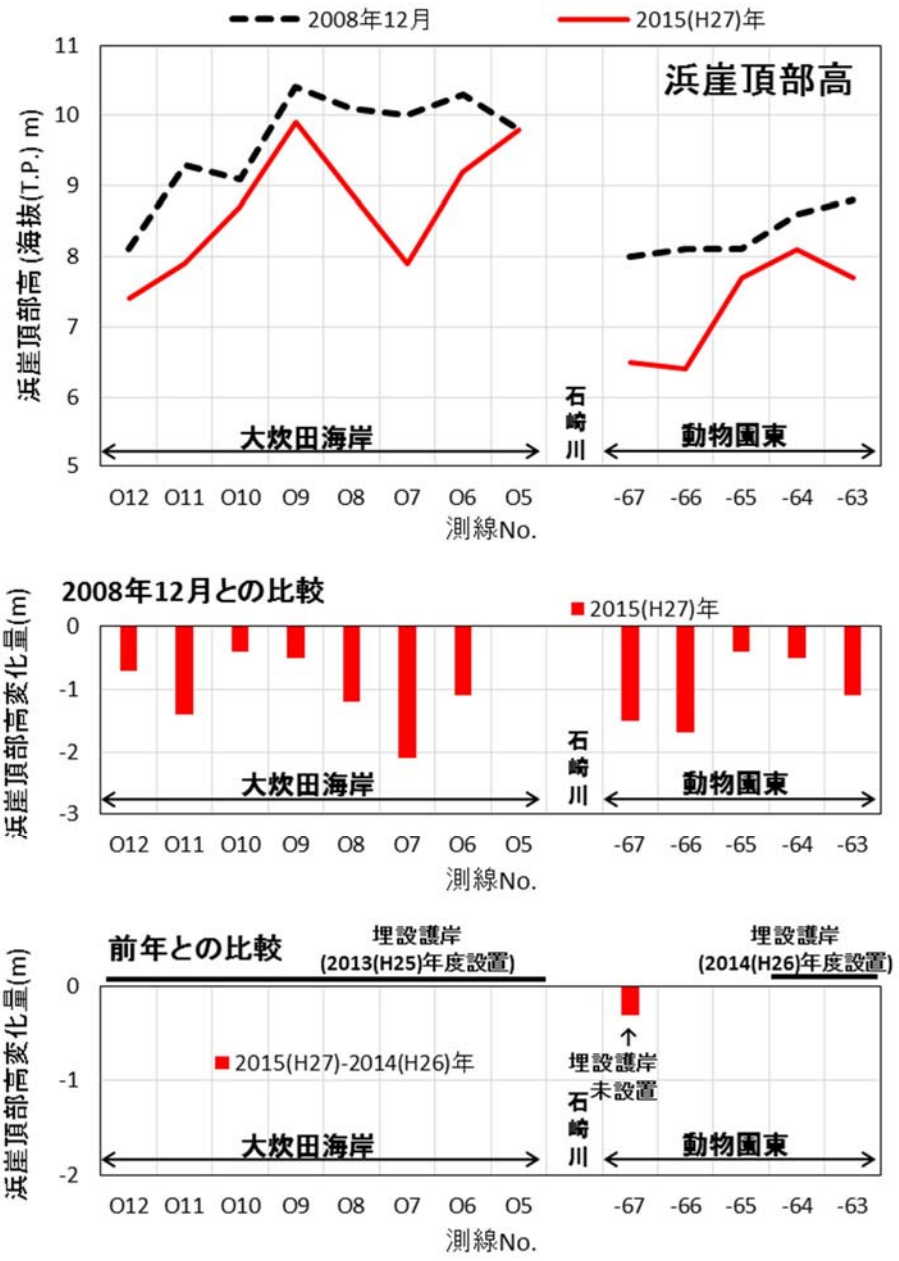

図－ 3.14　浜崖頂部高の変化

≪参考：2014(H26)年度の浜崖形状の変化≫

- 大炊田海岸は、基準時期(2008.12)との比較では、浜崖位置の後退及び浜崖頂部高の低下ともに範囲外↓であるが、前年との比較では範囲内（後退・低下なし）であった。
- 動物園東は、基準時期(2008.12)及び前年との比較ともに浜崖位置の後退及び浜崖頂部高の低下の範囲外↓であった。

表－ 3.34　浜崖形状の変化に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果		
			比較時期	2008.12	前年
2014(H26)	大炊田海岸	2014(H26)年 6,12 月	浜崖位置	範囲外↓ (後退)	範囲内
			浜崖頂部高	範囲外↓ (低下)	範囲内
	動物園東		浜崖位置	範囲外↓ (後退)	範囲外↓ (低下)
			浜崖頂部高	範囲外↓ (低下)	範囲外↓ (低下)

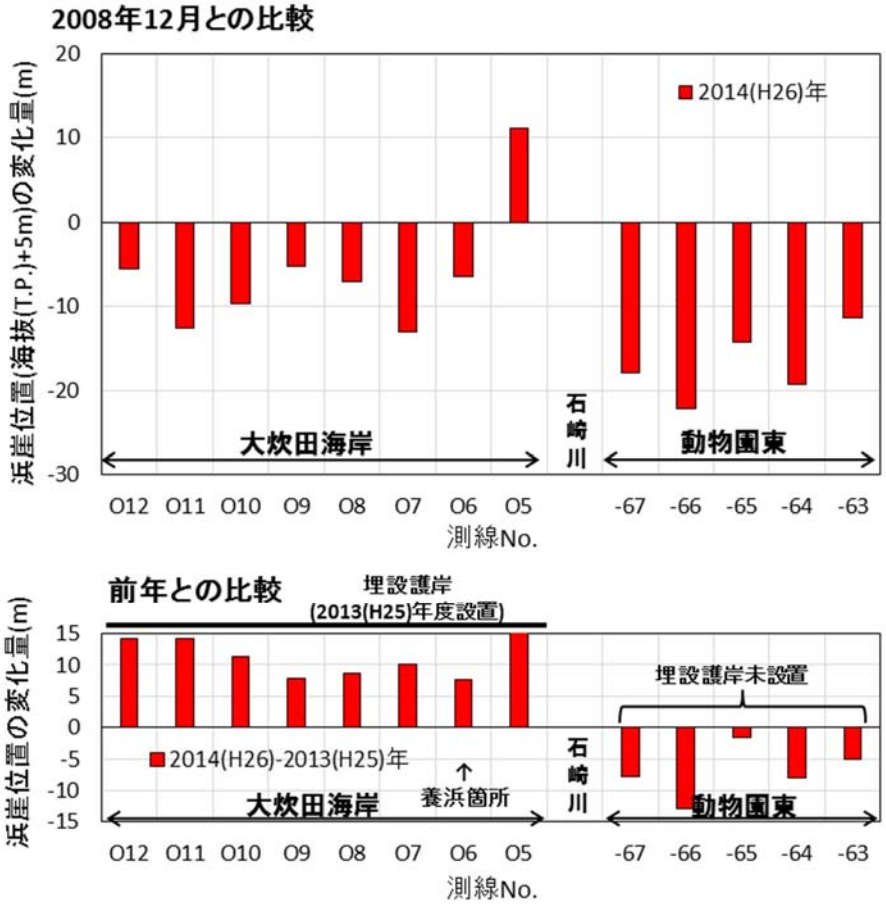

図－ 3.15　浜崖位置(海抜(T.P.)+5m)の変化状況

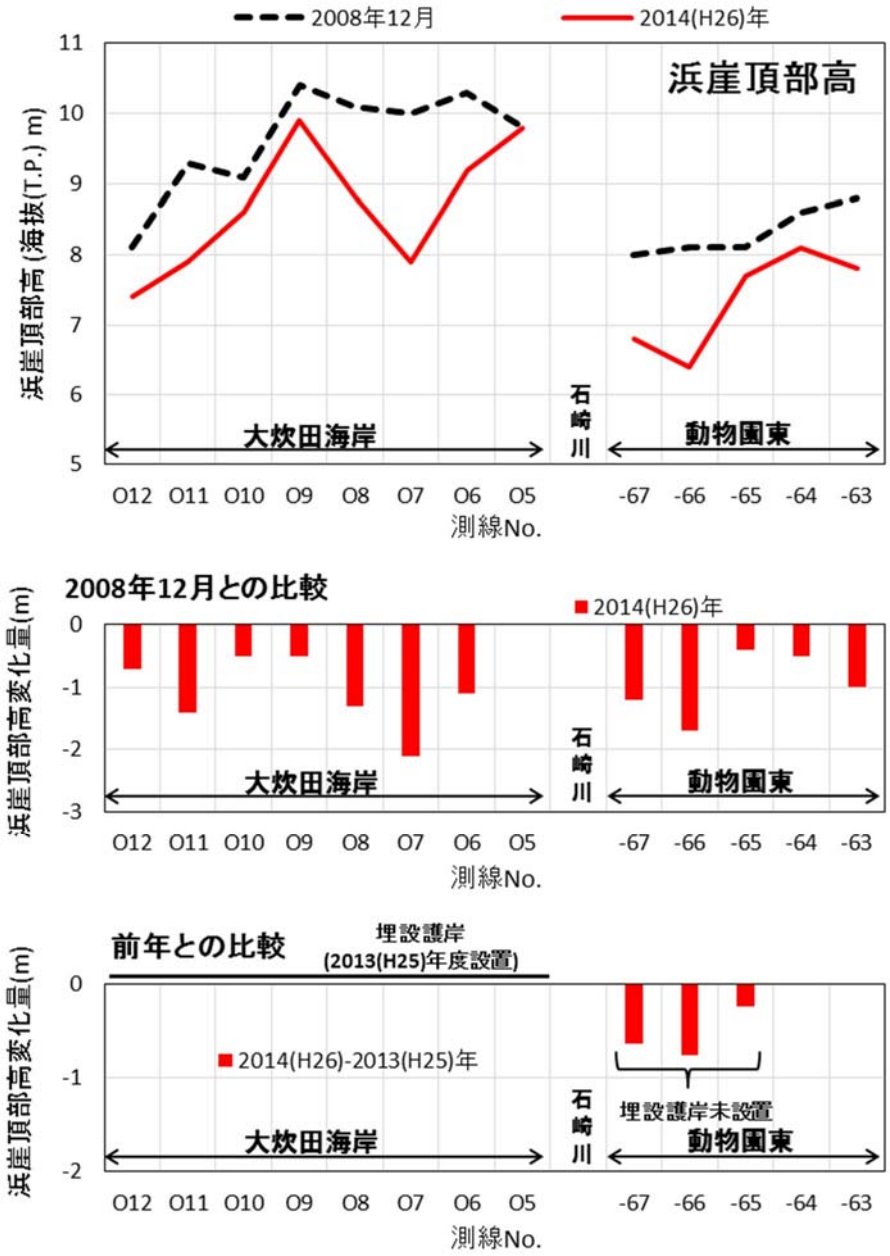

図－ 3.16　浜崖頂部高の変化

3.1.6 前浜勾配

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 前浜断面形状の変化

(B) 現象

- 前浜勾配が既往の調査結果と傾向が変化していないかを確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
前浜勾配が既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 県管理区間～小丸川までの区間とする。
- なお、侵食対策の効果影響が顕著に生じると考えられる県管理区間～一ツ瀬川までの区間については、1km 程度のブロックに区分してブロック毎に解析する。

3) 調査時期

- 前年度対策の効果・影響が年間の波浪を受けて均された状態を評価するため、当該年度の対策本格化前(11～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 既往の測量成果(1983 年 3 月～2011 年 12 月)より、背後地状況等を踏まえて区切ったブロック毎の平均前浜勾配（海抜(T.P.)-1m～+1m）を整理し、指標範囲と比較する。

5)　指標範囲の設定

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、既往の測量成果(1983 年 3 月～2011 年 12 月)を用いてブロック毎の平均前浜勾配（海抜(T.P.)-1m～+1m）とし、その標準偏差をブロック毎の振れ幅として設定する。

表－ 3.36　前浜勾配に関する指標範囲及び振れ幅

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			
		前浜平均勾配 (T.P.-1～+1m)	1/○	振れ幅（標準偏差）	指標範囲（平均値±振れ幅）
1	小丸川～一ツ瀬川	0.04	27	0.01	0.02 ～ 0.05
2	一ッ瀬川左岸	0.03	37	0.01	0.02 ～ 0.04
3	一ッ瀬川右岸	0.03	31	0.02	0.01 ～ 0.05
4	二ツ立海岸	0.09	11	0.06	0.03 ～ 0.16
5	大炊田海岸③	0.07	15	0.04	0.03 ～ 0.10
6	大炊田海岸②	0.06	17	0.03	0.03 ～ 0.08
7	大炊田海岸①	0.06	16	0.03	0.04 ～ 0.09
8	石崎川	0.06	17	0.02	0.03 ～ 0.08
9	石崎浜②	0.07	14	0.03	0.05 ～ 0.10
10	石崎浜①	0.06	16	0.03	0.03 ～ 0.09
11	動物園東②	0.07	14	0.03	0.04 ～ 0.10
12	動物園東①	0.07	14	0.03	0.04 ～ 0.10
13	補助突堤②北	0.09	12	0.04	0.05 ～ 0.12
14	補助突堤①北	0.13	8	0.08	0.05 ～ 0.20
15	突堤北	0.10	10	0.04	0.06 ～ 0.15
16	県管理区間	0.09	11	0.05	0.04 ～ 0.14

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- No.1～2（小丸川～一ツ瀬川左岸）ブロックで範囲外↑（指標範囲よりも緩勾配）、No.10～15（石崎浜①～突堤北）ブロックで範囲外↓（指標範囲よりも急勾配）の前浜勾配が確認された。

表－ 3.37　前浜勾配に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2016(H28)	県管理区間～小丸川までの区間	2016(H28)年 12 月	下表参照

表－ 3.38　前浜勾配に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲				検証対象 2016年12月		調査結果と指標範囲の比較結果
		前浜平均勾配 (T.P.-1～+1m)	前浜平均勾配 1/○	振れ幅（標準偏差）	指標範囲（平均値±振れ幅）	(T.P.-1～+1m)	1/○	
1	小丸川～一ツ瀬川	0.039	26	0.010	0.029 ～ 0.049	0.027	37	範囲外↑
2	一ツ瀬川左岸	0.030	33	0.003	0.027 ～ 0.033	0.023	43	範囲外↑
3	一ツ瀬川右岸	0.034	30	0.020	0.014 ～ 0.053	0.032	31	範囲内
4	二ツ立海岸	0.094	11	0.062	0.033 ～ 0.156	0.039	26	範囲内
5	大炊田海岸③	0.067	15	0.033	0.033 ～ 0.100	0.043	23	範囲内
6	大炊田海岸②	0.060	17	0.023	0.037 ～ 0.083	0.037	27	範囲内
7	大炊田海岸①	0.063	16	0.025	0.038 ～ 0.087	0.051	20	範囲内
8	石崎川	0.060	17	0.023	0.037 ～ 0.082	0.052	19	範囲内
9	石崎浜②	0.071	14	0.025	0.046 ～ 0.097	0.097	10	範囲内
10	石崎浜①	0.064	16	0.030	0.034 ～ 0.093	0.108	9	範囲外↓
11	動物園東②	0.070	14	0.030	0.040 ～ 0.100	0.122	8	範囲外↓
12	動物園東①	0.070	14	0.029	0.041 ～ 0.100	0.115	9	範囲外↓
13	補助突堤②北	0.086	12	0.035	0.051 ～ 0.122	0.140	7	範囲外↓
14	補助突堤①北	0.126	8	0.076	0.049 ～ 0.202	0.244	4	範囲外↓
15	突堤北	0.104	10	0.044	0.060 ～ 0.147	0.217	5	範囲外↓
16	県管理区間	0.089	11	0.048	0.042 ～ 0.137	0.065	15	範囲内



≪参考：2015(H27)年度の前浜勾配≫

- No.2,9,13（一ツ瀬川左岸、石崎浜②、補助突堤②北）ブロックで、範囲外↓（指標に設定する変動範囲よりも急勾配）の前浜勾配が確認された。

表－ 3.39　前浜勾配に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2015(H27)	県管理区間～小丸川までの区間	2015(H27)年 12 月	下表参照

表－ 3.40　前浜勾配に関する指標範囲との比較結果(ブロック毎)

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲				検証対象 2015年12月		調査結果と指標範囲の比較結果
		前浜平均勾配 (T.P.-1～+1m)	1/○	振れ幅(標準偏差)	指標範囲(平均値±振れ幅)	(T.P.-1～+1m)	1/○	
1	小丸川～一ツ瀬川	0.039	26	0.010	0.029 ～ 0.049	0.031	32	範囲内
2	一ッ瀬川左岸	0.030	33	0.003	0.027 ～ 0.033	0.040	25	範囲外↓
3	一ッ瀬川右岸	0.034	30	0.020	0.014 ～ 0.053	0.024	42	範囲内
4	二ツ立海岸	0.094	11	0.062	0.033 ～ 0.156	0.054	19	範囲内
5	大炊田海岸③	0.067	15	0.033	0.033 ～ 0.100	0.054	19	範囲内
6	大炊田海岸②	0.060	17	0.023	0.037 ～ 0.083	0.037	27	範囲内
7	大炊田海岸①	0.063	16	0.025	0.038 ～ 0.087	0.064	16	範囲内
8	石崎川	0.060	17	0.023	0.037 ～ 0.082	0.049	20	範囲内
9	石崎浜②	0.071	14	0.025	0.046 ～ 0.097	0.102	10	範囲外↓
10	石崎浜①	0.064	16	0.030	0.034 ～ 0.093	0.081	12	範囲内
11	動物園東②	0.070	14	0.030	0.040 ～ 0.100	0.090	11	範囲内
12	動物園東①	0.070	14	0.029	0.041 ～ 0.100	0.074	14	範囲内
13	補助突堤②北	0.086	12	0.035	0.051 ～ 0.122	0.125	8	範囲外↓
14	補助突堤①北	0.126	8	0.076	0.049 ～ 0.202	0.195	5	範囲内
15	突堤北	0.104	10	0.044	0.060 ～ 0.147	0.091	11	範囲内
16	県管理区間	0.089	11	0.048	0.042 ～ 0.137	0.114	9	範囲内



≪参考：2014(H26)年度の前浜勾配≫

- No.7（大炊田海岸①）及びNo.10（石崎浜①）ブロックで、範囲外↓（指標に設定する変動範囲よりも急勾配）の前浜勾配が確認された。

表－ 3.39　前浜勾配に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2014(H26)	県管理区間～小丸川までの区間	2014(H26)年 12 月	下表参照

表－ 3.40　前浜勾配に関する指標範囲との比較結果(ブロック毎)

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲				検証対象 2014年12月		調査結果と指標範囲の比較結果
		前浜平均勾配 (T.P.-1～+1m)	1/○	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (平均値±振れ幅)	(T.P.-1～+1m)	1/○	
1	小丸川～一ツ瀬川	0.04	27	0.01	0.02 ～ 0.05	0.04	25	範囲内
2	一ツ瀬川左岸	0.03	37	0.01	0.02 ～ 0.04	0.03	33	範囲内
3	一ツ瀬川右岸	0.03	31	0.02	0.01 ～ 0.05	0.03	33	範囲内
4	二ツ立海岸	0.09	11	0.06	0.03 ～ 0.16	0.06	17	範囲内
5	大炊田海岸③	0.07	15	0.04	0.03 ～ 0.10	0.08	13	範囲内
6	大炊田海岸②	0.06	17	0.03	0.03 ～ 0.08	0.05	20	範囲内
7	大炊田海岸①	0.06	16	0.03	0.04 ～ 0.09	0.16	6	範囲外↓
8	石崎川	0.06	17	0.02	0.03 ～ 0.08	0.08	13	範囲内
9	石崎浜②	0.07	14	0.03	0.05 ～ 0.10	0.05	20	範囲内
10	石崎浜①	0.06	16	0.03	0.03 ～ 0.09	0.10	10	範囲外↓
11	動物園東②	0.07	14	0.03	0.04 ～ 0.10	0.05	20	範囲内
12	動物園東①	0.07	14	0.03	0.04 ～ 0.10	0.04	25	範囲内
13	補助突堤②北	0.09	12	0.04	0.05 ～ 0.12	0.05	20	範囲内
14	補助突堤①北	0.13	8	0.08	0.05 ～ 0.20	0.09	11	範囲内
15	突堤北	0.10	10	0.04	0.06 ～ 0.15	0.07	14	範囲内
16	県管理区間	0.09	11	0.05	0.04 ～ 0.14	0.10	10	範囲内



3.1.7 等深線の変化

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 等深線の変化

(B) 現象

- 海抜(T.P.)-2m（海中の浅い場所），-5m（バー内側），-8m（バー外側）の等深線について、等深線の変化が地形変化予測計算による等深線予測値に合致しているかを確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
区間平均等深線位置の前進速度が早い・遅い。 ※区間：宮崎港～一ツ瀬川までの範囲を1km程度に区切る。

2) 調査位置

- 宮崎港港湾離岸堤区域～二ツ立海岸までの区間とする。
- なお、侵食対策の効果影響が顕著に生じると考えられる宮崎港港湾離岸堤区域～一ツ瀬川までの区間については、1km 程度のブロックに区分してブロック毎に解析する。

3) 調査時期

- 前年度対策の効果・影響が年間の波浪を受けて均された状態を評価するため、当該年度の対策本格化前(11～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 直轄海岸事業以降及び当該年度に実施された測量より、ブロック毎の平均等深線変化量データ（1 年当りの変化量に換算）を整理し、指標範囲と比較する

5)　指標範囲の設定

- 指標タイプは予測値±振れ幅とする。
- 振れ幅は、測量成果を用いて下記の手順で算定する。

①直轄海岸事業開始（2008(H20)年 4 月）以前の 1983(S58)年 3 月～2007(H19)年 1 月の冬季の測量データから等深線位置を読み取る。
②そのデータを用いて、背後地状況等を踏まえて区切ったブロック毎の平均等深線変化量を算定する。
③長期的な侵食・堆積傾向は振れ幅として考慮しないため、これを除去するために、等深線変化の一様な変化傾向について、回帰直線解析により期待値を算定する。
④③で求めた浜幅の一様な変化傾向を除去した残差データを算定する。
⑤その残差データの標準偏差を算定し、その標準偏差をブロック毎の振れ幅として設定する。

- なお、振れ幅は表－ 3.43 を用いるが、等深線変化の予測値は年度毎に変化するため、指標に設定する変動範囲（予測値±振れ幅）は年度毎に変化することになる。

表－ 3.43　等深線の変化に関する指標範囲及び振れ幅

【T.P.-2m（海中の浅い場所）】

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲		
		等深線【-2m】変化予測値(2012.12)	振れ幅(標準偏差)	指標範囲(予測値±振れ幅)
4	ニツ立海岸	-1.7	86.5	-88.2 ～ 84.7
5	大炊田海岸③	1.1	85.6	-84.5 ～ 86.7
6	大炊田海岸②	2.9	89.4	-86.5 ～ 92.3
7	大炊田海岸①	2.4	58.7	-56.3 ～ 61.1
9	石崎浜②	-2.3	38.1	-40.4 ～ 35.8
10	石崎浜①	-2.6	45.0	-47.6 ～ 42.4
11	動物園東②	-0.4	24.8	-25.3 ～ 24.4
12	動物園東①	0.0	26.1	-26.1 ～ 26.1
13	補助突堤②北	-0.2	35.1	-35.3 ～ 34.8
14	補助突堤①北	-0.1	25.1	-25.3 ～ 25.0
15	突堤北	-0.7	23.1	-23.8 ～ 22.4
16	県管理区間	1.3	15.9	-14.6 ～ 17.2
17	港湾離岸堤	1.3	30.6	-29.4 ～ 31.9
				前進傾向 / 後退傾向

振れ幅は毎年度この値を使用する

毎年度の予測計算結果により変化する

【-5m（バー内側）】

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲		
		等深線【-5m】変化予測値(2012.12)	振れ幅(標準偏差)	指標範囲(予測値±振れ幅)
4	ニツ立海岸	-0.5	245.4	-245.9 ～ 244.9
5	大炊田海岸③	-0.3	225.6	-225.8 ～ 225.3
6	大炊田海岸②	-0.3	93.4	-93.6 ～ 93.1
7	大炊田海岸①	-0.4	83.9	-84.3 ～ 83.6
9	石崎浜②	-0.6	93.1	-93.7 ～ 92.5
10	石崎浜①	-1.0	99.7	-100.7 ～ 98.6
11	動物園東②	-1.6	88.1	-89.7 ～ 86.6
12	動物園東①	-2.2	145.8	-147.9 ～ 143.6
13	補助突堤②北	-2.0	147.9	-149.9 ～ 145.8
14	補助突堤①北	-1.6	69.3	-70.8 ～ 67.7
15	突堤北	-7.9	65.7	-73.6 ～ 57.8
16	県管理区間	0.4	80.8	-80.4 ～ 81.2
17	港湾離岸堤	8.0	101.9	-93.9 ～ 109.9
				前進傾向 / 後退傾向

【-8m（バー外側）】

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲		
		等深線【-8m】変化予測値(2012.12)	振れ幅(標準偏差)	指標範囲(予測値±振れ幅)
4	ニツ立海岸	-0.4	69.6	-70.1 ～ 69.2
5	大炊田海岸③	0.4	64.2	-63.8 ～ 64.6
6	大炊田海岸②	0.5	60.2	-59.7 ～ 60.7
7	大炊田海岸①	0.3	42.9	-42.6 ～ 43.1
9	石崎浜②	-0.3	56.3	-56.6 ～ 56.0
10	石崎浜①	-0.7	52.4	-53.2 ～ 51.7
11	動物園東②	-1.0	39.1	-40.2 ～ 38.1
12	動物園東①	-1.5	31.2	-32.7 ～ 29.7
13	補助突堤②北	-2.3	41.2	-43.5 ～ 38.9
14	補助突堤①北	-3.1	30.1	-33.2 ～ 27.0
15	突堤北	-3.7	18.2	-21.9 ～ 14.5
16	県管理区間	-2.9	14.5	-17.5 ～ 11.6
17	港湾離岸堤	-4.7	32.4	-27.7 ～ 37.1
				前進傾向 / 後退傾向

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- **【T.P.-2m（海中の浅い場所）】**宮崎海岸南側に位置する No.11,14,16,17（動物園東②，補助突堤①北，県管理区間，港湾離岸堤）で範囲外↑の変化が確認された。
- **【T.P.-5m（バー内側）】**宮崎海岸北側に位置する No.4～6（二ツ立海岸～大炊田海岸②）で範囲外↓、南側に位置する No.12～15（動物園東①～突堤北）で範囲外↑の変化が確認された。
- **【T.P.-8m（バー外側）】**範囲外の変化は確認されなかった。

表－ 3.44　前浜勾配に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2016(H28)	宮崎港港湾離岸堤区域～二ツ立海岸までの区間	2016(H28)年 12 月	下表参照

表－ 3.45　等深線の変化に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

T.P.-2m（海中の浅い場所）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2016年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		等深線【-2m】変化予測値(2016.12)	振れ幅(標準偏差)	指標範囲（予測値±振れ幅）		変化傾向の変化	
4	二ツ立海岸	-0.4	51.9	-52.3 ～ 51.5	-28.9	無し	範囲内
5	大炊田海岸③	4.8	51.8	-47.0 ～ 56.6	18.6	無し	範囲内
6	大炊田海岸②	0.9	70.7	-69.9 ～ 71.6	6.2	無し	範囲内
7	大炊田海岸①	0.6	40.2	-39.6 ～ 40.8	-6.7	傾向逆転	範囲内
9	石崎浜②	-2.2	38.1	-40.3 ～ 35.9	-0.3	無し	範囲内
10	石崎浜①	-1.0	45.0	-46.0 ～ 44.1	-4.4	無し	範囲内
11	動物園東②	-2.0	24.8	-26.8 ～ 22.8	43.3	傾向逆転	範囲外↑
12	動物園東①	-1.2	26.1	-27.3 ～ 24.9	22.3	傾向逆転	範囲内
13	補助突堤②北	2.4	35.1	-32.6 ～ 37.5	-10.0	傾向逆転	範囲内
14	補助突堤①北	7.3	25.1	-17.8 ～ 32.4	72.4	無し	範囲外↑
15	突堤北	2.6	23.1	-20.6 ～ 25.7	20.4	無し	範囲内
16	県管理区間	1.4	15.9	-14.5 ～ 17.3	21.2	無し	範囲外↑
17	港湾離岸堤	-2.1	30.6	-32.7 ～ 28.6	30.5	傾向逆転	範囲外↑

前進傾向

後退傾向

T.P.-5m（バー内側）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2016年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		等深線【-5m】変化予測値(2016.12)	振れ幅(標準偏差)	指標範囲（予測値±振れ幅）		変化傾向の変化	
4	二ツ立海岸	-0.6	12.5	-13.1 ～ 11.9	-25.8	無し	範囲外↓
5	大炊田海岸③	-0.4	0.2	-0.5 -～ 0.2	-6.9	無し	範囲外↓
6	大炊田海岸②	-0.3	2.7	-3.1 ～ 2.4	-17.7	無し	範囲外↓
7	大炊田海岸①	-0.4	30.0	-30.4 ～ 29.6	-3.9	無し	範囲内
9	石崎浜②	-0.6	101.9	-102.5 ～ 101.2	-15.0	無し	範囲内
10	石崎浜①	-1.1	72.4	-73.5 ～ 71.4	3.4	傾向逆転	範囲内
11	動物園東②	-1.4	58.4	-59.8 ～ 57.0	-9.7	無し	範囲内
12	動物園東①	-1.6	18.7	-20.3 ～ 17.2	34.3	傾向逆転	範囲外↑
13	補助突堤②北	-2.0	48.3	-50.3 ～ 46.3	84.7	傾向逆転	範囲外↑
14	補助突堤①北	-4.0	33.6	-37.6 ～ 29.7	78.1	傾向逆転	範囲外↑
15	突堤北	-10.5	48.1	-58.6 ～ 37.6	109.6	傾向逆転	範囲外↑
16	県管理区間	0.1	25.3	-25.1 ～ 25.4	1.2	無し	範囲内
17	港湾離岸堤	7.6	62.8	-55.2 ～ 70.3	-44.1	傾向逆転	範囲内

T.P.-8m（バー外側）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2016年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		等深線【-8m】変化予測値(2016.12)	振れ幅(標準偏差)	指標範囲（予測値±振れ幅）		変化傾向の変化	
4	二ツ立海岸	-0.6	69.9	-70.5 ～ 69.3	-22.1	無し	範囲内
5	大炊田海岸③	0.2	64.3	-64.1 ～ 64.6	-36.6	傾向逆転	範囲内
6	大炊田海岸②	0.4	59.6	-59.2 ～ 60.0	-25.3	傾向逆転	範囲内
7	大炊田海岸①	0.2	43.0	-42.8 ～ 43.2	-27.4	傾向逆転	範囲内
9	石崎浜②	-0.3	56.3	-56.6 ～ 56.0	-31.4	無し	範囲内
10	石崎浜①	-0.7	52.4	-53.2 ～ 51.7	-22.6	無し	範囲内
11	動物園東②	-1.1	39.1	-40.2 ～ 38.0	-23.4	無し	範囲内
12	動物園東①	-1.5	31.2	-32.7 ～ 29.8	-20.6	無し	範囲内
13	補助突堤②北	-2.3	41.2	-43.5 ～ 38.9	-12.7	無し	範囲内
14	補助突堤①北	-3.2	30.1	-33.3 ～ 27.0	-7.8	無し	範囲内
15	突堤北	-3.6	18.2	-21.8 ～ 14.6	-14.6	無し	範囲内
16	県管理区間	-2.5	14.5	-17.1 ～ 12.0	-14.2	無し	範囲内
17	港湾離岸堤	5.3	32.4	-27.0 ～ 37.7	-10.9	傾向逆転	範囲内

≪参考：2015(H27)年度の等深線の変化≫

- **【T.P.-2m（海中の浅い場所）】**No.4（二ツ立海岸）で範囲外↑の変化が確認された。
- **【T.P.-5m（バー内側）】**No.4,5,6（二ツ立海岸～大炊田海岸②）及びNo.14,16（補助突堤①北，県管理区間）で範囲外↑の変化が確認された。
- **【T.P.-8m（バー外側）】**No.13,15,16（補助突堤②北，突堤北，県管理区間）で範囲外↓の変化が確認された。

表－ 3.47　等深線の変化に関する指標範囲との比較結果（ブロック毎）

T.P.-2m（海中の浅い場所）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分	指標に設定する変動範囲			検証対象 2015年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
	等深線【-2m】変化予測値 (2015.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
4 二ツ立海岸	-0.5	51.9	-52.4 ～ 51.4	83.9	傾向逆転	範囲外↑
5 大炊田海岸③	-0.1	51.8	-51.8 ～ 51.7	-29.8	無し	範囲内
6 大炊田海岸②	-1.3	70.7	-72.0 ～ 69.5	-4.2	無し	範囲内
7 大炊田海岸①	-0.6	40.2	-40.8 ～ 39.6	-0.3	無し	範囲内
9 石崎浜②	-1.8	38.1	-39.9 ～ 36.3	29.5	傾向逆転	範囲内
10 石崎浜①	-1.2	45.0	-46.2 ～ 43.8	28.5	傾向逆転	範囲内
11 動物園東②	-1.8	24.8	-26.6 ～ 23.0	-24.4	無し	範囲内
12 動物園東①	-1.1	26.1	-27.2 ～ 25.0	-24.9	無し	範囲内
13 補助突堤②北	1.9	35.1	-33.1 ～ 37.0	-4.7	傾向逆転	範囲内
14 補助突堤①北	3.8	25.1	-21.3 ～ 28.9	-15.7	傾向逆転	範囲内
15 突堤北	6.7	23.1	-16.4 ～ 29.8	-7.1	傾向逆転	範囲内
16 県管理区間	1.4	15.9	-14.5 ～ 17.3	7.0	無し	範囲内
17 港湾離岸堤	-4.8	30.6	-35.4 ～ 25.9	3.4	傾向逆転	範囲内

前進傾向

後退傾向

T.P.-5m（バー内側）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分	指標に設定する変動範囲			検証対象 2015年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
	等深線【-5m】変化予測値 (2015.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
4 二ツ立海岸	-0.6	12.5	-13.1 ～ 12.0	109.4	傾向逆転	範囲外↑
5 大炊田海岸③	-0.4	0.2	-0.5 -～ 0.2	29.2	傾向逆転	範囲外↑
6 大炊田海岸②	-0.3	2.7	-3.1 ～ 2.4	11.9	傾向逆転	範囲外↑
7 大炊田海岸①	-0.4	30.0	-30.4 ～ 29.6	4.3	傾向逆転	範囲内
9 石崎浜②	-0.6	101.9	-102.5 ～ 101.2	24.5	傾向逆転	範囲内
10 石崎浜①	-1.1	72.4	-73.5 ～ 71.4	-6.6	無し	範囲内
11 動物園東②	-1.5	58.4	-59.9 ～ 57.0	-4.2	無し	範囲内
12 動物園東①	-1.7	18.7	-20.4 ～ 17.1	-9.6	無し	範囲内
13 補助突堤②北	-1.9	48.3	-50.2 ～ 46.3	-1.6	無し	範囲内
14 補助突堤①北	-4.1	33.6	-37.7 ～ 29.5	55.6	傾向逆転	範囲外↑
15 突堤北	-8.7	48.1	-56.9 ～ 39.4	-5.5	無し	範囲内
16 県管理区間	-0.1	25.3	-25.3 ～ 25.2	45.0	傾向逆転	範囲外↑
17 港湾離岸堤	8.0	62.8	-54.7 ～ 70.8	68.8	無し	範囲内

T.P.-8m（バー外側）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分	指標に設定する変動範囲			検証対象 2015年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
	等深線【-8m】変化予測値 (2015.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
4 二ツ立海岸	-0.6	69.9	-70.5 ～ 69.3	-21.0	無し	範囲内
5 大炊田海岸③	0.3	64.3	-64.0 ～ 64.6	-8.2	傾向逆転	範囲内
6 大炊田海岸②	0.4	59.6	-59.2 ～ 60.0	-5.3	傾向逆転	範囲内
7 大炊田海岸①	0.2	43.0	-42.8 ～ 43.3	-10.4	傾向逆転	範囲内
9 石崎浜②	-0.3	56.3	-56.6 ～ 56.0	-5.4	無し	範囲内
10 石崎浜①	-0.7	52.4	-53.2 ～ 51.7	-16.8	無し	範囲内
11 動物園東②	-1.1	39.1	-40.2 ～ 38.0	-21.4	無し	範囲内
12 動物園東①	-1.4	31.2	-32.7 ～ 29.8	-26.2	無し	範囲内
13 補助突堤②北	-2.3	41.2	-43.4 ～ 38.9	-48.3	無し	範囲外↓
14 補助突堤①北	-3.2	30.1	-33.3 ～ 26.9	-15.3	無し	範囲内
15 突堤北	-3.6	18.2	-21.8 ～ 14.6	-32.2	無し	範囲外↓
16 県管理区間	-2.7	14.5	-17.2 ～ 11.9	-34.0	無し	範囲外↓
17 港湾離岸堤	5.4	32.4	-27.0 ～ 37.7	-17.4	傾向逆転	範囲内



≪参考：2014(H26)年度の等深線の変化≫

- 【T.P.-2m（海中の浅い場所）】No.11（動物園東②）ブロックで範囲外↑、No.15（突堤北）ブロックで範囲外↓の変化が確認された。
- 【T.P.-5m（バー内側）】No.14（補助突堤①北）で範囲外↓の変化が確認された。
- 【T.P.-8m（バー外側）】範囲内であった。

表－ 3.46　等深線の変化に関する指標範囲との比較結果(ブロック毎)

T.P.-2m（海中の浅い場所）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2014年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		等深線【-2m】変化予測値 (2014.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
4	二ツ立海岸	1.2	86.5	-85.3 ～ 87.6	29.0	無し	範囲内
5	大炊田海岸③	1.3	85.6	-84.3 ～ 86.9	-5.6	傾向逆転	範囲内
6	大炊田海岸②	4.7	89.4	-84.7 ～ 94.1	-28.4	傾向逆転	範囲内
7	大炊田海岸①	5.5	58.7	-53.2 ～ 64.2	2.3	無し	範囲内
9	石崎浜②	2.3	38.1	-35.8 ～ 40.4	-26.4	傾向逆転	範囲内
10	石崎浜①	0.8	45.0	-44.2 ～ 45.8	9.4	無し	範囲内
11	動物園東②	3.0	24.8	-21.8 ～ 27.9	32.5	無し	範囲外↑
12	動物園東①	4.6	26.1	-21.5 ～ 30.8	10.9	無し	範囲内
13	補助突堤②北	2.8	35.1	-32.3 ～ 37.8	-7.2	傾向逆転	範囲内
14	補助突堤①北	2.5	25.1	-22.7 ～ 27.6	-9.5	傾向逆転	範囲内
15	突堤北	12.6	23.1	-10.5 ～ 35.7	-23.9	傾向逆転	範囲外↓
16	県管理区間	0.6	15.9	-15.3 ～ 16.5	-8.9	傾向逆転	範囲内
17	港湾離岸堤	-14.5	30.6	-45.1 ～ 16.2	-19.3	無し	範囲内

前進傾向

後退傾向

T.P.-5m（バー内側）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2014年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		等深線【-5m】変化予測値 (2014.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
4	二ツ立海岸	-0.6	245.4	-246.0 ～ 244.9	26.8	傾向逆転	範囲内
5	大炊田海岸③	-0.4	225.6	-226.0 ～ 225.2	-39.8	無し	範囲内
6	大炊田海岸②	-0.3	93.4	-93.7 ～ 93.0	17.8	傾向逆転	範囲内
7	大炊田海岸①	-0.4	83.9	-84.4 ～ 83.5	-2.5	無し	範囲内
9	石崎浜②	-0.6	93.1	-93.7 ～ 92.5	3.1	傾向逆転	範囲内
10	石崎浜①	-1.1	99.7	-100.7 ～ 98.6	7.1	傾向逆転	範囲内
11	動物園東②	-1.5	88.1	-89.7 ～ 86.6	0.8	傾向逆転	範囲内
12	動物園東①	-1.8	145.8	-147.5 ～ 144.0	-7.5	無し	範囲内
13	補助突堤②北	-1.9	147.9	-149.7 ～ 146.0	-107.4	無し	範囲内
14	補助突堤①北	-3.6	69.3	-72.8 ～ 65.7	-84.1	無し	範囲外↓
15	突堤北	-9.4	65.7	-75.1 ～ 56.3	7.0	傾向逆転	範囲内
16	県管理区間	-0.1	80.8	-80.9 ～ 80.7	6.6	傾向逆転	範囲内
17	港湾離岸堤	8.5	101.9	-93.3 ～ 110.4	26.3	無し	範囲内

T.P.-8m（バー外側）

（単位：m/年）

効果検証評価ブロック区分		指標に設定する変動範囲			検証対象 2014年12月	調査結果と指標範囲の比較結果	
		等深線【-8m】変化予測値 (2014.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
4	二ツ立海岸	-0.6	69.6	-70.2 ～ 69.1	3.2	傾向逆転	範囲内
5	大炊田海岸③	0.3	64.2	-63.9 ～ 64.5	-9.2	傾向逆転	範囲内
6	大炊田海岸②	0.5	60.2	-59.8 ～ 60.7	2.1	無し	範囲内
7	大炊田海岸①	0.2	42.9	-42.7 ～ 43.1	2.4	無し	範囲内
9	石崎浜②	-0.3	56.3	-56.6 ～ 56.0	-3.3	無し	範囲内
10	石崎浜①	-0.7	52.4	-53.2 ～ 51.7	-2.2	無し	範囲内
11	動物園東②	-1.1	39.1	-40.2 ～ 38.1	-5.6	無し	範囲内
12	動物園東①	-1.4	31.2	-32.7 ～ 29.8	-9.6	無し	範囲内
13	補助突堤②北	-2.3	41.2	-43.4 ～ 38.9	26.5	傾向逆転	範囲内
14	補助突堤①北	-3.2	30.1	-33.3 ～ 26.9	0.6	傾向逆転	範囲内
15	突堤北	-3.6	18.2	-21.8 ～ 14.6	2.6	傾向逆転	範囲内
16	県管理区間	-2.8	14.5	-17.3 ～ 11.7	-8.6	無し	範囲内
17	港湾離岸堤	5.4	32.4	-27.0 ～ 37.8	-21.5	傾向逆転	範囲内



3.2 カメラ観測

3.2.1 汀線変化

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 汀線変化

(B) 現象

- 汀線の変化が地形変化予測計算による汀線予測値に合致しているかを確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
台風等での短期的な地形変化が、既往の調査結果より大きい。
区間平均浜幅の前進速度が早い・遅い。 ※区間:宮崎港～一ツ瀬川までの範囲を1km程度に区切る
県離岸堤区間の浜幅が維持できない。
一ツ瀬川北側の海岸の区間平均浜幅の前進速度が早い・遅い。 ※区間:一ツ瀬川導流堤北側の1km程度を想定

2) 調査位置

- カメラ観測を実施している一ツ瀬川左岸、大炊田海岸④、石崎浜②の 3 ブロックを当面の解析対象とする。対策の進捗により、定点固定カメラの追加設置を検討する。
- なお、補助突堤①北ブロックについては、カメラ観測を実施しているが現時点で砂浜が存在しないため、今後砂浜が回復してきた段階で、構造物近傍地点となる一ツ瀬川左岸ブロックの振れ幅を用いて解析する。

3) 調査時期

- 連続的な汀線変動を把握するため通年、毎正時とする。
- ただし、画像解析調査の特性上、データ取得は昼間(7 時～18 時)に限られる。

4) 調査結果の整理方法

- 2012(H24)年以降の当該年度に実施されたカメラ観測より年平均汀線位置を算定し、前年度の年平均汀線位置との差分により 1 年当りの汀線変化量を整理し、指標範囲と比較する。

5)　指標範囲の設定

- 指標タイプは予測値±振れ幅とする。
- カメラ観測結果から、各年の年平均汀線位置を算定し、前年度の年平均汀線位置との差分により１年当りの汀線変化量を算定する。
- 観測地点毎の年平均汀線変化量データを用いて標準偏差を算定し、その標準偏差を観測地点毎の振れ幅として設定する。
- 振れ幅設定の対象期間は、自然状態での変動状況を把握するために、対象ブロック周辺での養浜実施前までのデータにより設定することとし、以下のとおりとした。

一ツ瀬川左岸：養浜が実施されていないため 2006(H18)年 1 月～2011(H23)年 12 月

大炊田海岸③：2011(H23)年度から養浜が実施されているため 2006(H18)年 1 月～2010(H22)年 12 月

石　崎　浜①：カメラ観測開始当初の 2006(H18)年度から養浜が実施されているため大炊田海岸で設定した振れ幅を使用する。

- また、地形変化予測計算により解析する年の予測汀線位置から、観測地点が位置するブロック毎の平均汀線変化予測値を算定する。
- なお、振れ幅はを用いるが、汀線変化の予測値は年度毎に変化するため、指標に設定する変動範囲（予測値±振れ幅）は年度毎に変化することになる。

表－ 3.48　カメラ観測による汀線変化に関する指標範囲及び振れ幅

振れ幅は毎年度この値を使用する

効果検証評価ブロック区分	指標に設定する変動範囲		
	汀線変化予測値 (2012.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)
一ツ瀬川左岸	1.9	14.5	-12.6 ～ 16.4
大炊田海岸③	0.8	2.8	-2.0 ～ 3.6
石崎浜①	-2.0	2.8	-4.8 ～ 0.8

毎年度の予測計算結果により変化する



6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 大炊田海岸③は範囲外↑であった。
- 一ツ瀬川左岸および石崎浜①は範囲内であったが、汀線予測計算と逆の変化傾向が確認された。

表－ 3.49　カメラ観測による汀線変化に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2016(H28)	一ツ瀬川左岸 大炊田海岸③ 石崎浜①	2016(H28)年 1～12 月	下表参照

表－ 3.50　カメラ観測による汀線変化に関する指標範囲の比較結果
（ブロック毎）

（単位:m/年）

効果検証評価ブロック区分	指標に設定する変動範囲			検証対象 2016年	調査結果と指標範囲の比較結果	
	汀線変化予測値 (2016.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
一ッ瀬川左岸	1.4	14.5	-13.1 ～ 15.9	-5.1	傾向逆転	範囲内
大炊田海岸③	4.6	2.8	1.8 ～ 7.4	13.8	無し	範囲外↑
石崎浜①	-0.8	2.8	-3.6 ～ 2.0	1.9	傾向逆転	範囲内

≪参考：2015(H27)年度のカメラ観測による汀線変化≫

- 大炊田海岸③は範囲外↑であり、石崎浜①は範囲外↓で汀線予測計算での変化傾向に対して逆となる侵食傾向であった。

表－ 3.52　カメラ観測による汀線変化に関する指標範囲の比較結果
（ブロック毎）

（単位:m/年）

効果検証評価ブロック区分	指標に設定する変動範囲			検証対象 2015年	調査結果と指標範囲の比較結果	
	汀線変化予測値 (2015.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
一ッ瀬川左岸	1.5	14.5	-13.0 ～ 16.0	10.0	無し	範囲内
大炊田海岸③	0.5	2.8	-2.3 ～ 3.3	11.7	無し	範囲外↑
石崎浜①	0.6	2.8	-2.2 ～ 3.4	-3.3	傾向逆転	範囲外↓

≪参考：2014(H26)年度のカメラ観測による汀線変化≫

- 範囲内であった。
- ただし、一ツ瀬川左岸及び石崎浜①の両地点は、いずれも汀線予測計算での変化傾向に対して逆となる侵食傾向であった。

表－ 3.51　カメラ観測による汀線変化に関する指標範囲の比較結果
（ブロック毎）

（単位:m/年）

効果検証評価ブロック区分	指標に設定する変動範囲			検証対象 2014年	調査結果と指標範囲の比較結果	
	汀線変化予測値 (2014.12)	振れ幅 (標準偏差)	指標範囲 (予測値±振れ幅)		変化傾向の変化	
一ッ瀬川左岸	1.6	14.5	-12.9 ～ 16.1	-5.5	傾向逆転	範囲内
大炊田海岸③	1.5	2.8	-1.3 ～ 4.3	2.7	無し	範囲内
石崎浜①	1.2	2.8	-1.6 ～ 4.0	-1.5	傾向逆転	範囲内

3.2.2 汀線の短期変動量

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 汀線変化

(B) 現象

- 計画検討の前提条件として用いている汀線の短期変動幅 25m が、データの蓄積によって大きな変化が生じないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
台風等での短期的な地形変化が、既往の調査結果より大きい。

2) 調査位置

- カメラ観測を実施している一ツ瀬川左岸、大炊田海岸④、石崎浜②とする。
- なお、対策の進捗により、定点固定カメラの追加設置を検討する。

3) 調査時期

- 短期的な汀線変動を把握するため通年、毎正時とする。
- ただし、画像解析調査の特性上、現状ではデータ取得は昼間(7 時～18 時)に限られている。

4) 調査結果の整理方法

- 直轄海岸事業以降及び当該年度に実施されたカメラ観測より、各観測地点、各年について、年平均・最少・最大浜幅を算定し、年平均から最小・最大の差分から後退量及び前進量の年短期変動量を算定する。
- その年短期変動量について、地点・期間を通じた平均を整理し、指標範囲と比較する。

5)　指標範囲の設定

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、汀線の短期変動量について基準書等に明確な設定方法はない。
- そこで、宮崎海岸では、2006(H18)年 1 月より定点固定カメラによる日毎の汀線観測が実施されているため、そのデータを用いて、直轄海岸事業開始以前の2006(H18)年 1 月～2007(H19)年 12 月の観測結果より、汀線の短期変動量を設定した。
- 各観測地点、各年について年平均・最少浜幅位置を算定し、年平均からの後退量について 3 地点・2 年間を通じて平均した量を指標範囲とする。
- ここで設定している汀線後退の短期変動量 25m は計画の前提条件として用いている。

表－ 3.53　カメラ観測による汀線の短期変動に関する指標範囲

観測地点	浜幅(m)				年別短期変動量(m)		指標範囲
	年平均		年最少				2006～2007年平均短期変動量(m)
	2006	2007	2006	2007	2006年	2007年	
一ツ瀬左岸	144	147	122	111	-22	-37	-25
大炊田③	50	47	29	17	-21	-30	
石崎浜①	45	35	23	14	-22	-21	

表－ 3.54　既往検討による汀線の短期変動幅

既往研究成果※によると、宮崎海岸に近い環境（太平洋側で構造物の無い細砂の海岸）における 30 年確率の汀線後退量は 25m と推定された結果がある。これは、汀線の短期的な変動を確率的に考えた場合の数字であり、上記に示した宮崎海岸における汀線の短期変動量と設定方法は異なるが、同程度の数字となっている。

表―3　建設省直轄海岸の測量データに基づいた年超過確率 1/30 の汀線後退量

（単位：m）

	構造物無し		構造物有り	
	粗砂	細砂	粗砂	細砂
太平洋側	22	25		
日本海側	20	34		20

※福島ら（2000），海岸保全施設としての砂浜の確率論的手法による変動量評価，第 47 回海工論文集，pp.701-705.

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 範囲内であった。

表－ 3.55　カメラ観測による汀線の短期変動に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2016(H28)	一ツ瀬川左岸 大炊田海岸③ 石崎浜①	2006(H18)年 1 月 ～2016(H28)年 12 月	範囲内 （下表参照）

表－ 3.56　カメラ観測によるブロック毎の汀線の短期変動と指標範囲の比較

観測地点	指標範囲	年別短期変動量(m)											調査結果と指標範囲の比較結果
	2006～2007年平均短期変動量(m)	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2006～2016年平均短期変動量(m)
一ツ瀬左岸	−25	−22	−37	−24	−43	−25	−31	−22	−20	−14	−11	−19	−18
大炊田③		−21	−30	−17	−23	−13	−11	−6	−11	−19	−15	−17	
石崎浜①		−22	−21	−16	−18	−13	−22	−11	−4	−3	−7	−6	



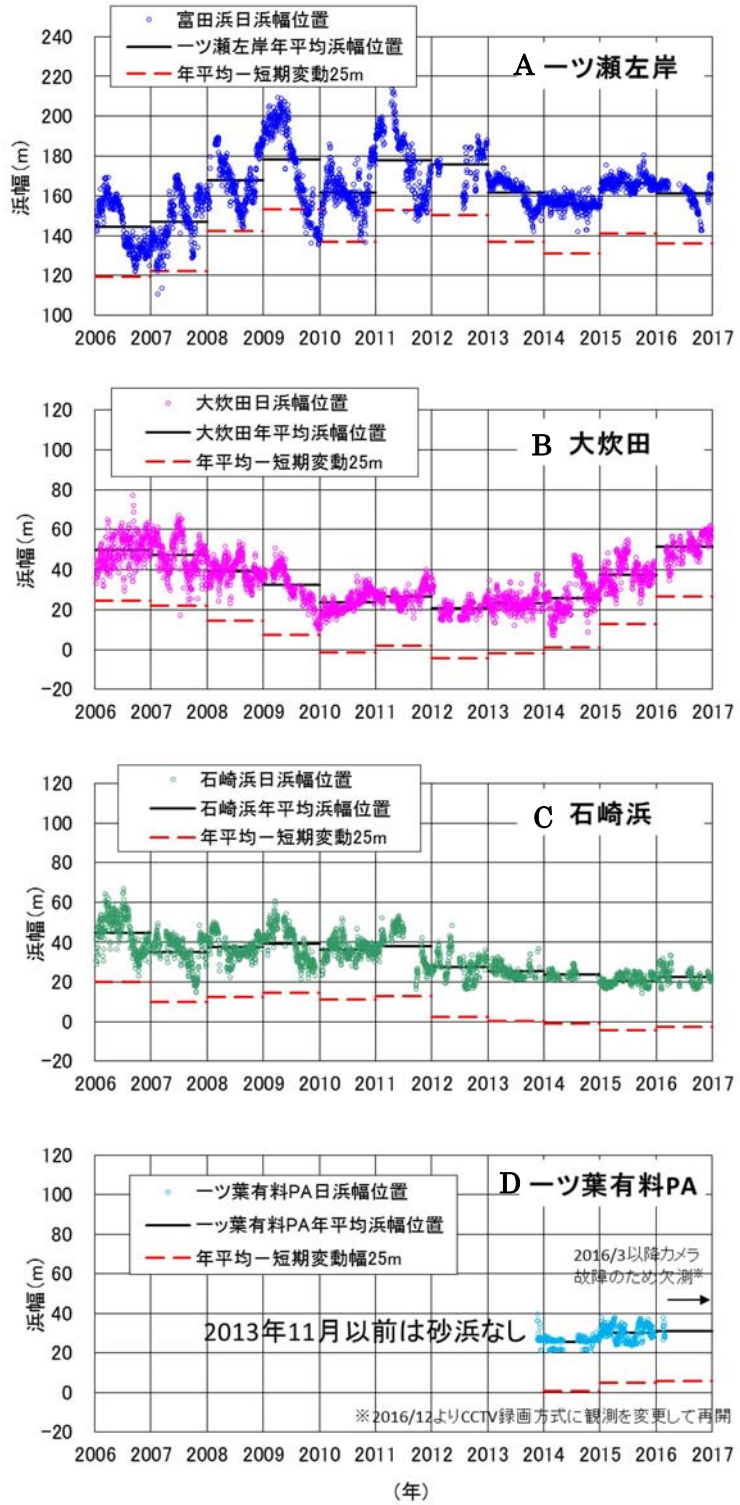

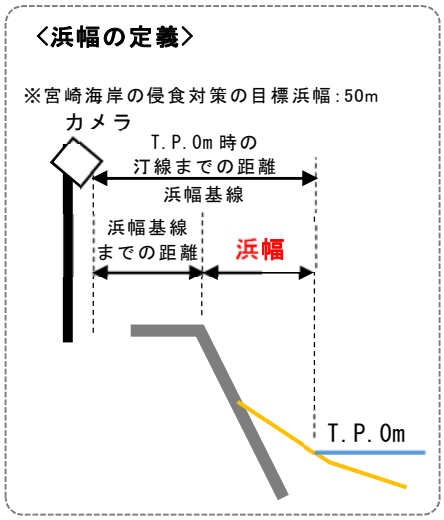

図ー 3.17　カメラ観測による浜幅の日変動状況
(2006(H18)年 1 月～2016(H28)年 12 月)

≪参考：2015(H27)年度の汀線の短期変動量≫

- 範囲内であった。

表－ 3.55　カメラ観測による汀線の短期変動に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2015(H27)	一ツ瀬川左岸 大炊田海岸③ 石崎浜①	2006(H18)年 1 月 ～2015(H27)年 12 月	範囲内 （下表参照）

表－ 3.56　カメラ観測によるブロック毎の汀線の短期変動と指標範囲の比較

観測地点	指標範囲	年別短期変動量(m)										調査結果と指標範囲の比較結果
	2006～2007年平均短期変動量(m)	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2006～2015年平均短期変動量(m)
一ツ瀬左岸	−25	−22	−37	−24	−43	−25	−31	−22	−20	−14	−11	−18
大炊田③		−21	−30	−17	−23	−13	−11	−6	−11	−19	−15	
石崎浜①		−22	−21	−16	−18	−13	−22	−11	−4	−3	−7	



≪参考：2014(H26)年度の汀線の短期変動量≫

- 範囲内であった。

表－ 3.57　カメラ観測による汀線の短期変動に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2014(H26)	一ツ瀬川左岸 大炊田海岸③ 石崎浜①	2006(H18)年 1 月 ～2014(H26)年 12 月	範囲内 （下表参照）

表－ 3.58　カメラ観測によるブロック毎の汀線の短期変動と指標範囲の比較

観測地点	指標範囲	年別短期変動量(m)									調査結果と指標範囲の比較結果
	2006～2007年平均短期変動量(m)	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2006～2014年平均短期変動量(m)
一ツ瀬左岸	−25	−22	−37	−24	−43	−25	−31	−22	−20	−14	−19
大炊田③		−21	−30	−17	−23	−13	−11	−6	−11	−19	
石崎浜①		−22	−21	−16	−18	−13	−22	−11	−4	−3	



3.3 施設点検

3.3.1 離岸堤

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 離岸堤天端高さの変化
- 離岸堤前面水深の変化

(B) 現象

- 離岸堤の高さが計画値を越えて沈下していないか、離岸堤の前面水深が既往の地形変化より大きくなっていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
離岸堤の高さが、計画値を越えて沈下する。

2) 調査位置

- 住吉海岸離岸堤区間（離岸堤 8 基）とする。

3) 調査時期

- 測量実施時に実施する。

4) 調査結果の整理方法

- 離岸堤の高さ及び周辺の測量結果より、各離岸堤の平均高さ、前面水深を整理し、指標範囲と比較する。

5) 指標範囲の設定

- 指標タイプは基準値とする。
- 「住吉海岸 海岸保全施設計画書(平成 17 年～)」より、離岸堤の天端高計画値は海抜(T.P.)+0.5m である。したがって、この計画値より海抜(T.P.)+0.5m を指標範囲とする。
- 前面水深は既往の地形変化の範囲内であるかを指標範囲とする(図－ 3.18 参照)。

表－ 3.63 施設点検(離岸堤)に関する指標範囲との比較結果(高さ)

離岸堤	指標範囲 計画値 (T.P.m)	2011(H23)年 4 月 観測値(T.P.m)	調査結果と指標 範囲の比較結果
8 基目	0.5	1.7	範囲内
7 基目		1.7	範囲内
6 基目		1.7	範囲内
5 基目		2.1	範囲内
4 基目		0.5	範囲内
3 基目		0.7	範囲内
2 基目		0.5	範囲内
1 基目		0.7	範囲内

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年は離岸堤の高さに関する測量は実施されていない。
- 2016(H28)年 12 月の離岸堤の前面水深の地形変化は範囲内であった。

表－ 3.62　施設点検(離岸堤)に関する指標範囲との比較結果(前面水深)

離岸堤	指標範囲	2015(H27)年 12 月観測値(T.P.m)	調査結果と指標範囲の比較結果
前面水深	前面水深は既往の地形変化の範囲内である	下図	範囲内

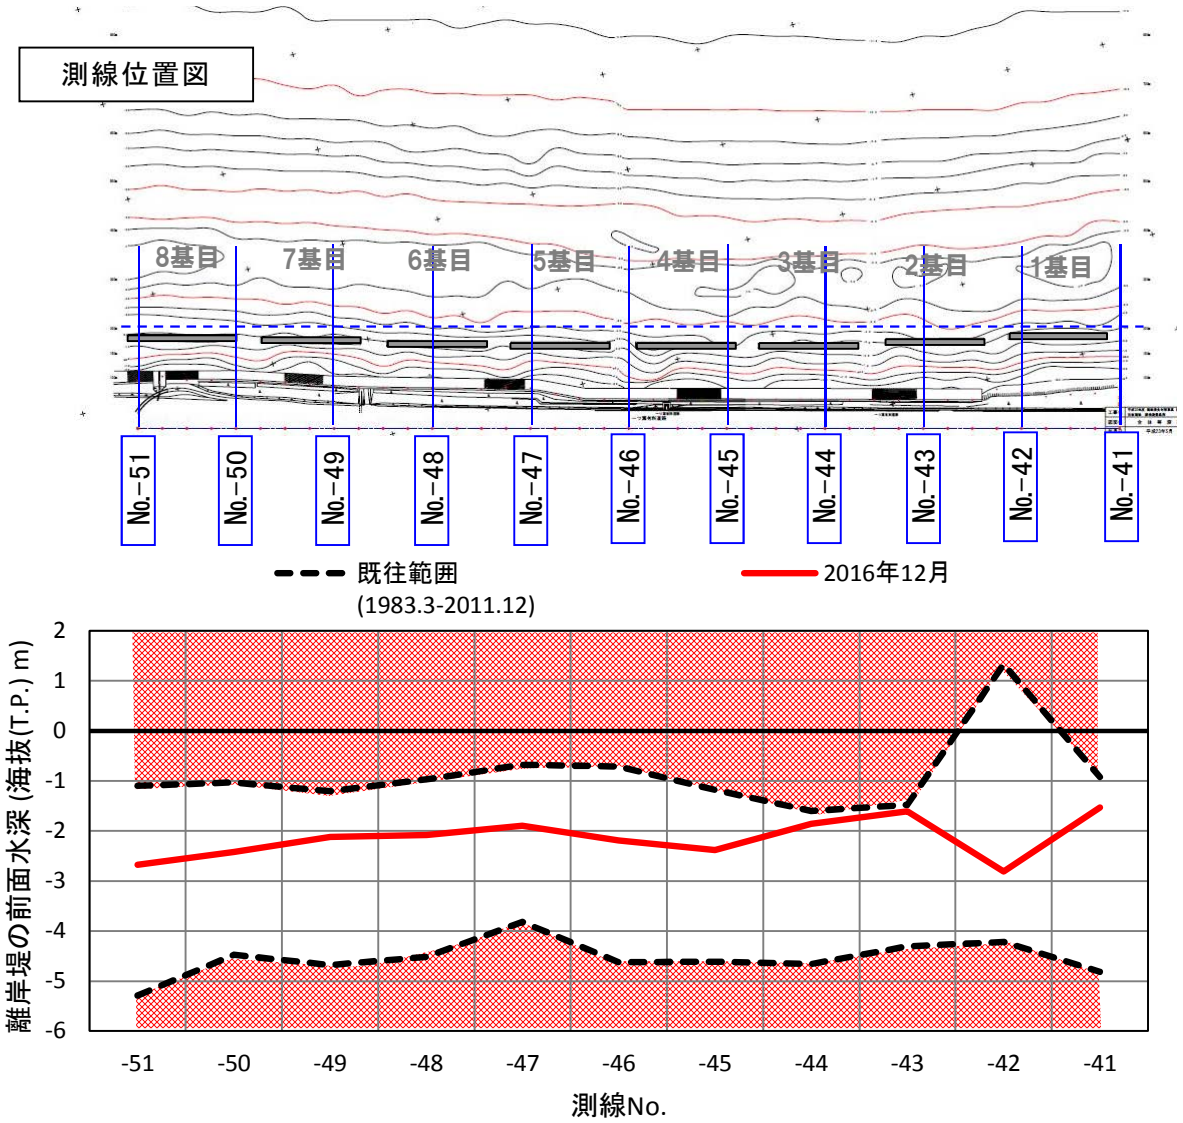

図－ 3.18　離岸堤前面水深の経年変化

≪参考：2014(H26)、2015(H27)年度の結果≫

- 2015(H27)年は離岸堤の高さに関する測量は実施されていない。
- 2015(H27)年 12 月の離岸堤の前面水深の地形変化は範囲内であった。

表－ 3.62　施設点検(離岸堤)に関する指標範囲との比較結果(前面水深)

離岸堤	指標範囲	2015(H27)年 12 月観測値(T.P.m)	調査結果と指標範囲の比較結果
前面水深	前面水深は既往の地形変化の範囲内である	下図	範囲内

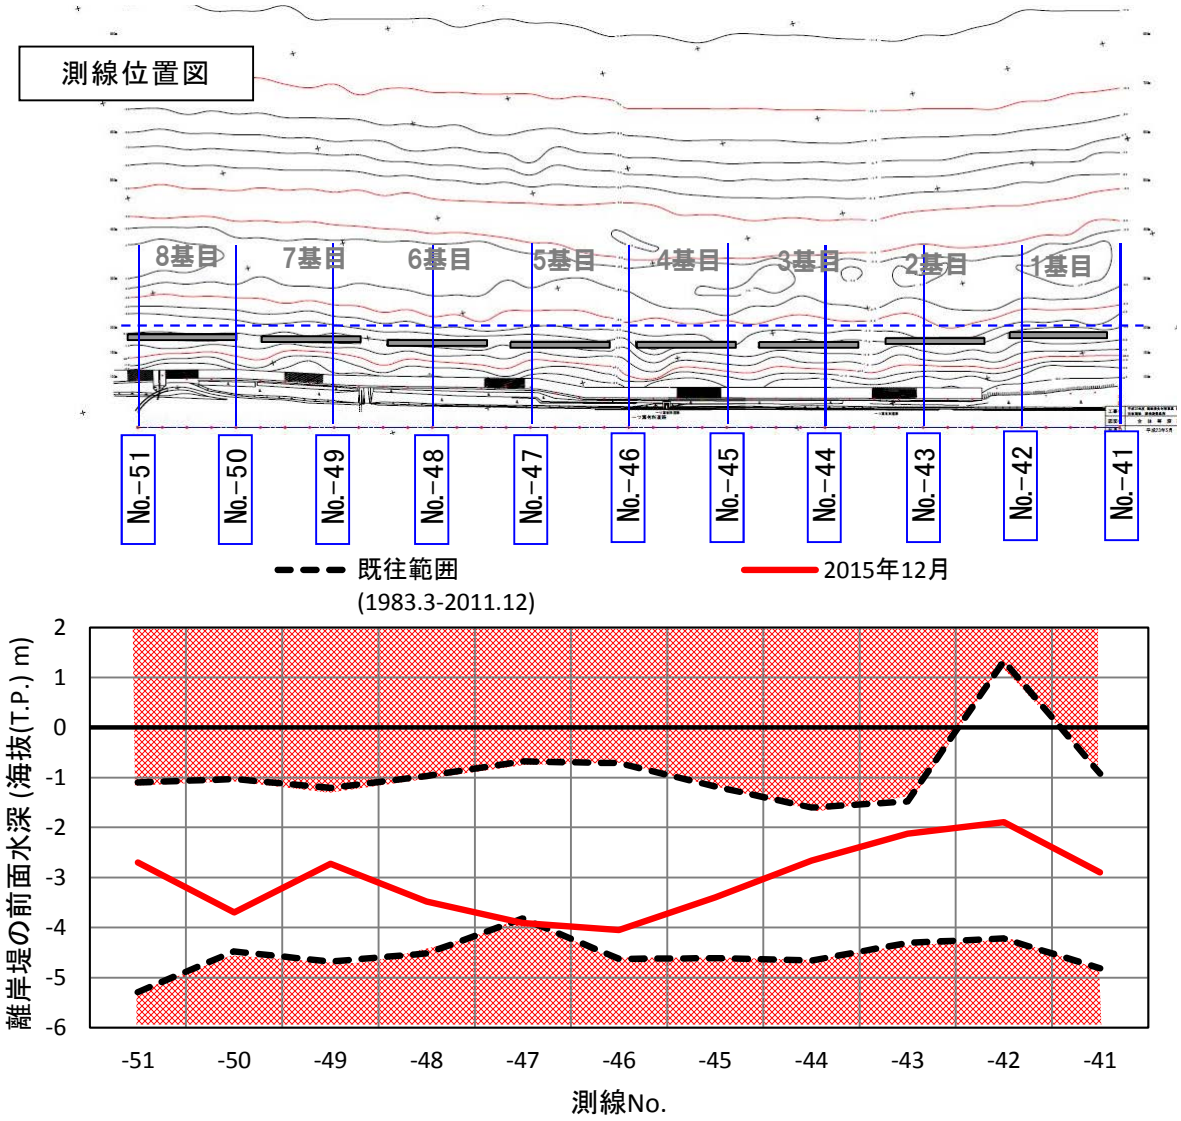

図－ 3.19　離岸堤前面水深の経年変化

≪参考：2014(H26)年度の結果≫

- 2014(H26)年は離岸堤の高さに関する測量は実施されていない。
- 2014(H26)年 12 月の離岸堤の前面水深の地形変化は範囲内であった。

表－ 3.64　施設点検(離岸堤)に関する指標範囲との比較結果(前面水深)

離岸堤	指標範囲	2014(H26)年 12 月観測値(T.P.m)	調査結果と指標範囲の比較結果
前面水深	前面水深は既往の地形変化の範囲内である	下図	範囲内

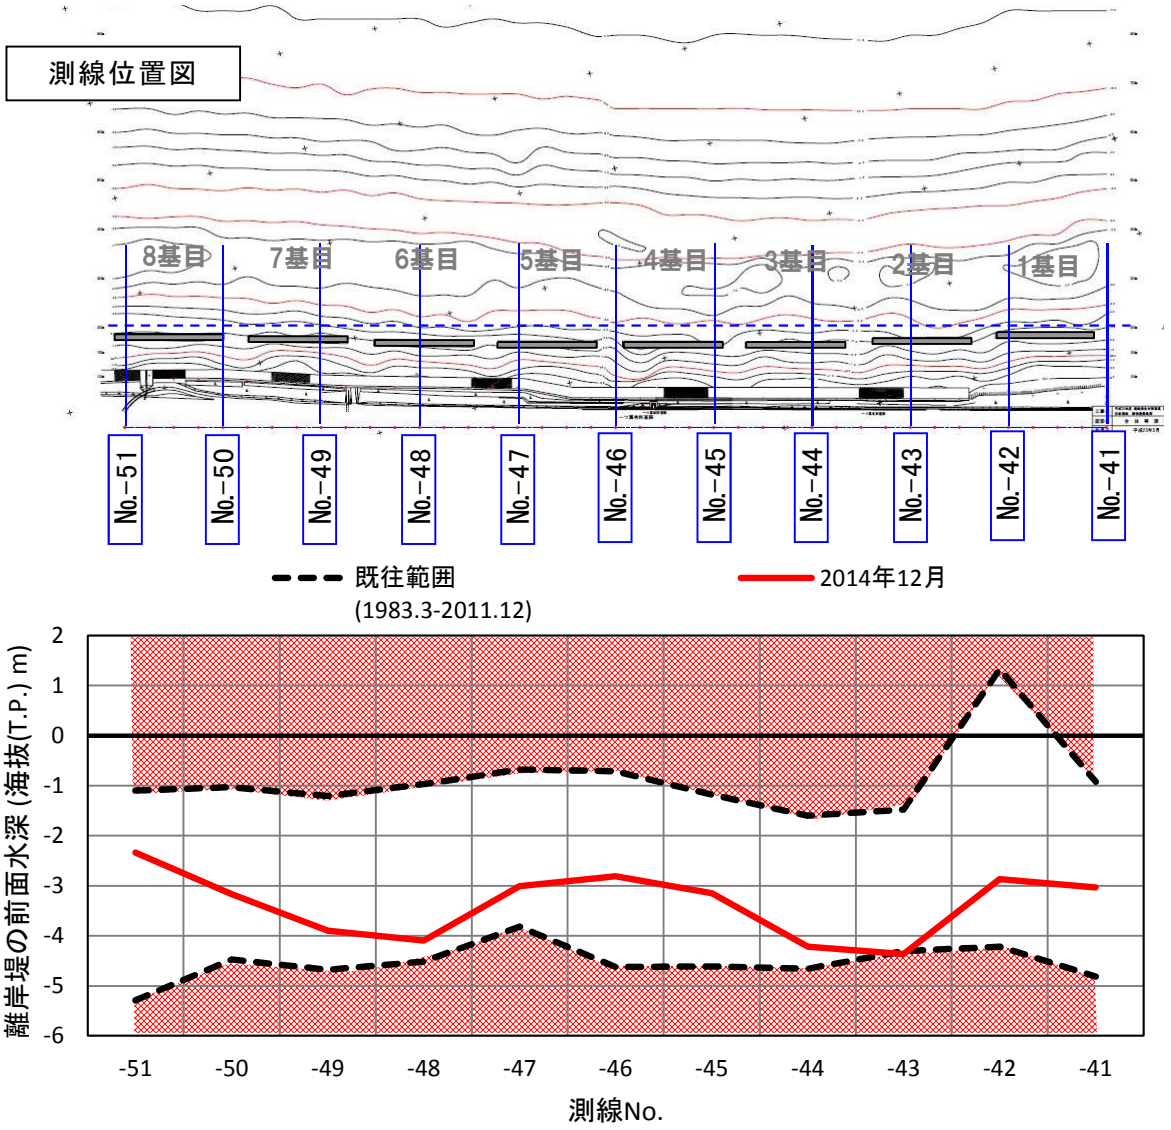

図－ 3.20　離岸堤前面水深の経年変化

≪参考：2011(H23)年度の結果≫

➢ 2011(H23)年の離岸堤の高さは範囲内であった。

表－ 3.63　施設点検(離岸堤)に関する指標範囲との比較結果(高さ)

離岸堤	指標範囲 計画値　(T.P.m)	2011(H23)年 4 月 観測値(T.P.m)	調査結果と指標 範囲の比較結果
8 基目	0.5	1.7	範囲内
7 基目		1.7	範囲内
6 基目		1.7	範囲内
5 基目		2.1	範囲内
4 基目		0.5	範囲内
3 基目		0.7	範囲内
2 基目		0.5	範囲内
1 基目		0.7	範囲内

出典：宮崎県提供データによる調査結果と指標範囲の比較結果。

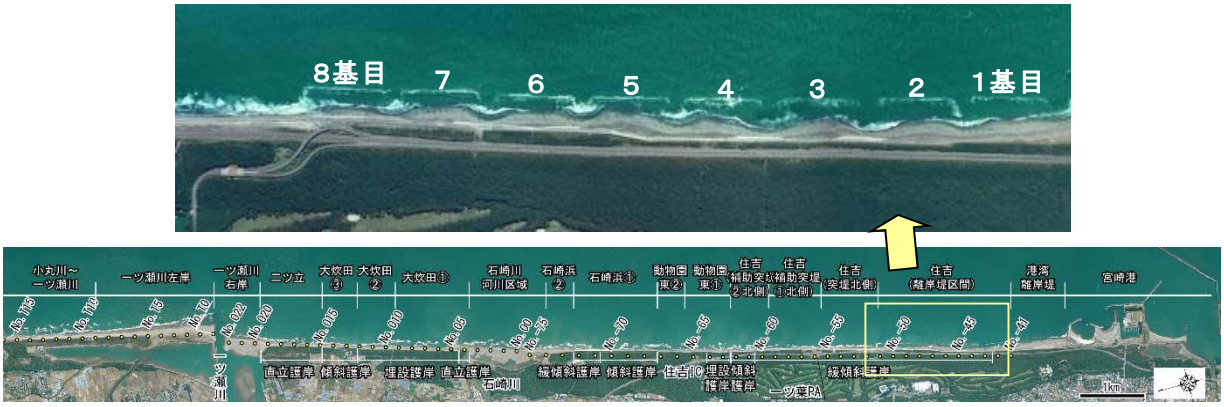

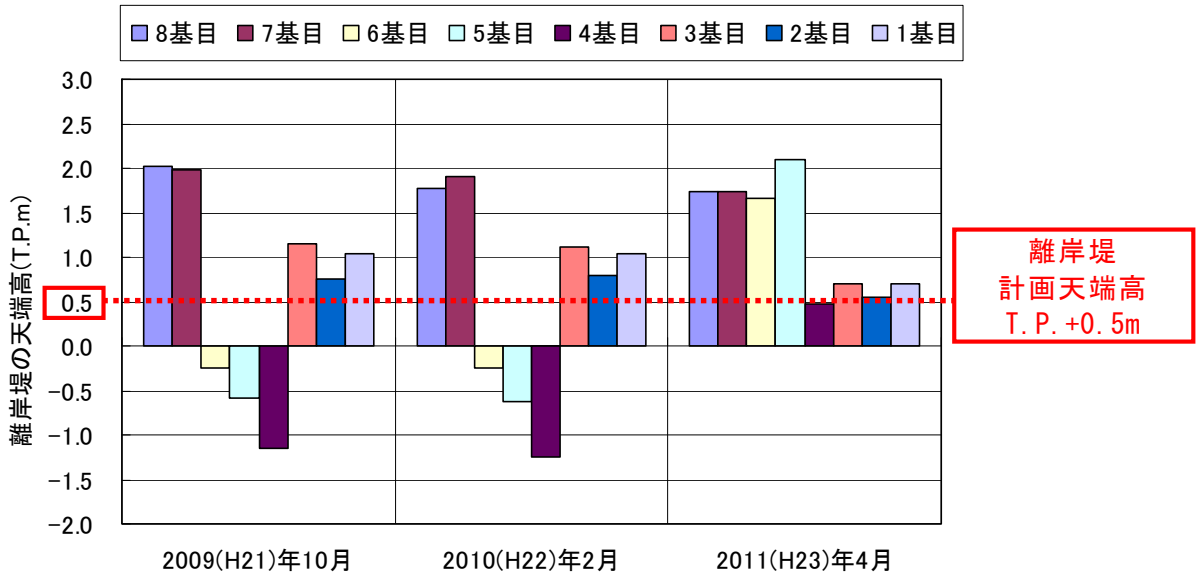

図－ 3.21　離岸堤天端高の経年変化

3.3.2 突堤

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 堤体の天端高さの変化
- 被覆ブロック及び捨石の移動

(B) 現象

- 突堤の高さが、計画値を越えて沈下していないか確認する。
- また、被覆ブロック・捨石が移動し、施設形状が変形していないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
突堤の高さが、計画値を越えて沈下する。
被覆ブロック・捨石が移動し、施設形状が変形する。

2) 調査位置

- 設置した突堤とする。

3) 調査時期

- 突堤施工後の測量実施時とする。

4) 調査結果の整理方法

- 突堤の高さの測量結果より、施工後の突堤平均高さを整理し、指標範囲と比較する。

5) 指標範囲の設定

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、突堤の天端高計画値とし、これを指標範囲とする。

陸側水平部分（突堤の基部から 120m）：海抜(T.P.)+4.0m
中間傾斜部（15m）：海抜(T.P.)+3.0～4.0m（陸側水平部分と先端部の接合部）
先端部（中間傾斜部から沖合 165m）：海抜(T.P.)+3.0m

表－ 3.65　突堤天端高の設定根拠

(1)-1) 技術分科会からの報告(委員会からの付託事項)　- 21 -
天端の高さの追加検討 (まとめ)

□ 検討結果(まとめ)

- 陸側水平部分:年数回波の遡上高、浜崖地形、嵩上げの可能性を考慮して、海抜(T.P.)+4.0mとする。
- 先端部:漂砂制御効果、その他の観点を考慮して、海抜(T.P.)+3.0mとする。
- 中間傾斜部分:陸側水平部分の高さ海抜(T.P.)+4.0mから、先端部の高さ海抜(T.P.)+3.0mまで、一定勾配で低下させる。

天端の高さは、陸側水平部分:海抜(T.P.)+4.0m、先端部:海抜(T.P.)+3.0mを基本とする。ただし、先端部の高さは、施工後の沈下量1mを考慮して、施工天端高を海抜(T.P.)+4.0mとする。

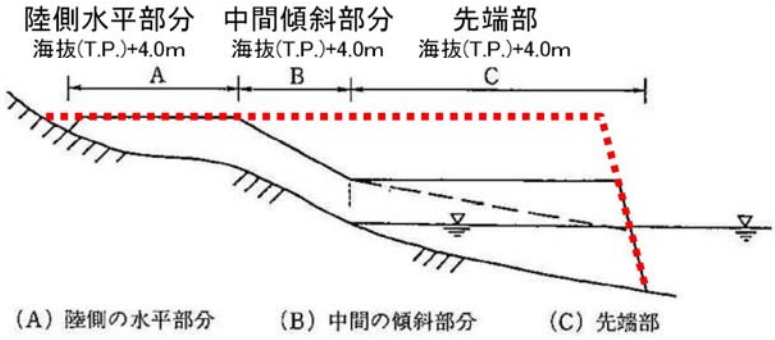

（出典：第 10 回宮崎海岸侵食対策検討委員会，資料 10-Ⅱ，p.21）

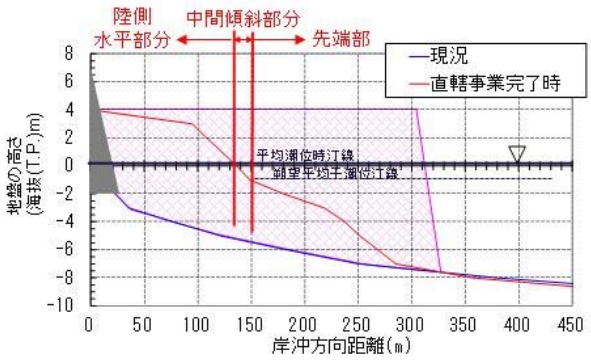

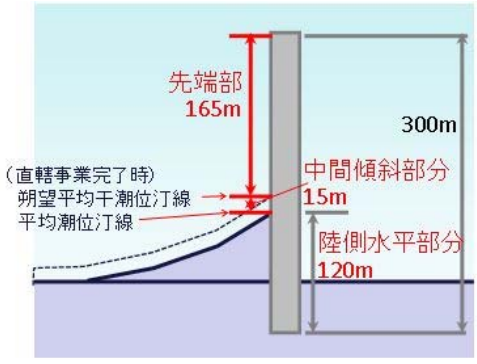

出典：第 10 回宮崎海岸侵食対策検討委員会，参考資料 2，p. 1

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 突堤は、天端被覆ブロックを設置して天端高海抜(T.P.)+4.0m を確保した。巡視時の先端部天端高の測量結果によると、8 月以降、高さの変化は生じておらず範囲内である。
- 補助突堤①は、2016(H28)年 6 月までに天端被覆ブロックを設置して天端高海抜(T.P.)+4.0m を確保した。巡視時の先端部天端高の測量結果によると、8 月以降、高さの変化は生じておらず範囲内である。
- 補助突堤②は、2017(H29)年 2 月までに天端被覆ブロックを設置して天端高海抜(T.P.)+4.0m を確保した。巡視時の先端部天端高の測量結果によると、2 月以降、高さの変化は生じておらず範囲内である。

表－ 3.66　突堤の天端高に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2016(H28)	突堤	2016(H28)年度	範囲内
	補助突堤①		範囲内
	補助突堤②		範囲内

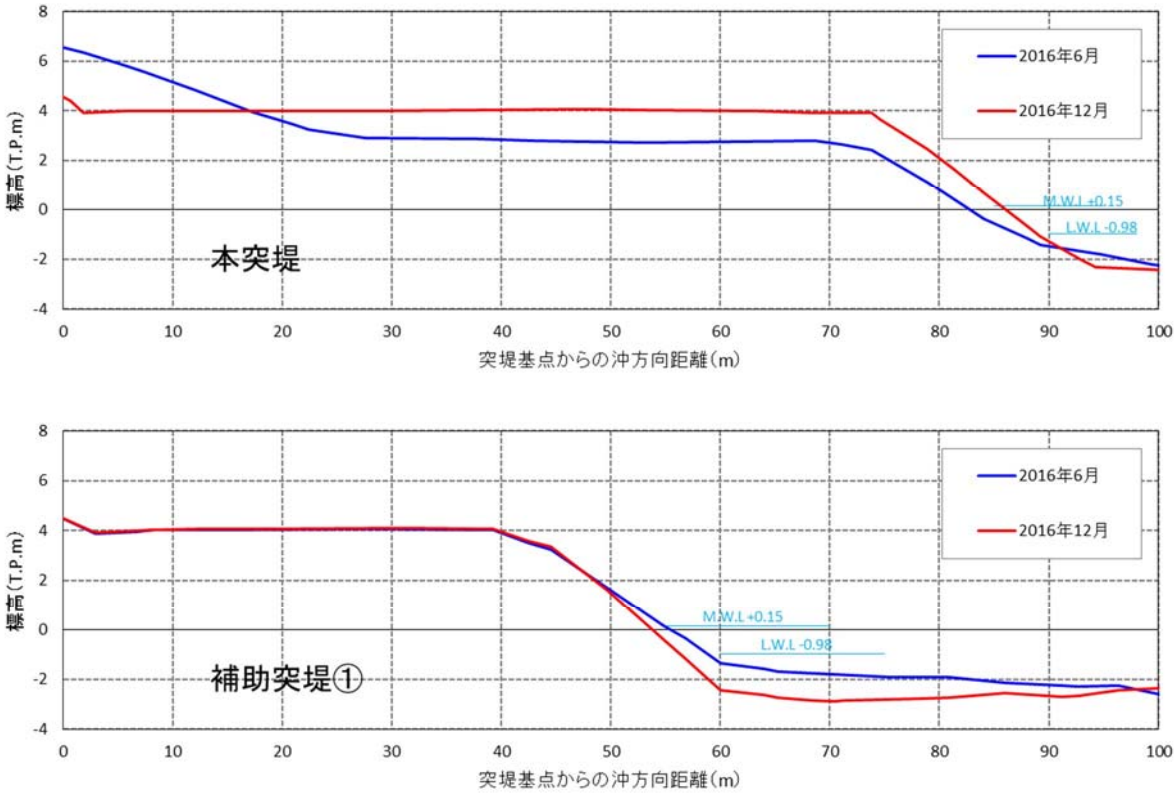

図－ 3.22　突堤天端高の経年変化

2k006　（本突堤）

【平面図】



【縦断図】

※"G"の標高　：　7.092　m　（内、柱石長　：　0.010　m）

読み値	8/30	9/27	10/25	11/29	12/27	1/31	2/28	3/27	単位
G ：	1.355	1.267	1.325	1.412	1.343	1.292	1.323	1.453	(m)
H ：	4.415	4.340	4.390	4.487	4.421	4.355	4.387	4.531	
I ：	4.430	4.354	4.400	4.498	4.435	4.378	4.400	4.544	
H5：	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
H6：	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	

※)"H5=G_Hの差"、"H6=G_Iの差"とし、標高表示とする。
（H28.8.30計測値より経過観察、H5：4.0m、H6：4.0m）
※)読み値"H"、"I"は、被覆ﾌﾞﾛｯｸ肩の高さとする。
※)読み値"G"は、「1級基準点No,22」とする。

3k800　（補助突堤①）

【平面図】



【縦断図】



※"G"の標高　：　7.138　m　（内、柱石長　：　0.010　m）

読み値	8/30	9/27	10/25	11/29	12/27	1/31	2/28	3/27	単位
G ：	1.210	1.084	1.243	1.312	0.400	1.008	0.950	1.455	(m)
H ：	4.315	4.188	4.350	4.415	3.505	4.116	4.050	4.560	
I ：	4.310	4.182	4.345	4.410	3.500	4.113	4.048	4.558	
H5：	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
H6：	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	

※)"H5=G_Hの差"、"H6=G_Iの差"とし、標高表示とする。
（H28.8.30計測値より経過観察、H5：4.0m、H6：4.0m）
※)読み値"H"、"I"は、被覆ﾌﾞﾛｯｸ肩の高さとする。
※)読み値"G"は、「1級基準点No,21」とする。

4k600　（補助突堤②）

【平面図】



【縦断図】



※"G"の標高　：　7.135　m　（内、柱石長　：　0.010　m）

読み値							2/28	3/27	単位
G ：							1.234	1.394	(m)
H ：							4.364	4.542	
I ：							4.362	4.537	
H5：							4.0	4.0	
H6：							4.0	4.0	

※)"H5=G_Hの差"、"H6=G_Iの差"とし、標高表示とする。
（H29.2.28計測値より経過観察、H5：4.0m、H6：4.0m）
※)読み値"H"、"I"は、被覆ﾌﾞﾛｯｸ肩の高さとする。
※)読み値"G"は、「1級基準点No,20」とする。

図－ 3.23　突堤先端部の天端高の変化

≪参考：2015(H27)年度の結果≫

- 突堤の延伸施工中であり天端被覆ブロック未設置であるが、突堤の天端高は設計断面を確保（施工精度の範囲内）している。
- ただし、突堤の先端法面は、設計断面に対して最大 2m 程度沈下している。

表－ 3.67　突堤の天端高に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2015(H27)	突堤	2015(H27)年度	範囲内

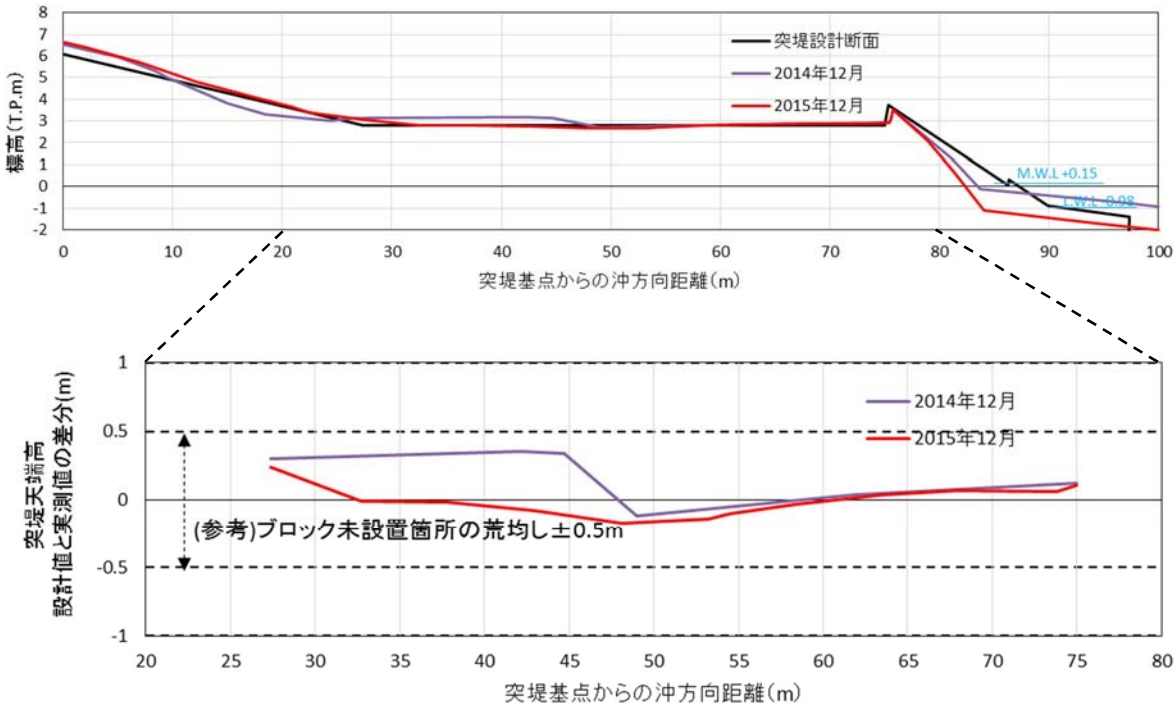

図－ 3.24　突堤天端高の経年変化

≪参考：2014(H26)年度の結果≫

- 突堤の延伸施工中であり天端被覆ブロック未設置であるが、突堤の天端高は設計断面を確保（施工精度の範囲内）できており範囲内である。
- ただし、突堤の先端法面は、設計断面に対して最大 1m 程度沈下している。

表－ 3.67　突堤の天端高に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
2014(H26)	突堤	2014(H26)年度	範囲内

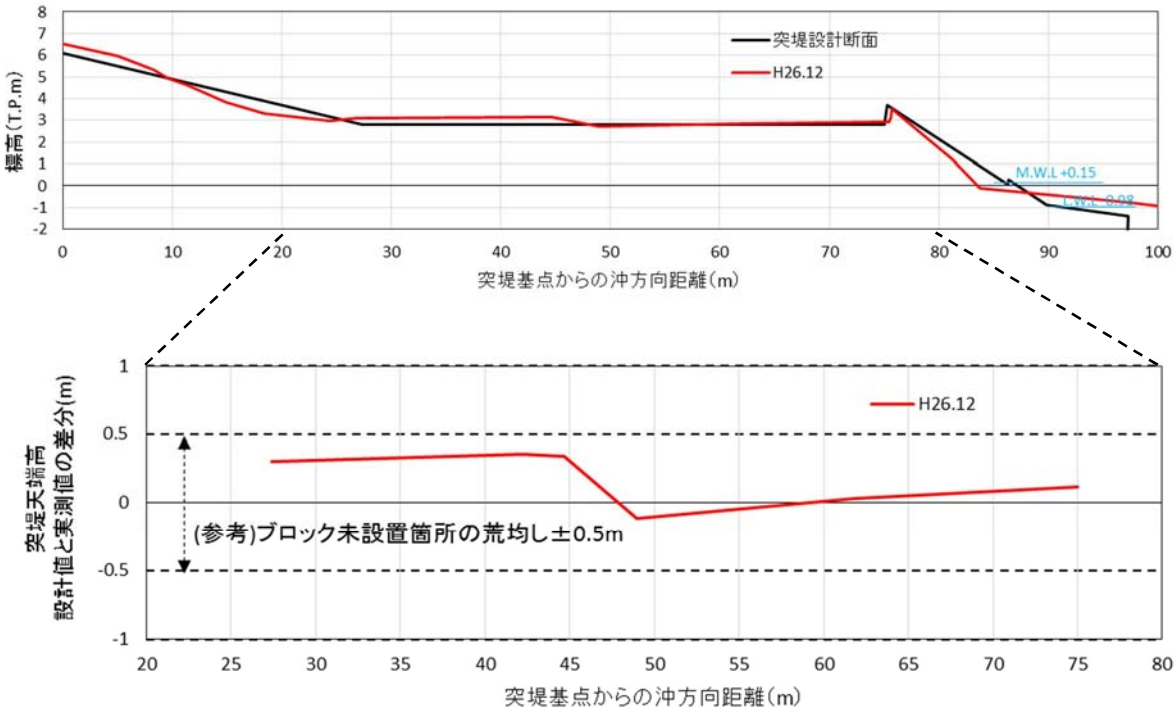

図－ 3.25　突堤天端高の経年変化

3.3.3 埋設護岸

(1) サンドパック天端高

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 埋設護岸の状態

(B) 現象

- 護岸が破損、変状して材料が流出していないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
護岸が破損、変状して材料が流出する。

2) 調査位置

- 埋設護岸設置区間とする。

3) 調査時期

- 前年度対策の効果・影響が年間の高波浪を受けた後の状態を評価するため、当該年度の対策本格化前(11～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 当該年度に実施された測量を用いて、サンドパック上段の天端高(海抜(T.P.)+4m)よりも低くなってしていないかを整理し、指標範囲と比較する。
- サンドパックが露出していない場合は、サンドパック上段中心線位置の地盤高を代用し評価する。

5) 指標範囲の設定

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、サンドパック上段の天端高計画値である海抜(T.P.)+4.0m 及び前年の計測値とし、これを指標範囲とする。

表－ 3.68 サンドパックの天端高に関する指標範囲

	指標範囲 (基準値)
サンドパック上段の天端高計画値	海抜(T.P.)+4.0m
サンドパック上段の前年の計測値	前年の高さ

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 大炊田海岸のサンドパック上段の中心線位置の高さは、機能復旧工事により所要天端高の確保を図った箇所もあるが、一部箇所では計画値よりも低下している箇所があり範囲外↓である。前年との比較は範囲内である。
- 動物園東のサンドパック上段の中心線位置の高さは、災害復旧工事により所要天端高が確保され範囲内である。前年との比較も範囲内である。

表－ 3.69　サンドパックの天端高に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果	
2016(H28)	大炊田海岸	2016(H28)年 12 月	計画値	範囲外↓
			前年計測値	範囲内
2016(H28)	動物園東	2016(H28)年 12 月	計画値	範囲内
			前年計測値	範囲内

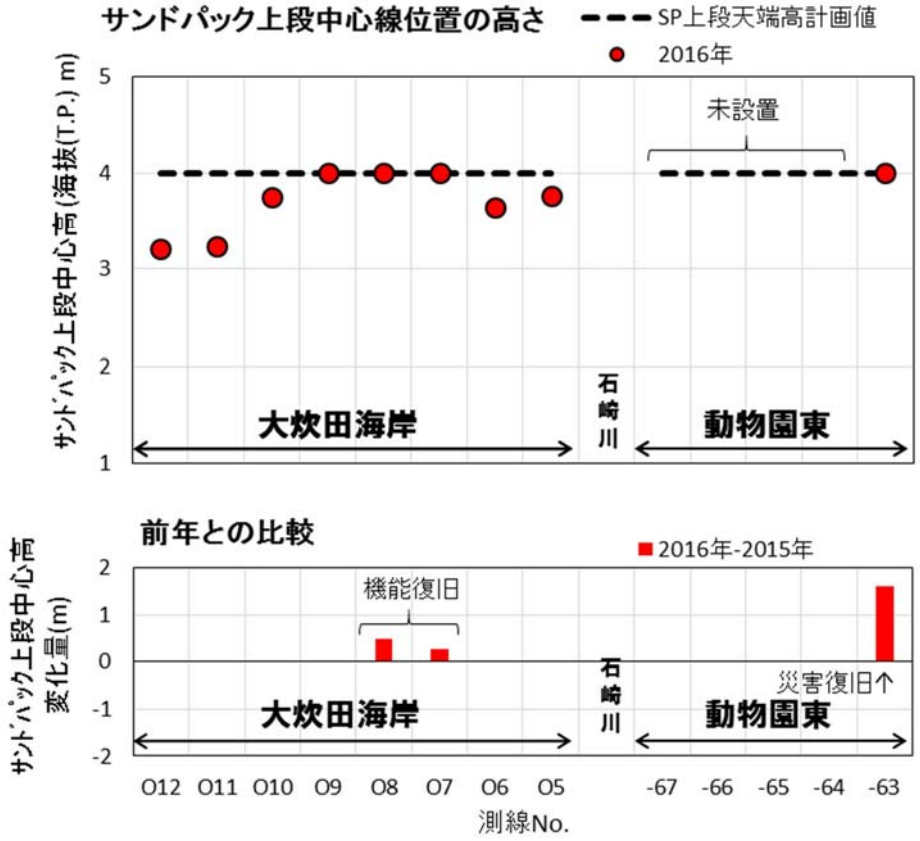

図－ 3.26　サンドパック上段天端高の沿岸分布図

≪参考：2015(H27)年度の結果≫

- 大炊田海岸のサンドパック上段の中心線位置の高さは、サンドパック上段の天端高計画値よりも低下している箇所があり範囲外↓である。また、前年と比較しても低下している箇所があり範囲外↓である。
- 動物園東のサンドパック上段の中心線位置の高さは、サンドパック上段の天端高計画値よりも低下している箇所があり範囲外↓である。

表－ 3.70　サンドパックの天端高に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果	
2015(H27)	大炊田海岸	2015(H27)年 12 月	計画値	範囲外↓
			前年計測値	範囲外↓
2015(H27)	動物園東	2015(H27)年 12 月	計画値	範囲外↓
			前年計測値	評価対象外（2014 年度から設置開始）

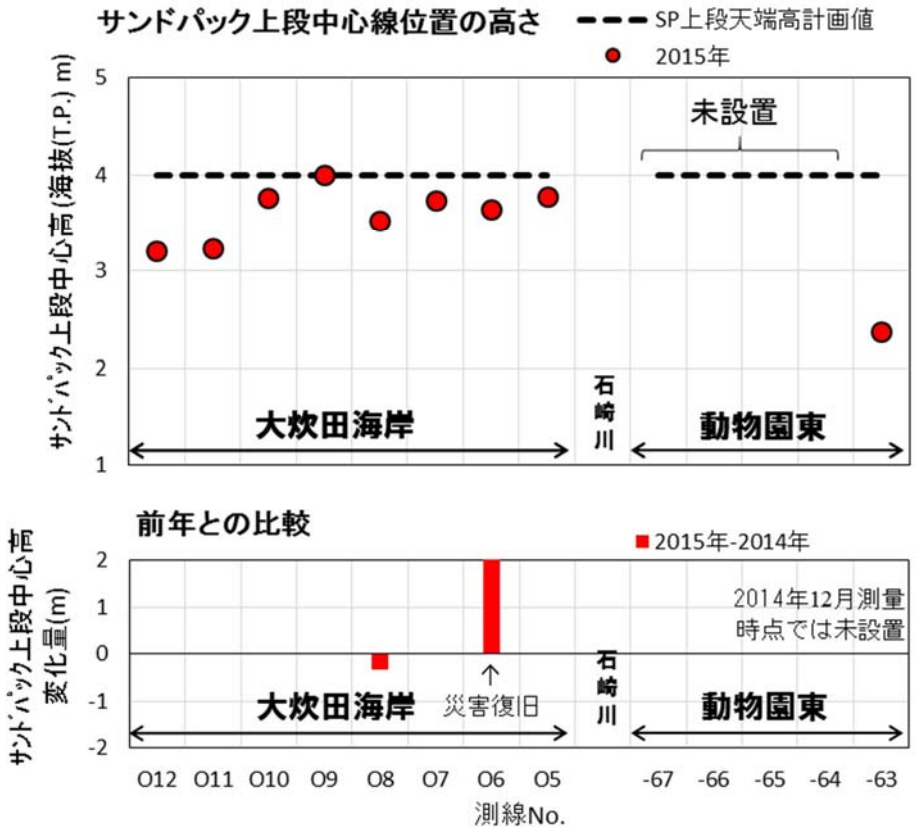

図－ 3.27　サンドパック上段天端高の沿岸分布図

≪参考：2014(H26)年度の結果≫

- 大炊田海岸は、サンドパック上段の天端高が計画値よりも低下している箇所があり範囲外↓である。なお、前年は未設置のため、評価対象外である。
- 動物園東は未設置のため、評価対象外である。

表－ 3.70　サンドパックの天端高に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果	
2014(H26)	大炊田海岸	2014(H26)年 12 月	計画値	範囲外↓
			前年計測値	評価対象外 (H25 年度設置)
2014(H26)	動物園東	2014(H26)年 12 月	計画値	評価対象外 (未設置)
			前年計測値	評価対象外 (未設置)

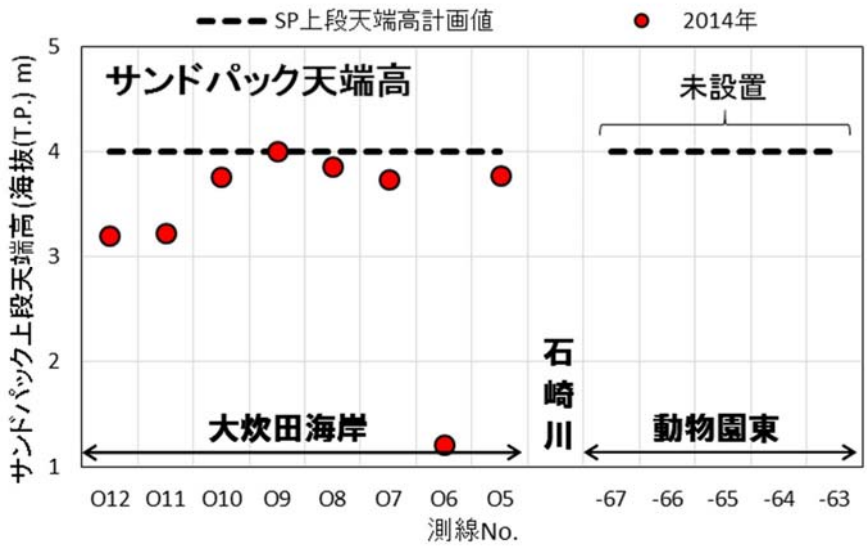

図－ 3.28　サンドパック上段天端高の沿岸分布図

(2) 背後養浜盛土形状

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 浜崖形状の変化
- 護岸越波
- 埋設護岸の状態

(B) 現象

- 波が護岸を越えて浜崖に作用していないか、その可能性は無いか、確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
波が護岸を越えて、浜崖に作用する。

2) 調査位置

- 埋設護岸設置区間とする。

3) 調査時期

- 前年度対策の効果・影響が年間の高波浪を受けた後の状態を評価するため、当該年度の対策本格化前(11～12 月)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 当該年度に実施された測量を用いて、サンドパック背後の養浜盛土形状を整理し、指標範囲と比較する。

5) 指標範囲の設定

- 指標タイプは定性評価とする。
- サンドパックを越波しても浜崖への作用を防止する計画上の背後養浜盛土形状（サンドパック上段中心線を基点として浜崖側に 1/6 勾配で立ち上げた断面地形）が、天然の浜崖よりも海側で確保できているかを指標範囲とする。
- 計画上の背後養浜盛土形状の陸端部の浜崖の高さが、越波対策上必要な高さ(海抜(T.P.)+7m)よりも高いかを指標範囲とする。

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 大炊田海岸は、計画上の背後養浜盛土形状が、天然の浜崖に食い込む箇所があり（No.O6）範囲外↓である。なお、計画上の背後養浜盛土形状の陸端部の浜崖の高さは範囲内である。
- 動物園東は、計画上の背後養浜盛土形状、計画上の背後養浜盛土形状の陸端部の浜崖の高さともに範囲内である。

表－ 3.71　背後養浜盛土形状に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果	
2016(H28)	大炊田海岸	2016(H28)年 12 月	背後養浜盛土形状	範囲外↓
			浜崖の高さ TP+7m 確保	範囲内
2016(H28)	動物園東	2016(H28)年 12 月	背後養浜盛土形状	範囲内
			浜崖の高さ TP+7m 確保	範囲内

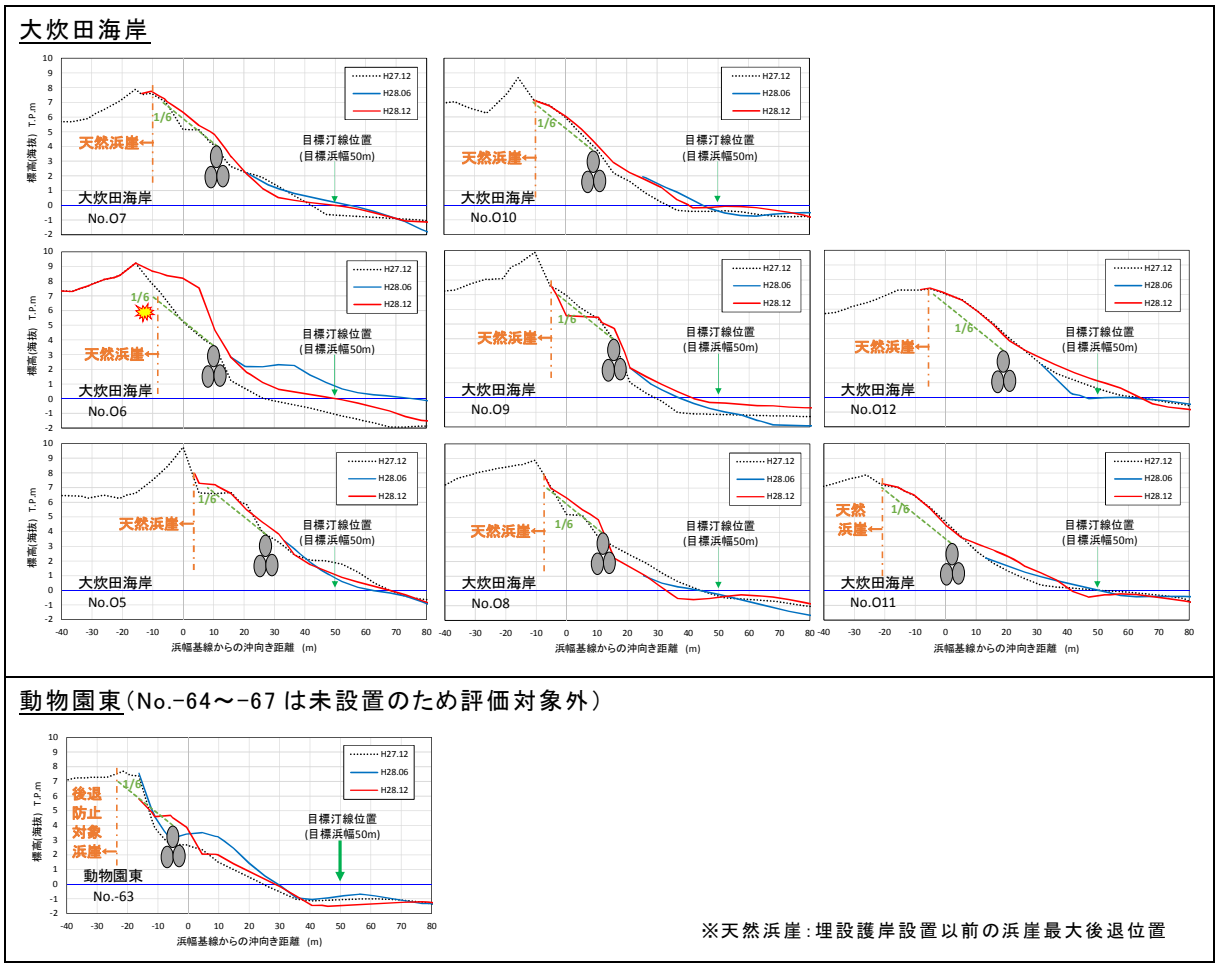

図－ 3.29　サンドパック背後の養浜盛土形状

≪参考：2015(H27)年度の結果≫

- 大炊田海岸は、計画上の背後養浜盛土形状が、天然の浜崖に食い込む箇所があり（No.O6,O8）範囲外↓である。なお、計画上の背後養浜盛土形状の陸端部の浜崖の高さは範囲内である。
- 動物園東は、計画上の背後養浜盛土形状が、天然の浜崖に食い込む箇所があり（No.-63）範囲外↓である。なお、計画上の背後養浜盛土形状の陸端部の浜崖の高さは範囲内である。

表－ 3.71　背後養浜盛土形状に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果	
2015(H27)	大炊田海岸	2015(H27)年 12 月	背後養浜盛土形状	範囲外↓
			浜崖の高さ TP+7m 確保	範囲内
2015(H27)	動物園東	2015(H27)年 12 月	背後養浜盛土形状	範囲外↓
			浜崖の高さ TP+7m 確保	範囲内

大炊田海岸

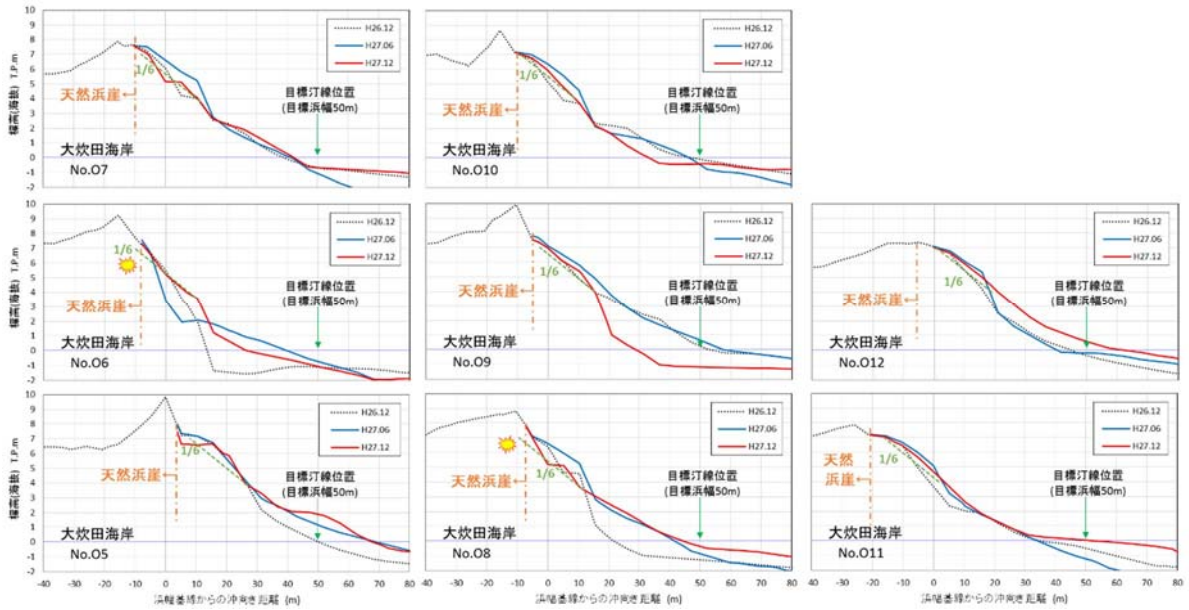

動物園東（No.-64～-67 は未設置のため評価対象外）



※天然浜崖：埋設護岸設置以前の浜崖最大後退位置

図－ 3.30　サンドパック背後の養浜盛土形状

≪参考：2014(H26)年度の結果≫

- 大炊田海岸は、計画上の背後養浜盛土形状が、天然の浜崖に食い込む箇所があり（No.O6）範囲外↓である。なお、計画上の背後養浜盛土形状の陸端部の浜崖の高さは範囲内である。
- 動物園東は未設置のため、評価対象外である。

表－ 3.72　背後養浜盛土形状に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果	
2014(H26)	大炊田海岸	2014(H26)年 12 月	背後養浜盛土形状	範囲外↓
			浜崖の高さ TP+7m 確保	範囲内
2014(H26)	動物園東	2014(H26)年 12 月	背後養浜盛土形状	評価対象外（未設置）
			浜崖の高さ TP+7m 確保	評価対象外（未設置）

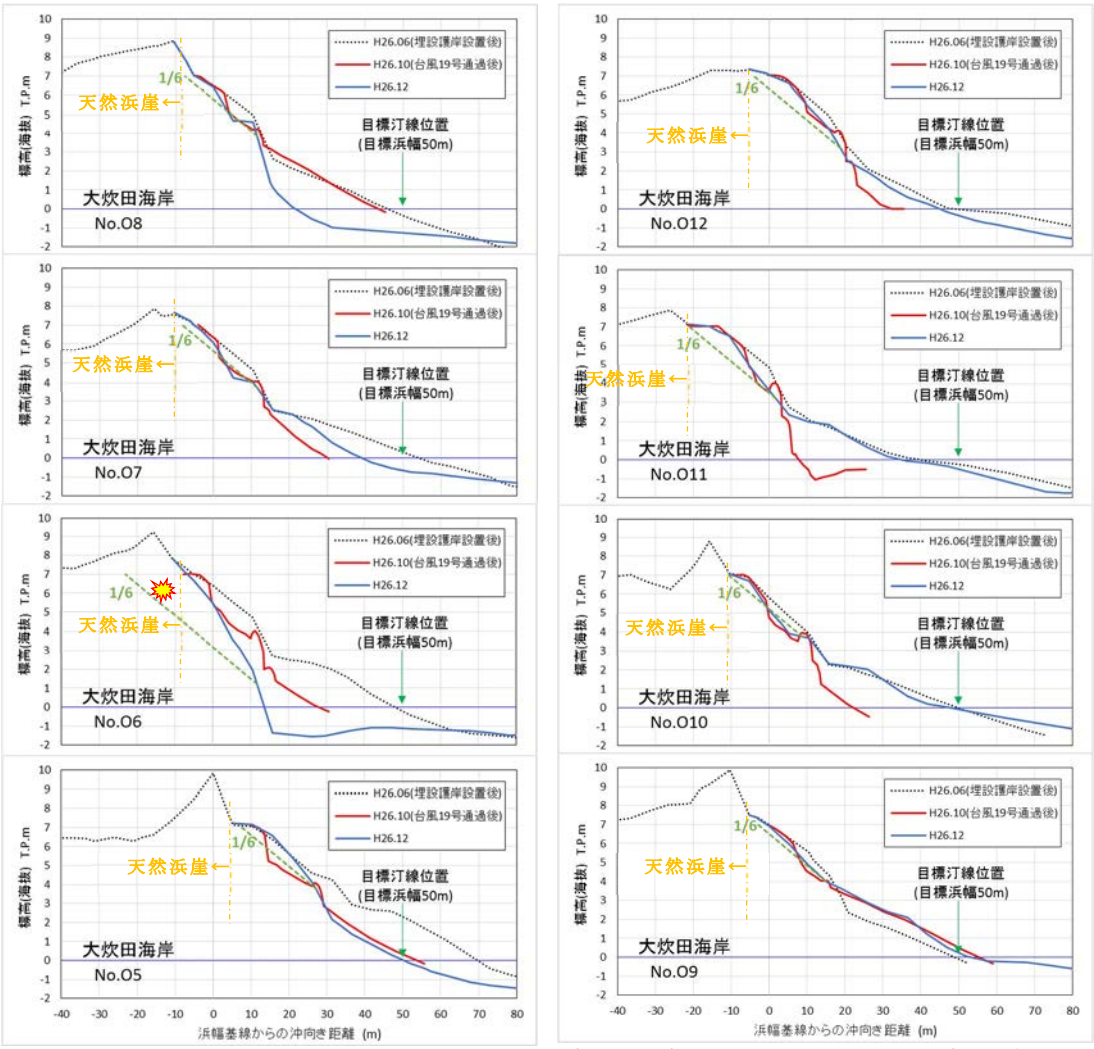

※天然浜崖：埋設護岸設置 2013(H25)年度以前の浜崖最大後退位置

図－ 3.31　サンドパック背後の養浜盛土形状

(3) サンドパックの露出状況

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 埋設護岸の状態

(B) 現象

- 覆土地形が流出して護岸が露出していないか、確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
覆土地形が流出して、護岸が露出する。

2) 調査位置

- 埋設護岸設置区間とする。

3) 調査時期

- 埋設護岸施工後の巡視時とする。

4) 調査結果の整理方法

- 巡視時の定点撮影写真から、①サンドパック露出，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)，③アスファルトマット露出，④サンドパック変状状況を整理し、指標範囲と比較する。

5) 指標範囲の設定

- 指標タイプは定性評価とする。
- ①サンドパック露出の有無，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)の有無，③アスファルトマット露出の有無,④サンドパック変状の有無を指標範囲とする。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 大炊田海岸は、応急復旧工事が終了した 7 月以降、①サンドパック露出は確認されたため範囲外↓であるが，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)，③アスファルトマット露出,④サンドパック変状は確認されなかったため範囲内である。
- 動物園東の埋設護岸設置区間は、①サンドパック露出，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)，③アスファルトマット露出，④サンドパック変状すべて確認され、範囲外↓である。

表－ 3.73　サンドパックの露出等の状況に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果	
2016(H28)	大炊田海岸	2016(H28)年 4 月 14 日 ～ 2017(H29)年 3 月 27 日	①ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ露出	範囲外↓
			②ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ背後養浜材流出(越波痕跡)	範囲内
			③ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ露出	範囲内
			④ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ変状	範囲内
2016(H28)	動物園東	2016(H28)年 4 月 14 日 ～ 2017(H29)年 3 月 27 日	①ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ露出	範囲外↓
			②ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ背後養浜材流出(越波痕跡)	範囲外↓
			③ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ露出	範囲外↓
			④ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ変状	範囲外↓

表－ 3.74　巡視時の定点撮影写真によるサンドパックの露出等の状況

＜大炊田海岸＞

チェック項目：①サンドパック露出，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)，③洗掘防止工露出，④サンドパック変
■：巡視時の写真よりチェック項目で該当するもの

	10k000				9k800				9k600				9k400				9k200				9k000				8k800				8k600				8k400				備考
	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	
4月14日																	■			■	■			■	覆土工埋設												
4月20日																	■			■	■			■													
4月28日																	■			■	■			■													
5月6日																	■			■	■			■													
5月12日																	■			■	■			■													
5月18日																	■			■	■			■													
5月24日																	■			■	応急復旧工事															
5月31日																	■			■	応急復旧工事															
6月8日	■																■			■	応急復旧工事															
6月14日	■																■			■	応急復旧工事															
6月22日	■																応急復旧工事				応急復旧工事															
6月28日	■												■				覆土工埋設				覆土工埋設															
7月5日	自然覆土埋設												■				覆土工埋設				覆土工埋設															
7月12日													■																							
7月19日													■																							
7月26日													■																							
8月2日													■																							
8月9日													■																							
8月16日													■																							
8月24日													■																							
8月30日													■																							
9月5日													■																							
9月13日													■																							r
9月21日													■				■				■															
9月27日	■												■				■				■															
10月6日	■												■				■				■															
10月12日	■												■				■				■															
10月18日	■												■				■				■															
10月25日	■								■				■				■				■															
11月1日	■								■				■				■				■															
11月8日	■								■				■				■				■															
11月15日	■								■				■				■				■								■							
11月22日	■								■				■				■				■								■							
11月29日	■								■				■				■				■								■							
12月6日	■								■				■				■				■								■							
12月14日	■								■				■				■				■								■							
12月20日	■								■				■				■				■								■							
12月27日	■								覆土工埋設				■				■				■								■							
1月5日	■												■				■				■								■							
1月11日	■												■				■				■								自然覆土埋設							
1月17日	■												■				■				■															
1月24日	■												■				■				■															
1月31日	■												■				■				■															
2月7日	■												■				■				■															
2月14日	自然覆土埋設												■				■				覆土工埋設															
2月21日													覆土工埋設				覆土工埋設																			全区間埋設
2月28日																																				全区間埋設
3月7日																																				全区間埋設
3月14日																																				全区間埋設
3月21日																																				全区間埋設
3月27日																																				全区間埋設

10k000	9k800	9k600	9k400	9k200	9k000	8k800	8k600	8k400
大炊田②			大炊田①					



＜動物園東＞

チェック項目：①サンドパック露出，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)，③洗掘防止工露出，④サンドパック変状

■：巡視時の写真よりチェック項目で該当するもの　　：埋設護岸未設置

	5k400				5k200				5k000				4k800				4k600				4k400				備考
	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	
4月14日																	■				■	■		■	
4月20日																	■				■	■		■	
4月28日																	■				■	■		■	
5月6日																	■				■	■		■	
5月12日																	■				■	■		■	
5月18日																	■				南端復旧工事				浜山護岸隣接の1,2工区
5月24日																	■				南端復旧工事				浜山護岸隣接の1,2工区
5月31日																	■				南端復旧工事				浜山護岸隣接の1,2工区
6月8日																	■				南端復旧工事				浜山護岸隣接の1,2工区
6月14日																	■				南端復旧工事				浜山護岸隣接の1,2工区
6月22日																	■				南端復旧工事				浜山護岸隣接の1,2工区
6月28日																	■				■			■	
7月5日																	■				■			■	
7月12日																	■				■		■	■	
7月19日																	■				■		■	■	
7月26日																	覆土工埋設				■		■	■	
8月2日																					■		■	■	
8月9日																	■				■		■	■	
8月16日																	■				■		■	■	
8月24日																	■				■		■	■	
8月30日																	■				■		■	■	
9月5日																	■		■		■		■	■	
9月13日																	■				■		■	■	
9月21日																	■				■		■	■	
9月27日																	■		■		■		■	■	
10月6日																	■		■		■		■	■	
10月12日																	■		■		■		■	■	
10月18日																	■	■			■			■	
10月25日																	■				復旧工事				3工区
11月1日																	■				復旧工事				3工区
11月8日																	■				復旧工事				3工区
11月15日																	■				復旧工事				3工区
11月22日																	■				復旧工事				3工区
11月29日																	■		■		復旧工事				3工区
12月6日																	■		■		復旧工事				3工区
12月14日																	■		■		復旧工事				3工区
12月20日																	■		■		復旧工事				3工区
12月27日																	■		■		復旧工事				3工区
1月5日																	■								
1月11日																	■								
1月17日																	■								
1月24日																	■								
1月31日																	■								
2月7日																	設置工事								里道前面
2月14日																	設置工事								里道前面
2月21日																	設置工事								里道前面
2月28日																	設置工事								里道前面
3月7日																	設置工事								里道前面
3月14日																	設置工事								里道前面
3月21日																	設置工事								里道前面
3月27日																	設置工事								里道前面
	5k400				5k200				5k000				4k800				4k600				4k400				
	動物園東②												動物園東①												



≪参考：2015(H27)年度の結果≫

- 大炊田海岸は、①サンドパック露出，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)，③アスファルトマット露出，④サンドパック変状すべて確認され、範囲外↓である。
- 動物園東の埋設護岸設置区間は、①サンドパック露出，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)，③アスファルトマット露出，④サンドパック変状すべて確認され、範囲外↓である。

表－ 3.74　巡視時の定点撮影写真によるサンドパックの露出等の状況

＜大炊田海岸＞

チェック項目：①サンドパック露出，②サンドパック背後養浜材流出(越波痕跡)，③アスファルトマット露出，④サンドパック変状
■：巡視時の写真よりチェック項目で該当するもの

	10k000				9k800				9k600				9k400				9k200				9k000				8k800				8k600				8k400				備考
	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	①	②	③	④	
4月22日	■																				■				■			■	■			■	■			■	
5月1日	■																■				覆土工埋設				■			■	■			■	■			■	
5月7日	■																覆土工埋設				■				■			■	■			■	■			■	
5月14日	■																■				■				■			■	■			■	■			■	
5月20日	■																■				■				覆土工埋設			■	■			■	■			■	
5月27日	■																■				■				■			■	■			■	■			■	
6月3日	■																■				■				■			■	■			■	■			■	
6月10日	■																■				■				復旧工事			■	復旧工事			■	■			■	
6月17日	■																■				■				復旧工事			■	復旧工事			■	■			■	
6月24日	■				■												■				■				復旧工事			■	復旧工事			■	■			■	
7月1日	■				■												■				■				復旧工事			■	復旧工事			■	■			■	
7月7日	■				■												■				■				復旧工事			■	復旧工事			■	■			■	
7月13日	■				■				■								■				■				■			■	■			■	■			■	
7月22日	■				■				■								■				■				■		■	■	■			■	■			■	
7月29日	■				■												■				■				■			■	■			■	■			■	
8月5日	■																■				■				■			■	■			■	■			■	
8月12日	■				■								■				■				■		■		■			■	■			■	■			■	
8月19日	■				■								■				■		■		■				■			■	■			■	■			■	
8月26日	■								■				■				■		■	■	■		■		■			■	■			■	■			■	
9月4日	自然覆土埋設								■								■	■	■	■	■		■	■	■			■	■			■	■			■	
9月9日									■								■	■	■	■	■		■	■	■			■	■			■	■			■	
9月16日					■				■				■				■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■			■	■			■	
9月25日					自然覆土埋設				■				■				■	■	■	■	■		■	■	■			■	■			■	■			■	
9月30日									■				■				■	■	■	■	■		■	■	■			■	■			■	■			■	
10月7日									■				■				■	応急復旧			■	応急復旧			■			■	■			■	■			■	
10月14日									■				■				■	■			■	■			■			■	■			■	■			■	
10月21日									■				■				■	■			■	■			■			■	■			■	■			■	
10月28日									■				■				■	■	■		■	覆土工埋設			■			■	■			■	■			■	
11月4日									■				■		■		■	■	■		■	■			■			■	■			■	■			■	
11月11日									■				■		■		■	■	■		■	■			■			■	■			■	■			■	
11月19日									■				■		■		■	■	■		■	■			■			■	■			■	復旧工事			■	
11月25日									■				■		■		■	■	■		■	■			■			■	■			■	復旧工事			■	
12月2日									■				■		■		■	■	■		■	■			■			■	■			■	復旧工事			■	
12月9日									■				■		■		■	■	■		■	■			■			■	復旧工事			■	復旧工事			■	
12月17日									■				■		■		■	■	■		■	■			■			■	復旧工事			■	復旧工事			■	
12月24日									覆土工埋設				■		■		■	■	■		■	■			■			■	復旧工事			■	復旧工事			■	
12月28日													■		■		■	■	■		■	■			■			■	復旧工事			■	復旧工事			■	
1月5日													■		■		■	■	■		■	■			■			■				■	復旧工事			■	
1月13日													■		■		■	■	■		■	■			■			■				■	復旧工事			■	
1月20日													■		■		■	■	■		■	■			■			■				■				■	
1月28日													■		■		■	■	■		■	■			■			■	覆土工埋設							■	
2月3日													■		■		■	■	■		■	■			■			■								■	
2月10日													■		■		■	■	■		■	■			■			■								■	
2月19日													覆土工埋設				■	■	■		■	■			■			■								■	
2月24日																	■	■	■		■	■			■			■								■	
3月2日																	■	■	■		■	■			■			■								■	
3月10日																	覆土工埋設				■	■			■			■								■	
3月16日																	■				■	■			■			■								■	
3月23日																	■				■	■			■			■								■	
3月29日																	■				■	■			■			■								■	
	10k000				9k800				9k600				9k400				9k200				9k000				8k800				8k600				8k400				



表－ 3.73　サンドパックの露出等の状況に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果	
2015(H27)	大炊田海岸	2015(H27)年 4 月 22 日 ～ 2016(H28)年 3 月 29 日	①ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ露出	範囲外↓
			②ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ背後養浜材流出(越波痕跡)	範囲外↓
			③ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ露出	範囲外↓
			④ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ変状	範囲外↓
2015(H27)	動物園東	2015(H27)年 4 月 22 日 ～ 2016(H28)年 3 月 29 日	①ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ露出	範囲外↓
			②ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ背後養浜材流出(越波痕跡)	範囲外↓
			③ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ露出	範囲外↓
			④ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ変状	範囲外↓

＜動物園東＞

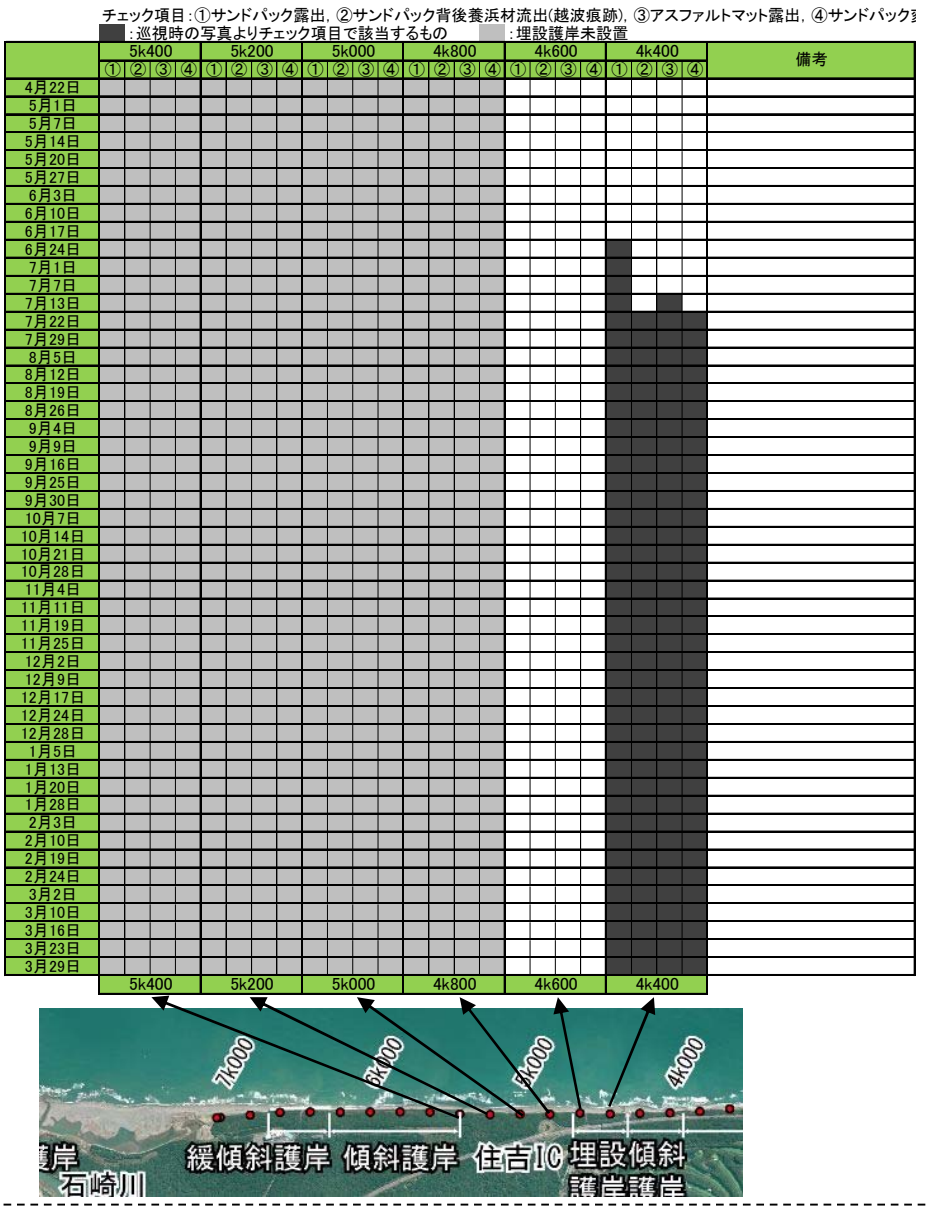

≪参考：2014(H26)年度の結果≫

- 大炊田海岸は、計画上の背後養浜盛土形状が、天然の浜崖に食い込む箇所があり範囲外↓である。なお、計画上の背後養浜盛土形状の陸端部の浜崖の高さは範囲内である。
- 動物園東は未設置のため、評価対象外である。

表－ 3.75　サンドパックの露出等の状況に関する指標範囲との比較結果

年度	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果	
2014(H26)	大炊田海岸	2014(H26)年 4 月 22 日 ～ 2015(H27)年 3 月 25 日	①ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ露出	範囲外↓
			②ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ背後養浜材流出(越波痕跡)	範囲外↓
			③ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ露出	範囲外↓
			④ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ変状	範囲外↓
2014(H26)	動物園東	2014(H26)年 4 月 22 日 ～ 2015(H27)年 3 月 25 日	①ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ露出	評価対象外（未設置）
			②ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ背後養浜材流出(越波痕跡)	評価対象外（未設置）
			③ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ露出	評価対象外（未設置）
			④ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ変状	評価対象外（未設置）

表－ 3.76　巡視時の定点撮影写真によるサンドパックの露出等の状況

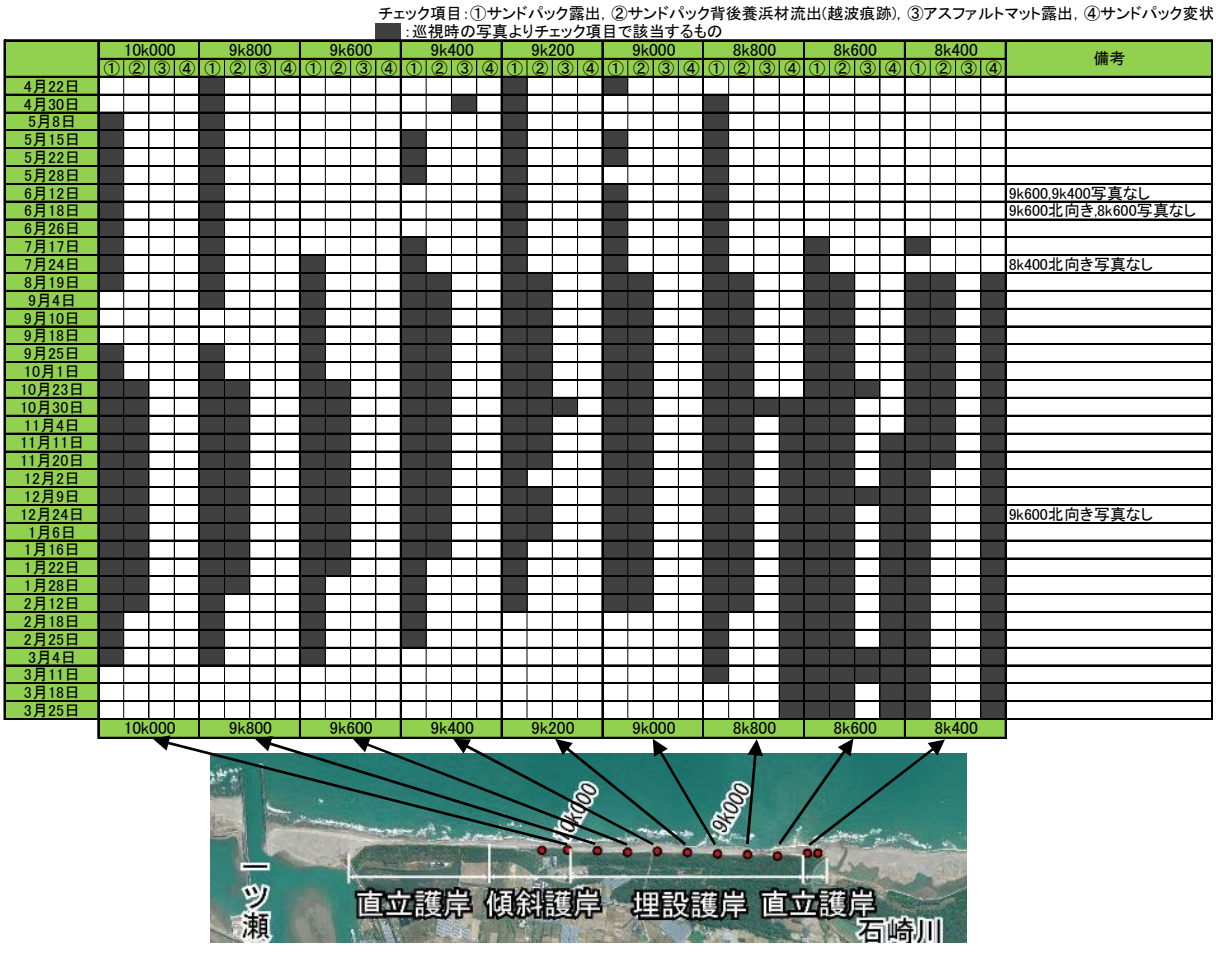

第4章　環境・利用における指標設定及び分析すべき指標の洗い出し

4.1 水　質 4-3
4.1.1 水質調査(汀線部・海中部) 4-3
4.1.2 水質調査(カメラ監視) 4-8
4.2 底　質 4-12
4.2.1 底質調査（粒度試験） 4-12
4.2.2 底質調査（有機物調査） 4-32
4.2.3 養浜材調査 4-36
4.3 浮遊生物、付着生物、幼稚仔 4-40
4.3.1 浮遊生物調査 4-40
4.3.2 付着生物調査 4-44
4.3.3 幼稚仔調査 4-60
4.4 底生生物 4-68
4.4.1 沿岸全域 4-68
4.4.2 石崎川河口域 4-96
4.5 魚介類 4-98
4.5.1 魚介類調査（地元漁法による採取） 4-98
4.5.2 魚介類調査（大型サーフネットによる採取） 4-118
4.5.3 潜水目視観察 4-128
4.5.4 漁獲調査 4-132
4.6 植　物 4-134
4.6.1 植生断面調査 4-134
4.6.2 植物相調査・植生図作成調査 4-138
4.7 昆　虫 4-142
4.8 鳥　類 4-144
4.8.1 鳥類調査 4-144
4.8.2 コアジサシ利用実態調査 4-146
4.9 アカウミガメ 4-150
4.9.1 アカウミガメ上陸実態調査 4-150
4.9.2 固結調査 4-155
4.10 利用 4-157
4.10.1 漁船による操船調査 4-157
4.10.2 海岸巡視 4-159
4.10.3 利用調査 4-164
4.11 景　観 4-166
4.11.1 視点場からの目視および写真撮影 4-164
4.11.2 ヒアリング・アンケート等 4-172
4.12 市民意見 4-184

4.1 水　質

4.1.1 水質調査（汀線部・海中部）

第 2 回効果検証分科会における「調査の効率化」で 2013(H25)年度より当面調査を実施しないこととなった。

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 水質（濁度、SS）

(B) 現象

- 養浜投入後の土砂の拡散状況を海水の濁り方から調査し、既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
海水の濁り方が既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 当該年度の養浜施工箇所周辺(汀線際、海中部)とする。

3) 調査時期

- 工事中の濁り状況と、その後の濁りの拡散状況を把握するため、当該年度の養浜工事中及び工事前後に 3 回/年以上とする。
- 工事中に影響の出る項目であるため、当該年度の調査結果を解析する。

4) 調査結果の整理方法

- 陸上養浜施工箇所周辺において、工事前(11 月～12 月上旬)、工事実施日と翌日朝(×2)、工事後(3 月)に汀線際バケツ採水、分析(SS、濁度)を実施する。その結果を整理し、指標範囲と比較する。
- 海中部施工箇所において、工事中、採水器による海中養浜周囲の採水、分析(SS、濁度)を実施する。その結果を整理し、指標範囲と比較する。なお、既往調査結果から海中養浜は濁りの拡散が早いことが分かっているため、工事前、工事後の調査は実施しない。また、下層のみ濁度が大きくなる現象が確認されているため、深度に応じた調査を実施する。
- なお、調査が施工箇所前面海域を対象としているため、1km 程度のブロック毎の解析は実施しない。

5)　指標に設定する範囲

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 陸上養浜施工箇所周辺における指標に設定する範囲は、汀線際バケツ採水による水質調査を開始した 2009(H21)年度から 2011(H23)年度の水質調査結果より、濁度及び SS 値の平均値、最小値、最大値を採取タイミング(下図)別に整理し、既往調査の最大値とする。なお、振れ幅は設定しない。

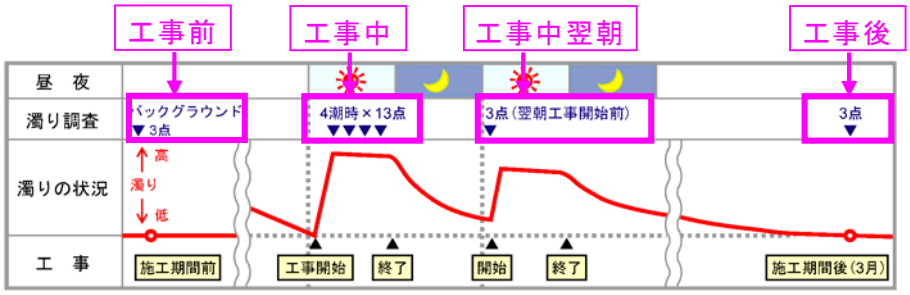

図－ 4.1　採水のタイミング

- 海中部施工箇所における指標に設定する範囲は、水質調査を開始した 2008(H20)年度から 2011(H23)年度の海中養浜実施地点での水質調査結果より、濁度及び SS 値の平均値、最小値、最大値を水深区分別に整理し、既往調査の最大値とする。
- なお、小丸川(重木観測所)の濁度連続観測結果を整理し、自然状態で起こりうる濁度も指標範囲の参考値とする。

表－ 4.1　既往調査結果の最大値（陸上養浜）

	工事前	工事中	工事中翌朝	工事後	(参考)小丸川 重木観測点
濁度(度)	30.5	788.0	43.4	24.9	1999.9
SS(mg/L)	72.3	1868.9	77.0	44.0	

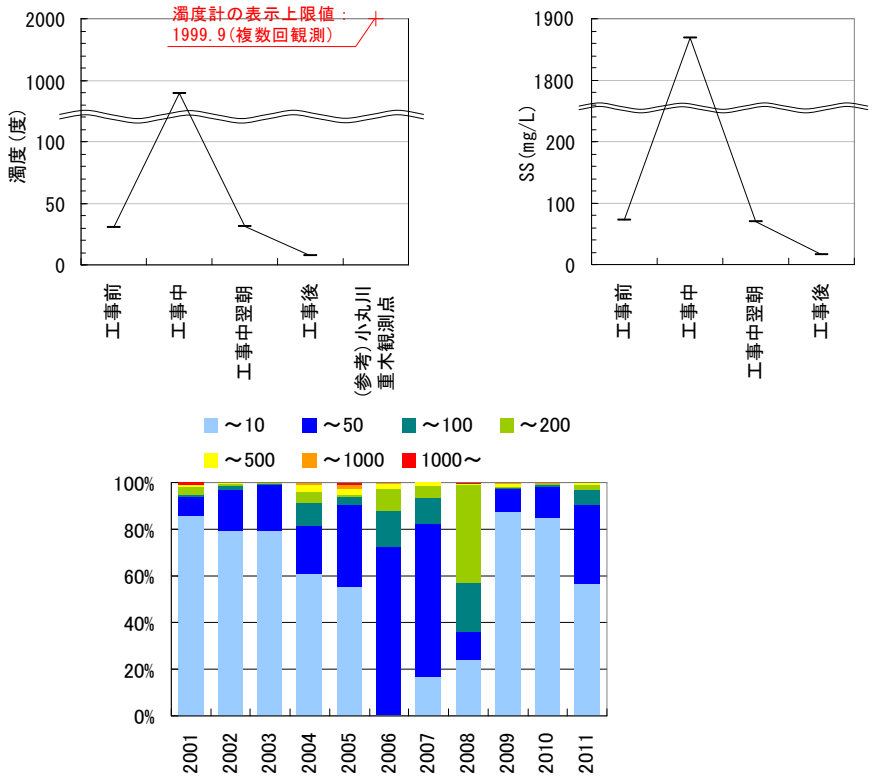

図－ 4.2　小丸川(重木観測所)で観測された濁度の分布

表－ 4.2　濁度・ＳＳの既往調査結果の最大値（海中養浜）

	上層	中層	下層
濁度(度)	65.2	72.7	149.8
SS(mg/L)	164.0	182.0	376.0

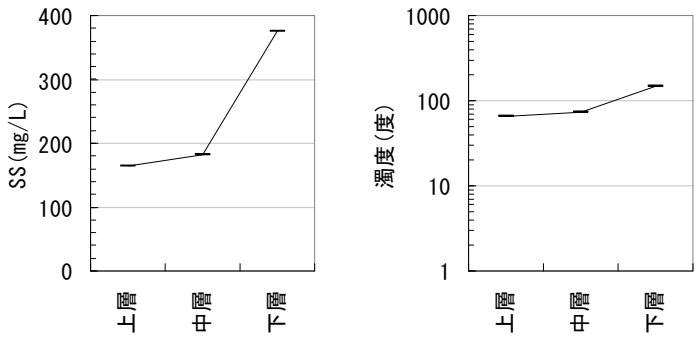

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は調査非実施である。

（2012(H24)年度の結果）

- 2012(H 24)年度は、調査結果と指標範囲の比較結果より、大炊田海岸の工事中翌朝において、濁度が範囲外↑となった。

表－ 4.3　水質(汀線部・海中部)に関する指標範囲との比較結果

	調査位置	調査実施状況	指標範囲	調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
水質調査	大炊田海岸	2011(H23)年度冬 2012(H24)年度冬	下表参照	下表参照	範囲外↑
	動物園東	2011(H23)年度冬	下表参照	下表参照	範囲外↑
	突堤施工箇所	2012(H24)年度冬	下表参照		範囲内

表－ 4.4　水質(汀線部・海中部)に関する指標範囲との採水時期毎の比較結果

大炊田海岸

		工事前	工事中	工事中翌朝	工事後	(参考)小丸川重木観測点
濁度(度)	設定範囲	30.5	788.0	30.9	7.6	1999.9
	2011(H23)年	27.2	41.1	43.4	24.9	－
	2012(H24)年	33.4	179.2	37.4	5.3	
SS(mg/L)	設定範囲	72.3	1868.9	69.3	17.0	－
	2011(H23)年	48.0	73.0	77.0	44.0	－
	2012(H24)年	58.6	314.6	65.7	9.3	

動物園東

		工事前	工事中	工事中翌朝	工事後	(参考)小丸川重木観測点
濁度(度)	設定範囲	30.5	788.0	30.9	7.6	1999.9
	2011(H23)年	20.7	18.8	20.1	12.9	－
SS(mg/L)	設定範囲	72.3	1868.9	69.3	17.0	－
	2011(H23)年	41.0	37.0	40.0	25.0	－

突堤施工箇所

		工事前	工事中	工事中翌朝	工事後	(参考)小丸川重木観測点
濁度(度)	設定範囲	30.5	788.0	30.9	7.6	1999.9
	2012(H24)年	13.8	27.7	17.5	7.3	－
SS(mg/L)	設定範囲	72.3	1868.9	69.3	17.0	－
	2012(H24)年	20.3	40.7	25.6	10.7	－

既往調査結果工事中最大　SS 値

1868.9mg/L

(石崎浜　2011(H 23)年 1 月 26 日)

図－ 4.3　工事中最大濁度観測時の状況

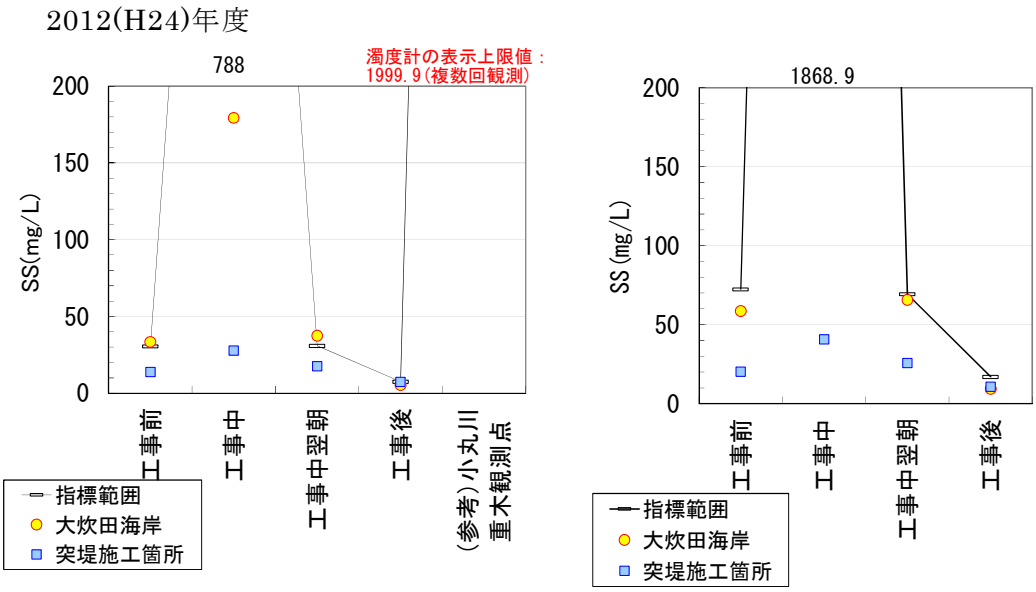

図－ 4.4　濁度・ＳＳの指標範囲と実測値の比較

4.1.2　水質調査（カメラ監視）

第 2 回効果検証分科会における「調査の効率化」で 2013(H25)年度より当面調査を実施しないこととなった。

1)　調査結果で確認する指標と現象

(A)　指標

- 水質（海色）

(B)　現象

- 海水の濁り方が時間的、空間的にどのように変化しているかを把握し、採水の水質調査の補間データとする。

計画変更につながる可能性がある現象
海水の濁り方が既往の調査結果と異なる。

2)　調査位置

- 県離岸堤北端～一ツ瀬川とするが、特に養浜実施位置を注視する。

3)　調査時期

- 当該年度の養浜実施期間に、1 回/日とする。

4)　調査結果の整理方法

- 一ツ葉ライブカメラ等を用いて日常監視を行う。
- また、カメラ画像から海水面の色調を確認し、既往調査結果と比較する。

5)　指標範囲の検討

- 指標に設定する範囲は、設定せずに画像を蓄積し必要に応じて検討に使用する。

図－ 4.5　2010(H22)年度の水質調査(カメラ監視)結果の例

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は調査非実施である。

(2012(H24)年度の結果)

- 2012(H24)年度の観測状況を表－ 4.5 に示す。

表－ 4.5 カメラ監視による水質の観察状況(2012(H24)年度)

水質調査	調査位置	指標範囲	2012(H24)年度 観測状況
カメラ監視	一ツ瀬川～宮崎港	なし	・今年度工事を行った大炊田海岸の視認性はあまり明瞭ではないこともあって濁りはほぼ視認されなかったが、突堤部周辺は突堤基部脇への養浜工事時（2013(H25)年 2 月上旬）などにおいて濁りが視認された。 ・突堤部で濁りが視認された時期は、2 月 5 日に 23mm の降雨があり、それとの関係性も考えられた。降雨と突堤箇所における濁りの関係性は、まとまった降雨が発生する上半期において確認することが望ましいが、この辺り一帯の護岸天端の中では当地だけがコンクリート打設がなく植物もない裸地状になっているため、そこが濁りの発生源になっている可能性も推測され、海岸工事とは関係性がない一面も考えられた。

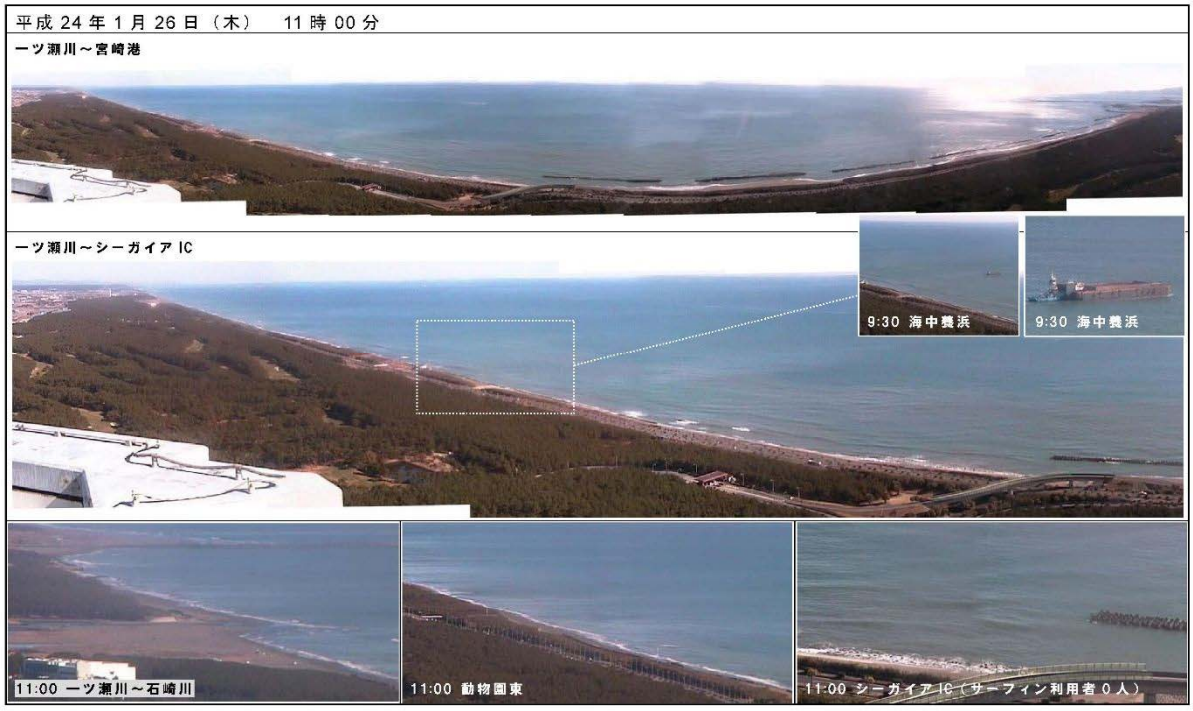

図－ 4.6　2011(H23)年度の水質調査(カメラ監視)結果の例

図－ 4.7　2012(H24)年度の水質調査(カメラ監視)結果の例

4.2 底　質

4.2.1 底質調査（粒度試験）

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 底質（粒度組成、粒径）

(B) 現象

- 底質粒度組成が、既往の調査結果と異なっていないか把握する。また、小丸川・一ツ瀬川の河口周辺の底質粒度組成が、既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
底質粒度組成が、既往の調査結果と異なる。
小丸川・一ツ瀬川の火口周辺の地形及び土砂量の変化速度が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 底質は底生生物との関連性が予想されるため、底生生物調査(広域及び施工箇所周辺)実施地点では同時に実施する。また、宮崎海岸の基礎調査として、宮崎港～小丸川(砂丘～海抜(T.P).-12m：標高 1m ピッチ)の広域調査を別途 1 回/2 年の頻度で実施する。
- なお、侵食対策の効果影響が顕著に生じると考えられる宮崎港港湾離岸堤区域～一ツ瀬川までの区間については、1km 程度のブロックに区分してブロック毎に解析する。

3) 調査時期

- 広域の底生生物調査と合わせて、春季と冬季の 2 回/年とする。
- 施工箇所周辺の底生生物調査と合わせて、4 回/年とする。
- 第 2 回効果検証分科会における「調査の効率化」で施工箇所周辺の底質調査は 3 回/年の実施となった。
- 宮崎港～小丸川の広域調査は既往調査結果時期と合わせて秋季に実施(1 回/2 年)とする。
- 第 2 回効果検証分科会における「調査の効率化」で広域調査は当面調査を実施しないこととなった。

4)　調査結果の整理方法

- 底質調査結果からブロック・水深毎の中央粒径 d_{50} 及びふるいわけ係数 S_0 を整理し、指標範囲と比較する。
- 底質調査結果から粒径加積曲線を整理し、指標範囲と比較する。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- まず、2007(H19)年度～2011(H23)年度の底質調査結果から粒径加積曲線、中央粒径 d_{50} 及びふるいわけ係数 S_0 を算出する。

(ふるい分け係数　：　$S_0 = \sqrt{\frac{d_{75}}{d_{25}}}$)

- 算出結果をブロック毎に整理する。さらに、ブロック内で陸上部(H.W.L 海抜(T.P.)＋1.09m 以上)、汀線付近(海抜(T.P.)+1m～バーの内側)、砕波帯(バーの外側)毎に整理する。
- ブロック毎に中央粒径及びふるい分け係数の平均値､最大値､最小値を算出する。
- また、ブロック毎の粒径加積曲線の最大値、最小値を算出する。

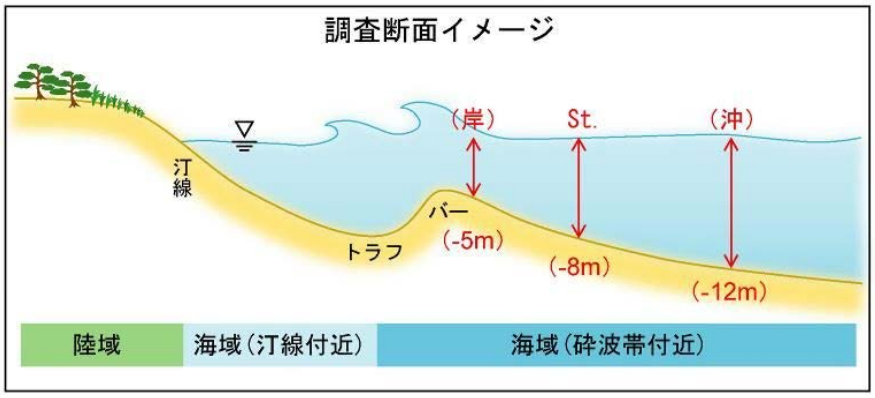

図－ 4.8　底質調査の調査位置断面イメージ

中央粒径		小丸川～一ツ瀬川	一ツ瀬左岸	一ツ瀬右岸	二ツ立	大炊田③	大炊田②	大炊田①	石崎川河川区域	石崎浜②
陸上部	最大値	15.63	0.24				0.29		0.72	2.15
	最小値	0.17	0.18				0.21		0.16	0.11
	平均値	0.47	0.20				0.26		0.34	0.29
海域（汀線付近）	最大値	24.40	0.33		2.04		2.62		8.61	11.14
	最小値	0.16	0.16		0.13		0.16		0.01	0.13
	平均値	0.42	0.22		0.24		0.25		0.26	0.26
海域（砕波帯）	最大値	1.84	0.37		0.38		0.46		0.42	0.44
	最小値	0.08	0.14		0.10		0.10		0.10	0.06
	平均値	0.16	0.18		0.15		0.16		0.16	0.17

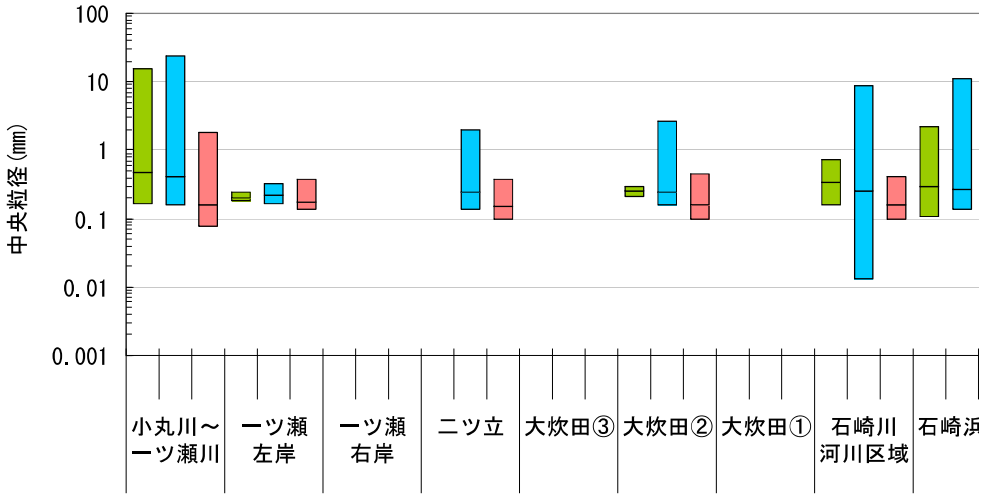

図－ 4.9　ブロック別

ふるい分け係数		小丸川～一ツ瀬川	一ツ瀬左岸	一ツ瀬右岸	二ツ立	大炊田③	大炊田②	大炊田①	石崎川河川区域	石崎浜②
陸上部	最大値	3.46	1.42				1.48		1.59	6.03
	最小値	1.24	1.22				1.36		1.29	1.27
	平均値	1.71	1.31				1.43		1.39	2.04
海域（汀線付近）	最大値	4.60	1.69		2.54		3.49		7.01	3.83
	最小値	1.21	1.24		1.23		1.23		1.22	1.22
	平均値	1.76	1.37		1.44		1.55		1.47	1.45
海域（砕波帯）	最大値	3.38	1.45		1.77		1.99		1.65	1.78
	最小値	1.23	1.26		1.23		1.23		1.23	1.22
	平均値	1.40	1.35		1.37		1.41		1.37	1.36

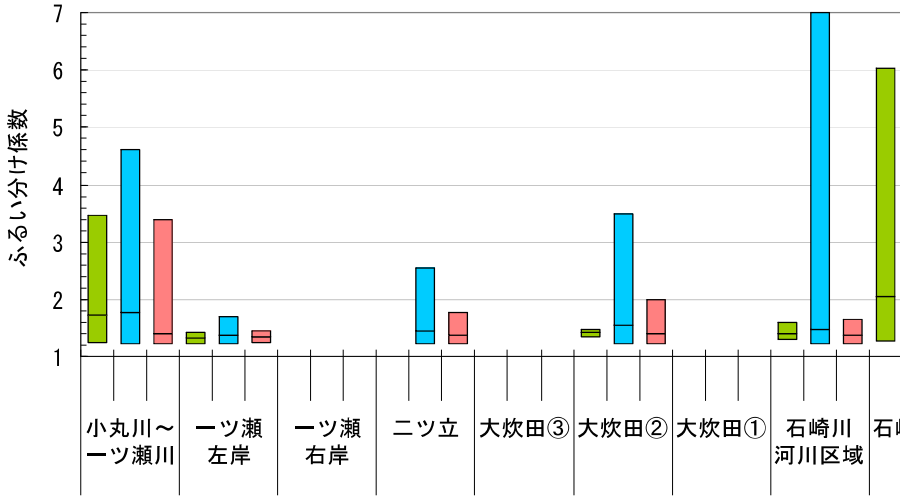

図－ 4.10　ブロック別設

石崎浜①	動物園東②	動物園東①	住吉海岸(補助突堤②北側)	住吉海岸(補助突堤①北側)	住吉海岸(突堤北側)	住吉海岸(離岸堤区間)	港湾離岸堤	宮崎港
0.52	0.89		4.83	0.38		0.33	0.40	
0.26	0.21		0.29	0.38		0.23	0.22	
0.35	0.31		0.71	0.38		0.27	0.33	
2.36	3.90	0.56	5.29	2.77	1.43	1.56	3.47	1.06
0.00	0.14	0.19	0.08	0.00	0.18	0.17	0.17	0.09
0.24	0.26	0.33	0.27	0.30	0.34	0.30	0.27	0.15
0.91	0.55	0.37	0.74	0.60	0.21	0.51	0.30	
0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	
0.16	0.23	0.20	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	

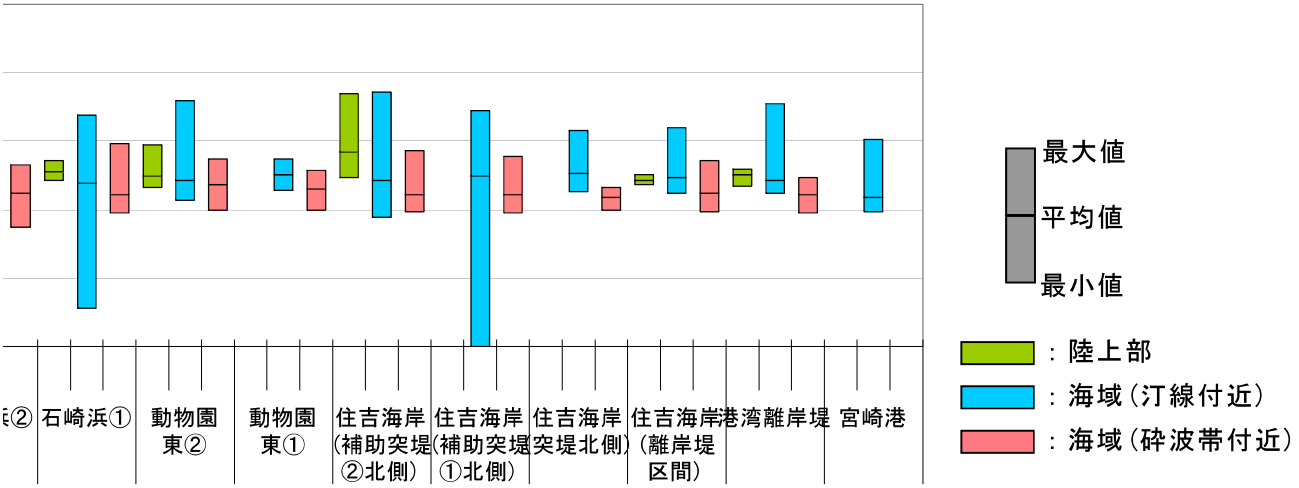

指標範囲（中央粒径 D_{50}）

石崎浜①	動物園東②	動物園東①	住吉海岸(補助突堤②北側)	住吉海岸(補助突堤①北側)	住吉海岸(突堤北側)	住吉海岸(離岸堤区間)	港湾離岸堤	宮崎港
4.04	3.80		5.32	1.37		1.43	1.59	
1.27	1.27		1.26	1.37		1.31	1.30	
1.46	1.45		2.36	1.37		1.40	1.41	
6.58	3.14	2.09	3.49	20.91	1.64	2.20	2.61	2.70
1.22	1.23	1.26	1.22	1.24	1.25	1.24	1.22	1.23
1.45	1.46	1.53	1.45	1.76	1.37	1.47	1.45	1.43
2.38	2.00	1.60	2.02	2.17	1.38	1.74	1.58	
1.23	1.24	1.26	1.23	1.23	1.26	1.23	1.24	
1.39	1.42	1.41	1.41	1.39	1.31	1.36	1.34	

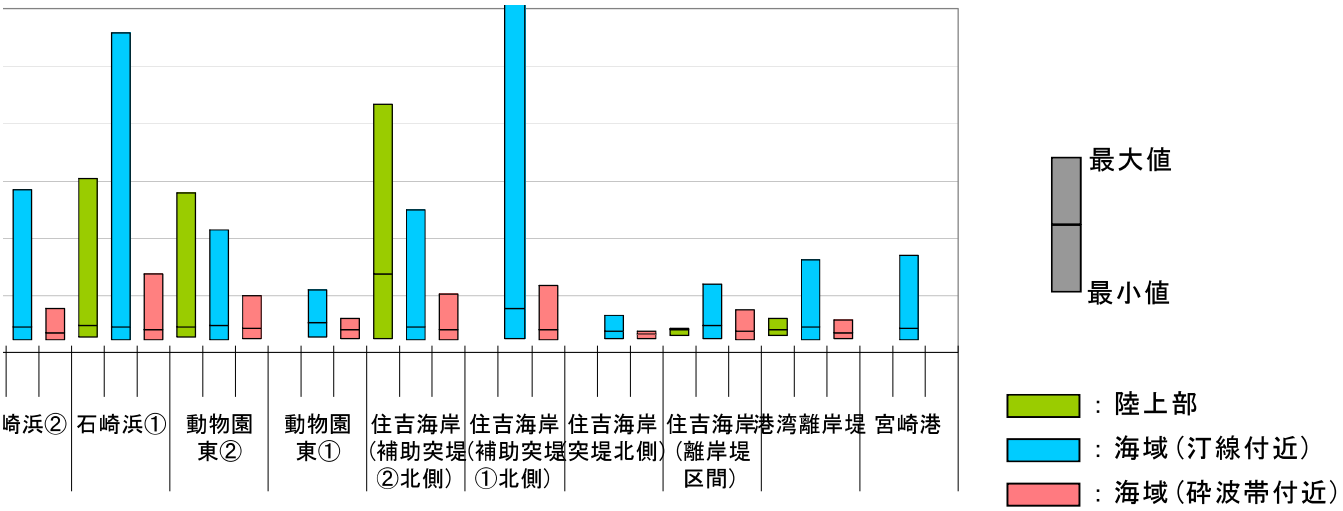

定範囲（ふるい分け係数）

表－ 4.6　ブロック別試

	小丸川～一ツ瀬川	一ツ瀬川左岸	二ツ立	大炊田②
海域（砕波帯）				
海域（汀線付近）				
陸上部			粒径（mm）	

	動物園東①	住吉（補助突堤②北側）	住吉（補助突堤①北側）	住吉（突堤北側）
海域（砕波帯）				
海域（汀線付近）				
陸上部	粒径（mm）			粒径（mm）

設定範囲（粒径加積曲線）

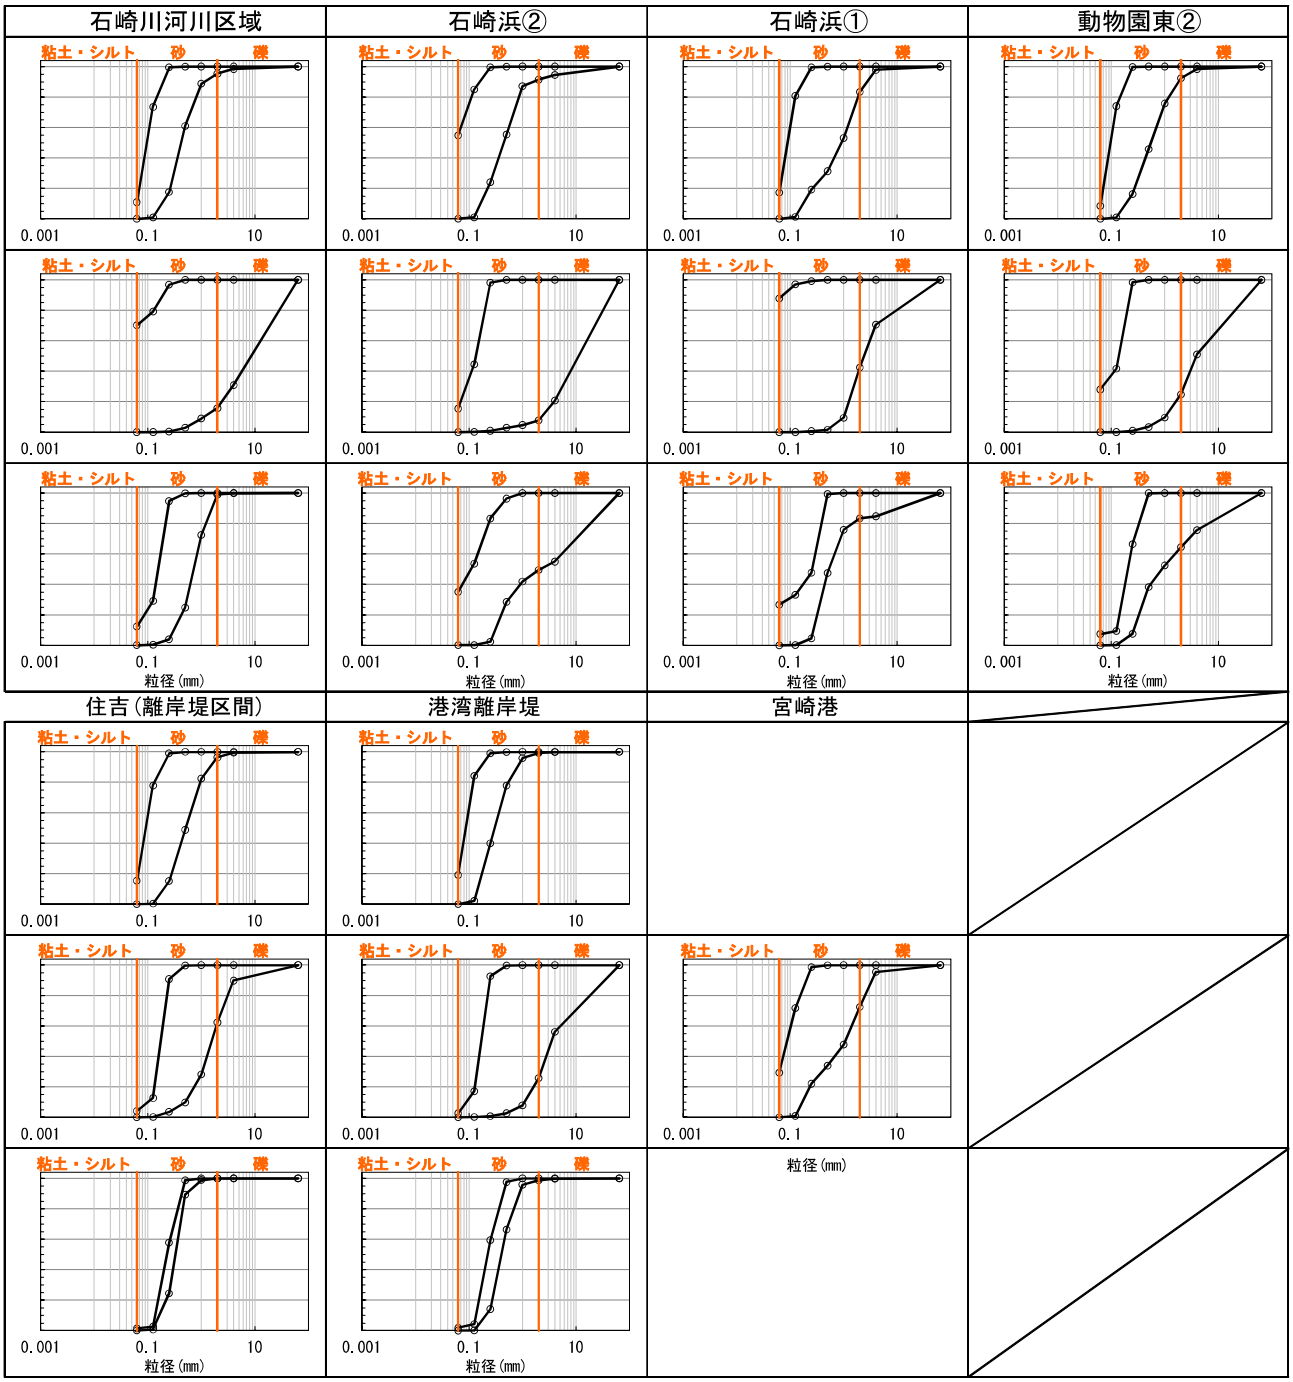
石崎川河川区域
石崎浜②
石崎浜①
動物園東②
住吉（離岸堤区間）
港湾離岸堤
宮崎港
粘土・シルト
砂
礫
0.001
0.1
10
粒径（mm）

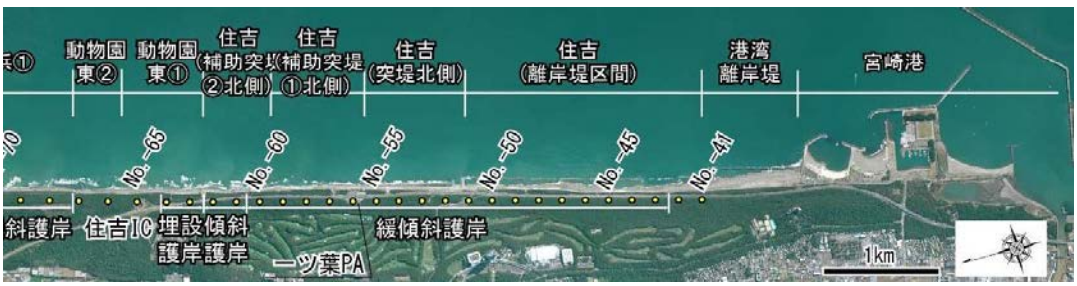
動物園東②
動物園東①
住吉（補助突堤②北側）
住吉（補助突堤①北側）
住吉（突堤北側）
住吉（離岸堤区間）
港湾離岸堤
宮崎港
No.-65
No.-60
No.-55
No.-50
No.-45
No.-41
住吉IC
埋設傾斜護岸護岸
緩傾斜護岸
1km

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度の結果によると、中央粒径は、石崎浜②-砕波帯および住吉(離岸堤区間)-砕波帯で最大値を上回った。
- ふるい分け係数は、石崎浜②-砕波帯および住吉(突堤北側)-汀線付近・砕波帯、住吉(離岸堤区間)-砕波帯で最大値を上回った。
- 粒径加積曲線は、大炊田②-砕波帯、住吉(突堤北側)-汀線付近および住吉(離岸堤区間)-砕波帯で細粒化した。石崎浜②-砕波帯で粗粒化した。住吉(突堤北側)-汀線付近では、粗粒化した地点と細粒化した地点があった。
- 住吉(突堤北側)-砕波帯は、中央粒径、粒径加積曲線が範囲外となっているが、同ブロックは指標範囲を設定するための対策前の底質調査数が少なかったことに留意する必要がある。

表－ 4.7　底質(粒度試験)に関する指標範囲との比較結果

項目	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
中央粒径	宮崎港～小丸川	2015(H27)年6月,11月 2016(H28)年1月,2月	次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ・石崎浜②-砕波帯 ・住吉(離岸堤区間)-砕波帯
ふるい分け係数			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ・石崎浜②-砕波帯 ・住吉(突堤北側)–汀線付近 ・住吉(突堤北側)-砕波帯 ・住吉(離岸堤区間)-砕波帯
粒径加積曲線			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑(粗粒にシフト) ・石崎浜②-砕波帯 ・住吉(突堤北側)-砕波帯 ・住吉(離岸堤区間)-砕波帯 下記で範囲外↓(細粒にシフト) ・住吉(突堤北側)–汀線付近 ・住吉(突堤北側)-砕波帯 ・住吉(離岸堤区間)–汀線付近

表－ 4.8(1)　底質(粒度試験)に関する指標範囲とのブロッ

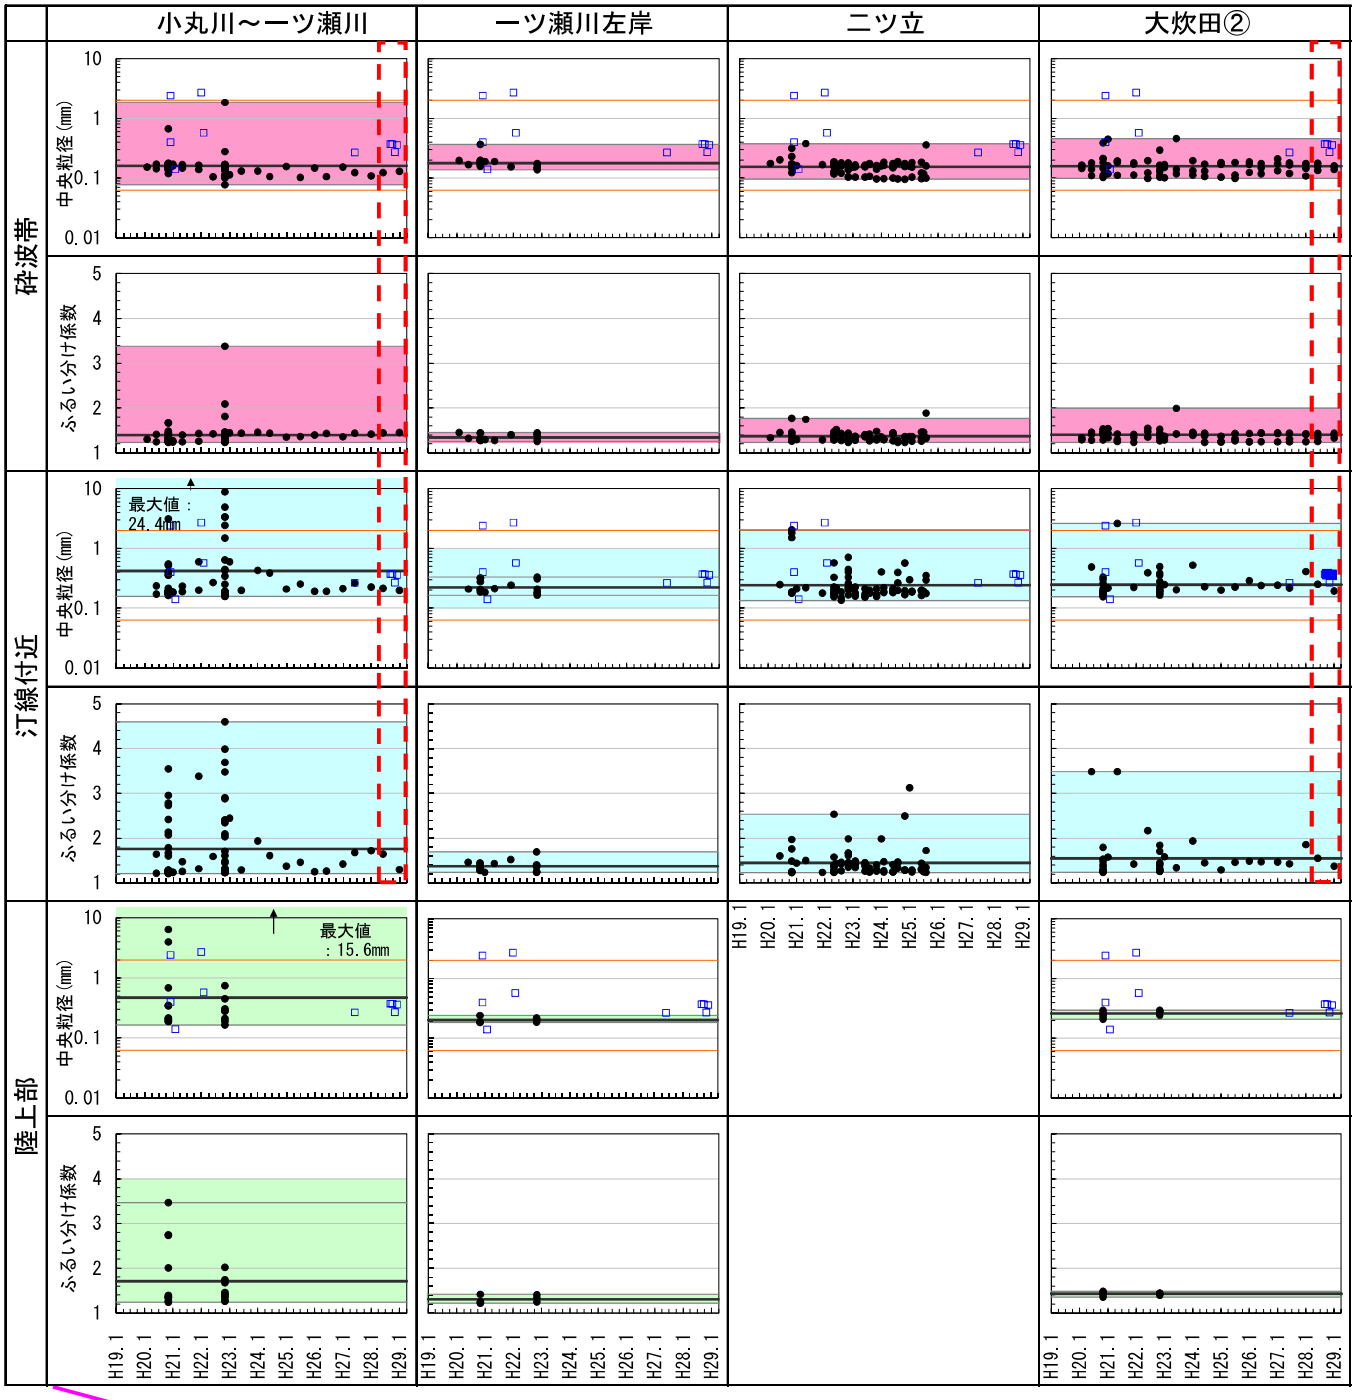

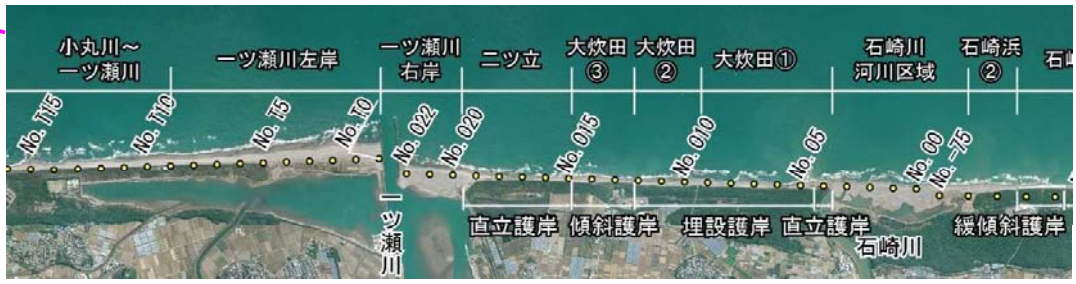

：既往調査結果の出現範囲　□：宮崎海岸全体での養浜実施
：2016(H28)年度調査結果　■：ブロック内での養浜実施

ク毎の比較結果(中央粒径等：その 1，2016(H28)年度まで)

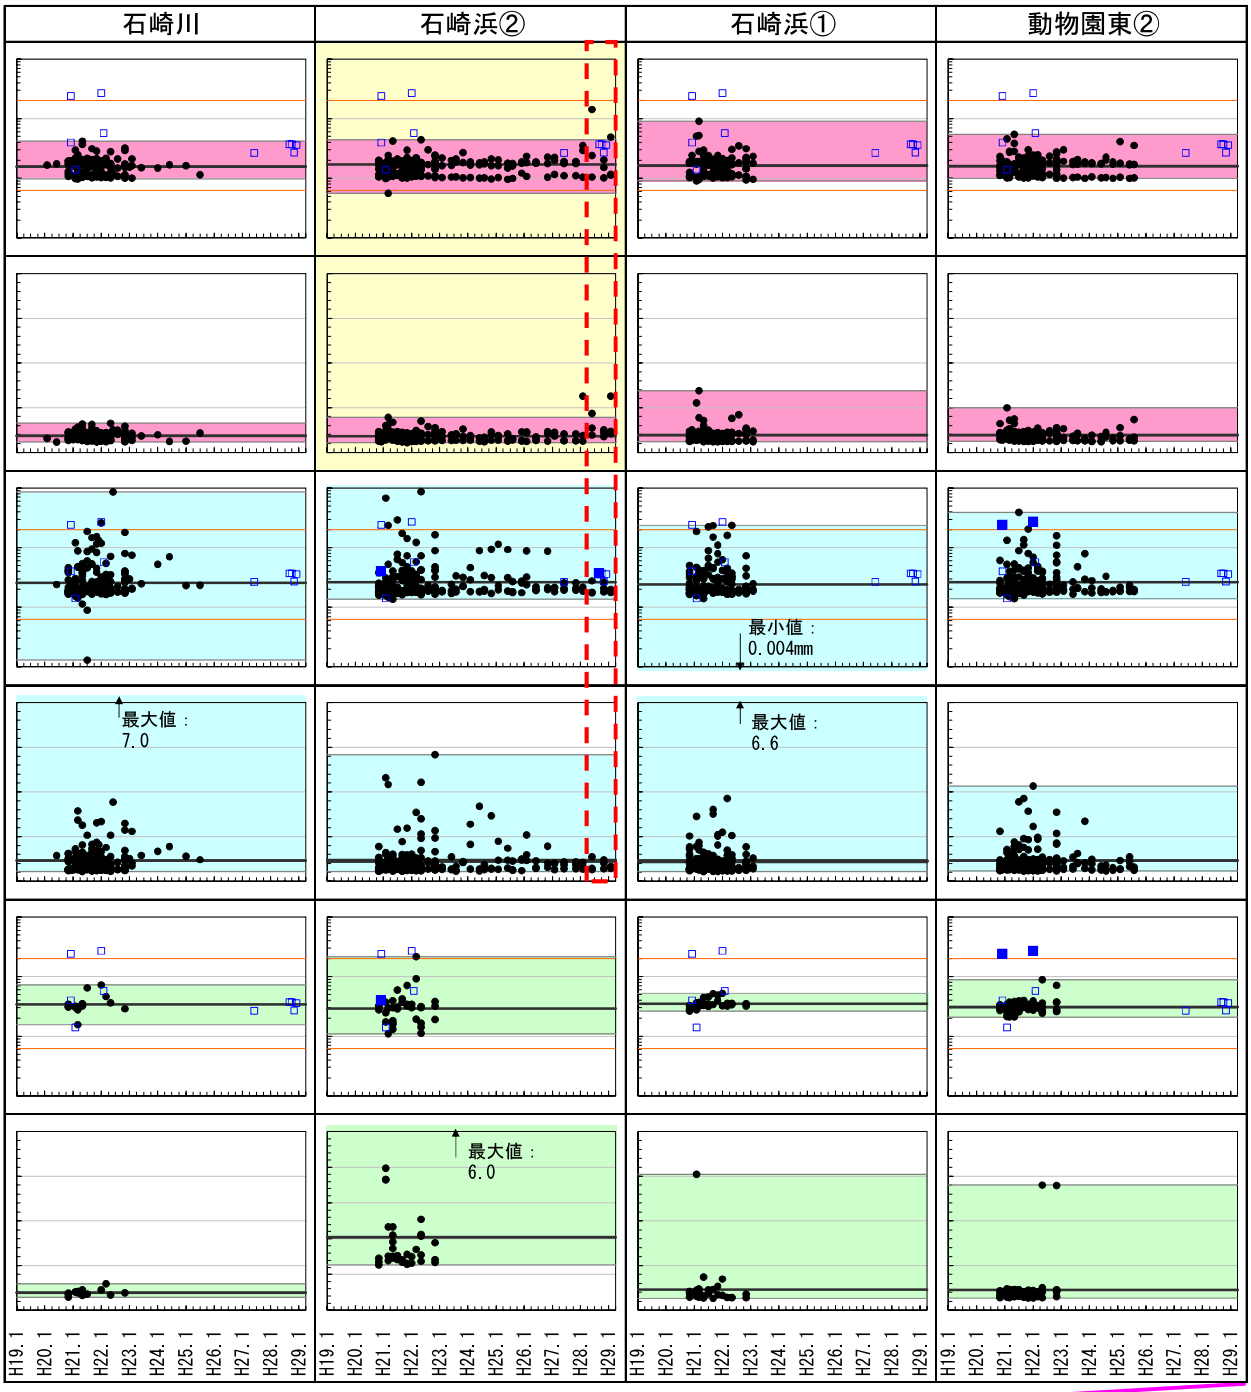

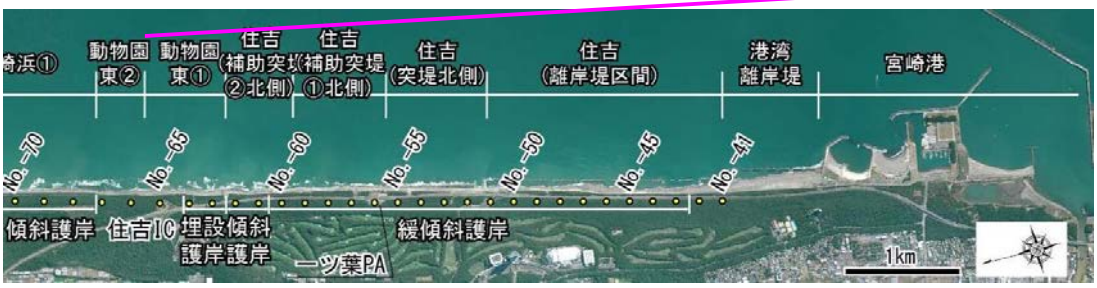

表－ 4.8(2)　底質(粒度試験)に関する指標範囲とのブロッ

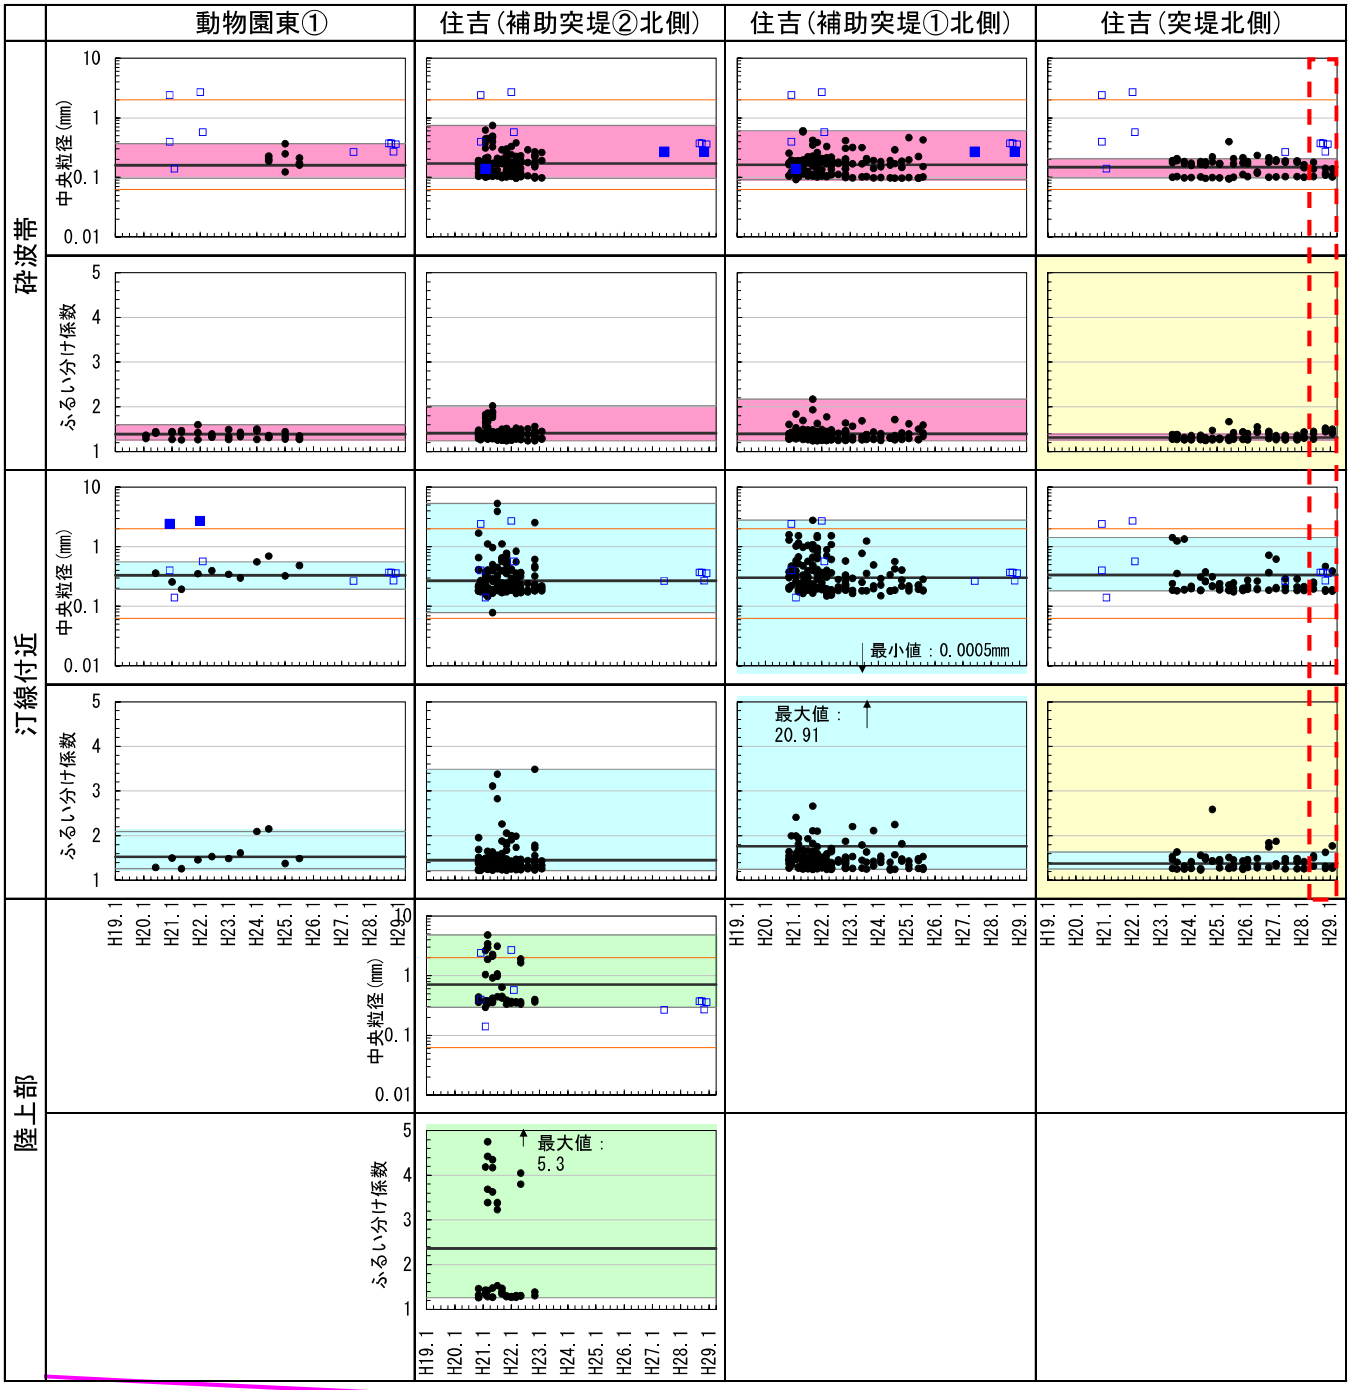

：既往調査結果の出現範囲　□：宮崎海岸全体での養浜実施
：2016(H28)年度調査結果　■：ブロック内での養浜実施

ク毎の比較結果(中央粒径等：その 2，2016(H28)年度まで)

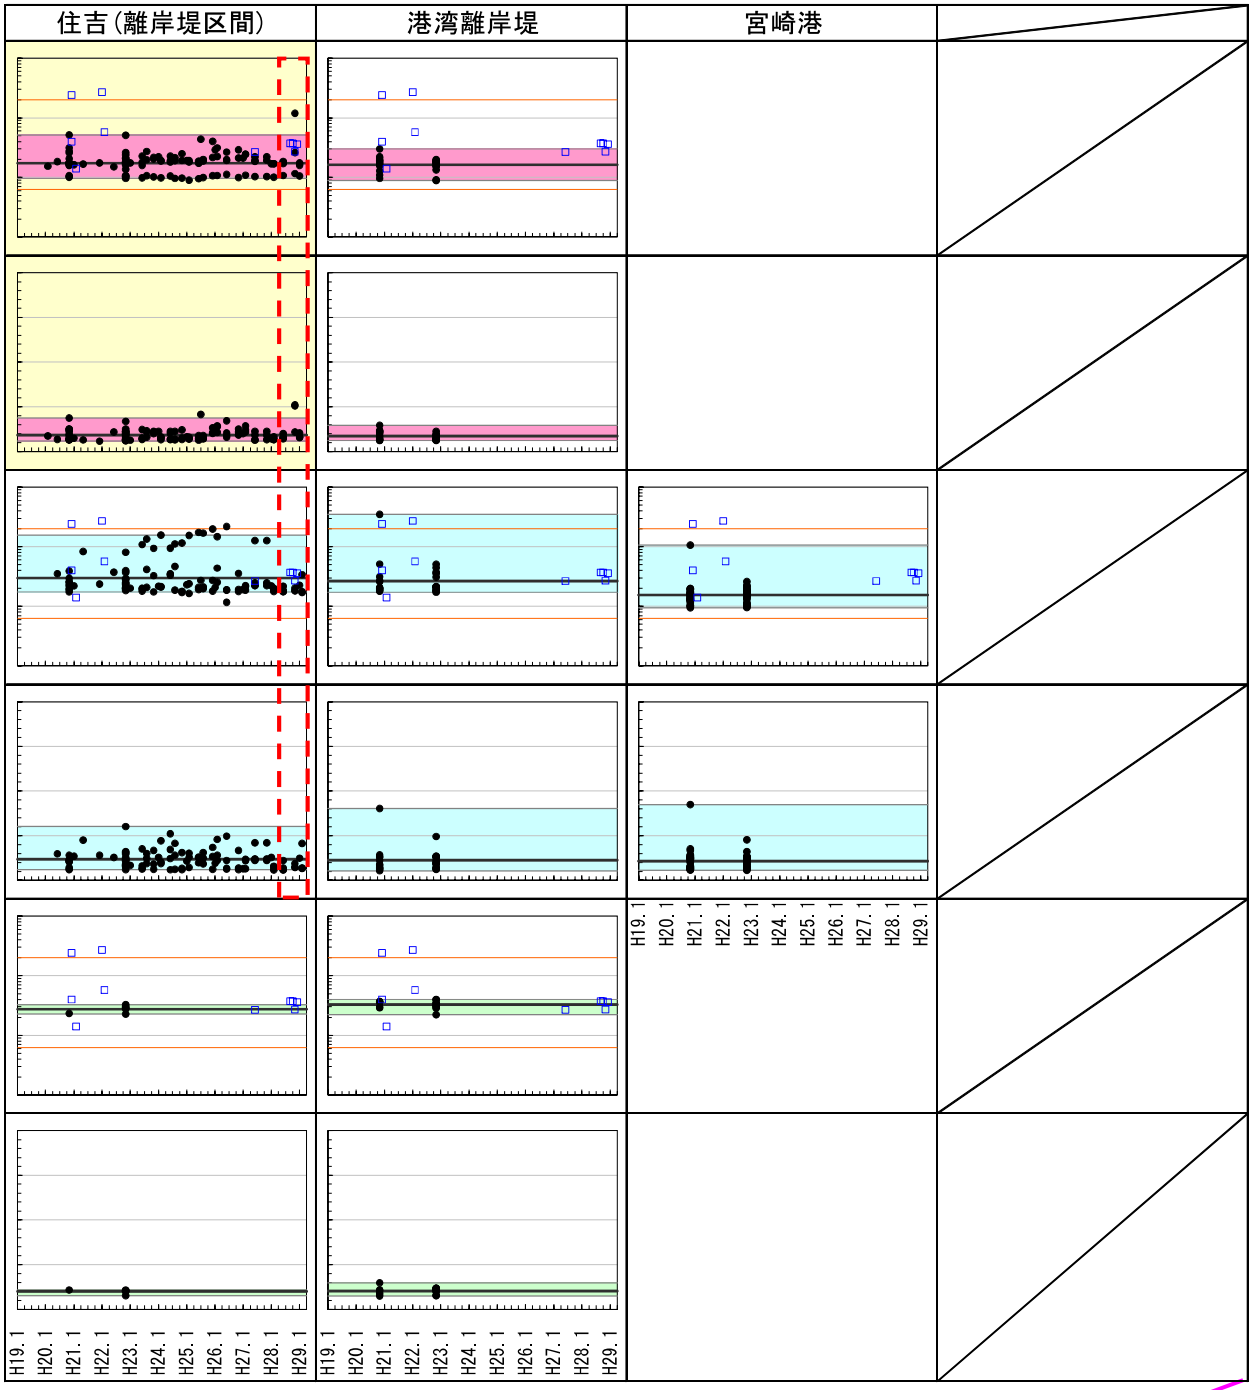

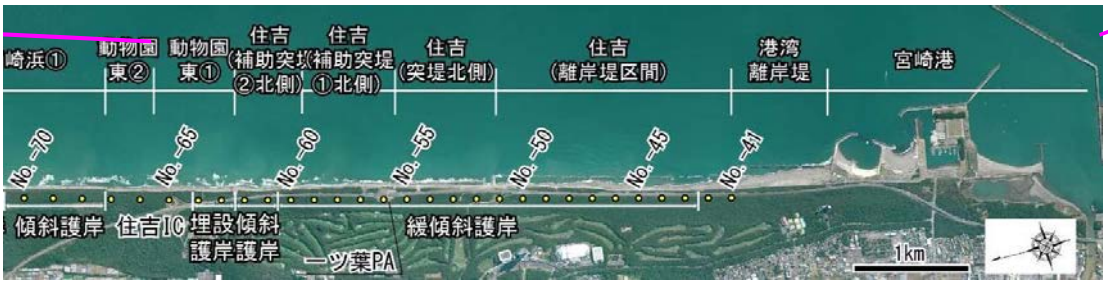

表－ 4.9　底質（粒度試験）に関する指標範囲とのブ

	小丸川～一ツ瀬川	一ツ瀬川左岸	二ツ立	大炊田②
海域（砕波帯）		平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	
海域（汀線付近）		平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	
陸上部	 平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	 平成28年度調査なし
	動物園東①	住吉（補助突堤②北側）	住吉（補助突堤①北側）	住吉（突堤北側）
海域（砕波帯）	平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	
海域（汀線付近）	平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	
陸上部	平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	 平成28年度調査なし

黒　　：過去の最大・最小
黒以外の色：2016(H28)年の調査結果

ロック毎の比較結果(粒径加積曲線，2016(H28)年度)

石崎川河川区域	石崎浜②	石崎浜①	動物園東②
平成28年度調査なし		平成28年度調査なし	平成28年度調査なし
平成28年度調査なし		平成28年度調査なし	平成28年度調査なし
平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	平成28年度調査なし

住吉(離岸堤区間)	港湾離岸堤	宮崎港	
	平成28年度調査なし		
	平成28年度調査なし	平成28年度調査なし	
平成28年度調査なし	平成28年度調査なし		

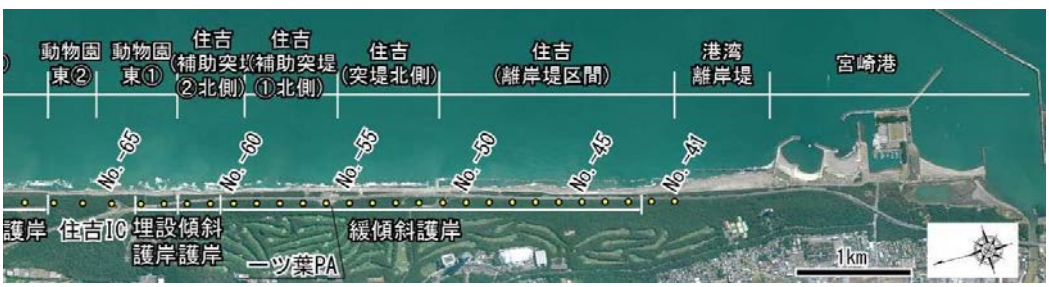

≪参考：2015(H27)年度の底質調査結果≫

- 2015(H27)年度の結果によると、中央粒径は、すべての地点で範囲内であった。
- ふるい分け係数は、石崎浜-砕波帯および住吉(突堤北側)-砕波帯で最大値を上回った。
- 粒径加積曲線は、大炊田②-砕波帯、住吉(突堤北側)-汀線付近および住吉(離岸堤区間)-砕波帯で細粒化した。石崎浜②-砕波帯で粗粒化した。住吉(突堤北側)-汀線付近では、粗粒化した地点と細粒化した地点があった。
- 住吉(突堤北側)-砕波帯は、中央粒径、粒径加積曲線が範囲外となっているが、同ブロックは指標範囲を設定するための対策前の底質調査数が少なかったことに留意する必要がある。

表－ 4.7　底質(粒度試験)に関する指標範囲との比較結果

項目	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
中央粒径	宮崎港～小丸川	2015(H27)年6月,11月 2016(H28)年1月,2月	次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	範囲内
ふるい分け係数			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ・石崎浜 -砕波帯 ・住吉(突堤北側) -砕波帯
粒径加積曲線			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑(粗粒にシフト) ・石崎浜②-砕波帯 ・住吉(突堤北側) -砕波帯 下記で範囲外↓(細粒にシフト) ・大炊田②-砕波帯 ・住吉(突堤北側) –汀線付近 ・住吉(突堤北側) -砕波帯 ・住吉(離岸堤区間) –汀線付近 ・住吉(離岸堤区間) -砕波帯

≪参考：2014(H26)年度の底質調査結果≫

- 2014(H26)年度の結果によると、中央粒径は、住吉(突堤北側)-砕波帯では最大値を上回った。住吉(離岸堤区間)-汀線付近では最大値を上回る地点と最小値を下回る地点が存在した。
- ふるい分け係数は、住吉(突堤北側)-汀線付近、砕波帯では最大値を上回った。住吉(離岸堤区間)-汀線付近では最小値を下回った。
- 粒径加積曲線は、住吉(突堤北側)-汀線付近で細粒化した。住吉(離岸堤区間)-砕波帯で粗粒化した。住吉(突堤北側)-砕波帯、住吉(離岸堤区間)-汀線付近では、粗粒化した地点と細粒化した地点があった。
- 住吉(突堤北側)-砕波帯は、中央粒径、ふるい分け係数、粒径加積曲線のいずれの諸元も範囲外となっているが、同ブロックは指標範囲を設定するための対策前の底質調査数が少なかったことに留意する必要がある。

表－ 4.10　底質(粒度試験)に関する指標範囲との比較結果

項目	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2013(H25)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
中央粒径	宮崎港～小丸川	2014(H26)年6月,11月 2015(H27)年1月,2月		次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ・住吉(突堤北側)-砕波帯 ・住吉(離岸堤区間)-汀線付近 下記で範囲外↓ ・住吉(離岸堤区間)-汀線付近
ふるい分け係数			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ・住吉(突堤北側)-汀線付近 ・住吉(突堤北側)-砕波帯 下記で範囲外↓ ・住吉(離岸堤区間)-汀線付近
粒径加積曲線			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑(粗粒にシフト) ・住吉(突堤北側)-砕波帯 ・住吉(離岸堤区間)-汀線付近 ・住吉(離岸堤区間)-砕波帯 下記で範囲外↓(細粒にシフト) ・住吉(突堤北側)–汀線付近 ・住吉(突堤北側)-砕波帯 ・住吉(離岸堤区間)-汀線付近

表－ 4.9　底質（粒度試験）に関する指標範囲とのブ

	小丸川～一ツ瀬川	一ツ瀬川左岸	二ツ立	大炊田②
海域（砕波帯）		平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	
海域（汀線付近）		平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	
陸上部	粒径（mm） 平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	粒径（mm） 平成27年度調査なし

	動物園東①	住吉（補助突堤②北側）	住吉（補助突堤①北側）	住吉（突堤北側）
海域（砕波帯）	平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	
海域（汀線付近）	平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	
陸上部	平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	粒径（mm） 平成27年度調査なし

黒　　：過去の最大・最小
黒以外の色：2015(H27)年の調査結果

ロック毎の比較結果(粒径加積曲線，2015(H27)年度)

石崎川河川区域	石崎浜②	石崎浜①	動物園東②
平成27年度調査なし		平成27年度調査なし	平成27年度調査なし
平成27年度調査なし		平成27年度調査なし	平成27年度調査なし
平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	平成27年度調査なし
住吉(離岸堤区間)	港湾離岸堤	宮崎港	
	平成27年度調査なし		
	平成27年度調査なし	平成27年度調査なし	
平成27年度調査なし	平成27年度調査なし		

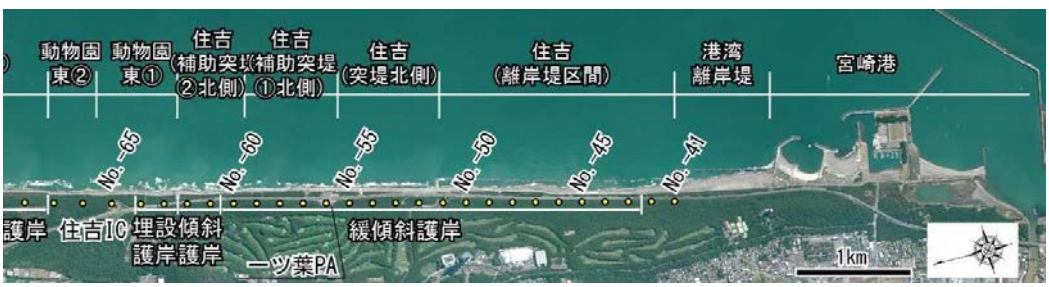

表－ 4.12　底質(粒度試験)に関する指標範囲とのブ

	小丸川～一ツ瀬川	一ツ瀬川左岸	二ツ立	大炊田②
海域(砕波帯)		平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	
海域(汀線付近)		平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	
陸上部	粒径(mm) 平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	粒径(mm) 平成26年度調査なし
	動物園東①	住吉(補助突堤②北側)	住吉(補助突堤①北側)	住吉(突堤北側)
海域(砕波帯)	平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	
海域(汀線付近)	平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	
陸上部	平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	粒径(mm) 平成26年度調査なし

ロック毎の比較結果(粒径加積曲線，2014(H26)年度)

黒　　：過去の最大・最小 黒以外の色：2015(H27)年の調査結果

石崎川河川区域	石崎浜②	石崎浜①	動物園東②
平成26年度調査なし		平成26年度調査なし	平成26年度調査なし
平成26年度調査なし		平成26年度調査なし	平成26年度調査なし
平成26年度調査なし	粒径(mm) 平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	平成26年度調査なし
住吉(離岸堤区間)	港湾離岸堤	宮崎港	
	平成26年度調査なし		
	平成26年度調査なし	平成26年度調査なし	
粒径(mm) 平成26年度調査なし	平成26年度調査なし		

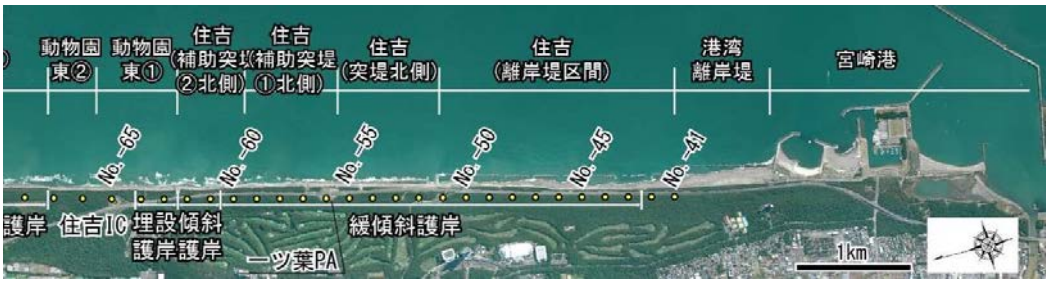

4.2.2 底質調査（有機物調査）

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 化学的酸素要求量(CODsed)、硫化物(T-S)

(B) 現象

- 底質の有機物濃度が底生生物の生息のため最低限維持しなければならない範囲を超えていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
底質の有機物濃度が底生生物の生息のため最低限維持しなければならない範囲を超える。

2) 調査位置

- 比較対象として一ツ瀬川左岸を含んだ 6 地点(当該年度の養浜箇所及びその周辺、突堤及び県離岸堤周辺)とする。
- 特に突堤と離岸堤により土砂の移動が制御される領域を注視する。

3) 調査時期

- 季節変動を考慮して、春季(5～6 月)及び冬季(12～1 月)の 2 回/年とする。
- 対策実施前後の状況を把握するため、台風・梅雨前(5-6 月)，当該年度の対策本格化前(11 月)、同対策実施中(2 月)とする。
- なお、有機物調査は底生生物調査と合わせて実施する。
- コスト縮減の観点より、平成 28 年度より有機物調査は台風・梅雨前(5-6 月)の 1 回のみとした。

4) 調査結果の整理方法

- 底生生物調査実施箇所において、底質を採取する。
- 化学的酸素要求量(CODsed)と硫化物(T-S)を「水産用水基準,社団法人日本水産資源保護協会」による基準と比較する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 水産用水基準（2005 年版）では、東京湾以西で海域の底層の DO が底生生物の生息のため最低限維持しなければならない臨界濃度である 4.3mg/L 以下にならないための値として、化学的酸素要求量（CODsed）、硫化物（T-S）に関する基準が定められている。
- 基準で定められた上限値であるため、振れ幅は設定しない。

表－ 4.14 水産用水基準（抜粋）

調査項目	水産用水基準
化学的酸素要求量 (CODsed)	20mg/g 乾泥以下
硫化物(T-S)	0.2mg/g 乾泥以下

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は、いずれの項目・箇所においても基準とする指標の範囲内であった。

表－ 4.15 底質に関する指標範囲との比較結果

項目	調査位置	調査実施状況	基準とする指標	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
化学的酸素要求量 CODsed	宮崎港～小丸川	2016(H28)年6月、11月 2017(H29)年2月	20mg/g	次頁参照	範囲内
硫化物 T-S			0.2mg/g	次頁参照	範囲内

≪参考：2015(H27)年度の有機物調査結果≫

- 2015(H27)年度は、いずれの項目・箇所においても基準とする指標の範囲内であった。

表－ 4.15 底質に関する指標範囲との比較結果

項目	調査位置	調査実施状況	基準とする指標	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
化学的酸素要求量 CODsed	宮崎港～小丸川	2015(H27)年6月、11月 2016(H28)年2月	20mg/g	次頁参照	範囲内
硫化物 T-S			0.2mg/g	次頁参照	範囲内

≪参考：2014(H26)年度の有機物調査結果≫

- 2014(H26)年度は、いずれの項目・箇所においても基準とする指標の範囲内であった。

表－ 4.16 底質に関する指標範囲との比較結果

項目	調査位置	調査実施状況	基準とする指標	2014(H26)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
化学的酸素要求量 CODsed	宮崎港～小丸川	2014(H26)年6月、11月 2015(H27)年2月	20mg/g	次頁参照	範囲内
硫化物 T-S			0.2mg/g	次頁参照	範囲内

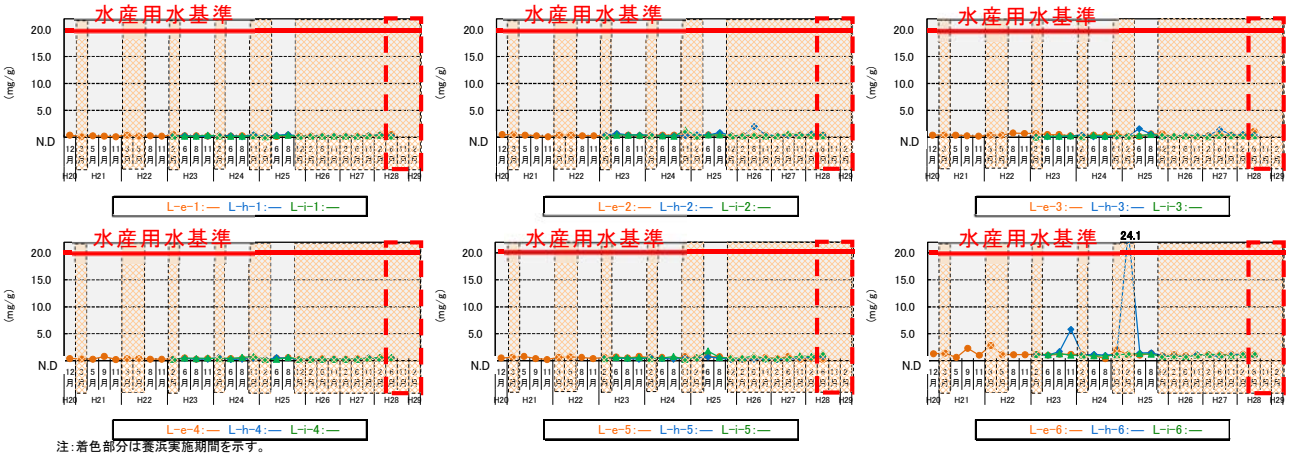

図－ 4.11　化学的酸素要求量(CODsed)の経時変化(2008(H20)～2016(H28)年度)

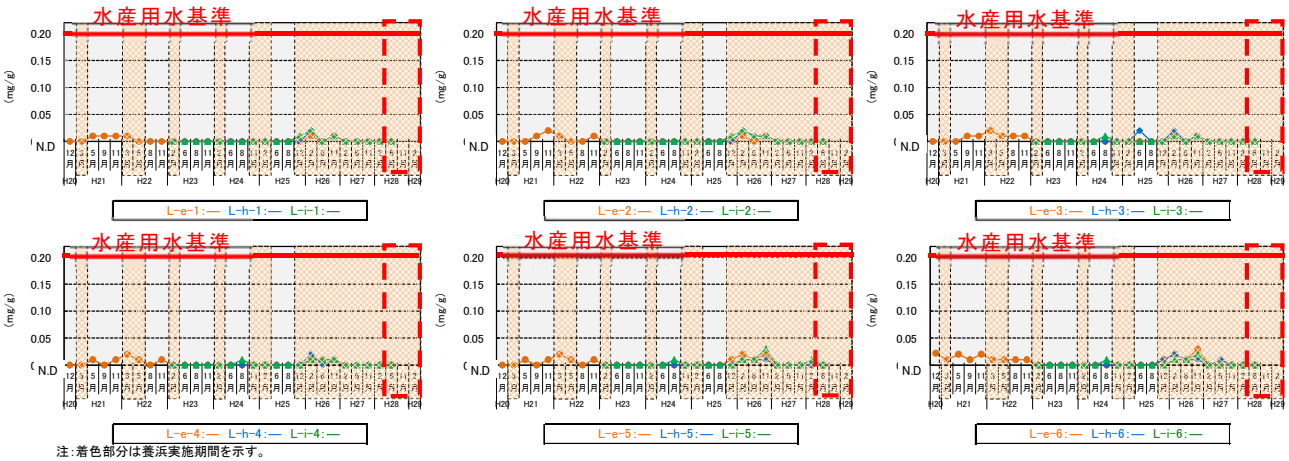

図－ 4.12　硫化物(T-S)の経時変化(2008(H20)～2016(H28)年度)

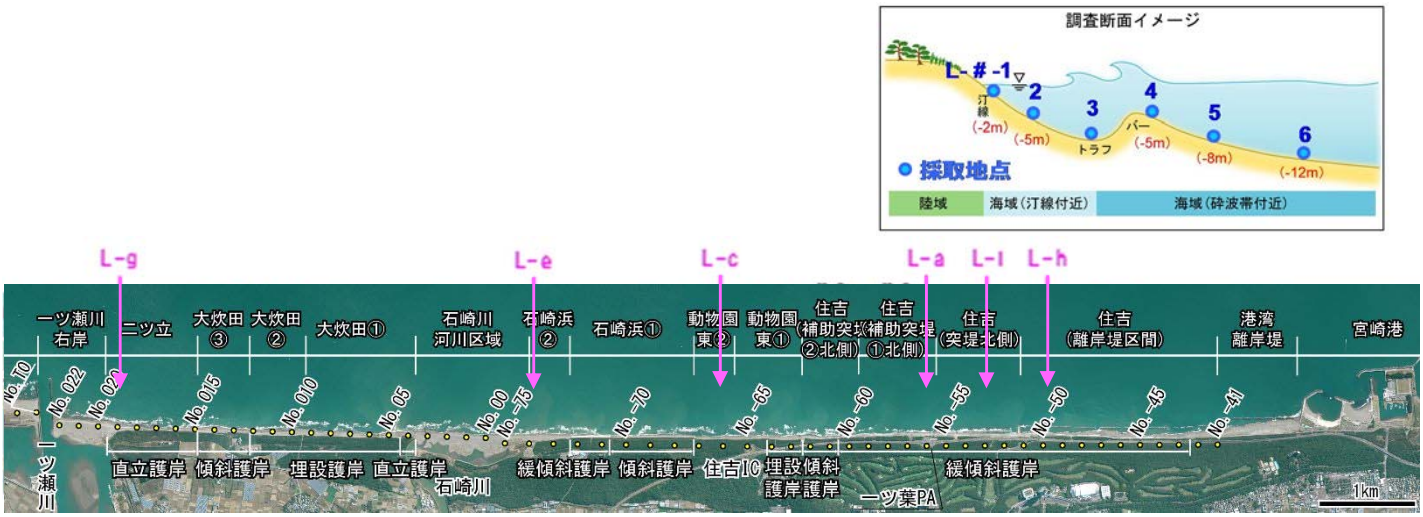

4.2.3 養浜材調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 底質の有害物質の有無

(B) 現象

- 新規の土砂(各種工事発生土砂、購入砂等)を養浜材として投入する場合に、土砂が養浜材として不適切でないかを確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
養浜材の新規採取箇所で有害物質が検出される。

2) 調査位置

- 新規の養浜材の発生場所及び必要に応じて養浜材投入位置とする。

3) 調査時期

- 養浜投入前(新規養浜材の発生場所)及び投入後(養浜材投入位置、粒度試験のみ実施)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 新規養浜材の解析(他事業との連携で養浜を実施する場合は、発生源の施工担当者が実施する)を実施し、有害物質の溶質量、含有量を整理し、指標範囲と比較する。
- 新規養浜材の粒度試験を実施し、既往の宮崎海岸の粒度試験結果と比較する。
- 上記より、養浜材としての受け入れ可否を判断する。
- 養浜材の対策箇所への投入後、再度粒度試験を実施し、投入土砂の底質調査結果として整理する。

5)　指標範囲の設定

- 指標タイプは基準値とする。
- 基準値は、下表に示す「浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針,国土交通省港湾局(平成 18 年 6 月)」に規定されている、「水底土砂に係る判定基準」の値とする。
- 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(平成 26 年 5 月 30 日最終改正)に基づき、「水底土砂に係る判定基準」が一部変更になっている(下表赤字)
- 基準で定められた上限値であるため、振れ幅は設定しない。

表－ 4.18　水底土砂に係る判定基準

項　　目	判　定　基　準
アルキル水銀化合物	アルキル水銀化合物につき検出されないこと
水銀又はその化合物	検液 1L につき水銀 0.005mg 以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物	検液 1L につきカドミウム 0.1mg 以下
鉛又はその化合物	検液 1L につき鉛 0.1mg 以下
有機燐化合物	検液 1L につき有機リン化合物 1mg 以下
六価クロム化合物	検液 1L につき六価クロム 0.5mg 以下
砒素又はその化合物	検液 1L につき砒素 0.1mg 以下
シアン化合物	検液 1L につきシアン 1mg 以下
PCB	検液 1L につき PCB 0.003mg 以下
銅又はその化合物	検液 1L につき銅 3mg 以下
亜鉛又はその化合物	検液 1L につき亜鉛 5mg 以下
ふつ化物	検液 1L につきフッ素 15mg 以下
トリクロロエチレン	検液 1L につきトリクロロエチレン 0.3mg 以下
テトラクロロエチレン	検液 1L につきテトラクロロエチレン 0.1mg 以下
ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物	検液 1L につきベリリウム 2.5mg 以下
クロム又はその化合物	検液 1L につきクロム 2mg 以下
ﾆｯｹﾙ又はその化合物	検液 1L につきニッケル 1.2mg 以下
ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物	検液 1L につきバナジウム 1.5mg 以下
※有機塩素化合物	試料 1kg につき塩素 40mg 以下
ジクロロメタン	検液 1L につきジクロロメタン 0.2mg 以下
四塩化炭素	検液 1L につき四塩化炭素 0.02mg 以下
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	検液 1L につき 1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.04mg 以下
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	検液 1L につき 1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1mg 以下（変更）
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	検液 1L につきｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4mg 以下
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	検液 1L につき 1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3mg 以下
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	検液 1L につき 1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06mg 以下
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	検液 1L につき 1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.02mg 以下
チウラム	検液 1L につきチウラム 0.06mg 以下
シマジン	検液 1L につきシマジン 0.03mg 以下
チオベンカルブ	検液 1L につきチオベンカルブ 0.2mg 以下
ベンゼン	検液 1L につきベンゼン 0.1mg 以下
セレン又はその化合物	検液 1L につきセレン 0.1mg 以下
1.4-ジオキサン（追加）	検液 1L につき 1.4-ジオキサン 0.5mg 以下
ダイオキシン類	検液 1L につきダイオキシン類 10pg-TEQ 以下

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2014(H26)～2016(H28)年度に、新規養浜材採取に際して実施した調査結果はすべて指標範囲内であった。

なお、関連する項目としては、「4.2　底　質」が挙げられる。

表－ 4.19　「水底土砂に係る判定基準の項目」に関する養浜材分析結果

分析項目	単位	基準	平成28年度				平成27年度	平成26年度		
			小丸川河道掘削土砂	三財川掘削土砂	佐土原浄化センター掘削土砂	宮崎港マリーナ航路浚渫土砂	宮崎港マリーナ航路浚渫土砂	川南漁港掘削土砂	小丸川河道掘削土砂	大淀川河道掘削土砂
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出（0.0005未満）	N.D.（0.0005）	不検出（0.0005未満）	N.D.（0.0005）	0.0005未満	N.D.（0.0005）	N.D.（0.0005）	不検出（0.0005未満）	不検出（0.0005未満）
水銀又はその化合物	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.1以下	0.001未満	0.01未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.01未満	0.01未満
鉛又はその化合物	mg/L	0.1以下	0.005未満	0.01未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.03	0.01未満
有機りん化合物	mg/L	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ヒ素又はその化合物	mg/L	0.1以下	0.001未満	0.01未満	0.002	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01未満
シアン化合物	mg/L	1以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	不検出（0.1未満）
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
銅又はその化合物	mg/L	3以下	0.01未満	0.3未満	0.01未満	0.05未満	0.01未満	0.01未満	0.3未満	0.3未満
亜鉛又はその化合物	mg/L	5以下	0.01未満	0.2未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.2未満	0.5未満
ふっ化物	mg/L	15以下	0.1未満	0.8未満	0.1未満	0.08未満	0.1未満	0.1未満	1.5未満	1.5未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	0.001未満	0.03未満	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.03未満	0.03未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.0005未満	0.01未満	0.0005未満	0.001未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01未満	0.01未満
ベリリウム又はその化合物	mg/L	2.5以下	0.01未満	0.25未満	0.01未満	0.05未満	0.01未満	0.01未満	0.25未満	0.25未満
クロム又はその化合物	mg/L	2以下	0.03未満	0.2未満	0.03未満	0.05未満	0.03未満	0.03未満	0.2未満	0.2未満
ニッケル又はその化合物	mg/L	1.2以下	0.01未満	0.12未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.12未満	0.12未満
バナジウム又はその化合物	mg/L	1.5以下	0.01未満	0.15未満	0.01未満	0.05未満	0.01未満	0.01未満	0.15未満	0.15未満
有機塩素化合物	mg/Kg	40以下	4未満	4未満	4未満	4未満	4未満	4未満	4未満	4未満
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	0.002未満	0.02未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	0.0002未満	0.002未満	0.0002未満	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002未満	0.002未満
1,2−ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	0.0004未満	0.004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	0.002未満	0.02未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1未満	0.1未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	0.004未満	0.04未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	0.001未満	0.3未満	0.001未満	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	0.0006未満	0.006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	0.0002未満	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チラウム	mg/L	0.06以下	0.0006未満	0.006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
シマジン	mg/L	0.03以下	0.0003未満	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	0.002未満	0.02未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/L	0.1以下	0.001未満	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01未満	0.01未満
セレン又はその化合物	mg/L	0.1以下	0.002未満	0.01未満	0.002未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.01未満	0.01未満
ダイオキシン類（1,4-ジオキサン）	pg（TEQ）/L mg/L	10以下	0.005未満	0.12	0.005未満	0.05未満	0.005未満	0.005未満	0.05未満	0.05未満

※1,1-ジクロロエチレンの基準値は、平成26年5月30日に0.2mg/L→1.0mg/Lに変更

4.3 浮遊生物、付着生物、幼稚仔

4.3.1 浮遊生物調査

第 2 回効果検証分科会における「調査の効率化」で 2013(H25)年度冬季より当面調査を実施しないこととなった。

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 浮遊生物の出現状況

(B) 現象

- 浮遊生物の出現状況が、既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
浮遊生物の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 浮遊生物は周辺環境に影響を受けずに浮遊しているため、対策実施に伴う沿岸方向・岸沖方向の変化の影響は受けないと判断し、代表地点で調査を行う。

3) 調査時期

- 季節変動を考慮して、春季(5～6 月)及び冬季(12～1 月)の 2 回/年とする。

4) 調査結果の整理方法

- 採水及びネットを用いたプランクトンの採取・調査結果と指標範囲の比較結果から動物プランクトン及び植物プランクトンの出現状況を整理し、指標範囲と比較する。
- 出現数の変動状況を既往の調査結果の最大値、最小値と比較して時系列で確認する。
- 砂浜海岸や砂浜生息生物に対して、門や種別の大きな特色はないため、整理は動物プランクトン及び植物プランクトンの総量とし、門や種毎の整理は行わない。
- 整理単位は動物プランクトン：個体数/m^3、植物プランクトン：細胞数/L とする。また、種数についても整理する。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 2008(H20)年～2011(H23)年の浮遊生物調査結果から、動物プランクトン及び植物プランクトンの出現個体数(細胞数)及び出現種数の最大値、最小値及び平均値を算定し、指標範囲として設定する。なお、データの蓄積が少ないことから、振れ幅は設定しない。

表－ 4.20　浮遊生物調査に関する指標範囲

出現個体数		動物プランクトン	植物プランクトン
		(個体数/m^3)	(細胞数/L)
	最大値	31,946	2,530,000
	最小値	5,331	72,000
	平均値	13,551	762,500

出現種数		動物プランクトン	植物プランクトン
		(種数)	(種数)
	最大値	26	74
	最小値	16	13
	平均値	20	35

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2015(H27)年度は調査非実施である。

≪参考：2013(H25)年度の浮遊生物調査結果≫

- 2013(H25)年度春季は、動物プランクトン、植物プランクトンの個体数、種数ともに、出現数は既往調査結果の変動内であった。2013(H25)年度冬季は調査非実施である。

表－ 4.21 浮遊生物調査に関する指標範囲との比較結果

指標		調査位置	調査実施状況	指標範囲	2013(H25)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
項目	単位					
動物プランクトン	個体数/m^3	動物園東①	2013(H25)年春	最大：31,946 最小： 5,331	8,950	範囲内
植物プランクトン	細胞数/L			最大：2,530,000 最小： 72,000	827,350	範囲内
動物プランクトン	種数			最大：26 最小：16	20	範囲内
植物プランクトン				最大：74 最小：13	21	範囲内

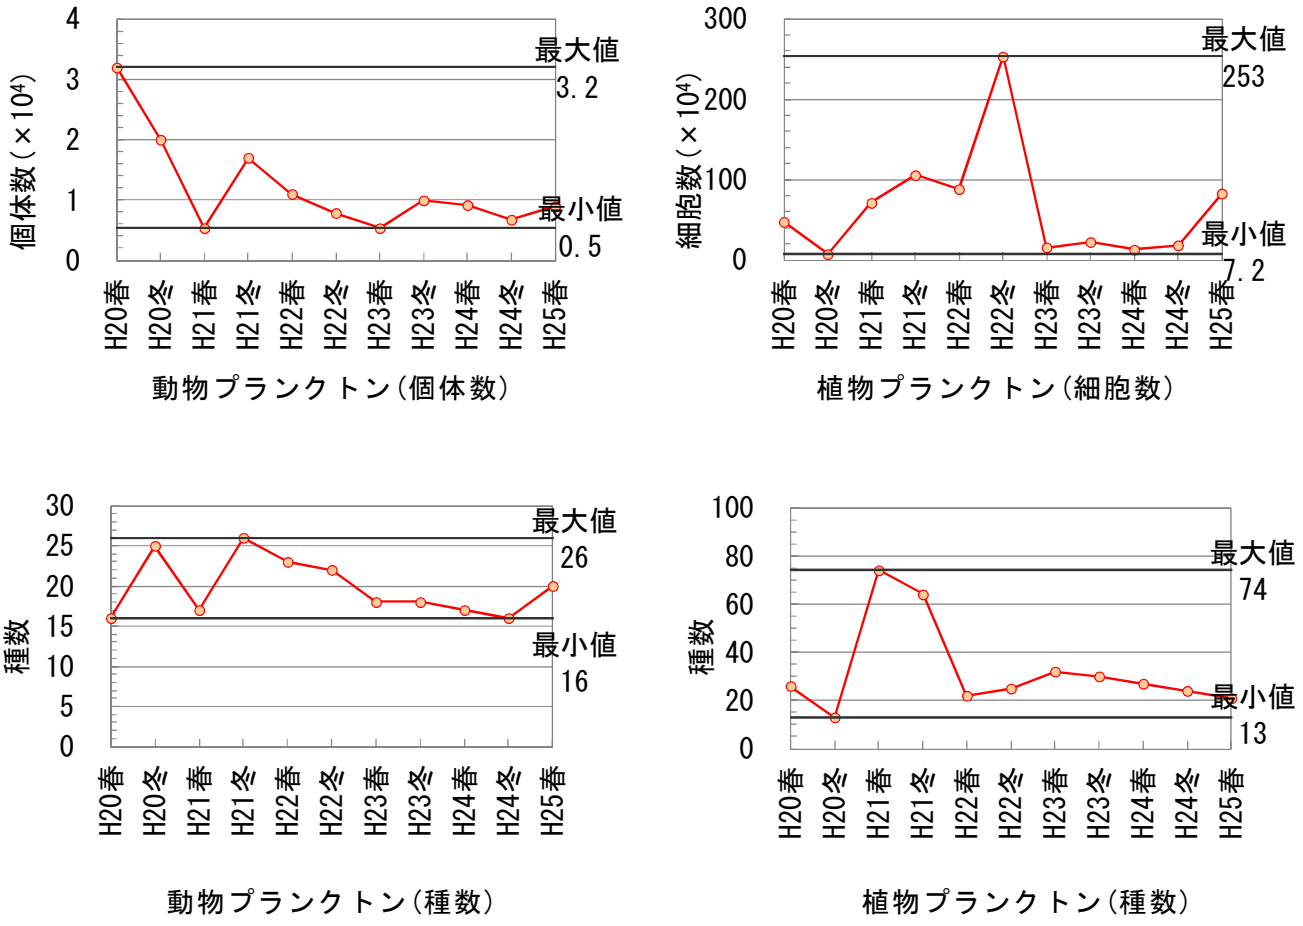

図－ 4.13　浮遊生物調査の経年変化(2008(H20)年度～2013(H25)年度)

4.3.2 付着生物調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 付着生物の出現状況

(B) 現象

- 付着生物の出現状況が、既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
付着生物の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 海中のブロック設置個所である、突堤及び既設離岸堤とする。
- 突堤は 2012(H24)年度に建設後、北側ブロック側面を 2013(H25)年春季から、北側ブロック表面を 2013(H25)年冬季から調査している。また、南側ブロック表面を 2015(H27)年春季および冬季のみ調査している。なお、2014(H26 年)冬季以降は側面の調査を実施していない。

3) 調査時期

- 季節変動を考慮して、春季(5～6 月)及び冬季(12～1 月)の 2 回/年とする。
- 2016(H28)年は、4～6 月にかけて突堤の捨石均しおよび被覆ブロック再据付が実施されたため、突堤のみ実施時期を 9 月とした。

4) 調査結果の整理方法

- 潜水目視視察及び枠内採取・調査結果と指標範囲の比較結果から門・類別の出現状況を整理し、指標範囲と比較する。
- 出現数の変動状況を既往の調査結果の最大値、最小値と比較して時系列で確認する。
- 付着動物は出現個体数、付着植物は湿重量の整理とした。また、種の多様性の確認のため、出現種数も合わせて整理した。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 2008(H20)年～2011(H23)年の付着生物調査結果から、門・綱別の出現個体数、出現種数の最大値、最小値及び平均値を算定し、指標範囲として設定する。なお、データの蓄積が少ないことから、振れ幅は設定しない。
- 地点は、従来の離岸堤ブロックと離岸堤延伸時に積み増した新しい離岸堤ブロックの 2 箇所とする。2013(H25)年冬季からは従来の離岸堤ブロックの 1 箇所とする。
- 突堤の付着生物については対策前の調査結果が存在しないため、離岸堤の指標範囲をそのまま適用する。

表－ 4.22　付着生物調査に関する指標範囲

①動物

出現個体数		住吉(離岸堤区間) St.1-①	住吉(離岸堤区間) St.1-②
軟体動物門	最大値	6608	1697
	最小値	44	191
	平均値	1775.8	873.3
環形動物門	最大値	4045	533
	最小値	0	68
	平均値	1561.5	337.0
節足動物門	最大値	33532	1045
	最小値	9	125
	平均値	5307.8	504.7
その他	最大値	29556	155
	最小値	0	33
	平均値	5517.0	74.0

出現種数		住吉(離岸堤区間) St.1-①	住吉(離岸堤区間) St.1-②
軟体動物門	最大値	18	17
	最小値	1	11
	平均値	10.5	14.3
環形動物門	最大値	25	10
	最小値	0	7
	平均値	13.2	8.3
節足動物門	最大値	21	7
	最小値	6	4
	平均値	11.6	6.0
その他	最大値	13	6
	最小値	0	2
	平均値	7.9	4.0

②植物

出現湿重量		住吉(離岸堤区間) St.1-①	住吉(離岸堤区間) St.1-②
藍藻綱	最大値	0.1	0.0
	最小値	0.0	0.0
	平均値	0.0	0.0
緑藻綱	最大値	398.0	62.7
	最小値	0.3	0.6
	平均値	54.6	25.5
褐藻綱	最大値	20.3	0.1
	最小値	0.0	0.0
	平均値	3.4	0.1
珪藻綱	最大値	2.1	0.1
	最小値	0.0	0.0
	平均値	0.3	0.0
紅藻綱	最大値	934.4	17.5
	最小値	0.1	3.4
	平均値	172.3	8.1

出現種数		住吉(離岸堤区間) St.1-①	住吉(離岸堤区間) St.1-②
藍藻綱	最大値	1.0	1.0
	最小値	0.0	0.0
	平均値	0.1	0.7
緑藻綱	最大値	3.0	2.0
	最小値	1.0	1.0
	平均値	2.1	1.7
褐藻綱	最大値	2.0	2.0
	最小値	0.0	0.0
	平均値	1.4	1.0
珪藻綱	最大値	1.0	1.0
	最小値	0.0	0.0
	平均値	0.5	0.3
紅藻綱	最大値	12.0	21.0
	最小値	3.0	5.0
	平均値	9.0	10.7

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

a) 出現個体数・湿重量

- 突堤(北側ブロック表面)では珪藻綱が既設離岸堤最大値を上回った。突堤(南側ブロック表面)では緑藻綱が連続して既設離岸堤最大値を上回った。突堤(北側ブロック表面)では紅藻綱が見られず、既設離岸堤最小値を下回った。
- 離岸堤では藍藻綱および紅藻綱が既往最大値を上回った。

b) 出現種数

- 突堤(北側ブロック表面)では紅藻綱が見られず、既設離岸堤最小値を下回った。突堤(北側ブロック表面および南側ブロック表面)で節足動物門が既設離岸堤最小値を下回った。
- 離岸堤では紅藻綱が既往最大値を上回った。

なお、突堤では 4～6 月にかけて捨石均しおよび被覆ブロック再据付が実施されたため、連続性が断たれていることに注意が必要である。

表－ 4.23　付着生物調査に関する指標範囲との比較結果(突堤)

指標		調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
項目	単位					
付着動物	個体数/m^3	住吉海岸(突堤北側)	2016(H28)年夏、冬	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
付着植物	湿重量/m^3			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■珪藻綱 突堤北側ﾌﾞﾛｯｸ表面 ■緑藻綱 突堤南側ﾌﾟﾛｯｸ表面 下記で範囲外↓ ■紅藻綱 突堤北側ﾌﾟﾛｯｸ表面
付着動物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↓ ■節足動物門 突堤北側ﾌﾞﾛｯｸ表面 突堤南側ﾌﾞﾛｯｸ表面
付着植物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↓ ■紅藻綱 突堤北側ﾌﾟﾛｯｸ表面

表－ 4.24　付着生物調査に関する指標範囲との比較結果(離岸堤)

指標		調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
項目	単位					
付着動物	個体数/m^3	住吉海岸(離岸堤区間)	2016(H28)年夏、冬	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
付着植物	湿重量/m^3			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■藍藻綱 ■紅藻綱
付着動物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
付着植物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■紅藻綱

≪参考：2015(H27)年度の付着生物調査結果≫

a) 出現個体数・湿重量

- 突堤では緑藻綱(突堤南側ブロック表面)が既設離岸堤最大値を上回った。
- 離岸堤では軟体動物門が既往最大値を上回った。また、緑藻綱が既往最小値を下回った。

b) 出現種数

- 突堤はすべての項目で指標範囲内であった。
- 離岸堤では軟体動物門、その他の動物門および紅藻綱が既往最大値を上回った。紅藻綱は、6 季連続で最大値を上回った後、指標範囲内に戻ったところである。

表－ 4.23 付着生物調査に関する指標範囲との比較結果(突堤)

指標		調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
項目	単位					
付着動物	個体数/m^3	住吉海岸(突堤北側)	2015(H27)年春、冬	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
付着植物	湿重量/m^3			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■緑藻綱 突堤南側ﾌﾞﾛｯｸ表面
付着動物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
付着植物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内

表－ 4.24　付着生物調査に関する指標範囲との比較結果(離岸堤)

指標		調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
項目	単位					
付着動物	個体数/m^3	住吉海岸(離岸堤区間)	2015(H27)年春、冬	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門
付着植物	湿重量/m^3			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↓ ■緑藻綱
付着動物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 ■その他
付着植物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■紅藻綱

≪参考：2014(H26)年度の付着生物調査結果≫

a) 出現個体数・湿重量

- 突堤では軟体動物門(突堤北側ブロック側面)、節足動物門(突堤北側ブロック側面)、藍藻綱(突堤北側ブロック表面)、緑藻綱(突堤北側ブロック表面)、褐藻綱(突堤北側ブロック表面、側面)が既設離岸堤最大値を上回った。
- 離岸堤では軟体動物門、環形動物門が最大値を上回った。軟体動物門は、2014(H26)年春季まで 3 季連続で最大値を上回っていたが、2014(H26)冬季に範囲内となった。

b) 出現種数

- 突堤では紅藻綱(突堤北側ブロック表面、側面)が既設離岸堤最小値を下回った。
- 離岸堤では軟体動物門、環形動物門、その他、緑藻綱、褐藻綱、紅藻綱が最大値を上回った。紅藻綱は、5 季連続で最大値を上回っている。

表－ 4.25 付着生物調査に関する指標範囲との比較結果(突堤)

指標		調査位置	調査実施状況	指標範囲	2014(H26)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
項目	単位					
付着動物	個体数/m^3	住吉海岸(突堤北側)	2014(H26)年春、冬	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 突堤北側ﾌﾞﾛｯｸ側面 ■節足動物門 突堤北側ﾌﾞﾛｯｸ側面
付着植物	湿重量/m^3			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■藍藻綱 突堤北側ﾌﾞﾛｯｸ表面 ■緑藻綱 突堤北側ﾌﾞﾛｯｸ表面 ■褐藻綱 突堤北側ﾌﾞﾛｯｸ表面、側面
付着動物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
付着植物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↓ ■紅藻綱 突堤北側ﾌﾞﾛｯｸ表面、側面

表－ 4.26　付着生物調査に関する指標範囲との比較結果(離岸堤)

指標		調査位置	調査実施状況	指標範囲	2013(H25)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
項目	単位					
付着動物	個体数/m^3	住吉海岸(離岸堤区間)	2014(H26)年春、冬	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 ■環形動物門
付着植物	湿重量/m^3			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
付着動物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 ■環形動物門 ■その他
付着植物	種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■緑藻綱 ■褐藻綱 ■紅藻綱

表－ 4.29　付着生物の門・綱別出

：当該地点の出現個体数、　：当該時期の沿岸での

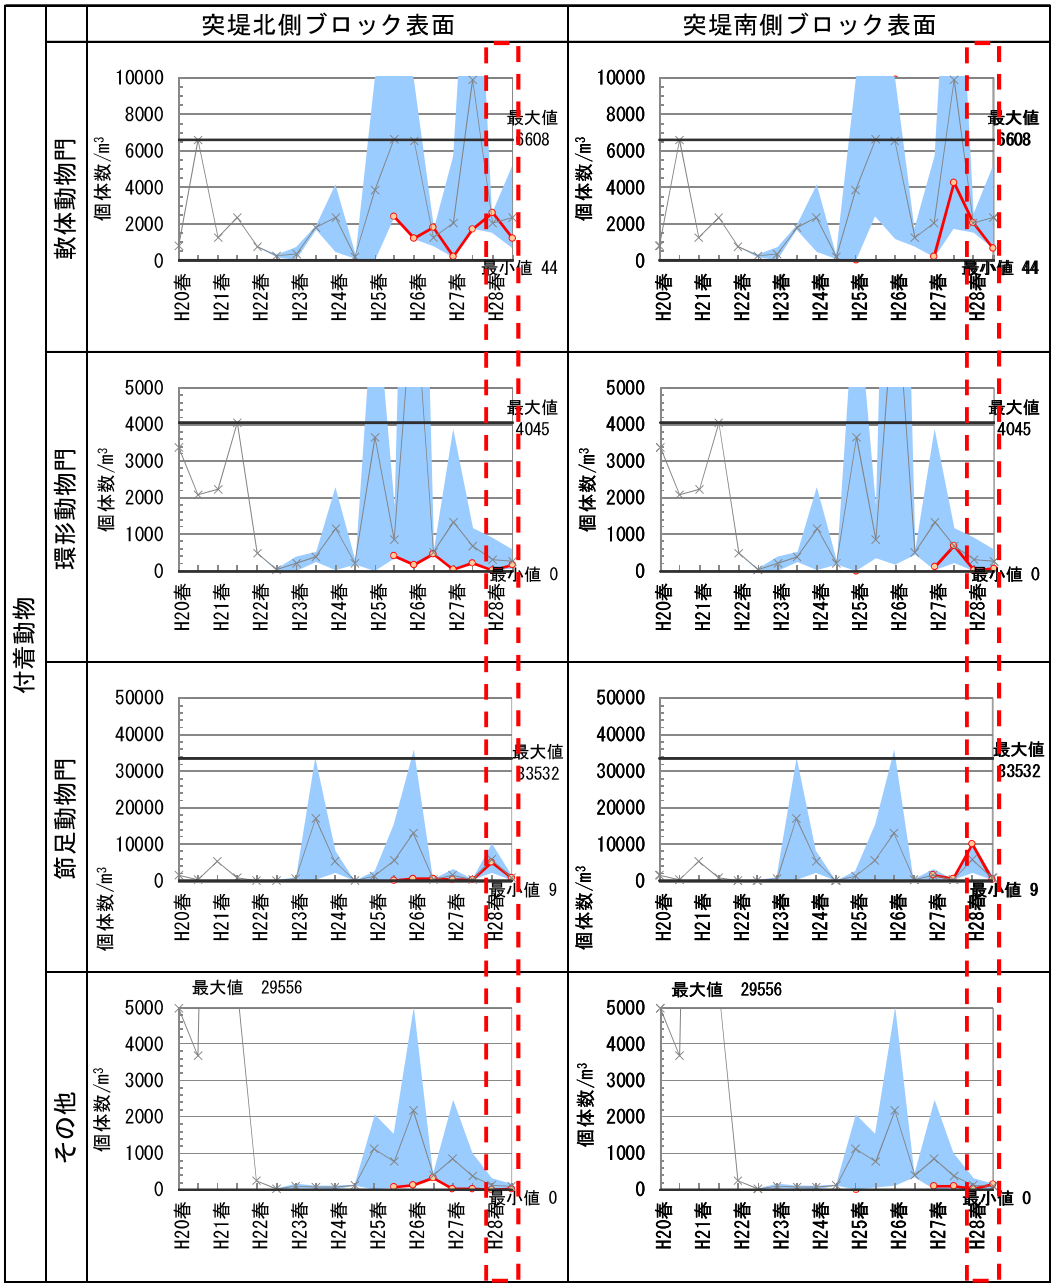

現個体数・湿重量の変動状況（突堤）

）出現個体数分布範囲、×：当該時期の平均出現個体数・湿重量

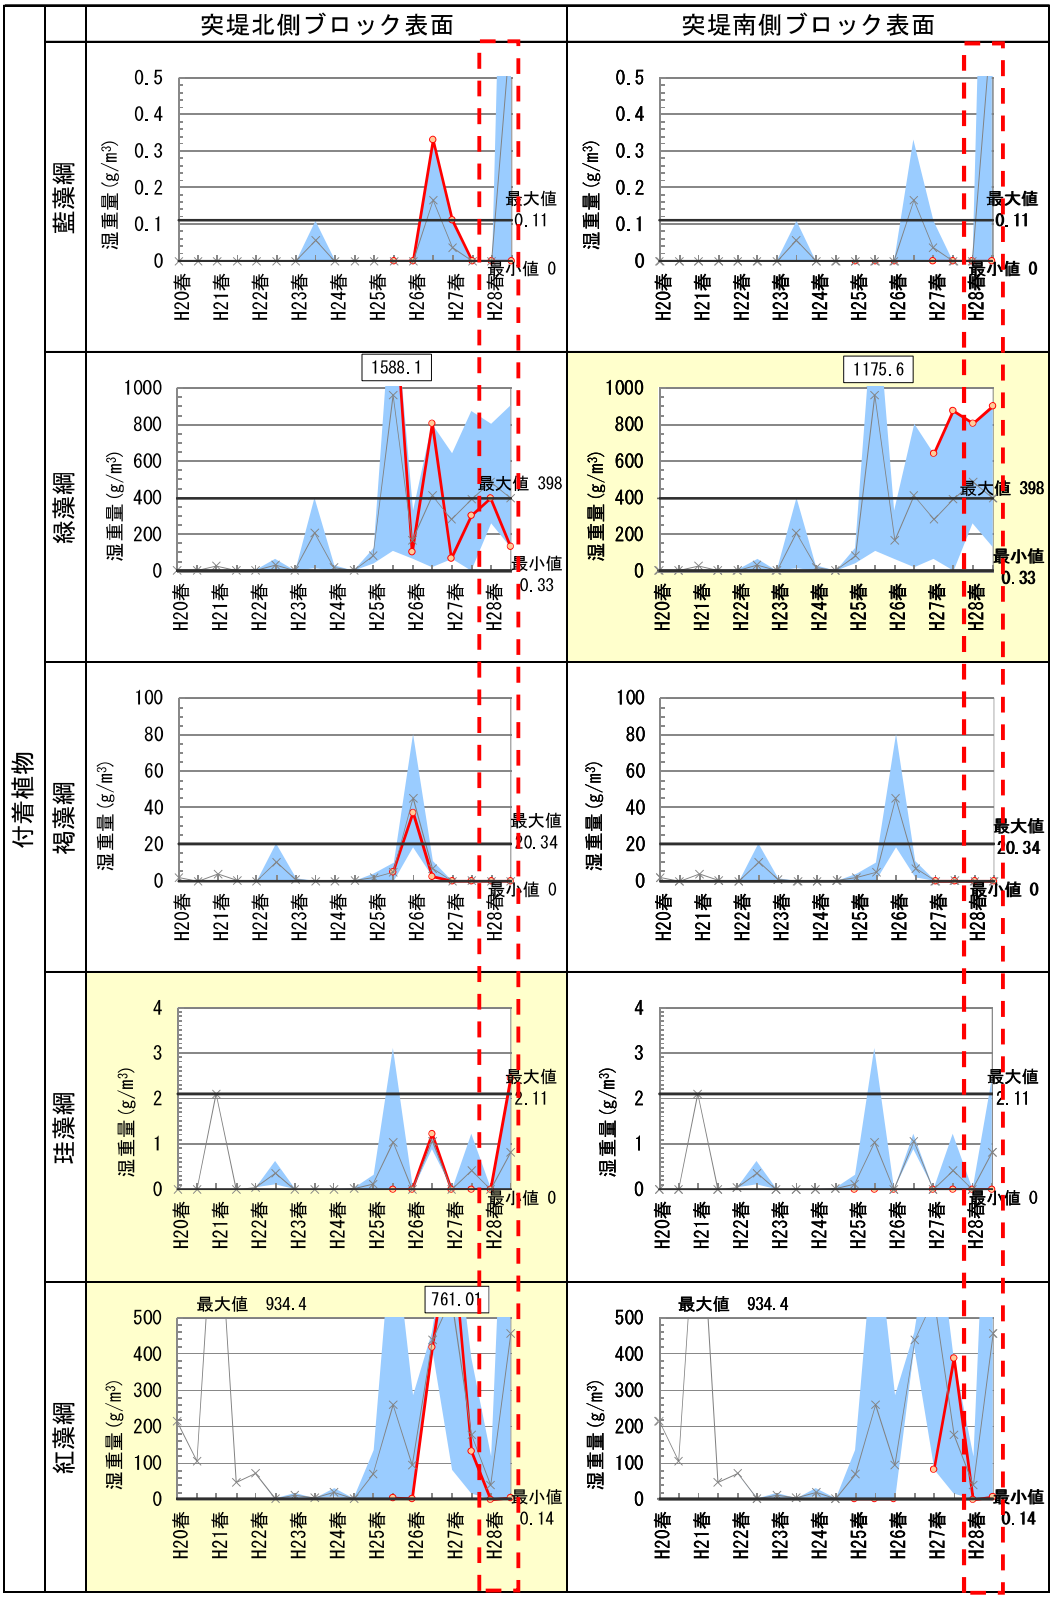

表－ 4.30　付着生物の門・綱

：当該地点の出現種数、　：当該時期の沿

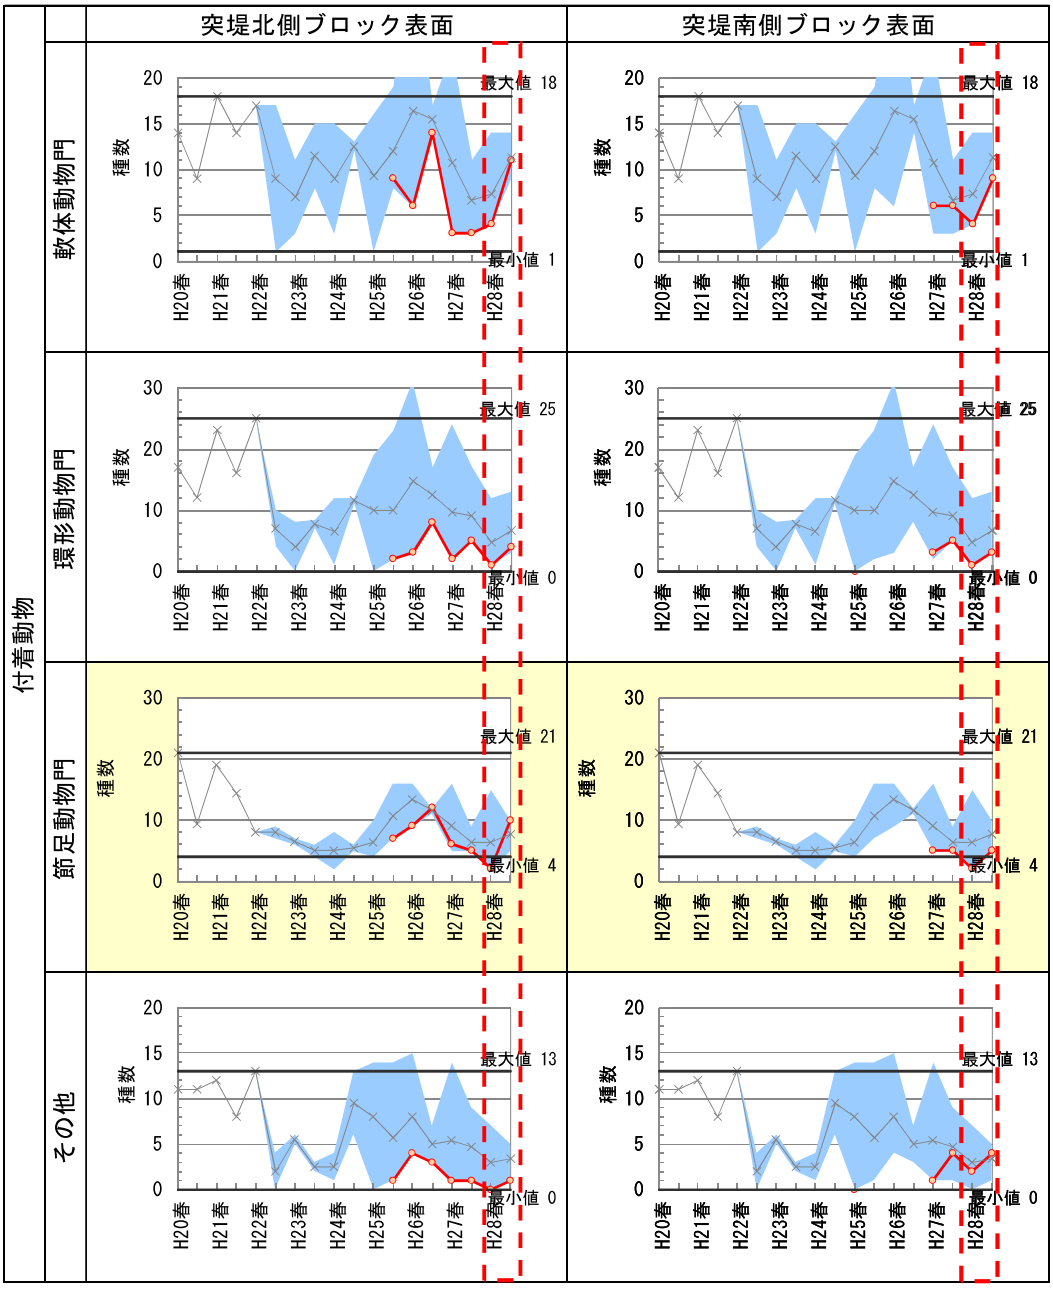

別出現種数の変動状況（突堤）

岸での出現種数分布範囲、×：当該時期の平均出現種数

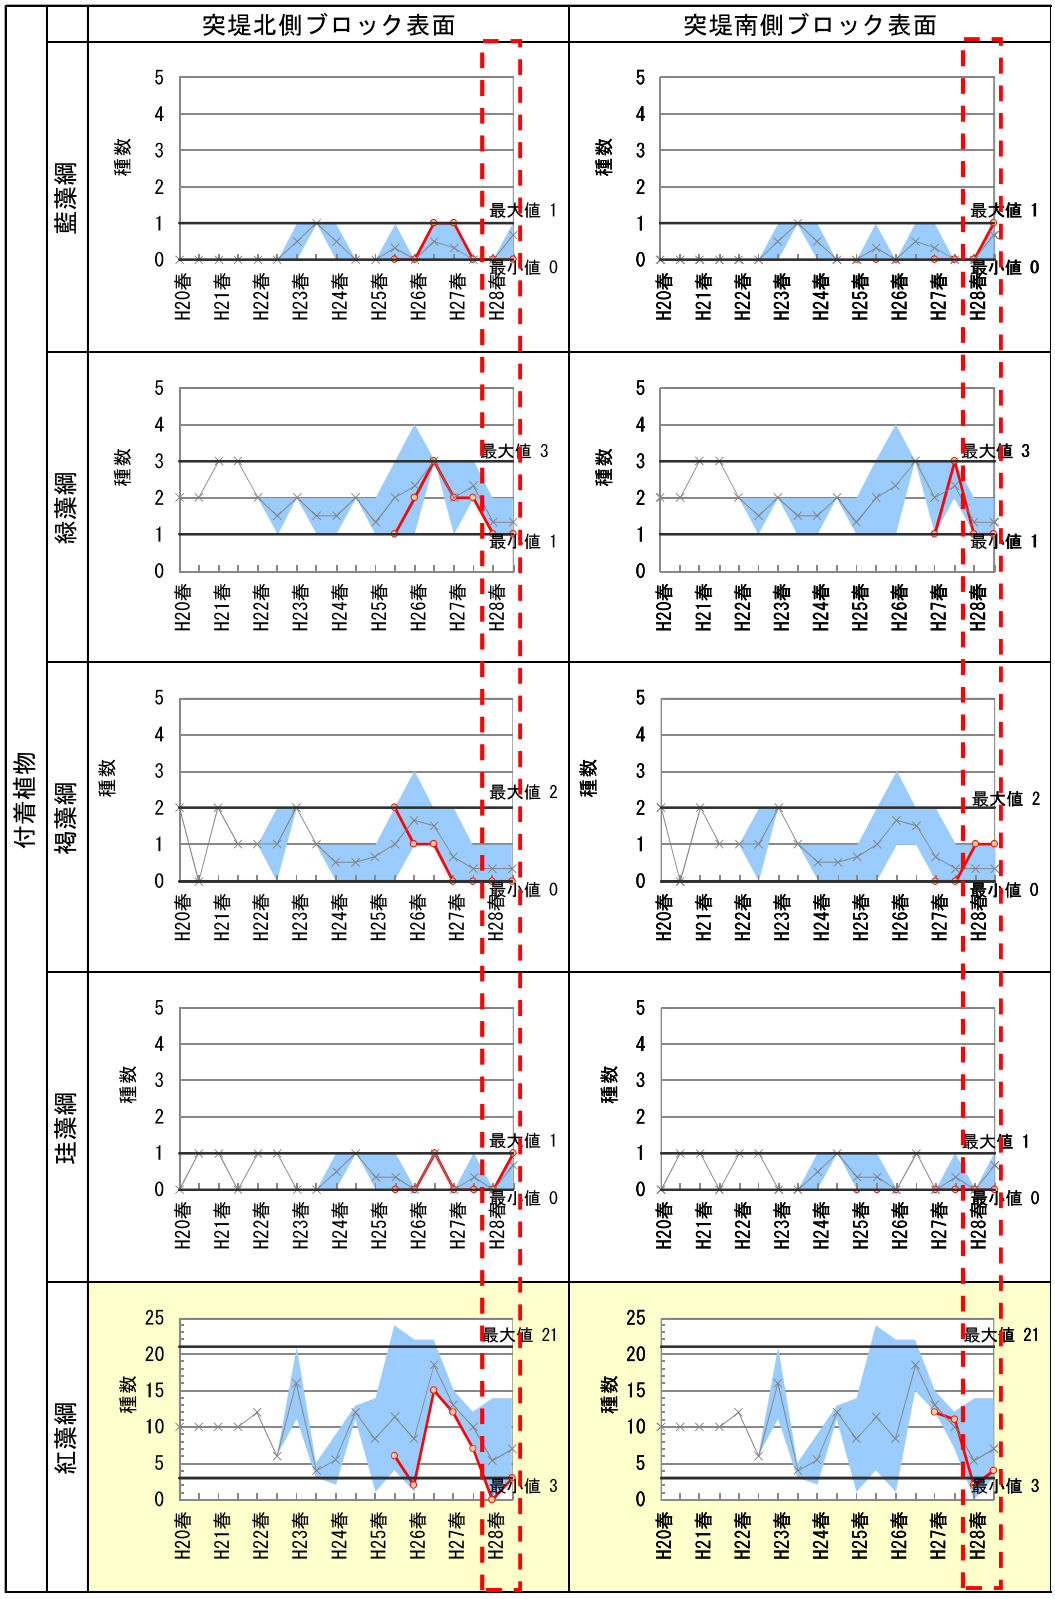

表－ 4.31　付着生物の門・綱別出現

：当該地点の出現個体数、■：当該時期の沿岸での

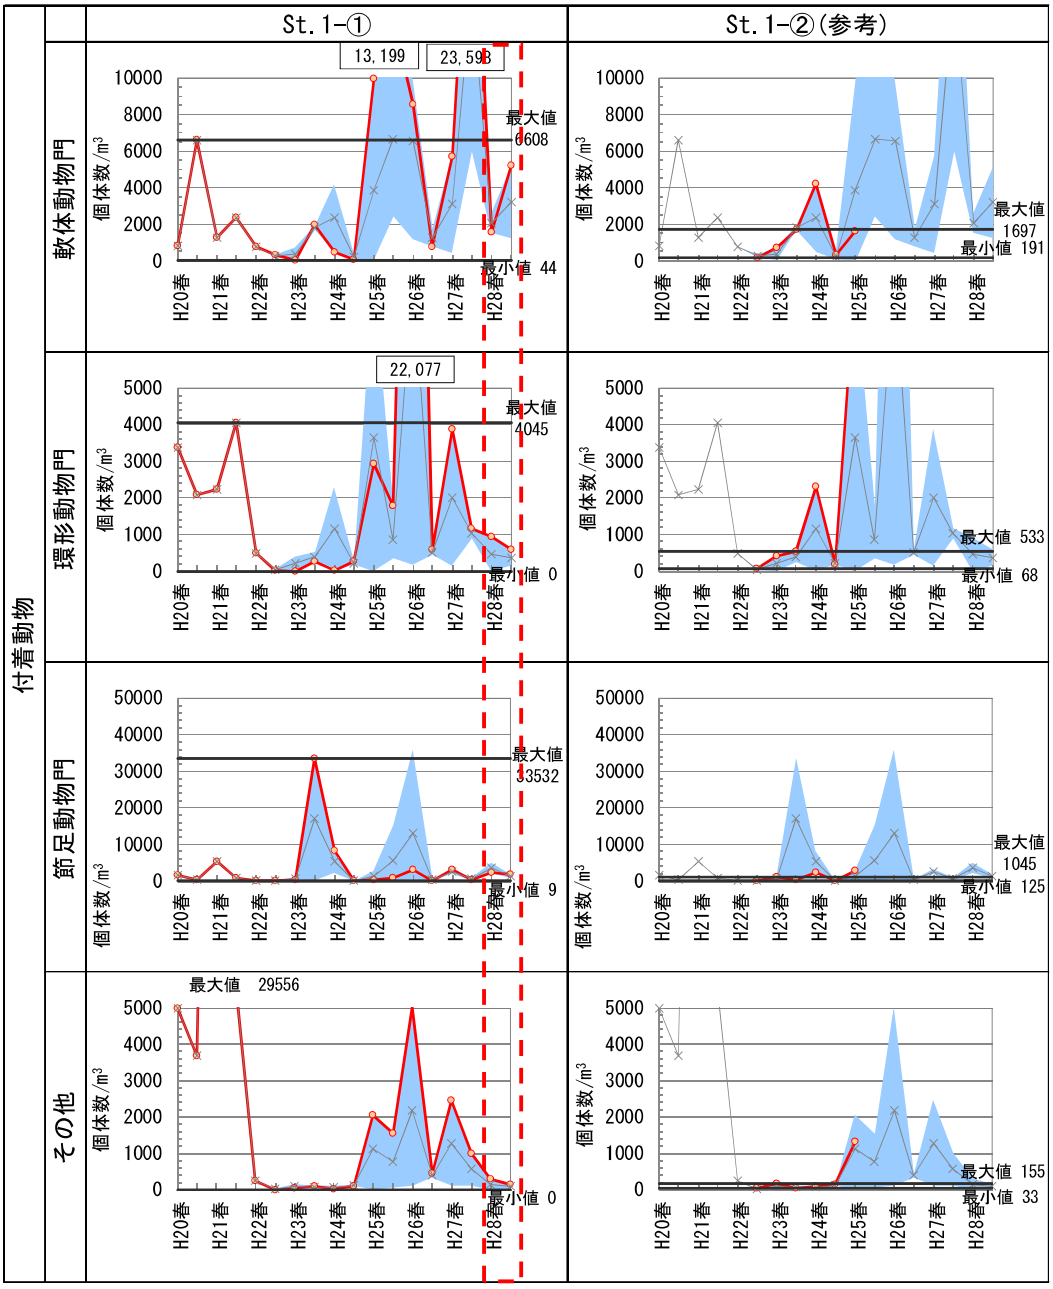

個体数・湿重量の変動状況(離岸堤)

)出現個体数分布範囲、×：当該時期の平均出現個体数・湿重量

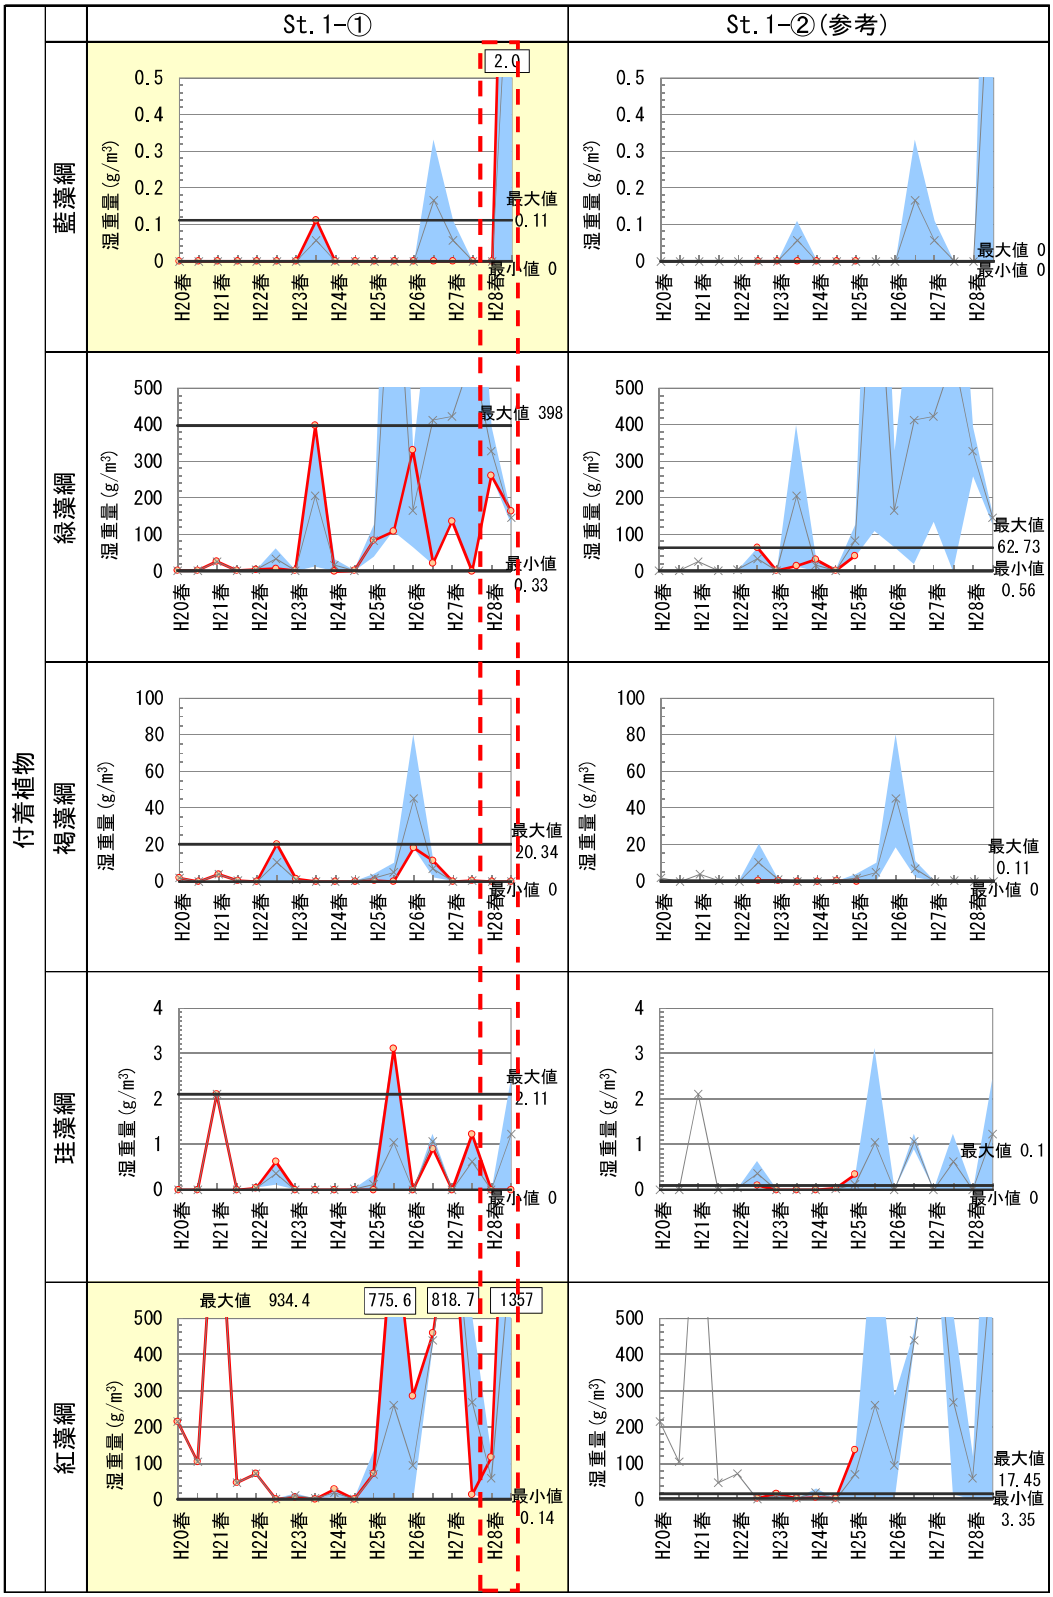

表－ 4.32　付着生物の門・綱

：当該地点の出現種数、　：当該時期の沿

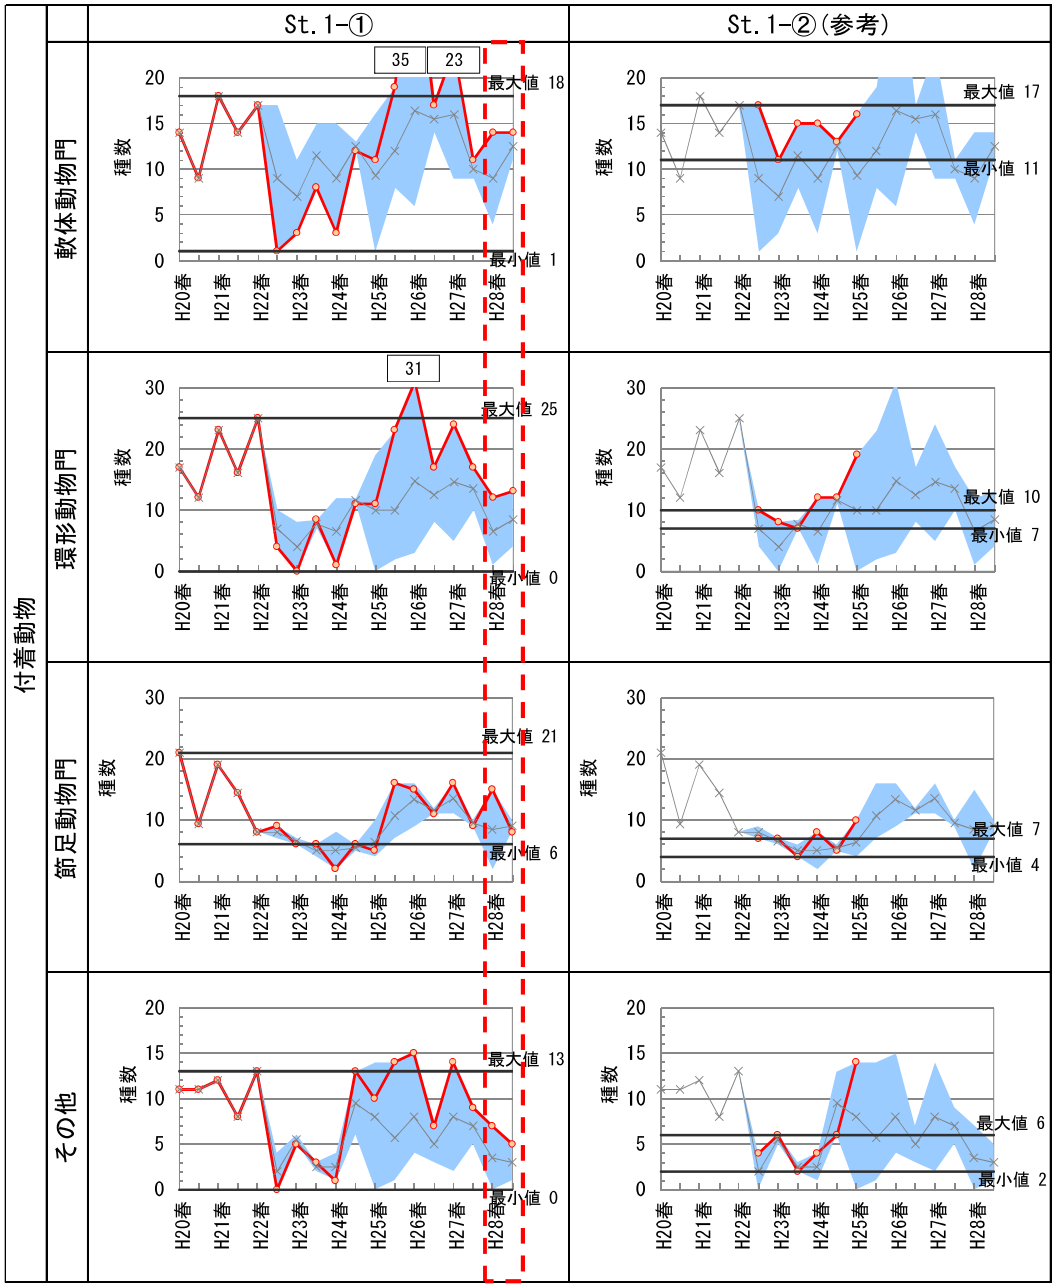

引出現種数の変動状況（離岸堤）

岸での出現種数分布範囲、×：当該時期の平均出現種数

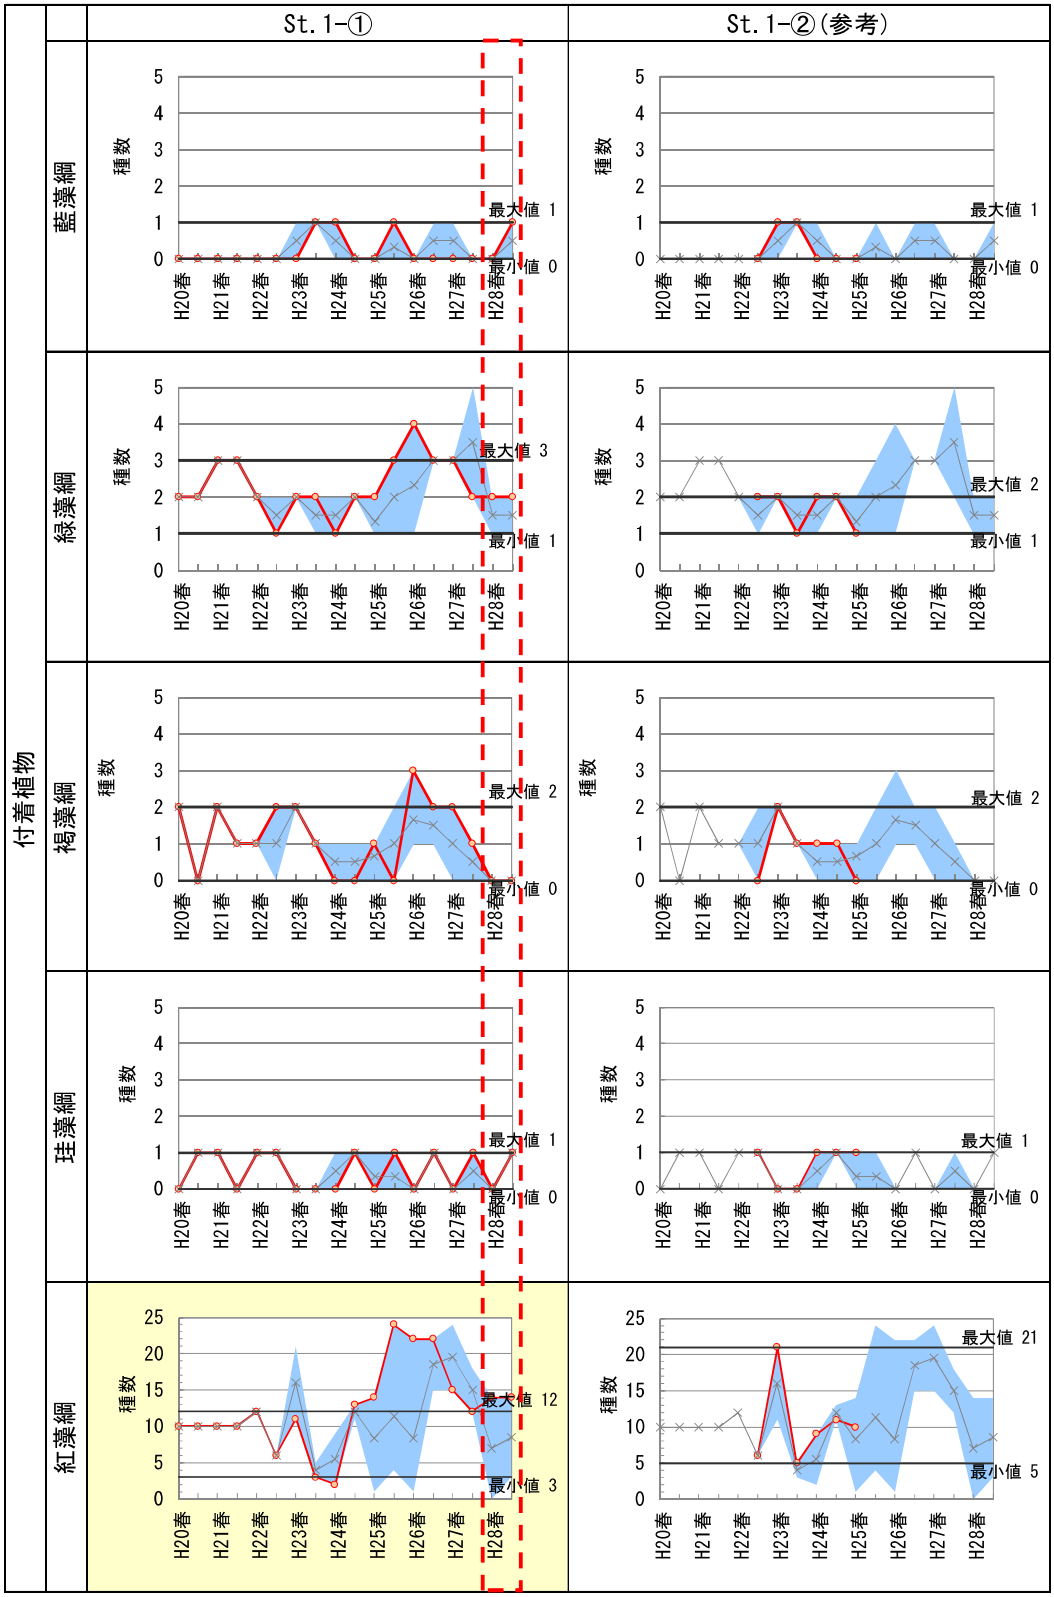

4.3.3 幼稚仔調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 幼稚仔の出現状況

(B) 現象

- 幼稚仔の出現状況が、既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
幼稚仔の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 比較対象として一ツ瀬川左岸を含んだ 6 地点とする。
- 第 2 回効果検証分科会における「調査の効率化」で 2013(H25)年度冬季より 3 地点に変更した。

3) 調査時期・頻度

- 季節変動を考慮して、春季(5～6 月)及び冬季(12～1 月)の 2 回/年とする。

4) 調査結果の整理方法

- サーフネットを用いた幼稚仔の採取･調査結果と指標範囲の比較結果から 1km 程度に区分したブロックに対応する地点毎に、門別の出現状況を整理し、指標範囲と比較する。
- 出現数の変動状況を既往の調査結果の最大値、最小値と比較して時系列で確認する。
- 幼稚仔は門毎に大枠の生息特性が異なるため、門毎に整理する。
- 幼稚仔は種別の個体重量の差が小さいため、出現重量ではなく出現個体数の整理とした。また、種の多様性の確認のため、出現種数も合わせて整理する。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 2008(H20)年～2011(H23)年の幼稚仔調査結果から、地点毎に門別の出現個体数及び出現種数の最大値、最小値及び平均値を算定し、指標範囲として設定する。なお、データ蓄積が少ないことから振れ幅は設定しない。

表－ 4.33　幼稚仔調査に関する指標範囲

出現個体数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	4	0	1	0	1	19
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.8	0.0	0.1	0.0	0.4	2.5
環形動物門	最大値	10	1	0	8	2	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	1.5	0.1	0.0	1.3	0.3	0.0
節足動物門	最大値	4357	219	268	344	350	820
	最小値	3	11	16	7	20	18
	平均値	852.5	75.6	74.3	131.4	187.5	232.4
脊髄動物門	最大値	127	1287	219	1574	378	47947
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	28.8	210.5	67.0	345.1	107.5	6074.0
その他	最大値	26	21	27	8	31	96
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	5.9	3.9	4.1	1.3	5.6	12.8

出現個体数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	3	0	1	0	1	1
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.6	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3
環形動物門	最大値	2	1	0	1	1	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.5	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0
節足動物門	最大値	19	24	17	19	16	22
	最小値	1	2	3	4	4	4
	平均値	9.4	9.9	8.1	8.6	9.3	10.3
脊髄動物門	最大値	6	11	19	9	8	10
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	2.4	3.1	5.8	4.5	4.6	4.8
その他	最大値	6	11	19	9	8	10
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	2.4	3.1	5.8	4.5	4.6	4.8

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

a)　出現個体数

- 2016(H28)年度は、節足動物門が大炊田②で既往最大値を上回った。

b)　出現種数

- 2016(H28)年度は、軟体動物門が小丸川～一ツ瀬川で既往最大値を上回った。

表－ 4.34　幼稚仔調査に関する指標範囲との比較結果

指標	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
出現個体数	住吉海岸～小丸川	2016(H28)年春、冬	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■節足動物門 大炊田②
出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 小丸川～一ツ瀬川

≪参考：2015(H27)年度の幼稚仔調査結果≫

a)　出現個体数

- 2015(H27)年度は、節足動物門が大炊田②で既往最大値を上回った。

b)　出現種数

- 2015(H27)年度は、脊髄動物門が大炊田②で既往最大値を上回った。

表－ 4.34　幼稚仔調査に関する指標範囲との比較結果

指標	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
出現個体数	住吉海岸～小丸川	2015(H27)年春、冬	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■節足動物門 大炊田②
出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■脊髄動物門 大炊田②

≪参考：2014(H26)年度の幼稚仔調査結果≫

a) 出現個体数

- 2014(H26)年度は、軟体動物門が大炊田②および住吉(離岸堤区間)で既往最大値を上回った。環形動物門は住吉(離岸堤区間)で既往最大を上回った。節足動物門は調査対象のすべての地点で既往最大値を上回った。脊髄動物門は大炊田②で既往最大値を上回った。特に、夏季調査で既往最大値を上回った地点・種が多かった。

b) 出現種数

- 2014(H26)年度は、節足動物が大炊田②および住吉(離岸堤区間)で既往最大値を上回った。また、脊髄動物が大炊田②で既往最大値を上回った。

表－ 4.35 幼稚仔調査に関する指標範囲との比較結果

指標	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2014(H26)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
出現個体数	住吉海岸～小丸川	2014(H26)年春、冬	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田② ■環形動物門 住吉(離岸堤区間)、 ■節足動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川 ■脊椎動物門 大炊田②
出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川 ■節足動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田② ■脊髄動物門 大炊田②

表－ 4.37　幼稚仔の門

：当該地点の出現個体数、 ：当該時期の沿岸

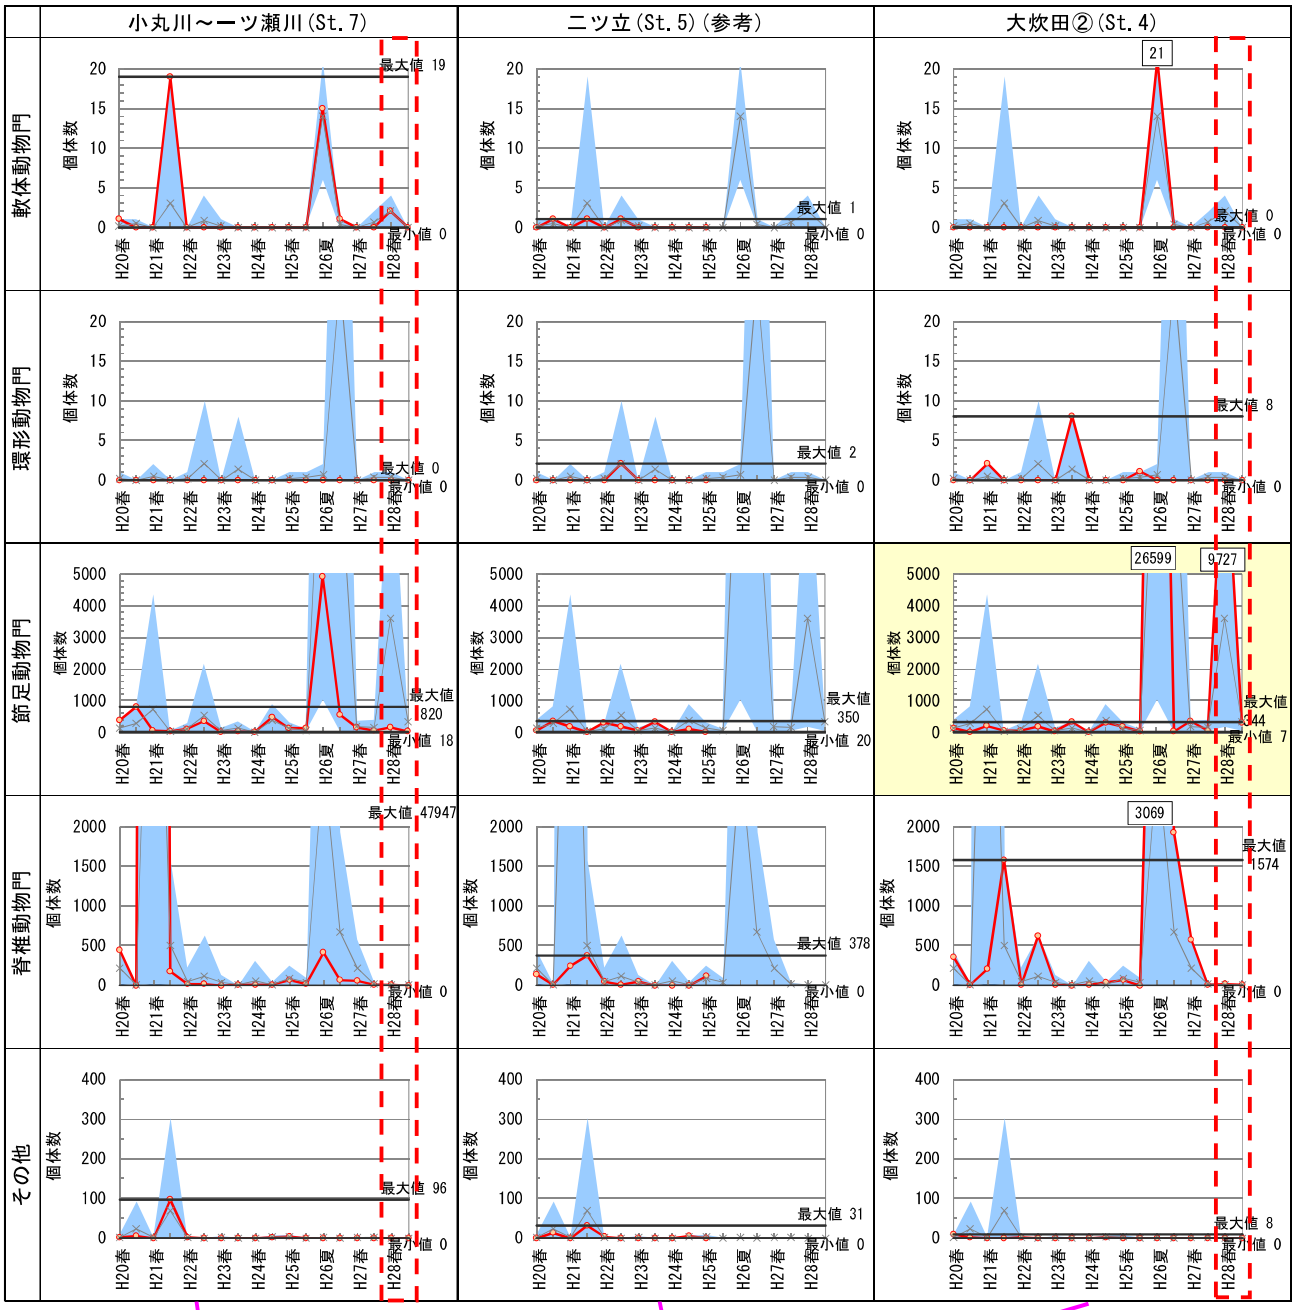

別出現個体数の変動状況

での出現個体数分布範囲、×：当該時期の平均出現個体数

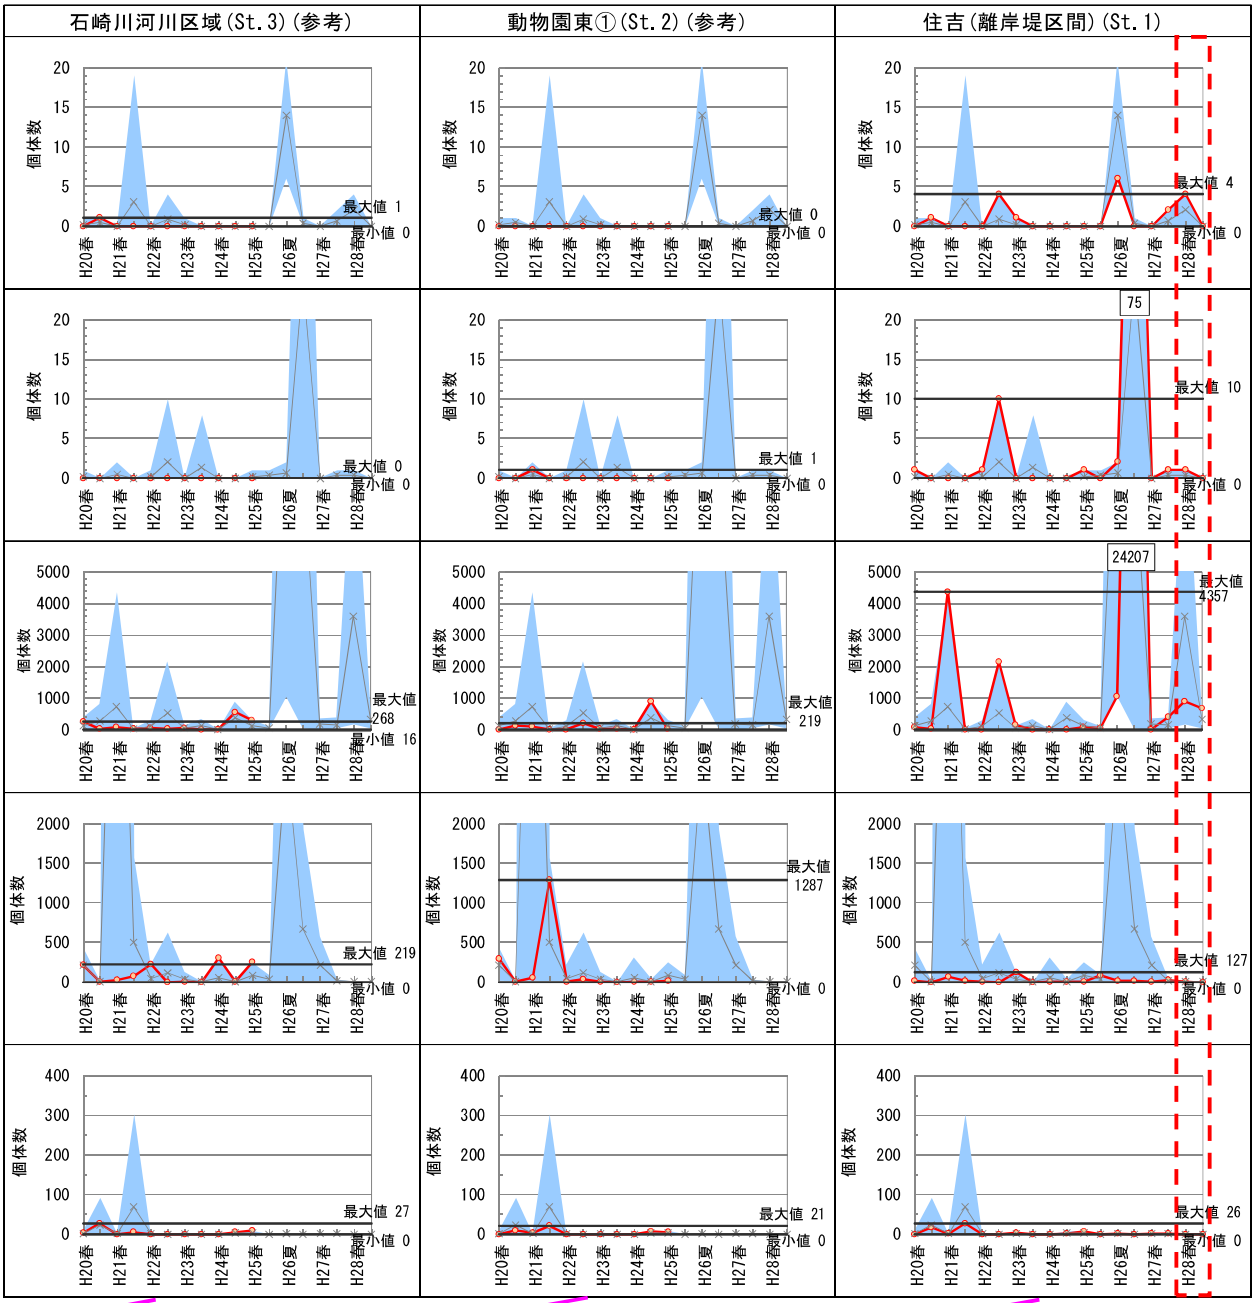

表－ 4.38　幼稚仔の門

●：当該地点の出現種数、■：当該時期の沿

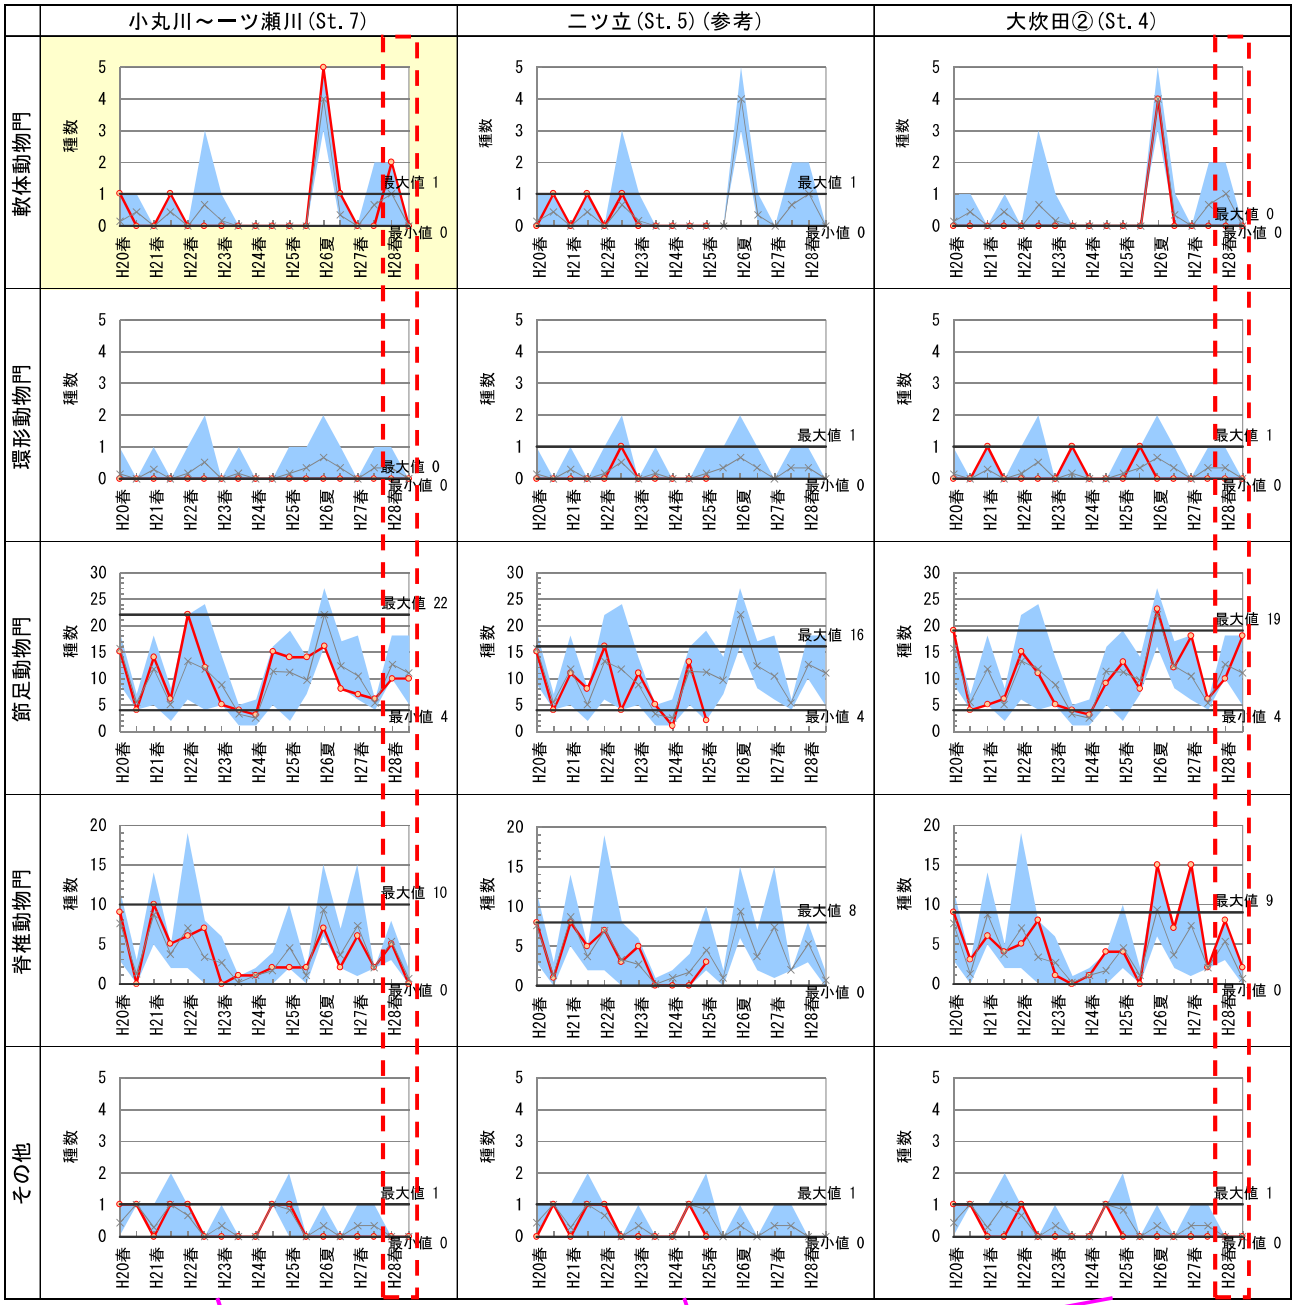

別出現種数の変動状況

岸での出現種数分布範囲、×：当該時期の平均出現種数

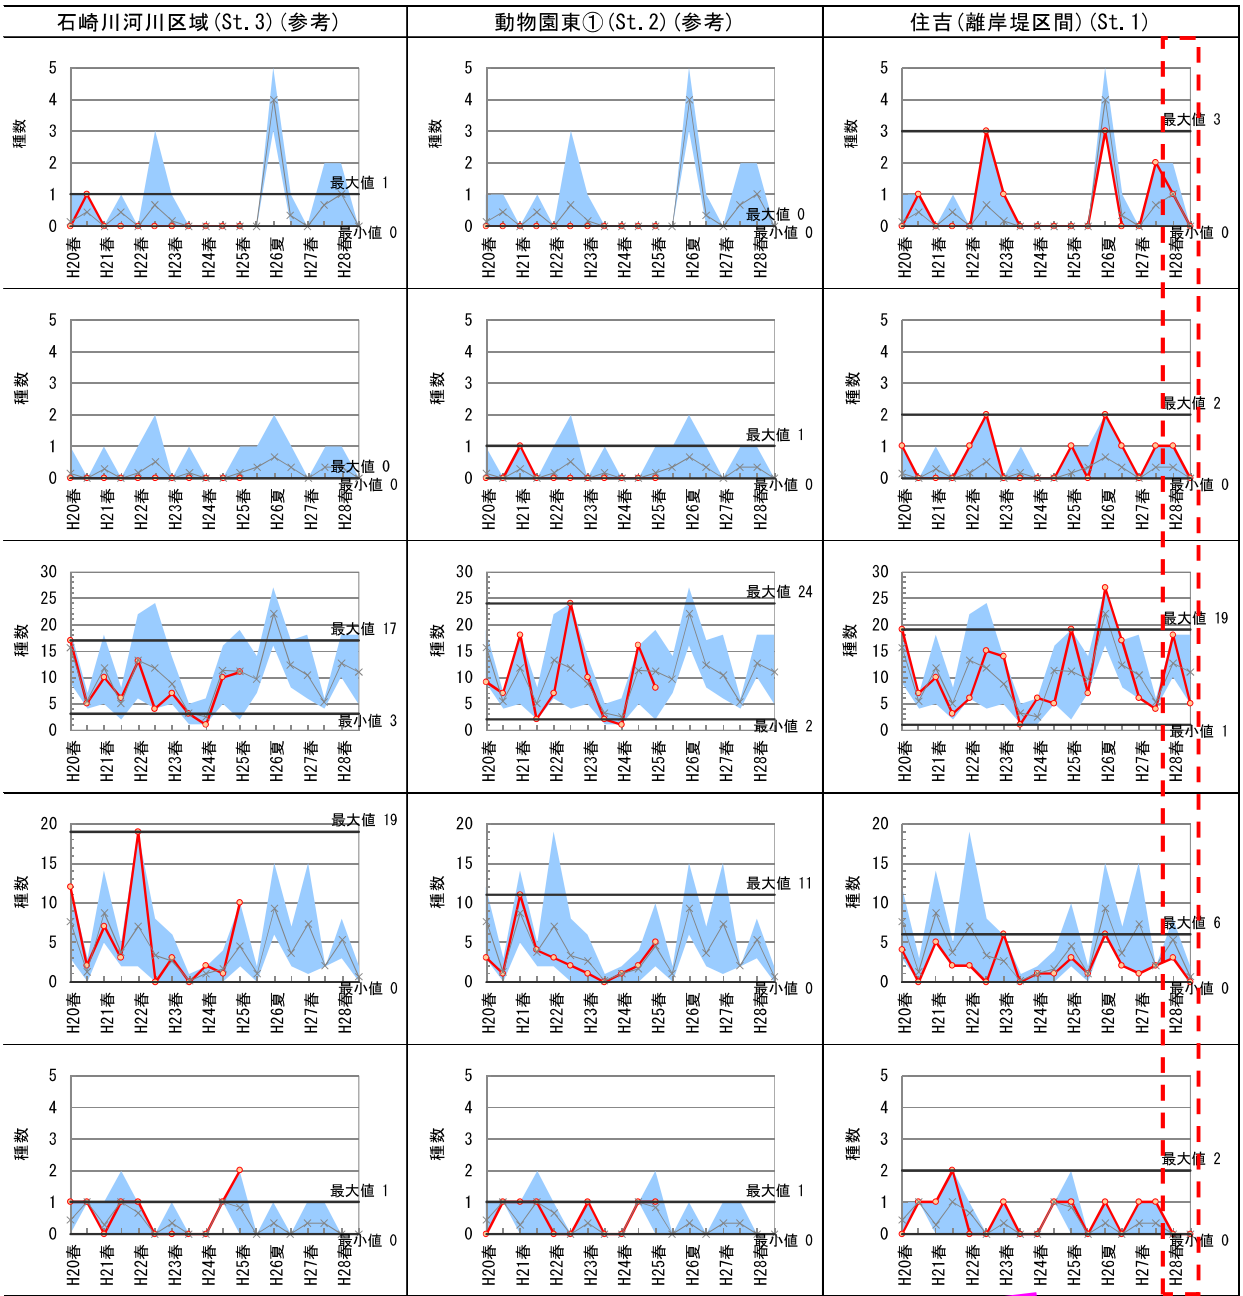

4.4　底 生 生 物

4.4.1　沿岸全域

1)　調査結果で確認する指標と現象

(A)　指標

- 底生生物の出現状況

(B)　現象

- 底生生物の出現状況が、既往の調査結果と異ならないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
底生生物の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2)　調査位置

- 6 地点（小丸川～一ツ瀬川(St.7)．二ツ立(St.5)，大炊田②(St.4)，石崎川河川区域(St.3)，動物園東①(St.2)，住吉(離岸堤区間)(St.1)）とする。
- 第 2 回効果検証分科会における「調査の効率化」で 2013(H25)年度冬季より 3 地点に変更した。

3)　調査時期

- 5-6 月，11 月，1-2 月とする。

4)　調査結果の整理方法

- 定点での採泥器、ソリネットによる底質採取、調査結果と指標範囲の比較結果から 1km 程度に区分したブロックに対応する地点毎に、門別の出現状況を整理し、指標範囲と比較する。
- 出現数の変動状況を既往の調査結果の最大値、最小値と比較して時系列で確認する。
- 地点別・岸沖方向(汀線付近、砕波帯)の調査結果について、門毎に出現個体数及び出現種数、湿重量を整理する。

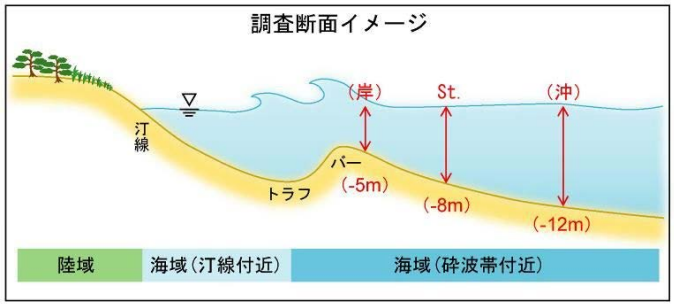

図－ 4.14　底生生物調査の調査位置断面イメージ

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 2008(H20)年度～2011(H23)年度の底生生物調査のうち、定点調査結果から、地点別・岸沖方向(汀線付近、砕波帯)の調査結果について、門毎に出現個体数及び出現種数、湿重量を整理する。
- 整理結果から出現数の最大値､最小値及び平均値を算定し､指標として設定する。なお、データの蓄積が少ないことから振れ幅は設定しない。

表－ 4.39　底生生物調査(沿岸全域)に関する指標範囲

出現個体数(採泥器　汀線)

出現個体数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	28	61	7	7	55	48
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	3.5	15.6	1.0	1.8	10.5	7.1
環形動物門	最大値	28	28	1	14	14	2
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	3.6	6.1	0.1	4.4	2.0	0.4
節足動物門	最大値	33	48	35	207	327	110
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	14.0	19.4	17.9	40.1	54.6	36.9
その他	最大値	14	0	0	7	14	7
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	3.5	0.0	0.0	0.9	1.8	1.0

出現個体数(採泥器　砕波帯)

出現個体数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	1120	799	1467	1121	93	1601
	最小値	9	9	7	2	5	8
	平均値	164.4	153.7	230.3	160.7	33.2	262.0
環形動物門	最大値	159	241	226	372	145	510
	最小値	8	16	28	41	6	58
	平均値	49.3	84.8	99.7	116.4	59.8	162.2
節足動物門	最大値	180	215	334	152	308	338
	最小値	5	21	13	16	27	17
	平均値	57.9	108.3	90.7	75.9	101.2	181.1
その他	最大値	21	35	74	167	35	40
	最小値	0	5	5	0	0	0
	平均値	11.8	17.7	18.6	36.8	13.6	15.3

出現種数(採泥器　汀線)

出現種数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	2	4	1	1	2	1
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.3	1.4	0.3	0.3	0.6	0.4
環形動物門	最大値	4	2	1	2	2	2
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.6	0.6	0.1	0.5	0.5	0.4
節足動物門	最大値	2	3	3	2	2	6
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	1.3	1.4	1.8	1.0	1.4	2.5
その他	最大値	2	0	0	1	1	1
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3

出現種数(採泥器　砕波帯)

出現個体数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	8	7	6	7	6	8
	最小値	2	2	1	1	2	2
	平均値	5.1	4.3	3.7	4.0	3.6	4.9
環形動物門	最大値	8	9	11	15	8	13
	最小値	1	3	1	3	1	2
	平均値	4.2	5.1	4.8	5.9	3.7	6.0
節足動物門	最大値	10	13	9	7	10	12
	最小値	2	2	2	2	2	6
	平均値	6.0	5.7	5.1	5.0	4.4	8.6
その他	最大値	3	3	3	3	3	4
	最小値	0	1	1	0	0	0
	平均値	1.4	2.0	1.4	1.6	1.6	1.9

湿重量(採泥器　汀線)

湿重量(g/m3)		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	17	13	0	4	62	5
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	2.1	3.3	0.1	0.8	8.7	0.6
環形動物門	最大値	1	1	0	0	0	1
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1
節足動物門	最大値	2	1	2	7	2	1
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.3	0.3	0.5	1.0	0.6	0.3
その他	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

湿重量(採泥器　砕波帯)

湿重量(g/m3)		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	38	103	124	81	40	105
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	17.5	25.9	16.8	12.0	11.2	18.6
環形動物門	最大値	2	2	10	12	1	18
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.7	0.8	1.9	1.8	0.4	2.6
節足動物門	最大値	27	3	17	6	3	17
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	4.0	0.7	3.2	2.1	1.0	3.8
その他	最大値	13	20	4	10	24	17
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	3.4	4.0	0.6	2.5	5.1	3.2

出現個体数(ソリネット　汀線)

出現個体数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	4	10	13	2	3	32
	最小値	0	0	0	0	0	1
	平均値	1.1	2.5	2.8	0.5	1.0	7.3
環形動物門	最大値	1	2	1	1	2	19
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.3	0.5	0.1	0.3	0.3	2.4
節足動物門	最大値	26	103	369	936	200	218
	最小値	1	0	0	4	0	1
	平均値	7.6	34.3	78.8	158.4	34.3	63.1
脊椎動物門	最大値	0	0	2	9	2	5
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.3	1.5	0.3	1.0
その他	最大値	6	3	2	1	3	47
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	1.1	0.9	0.3	0.3	0.5	6.3

出現種数(ソリネット　汀線)

出現種数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	3	2	3	2	2	9
	最小値	0	0	0	0	0	1
	平均値	0.8	0.8	0.9	0.5	0.8	2.0
環形動物門	最大値	1	2	1	1	1	12
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.3	0.5	0.1	0.3	0.1	1.5
節足動物門	最大値	7	5	3	6	5	28
	最小値	1	0	0	1	0	1
	平均値	3.5	2.3	1.5	2.8	2.4	7.0
脊椎動物門	最大値	0	0	1	1	2	2
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5
その他	最大値	0	0	1	1	2	2
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5

湿重量(ソリネット　汀線)

湿重量(g/m3)		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門	最大値	1	12	6	1	1	6
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.2	1.8	0.8	0.2	0.2	1.6
環形動物門	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
節足動物門	最大値	1	11	27	8	4	2
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.2	2.4	3.8	1.9	0.8	0.7
脊椎動物門	最大値	0	0	0	2	1	12
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	2.2
その他	最大値	1	0	4	0	0	68
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	8.9

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

a) 出現個体数

- 採泥器調査(汀線)は、軟体動物門（大炊田②)、環形動物門（大炊田②)、節足動物門（小丸川～一ツ瀬川、大炊田②、住吉(離岸堤区間)）が指標範囲を上回った。
- 採泥器調査(砕波帯)は、その他（小丸川～一ツ瀬川、住吉(離岸堤区間)）が指標範囲を上回った。環形動物門（小丸川～一ツ瀬川）が指標範囲を下回った。なお、住吉(離岸堤区間)においては､その他が6季連続して指標範囲を上回っていたが、2016(H28)年度冬季調査で指標範囲内となった。
- ソリネット調査は、軟体動物門（大炊田②)、節足動物門（小丸川～一ツ瀬川、住吉(離岸堤区間)）が指標範囲を上回った。

b) 出現種数

- 採泥器調査(汀線)は、環形動物門（小丸川～一ツ瀬川)、節足動物門（大炊田②、住吉(離岸堤区間)）が指標範囲を上回った。
- 採泥器調査(砕波帯)は、軟体動物門（小丸川～一ツ瀬川）が指標範囲を上回った。また、節足動物門（小丸川～一ツ瀬川）が指標範囲を下回った。
- ソリネット調査は、その他（住吉(離岸堤区間)）が指標範囲を上回った。

c) 湿重量

- 採泥器調査(汀線)は、環形動物門（大炊田②)、節足動物門（小丸川～一ツ瀬川)、その他（小丸川～一ツ瀬川）が指標範囲を上回った。
- 採泥器調査(砕波帯)は、すべて指標範囲内であった。
- ソリネット調査は、軟体動物門（大炊田②)、節足動物門（小丸川～一ツ瀬川)、その他（大炊田②）が指標範囲を上回った。

表－ 4.40　底生生物(沿岸全域)に関する指標範囲との比較結果(採泥器調査)

調査種別	指標	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
採泥器調査	出現個体数	住吉海岸～小丸川 汀線付近	2016(H28)年春季、冬季	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 大炊田② ■環形動物門 大炊田② ■節足動物門 小丸川～一ツ瀬川、大炊田②、住吉(離岸堤区間)
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■環形動物門 小丸川～一ツ瀬川 ■節足動物門 大炊田②、住吉(離岸堤区間)
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■環形動物門 大炊田② ■節足動物門 小丸川～一ツ瀬川 ■その他 小丸川～一ツ瀬川
	出現個体数	住吉海岸～小丸川 砕波帯付近		次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■その他 小丸川～一ツ瀬川、住吉(離岸堤区間) 下記で範囲外↓ ■環形動物門 小丸川～一ツ瀬川
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 小丸川～一ツ瀬川 下記で範囲外↓ ■節足動物門 小丸川～一ツ瀬川
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内

表－ 4.41　底生生物(沿岸全域)に関する指標範囲との比較結果(ソリネット調査)

調査種別	指標	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
ソリネット	出現個体数	住吉海岸～小丸川 汀線付近	2016(H28)年春季、冬季	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 大炊田② ■節足動物門 小丸川～一ツ瀬川、住吉(離岸堤区間)
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■その他 住吉(離岸堤区間)
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 大炊田② ■節足動物門 小丸川～一ツ瀬川 ■その他 大炊田②

≪参考：2015(H27)年度の底生生物調査結果≫

a) 出現個体数

- 採泥器調査(汀線)は、すべて指標範囲内であった。
- 採泥器調査(砕波帯)では、その他（住吉（離岸堤区間)、小丸川～一ツ瀬川）が指標範囲を上回った。軟体動物門（住吉（離岸堤区間))、環形動物門（大炊田②）が指標範囲を下回った。特に、住吉(離岸堤区間)においてはその他が、5季連続して指標範囲を上回っているため、今後の動向を注視する必要がある。なお、「その他」は、継続して棘皮動物門であるハスノハカシパンが主な増加種である。
- ソリネット調査では、軟体動物門（大炊田②)、環形動物門（大炊田②)、節足動物門（住吉（離岸堤区間)）が既往最大値を上回った。

b) 出現種数

- 採泥器調査(汀線)では、軟体動物門（小丸川～一ツ瀬川）が指標範囲を上回った。
- 採泥器調査(砕波帯)では、節足動物門（大炊田②）が指標範囲を上回った。また、軟体動物門(住吉(離岸堤区間))が指標範囲を下回った。
- ソリネット調査は、すべて指標範囲内であった。

c) 湿重量

- 採泥器調査(汀線)では、軟体動物門（大炊田②）が指標範囲を上回った。
- 採泥器調査(砕波帯)では、軟体動物門（住吉(離岸堤区間)）が指標範囲を連続して下回った。
- ソリネット調査では、軟体動物門（大炊田②、小丸川～一ツ瀬川)、環形動物門（大炊田②)、節足動物門（住吉(離岸堤区間)）が指標範囲を上回った。

表－ 4.40　底生生物(沿岸全域)に関する指標範囲との比較結果(採泥器調査)

調査種別	指標	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
採泥器調査	出現個体数	住吉海岸～小丸川 汀線付近	2015(H27)年春季、冬季	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 小丸川～一ツ瀬川
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 大炊田②
	出現個体数	住吉海岸～小丸川 砕波帯付近		次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■その他 住吉(離岸堤区間) 小丸川～一ツ瀬川 下記で範囲外↓ ■軟体動物門 住吉(離岸堤区間) ■環形動物門 大炊田②
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■節足動物門 大炊田② 下記で範囲外↓ ■軟体動物門 住吉(離岸堤区間)
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↓ ■軟体動物門 住吉(離岸堤区間)

表－ 4.41　底生生物(沿岸全域)に関する指標範囲との比較結果(ソリネット調査)

調査種別	指標	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
ソリネット	出現個体数	住吉海岸～小丸川 汀線付近	2015(H27)年春季、冬季	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 大炊田② ■環形動物門 大炊田② ■節足動物門 住吉(離岸堤区間)
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川 ■環形動物門 大炊田② ■節足動物門 住吉(離岸堤区間)

≪参考：2014(H26)年度の底生生物調査結果≫

a) 出現個体数

- 採泥器調査(汀線)では、軟体動物門（住吉(離岸堤区間)、小丸川～一ツ瀬川）、節足動物門（全地点）が指標範囲を上回った。特に小丸川～一ツ瀬川および大炊田②においては、節足動物門が 3 季連続して指標範囲を上回っているため、今後の動向を注視する必要がある。
- 採泥器調査(砕波帯)では、軟体動物門（大炊田②、小丸川～一ツ瀬川）、節足動物門（住吉(離岸堤区間)）、その他(全地点)が指標範囲を上回った。特に、住吉(離岸堤区間)においてはその他が、3 季連続して指標範囲を上回っているため、今後の動向を注視する必要がある。なお、「その他」は、棘皮動物門であるハスノハカシパンが主な増加種である。
- ソリネット調査では、軟体動物門（住吉(離岸堤区間)、大炊田②）、環形動物門（大炊田②）、節足動物門（全地点）が既往最大値を上回った。

b) 出現種数

- 採泥器調査(汀線)では、軟体動物門（小丸川～一ツ瀬川）、節足動物門(住吉(離岸堤区間)、大炊田②)が指標範囲を上回った。
- 採泥器調査(砕波帯)では、節足動物門（大炊田②）が指標範囲を上回った。また、節足動物門(住吉(離岸堤区間))が指標範囲を下回った。
- ソリネット調査では、軟体動物門（大炊田②）、環形動物門（大炊田②）、節足動物門（大炊田②、住吉(離岸堤区間)）、その他（住吉(離岸堤区間)）が指標範囲を上回った。住吉(離岸堤区間)では、節足動物門が 4 期連続して指標範囲を上回っていたが、平成 26 年度冬季は範囲内に戻った。

c) 湿重量

- 採泥器調査(汀線)では節足動物門（小丸川～一ツ瀬川）が指標範囲を上回った。
- 採泥器調査(砕波帯)では、軟体動物門（住吉(離岸堤区間)、大炊田②）、環形動物門(住吉(離岸堤区間))、その他（住吉(離岸堤区間)、大炊田②）が指標範囲を上回った。特に大炊田②においては節足動物門が 3 期連続して指標範囲を上回っているため、今後の動向を注視する必要がある。
- ソリネット調査では、軟体動物門（住吉(離岸堤区間)）、環形動物門（住吉(離岸堤区間)、大炊田②）、節足動物門（小丸川～一ツ瀬川）、その他（住吉(離岸堤区間)）が指標範囲を上回った。

表－ 4.42　底生生物(沿岸全域)に関する指標範囲との比較結果(採泥器調査)

調査種別	指標	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2014(H26)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
採泥器調査	出現個体数	住吉海岸～小丸川 汀線付近	2014(H26)年春季、冬季	次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 住吉(離岸堤区間) 小丸川～一ツ瀬川 ■節足動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川
	出現種数			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 小丸川～一ツ瀬川 ■節足動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田②
	湿重量			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ■節足動物門 小丸川～一ツ瀬川 ■その他 住吉(離岸堤区間)
	出現個体数	住吉海岸～小丸川 砕波帯付近		次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川 ■節足動物門 大炊田② ■その他 住吉(離岸堤区間) 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川 下記で範囲外↓ ■節足動物門 住吉(離岸堤区間)
	出現種数			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ■節足動物門 大炊田② 下記で範囲外↓ ■節足動物門 住吉(離岸堤区間)
	湿重量			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田② ■その他 住吉(離岸堤区間) 大炊田② 下記で範囲外↓ ■節足動物門 住吉(離岸堤区間)

表－ 4.43　底生生物(沿岸全域)に関する指標範囲との比較結果(ソリネット調査)

調査種別	指標	調査位置	調査実施状況	指標範囲	2014(H26)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
ソリネット	出現個体数	住吉海岸～小丸川 汀線付近	2014(H26)年春季、冬季	次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田② ■環形動物門 大炊田② ■節足動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川
	出現種数			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 大炊田② ■環形動物門 大炊田② ■節足動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田② ■その他 住吉(離岸堤区間)
	湿重量			次頁以降 グラフ参照	次頁以降 グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門 住吉(離岸堤区間) ■環形動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田②(St.4) ■節足動物門 小丸川～一ツ瀬川 ■その他 住吉(離岸堤区間)

表－ 4.46　汀線付近(採泥器)

：当該地点の出現個体数、 ：当該時期の沿岸

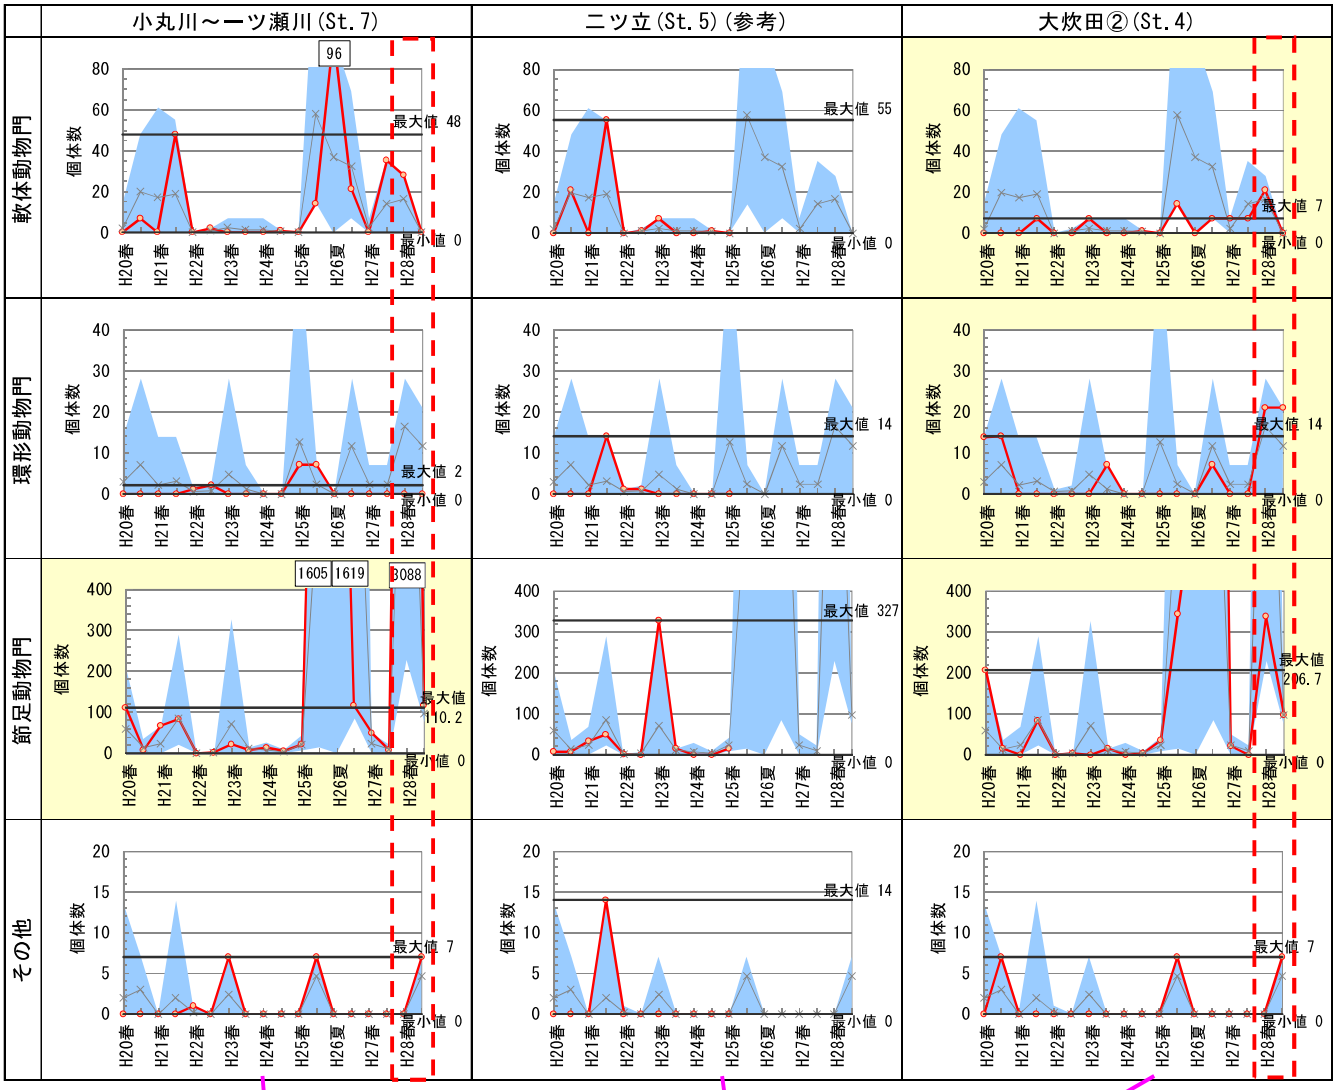

門別出現個体数の変動状況

での出現個体数分布範囲、×：当該時期の平均出現個体数

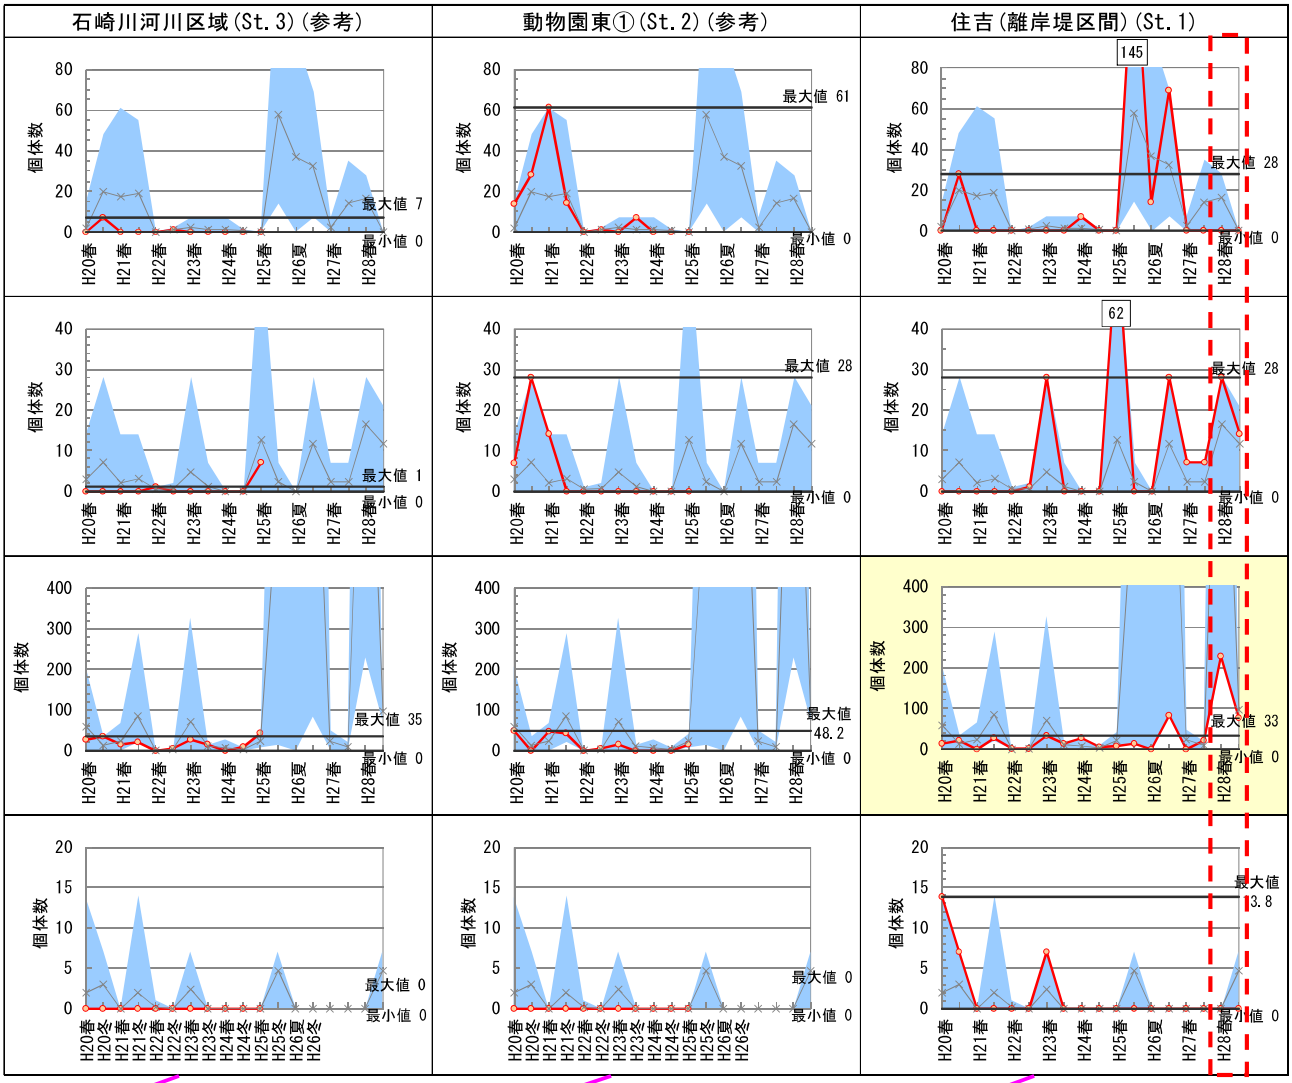

表－ 4.47　汀線付近(採泥器

：当該地点の出現種数、　：当該時期の沿

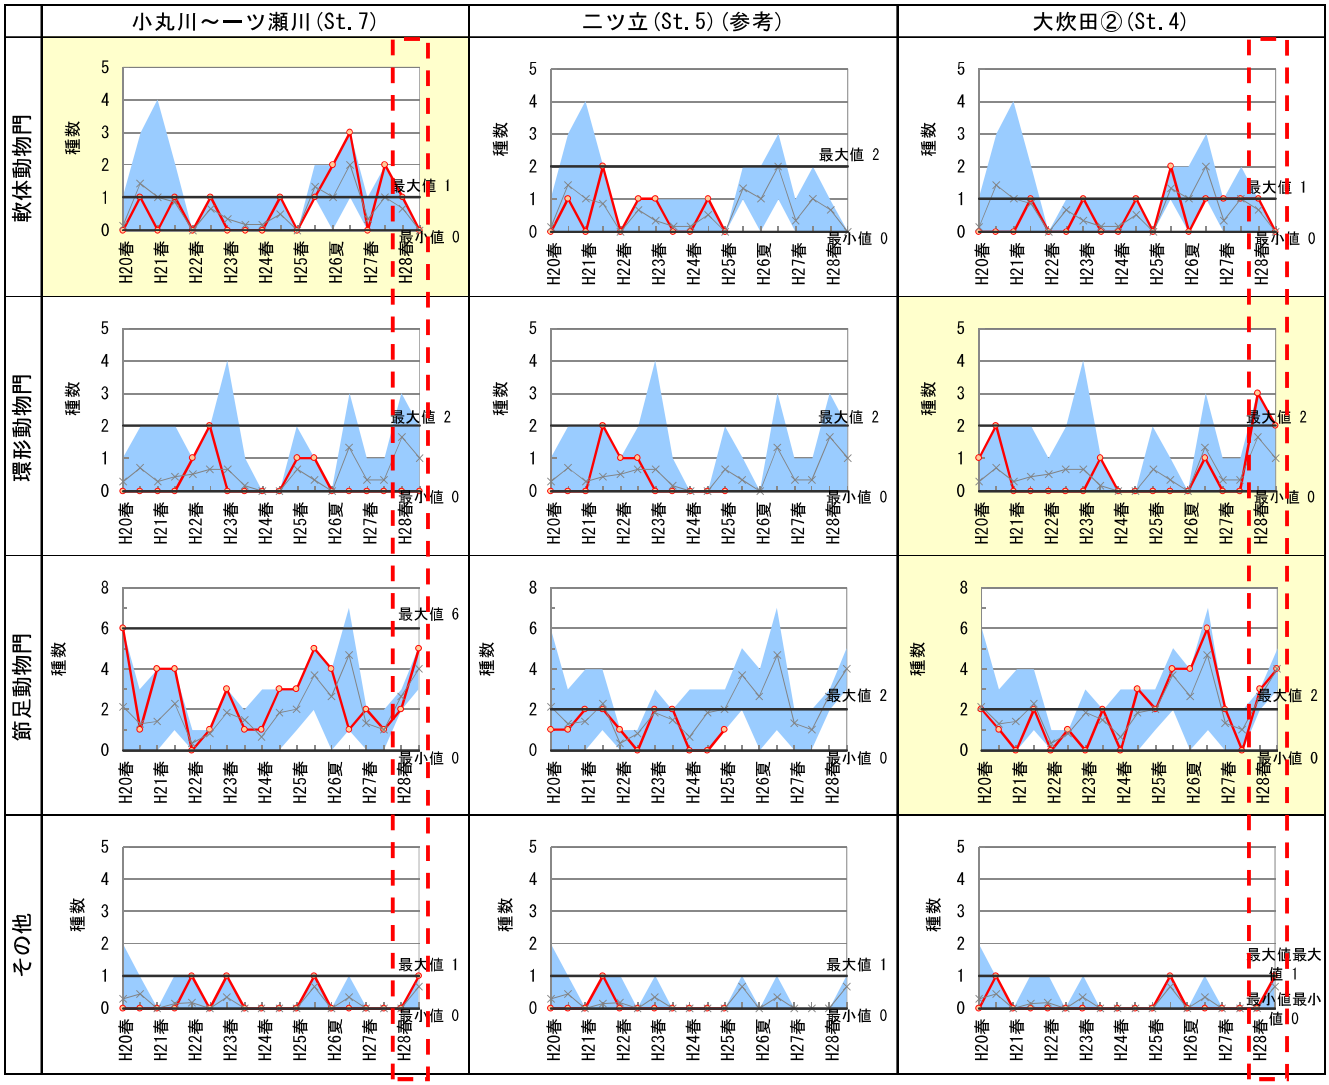

ｲ)　門別出現種数の変動状況

岸での出現種数分布範囲、×：当該時期の平均出現種数

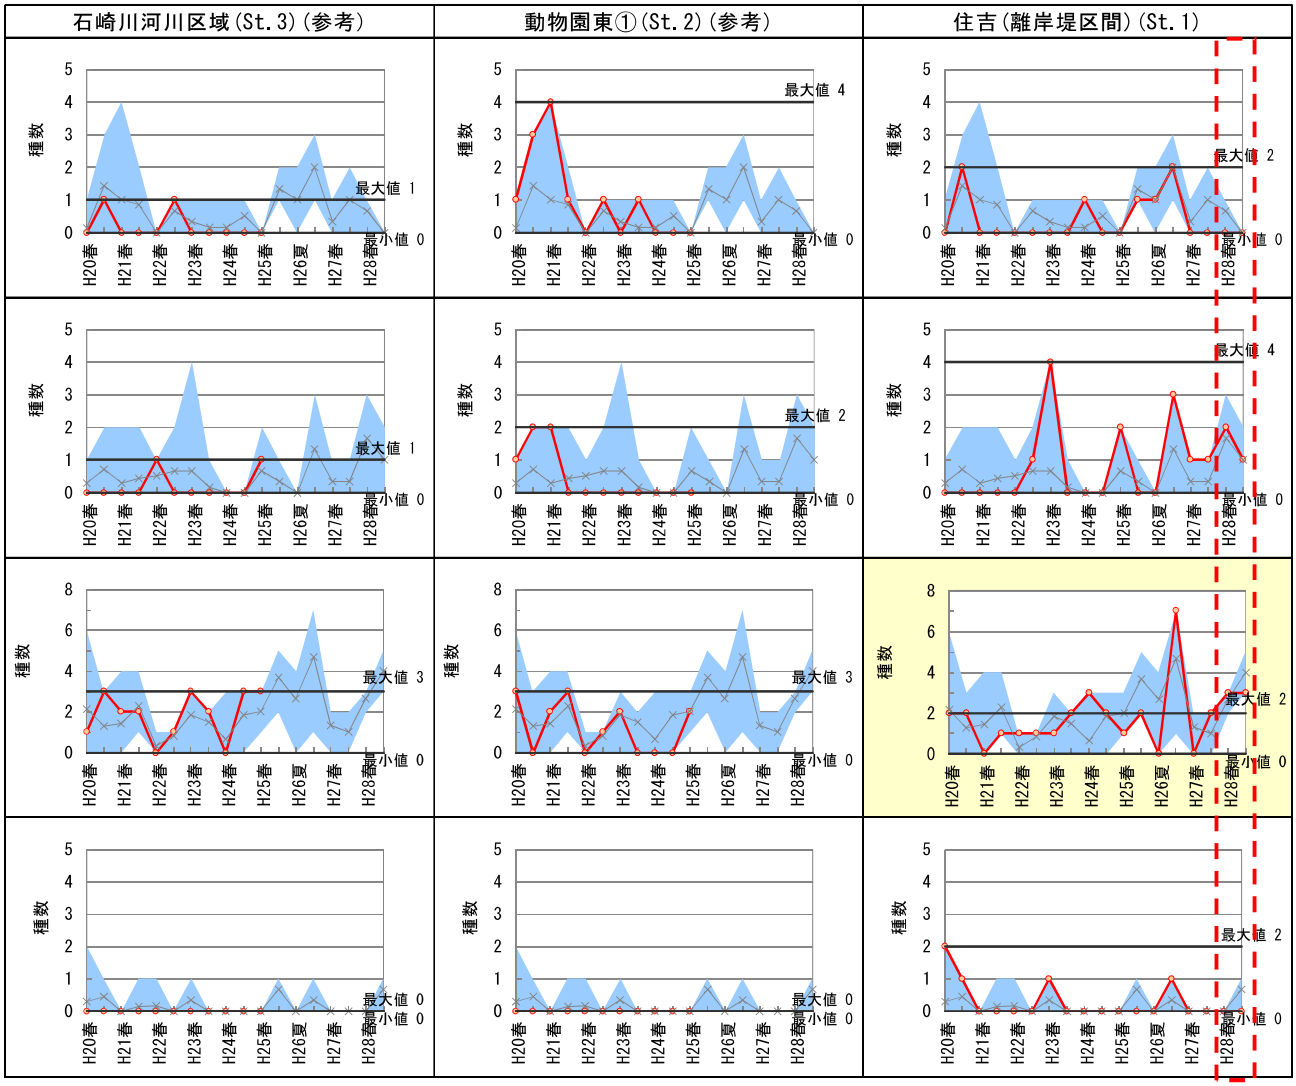

表－ 4.48　汀線付近（採泥

：当該地点の湿重量、 ：当該時期の沿岸

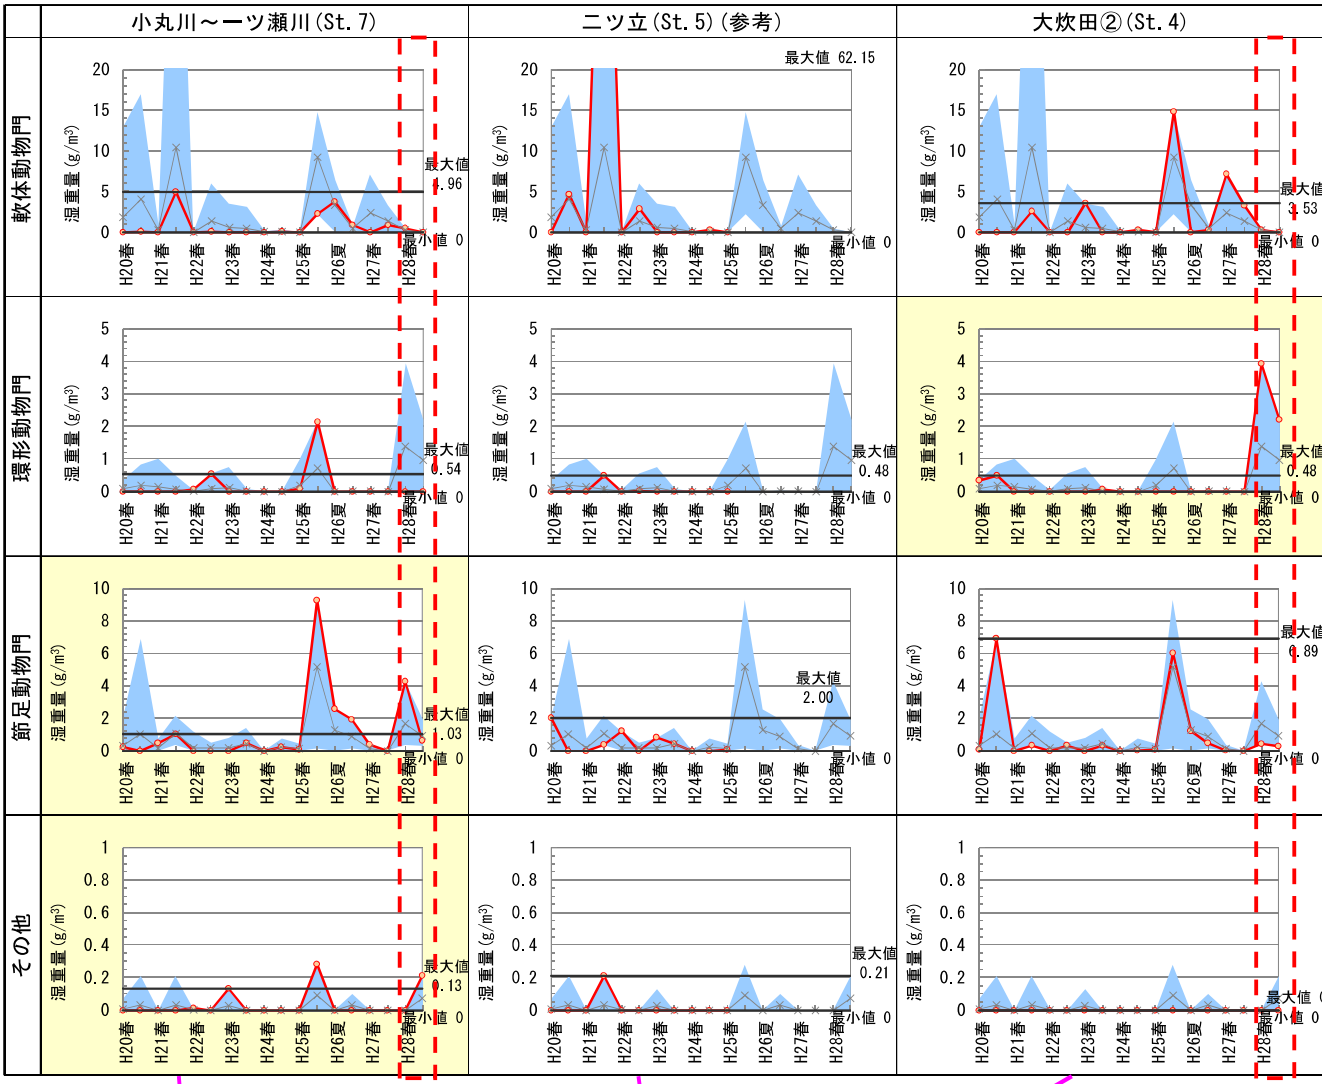

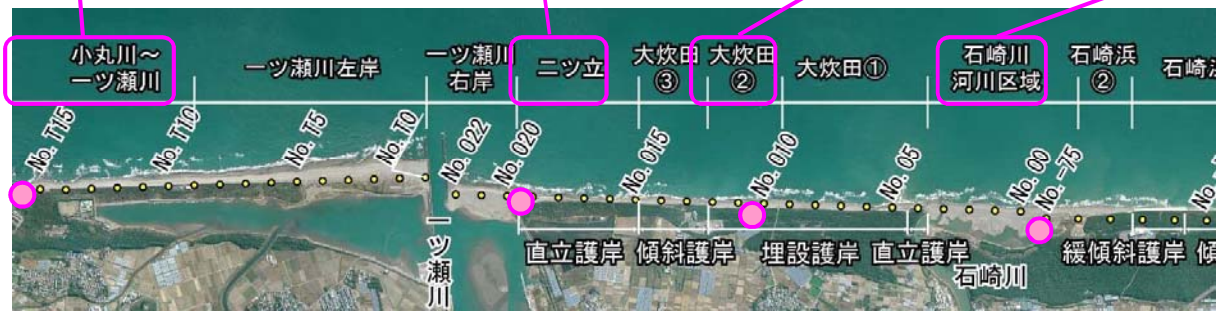

器） 門別湿重量の変動状況

での湿重量分布範囲、×：当該時期の平均湿重量

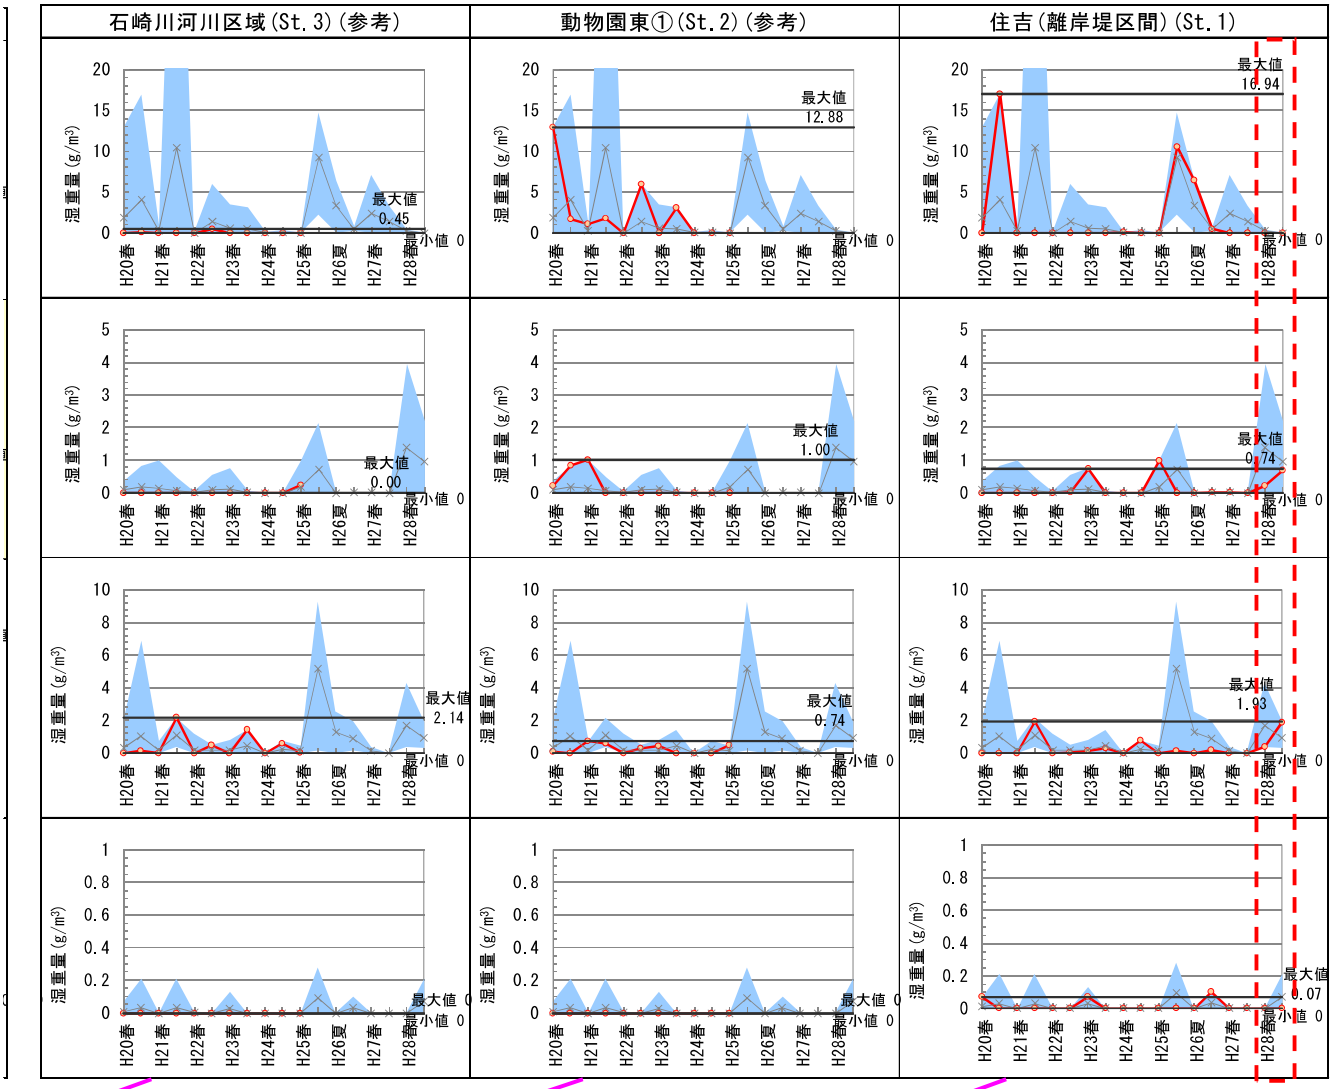

表－ 4.49　砕波帯付近　[illegible]

：当該地点の出現個体数、■：当該時期の沿岸

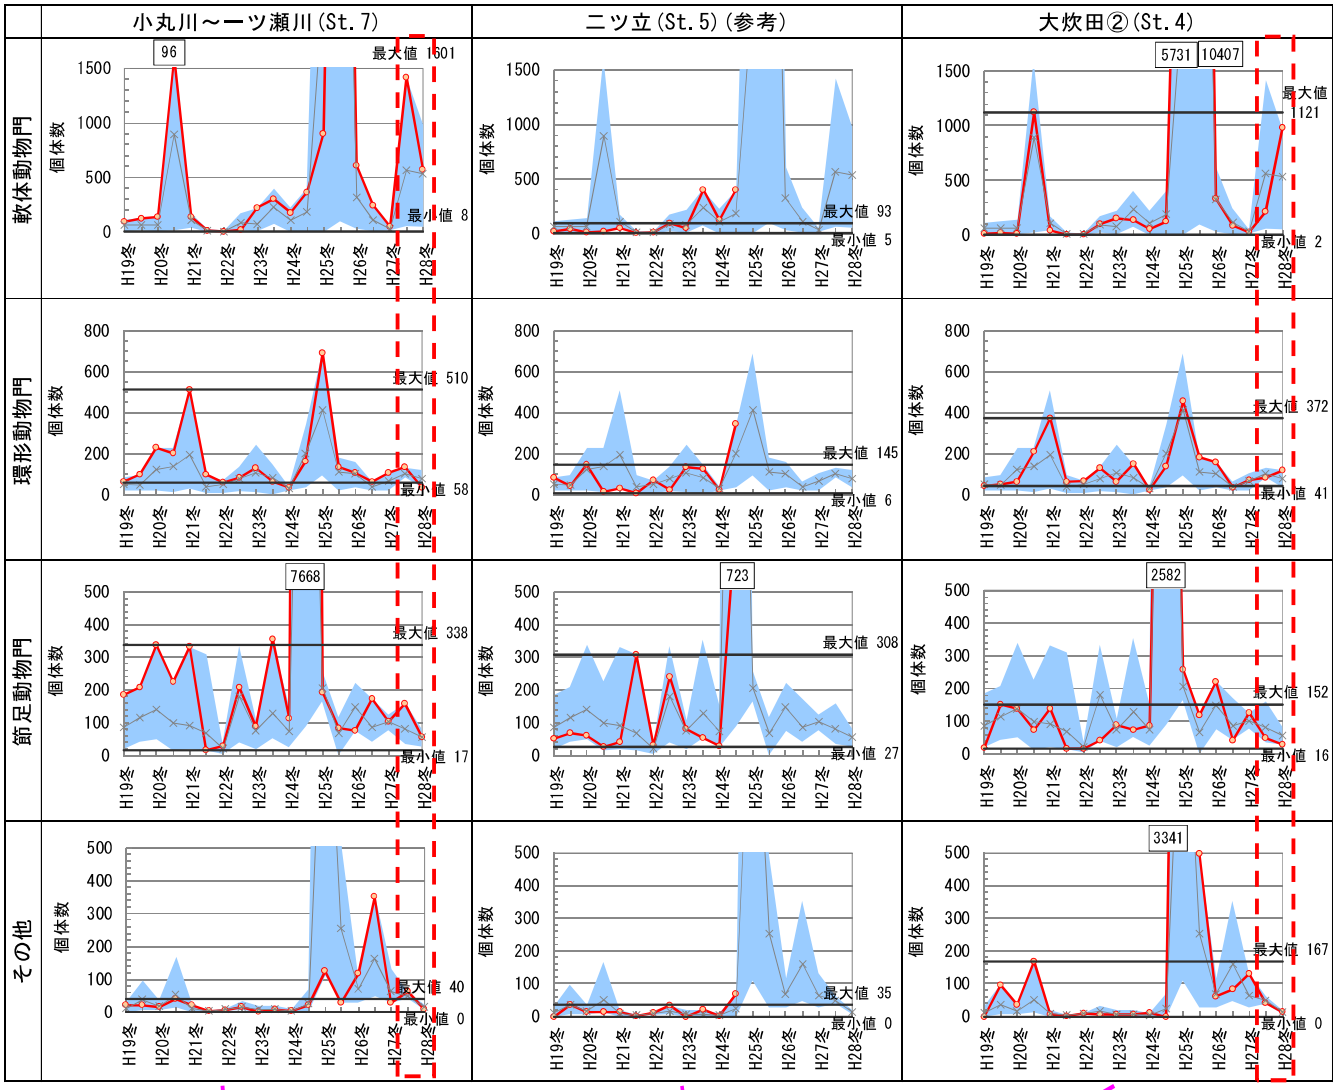

門別出現個体数の変動状況

までの出現個体数分布範囲、×：当該時期の平均出現個体数

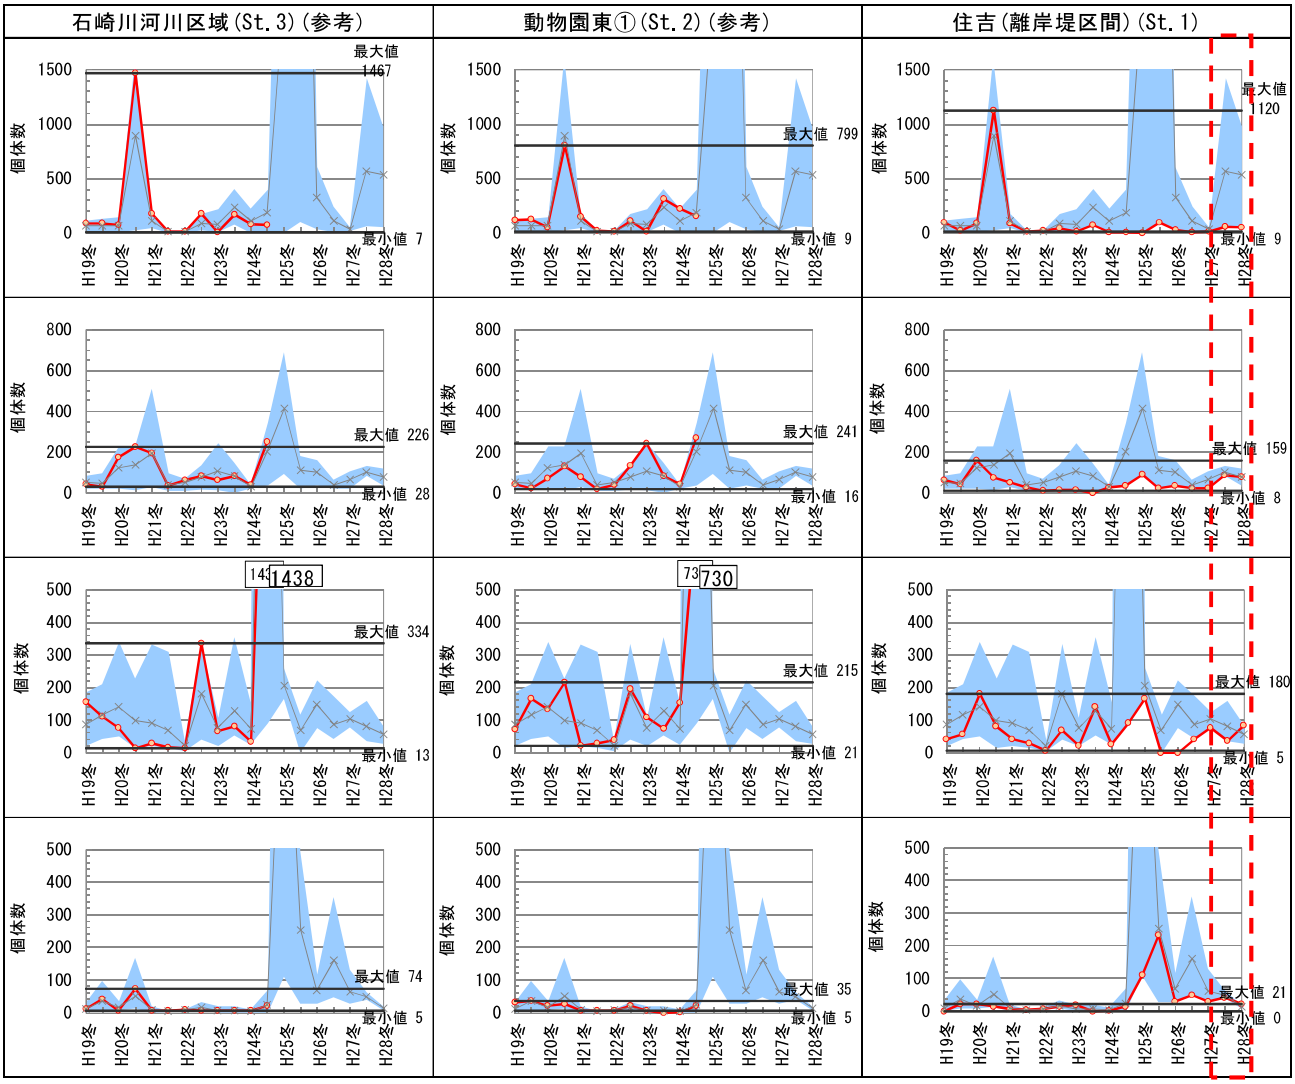

表－ 4.50　砕波帯付近

：当該地点の出現種数、 ：当該時期の沿

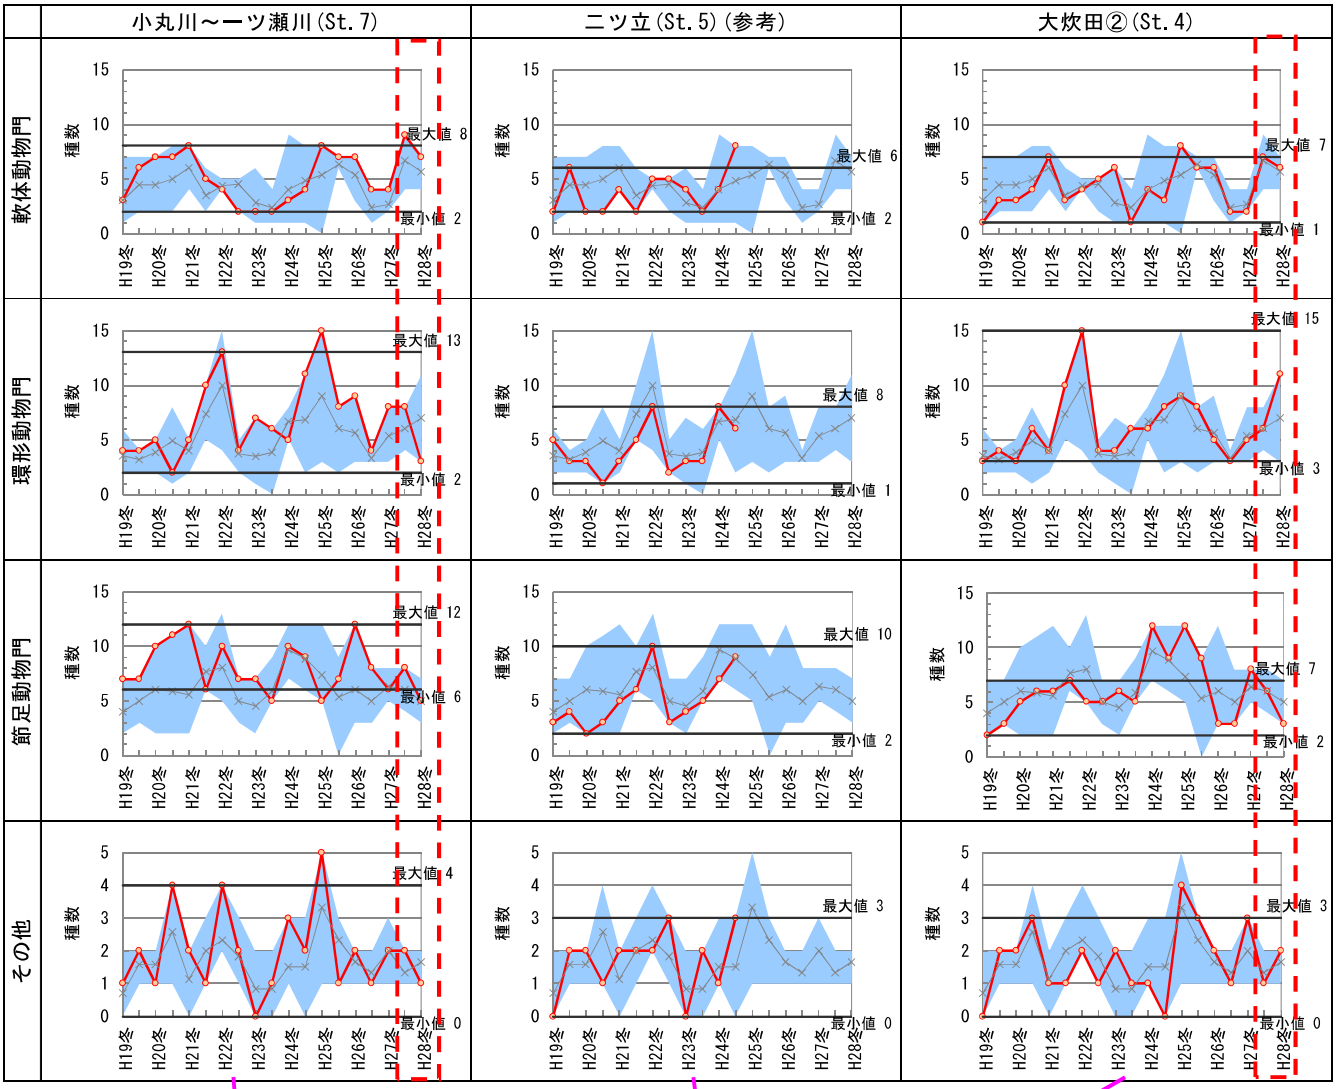

門別出現種数の変動状況

岸での出現種数分布範囲、×：当該時期の平均出現種数

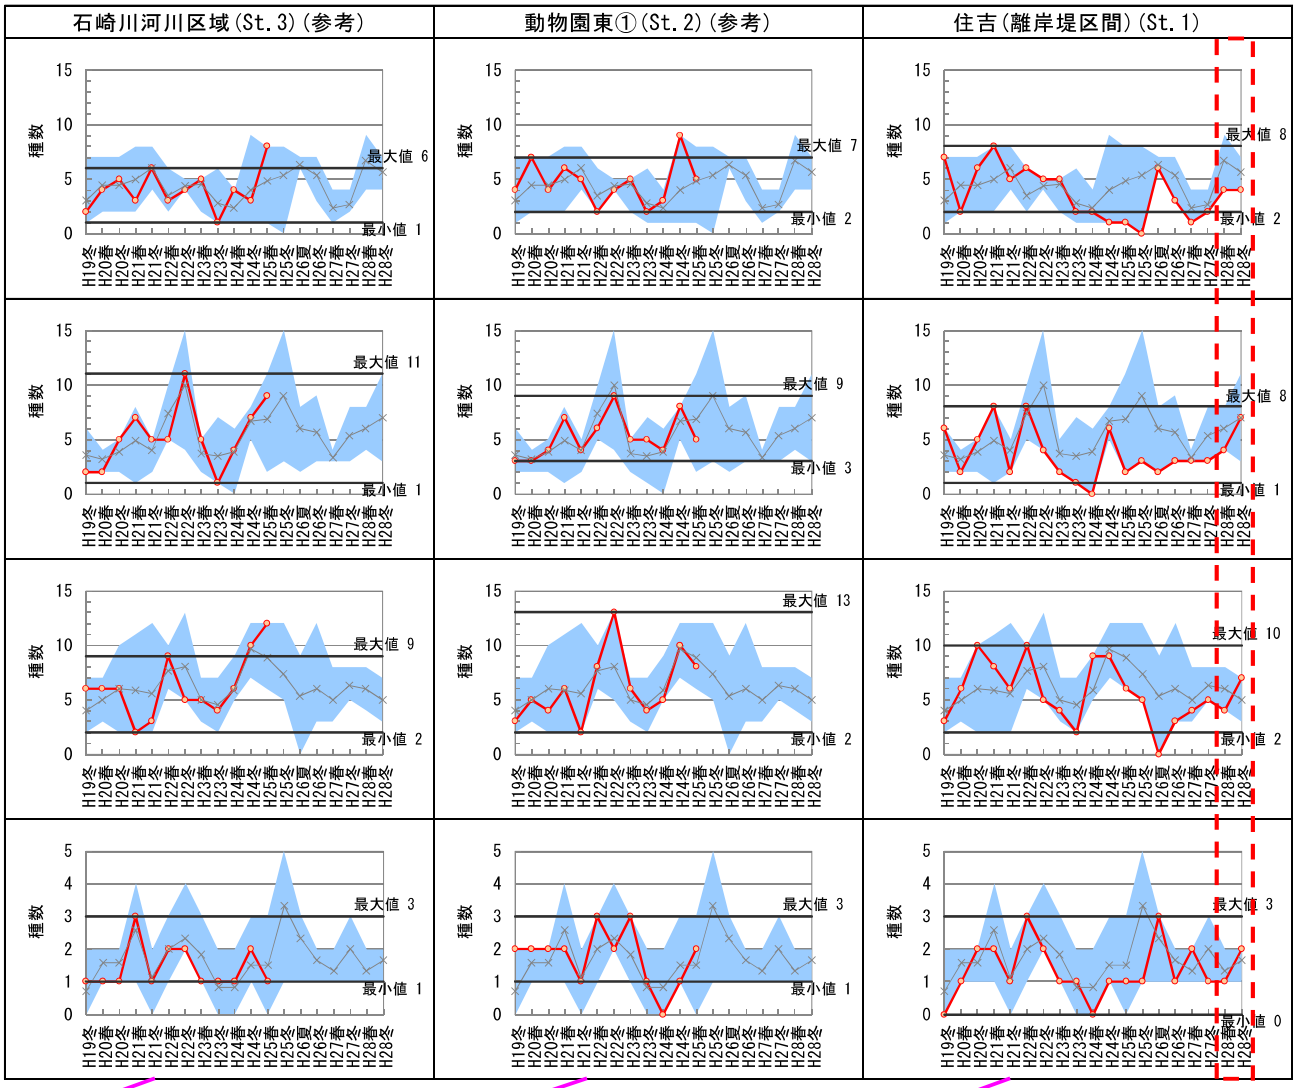

表－ 4.51　砕波帯付近

：当該地点の湿重量、■：当該時期の沿岸で

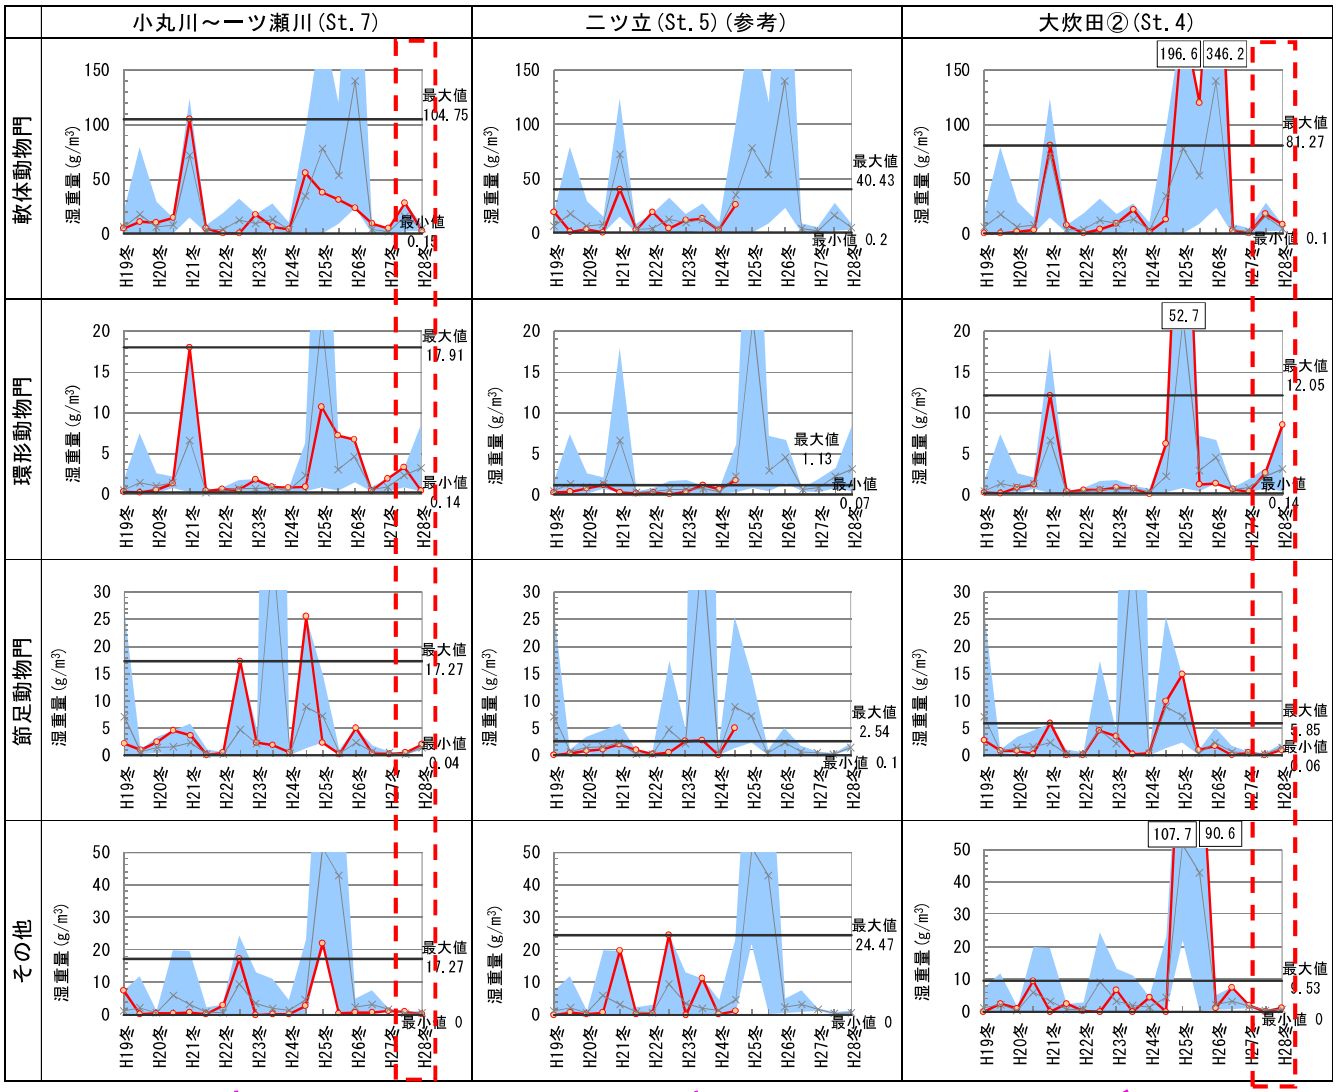

門別湿重量の変動状況

での湿重量分布範囲、×：当該時期の平均湿重量

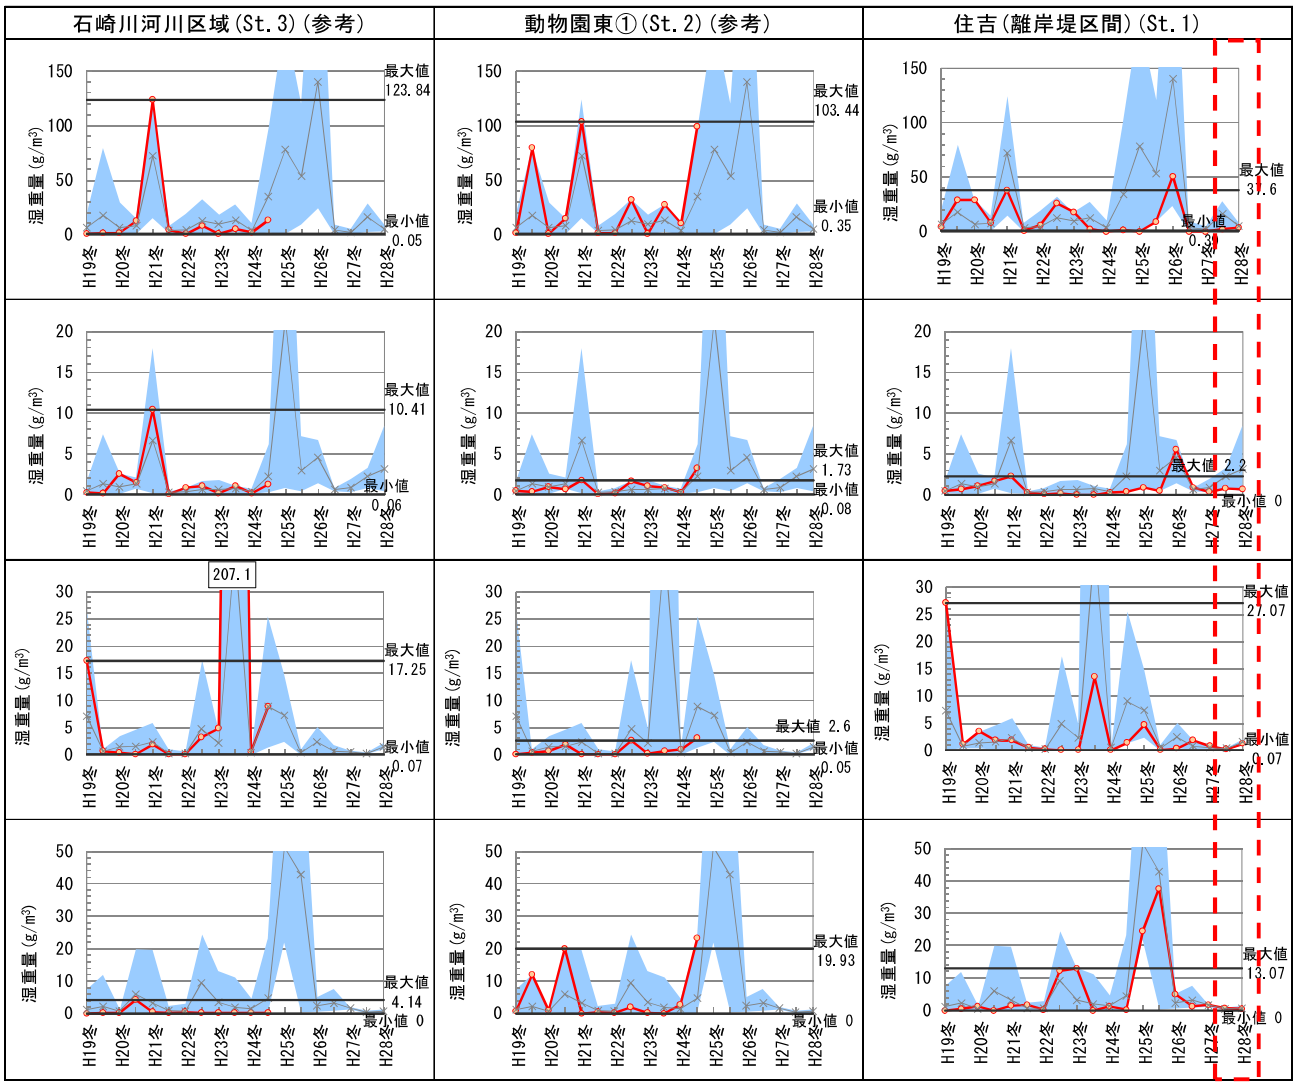

表－ 4.52　汀線付近（ソリネッ

：当該地点の出現個体数、　：当該時期の沿岸

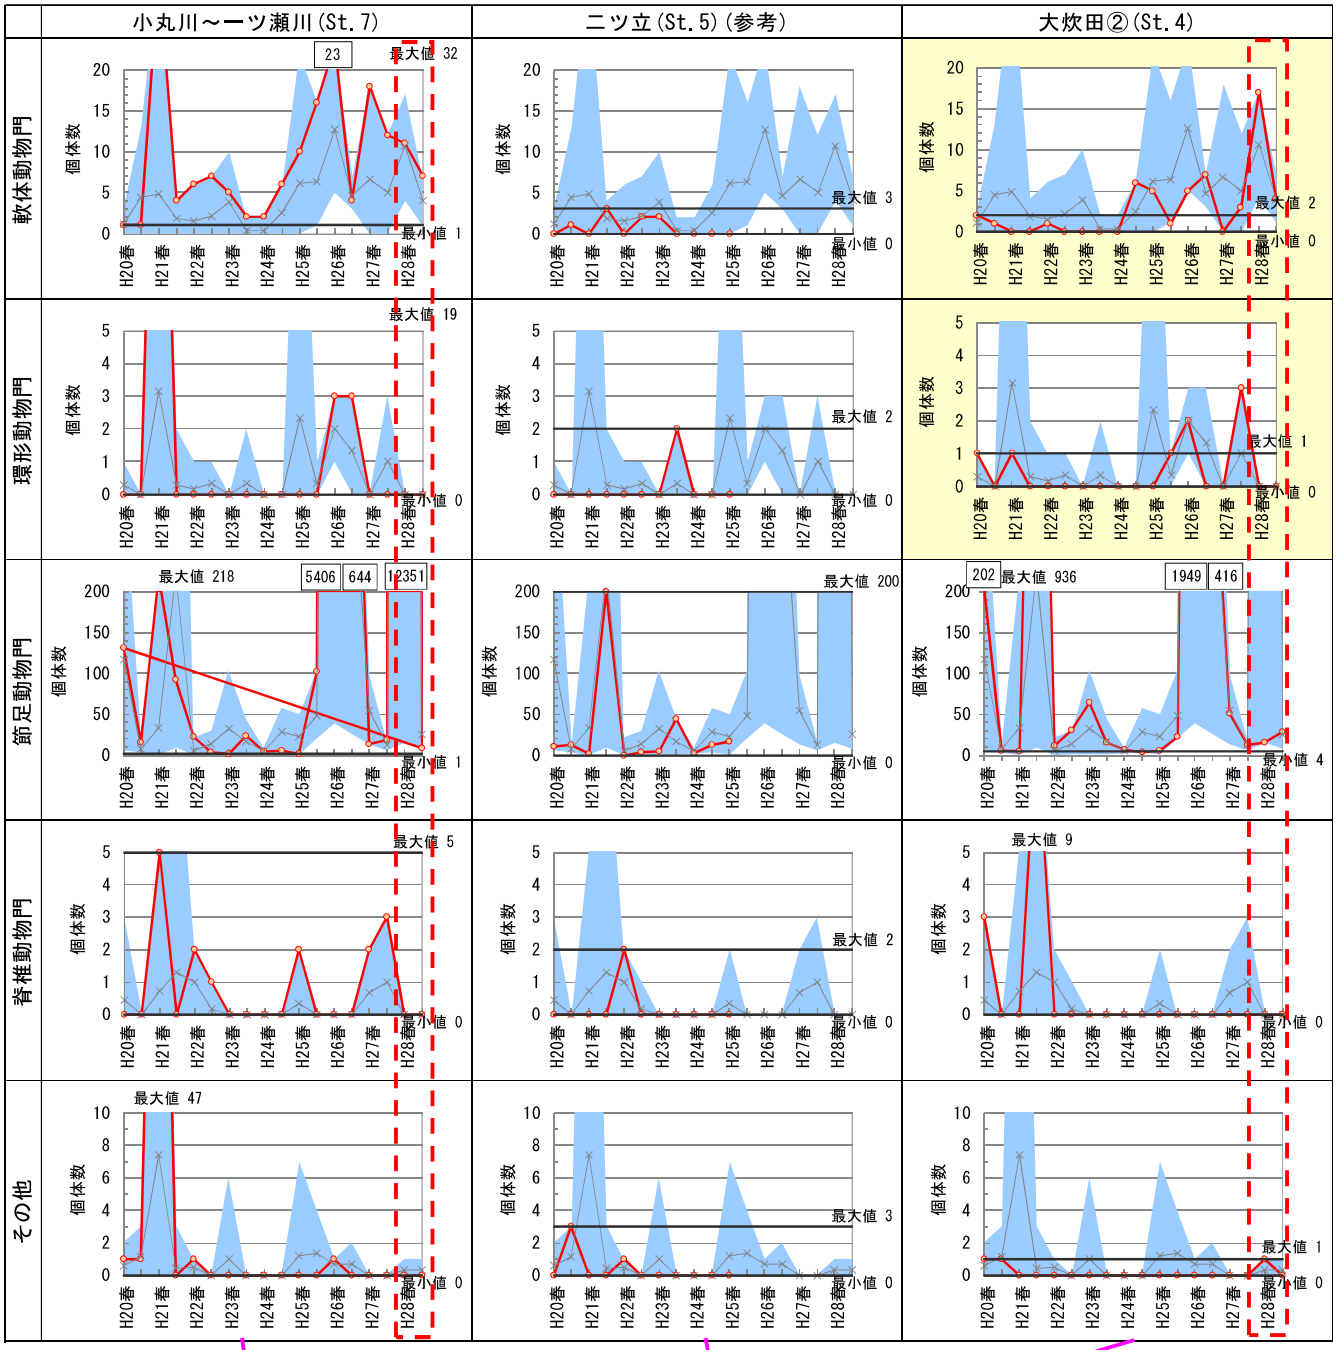

ト） 門別出現個体数の変動状況

ﾐでの出現個体数分布範囲、×：当該時期の平均出現個体数

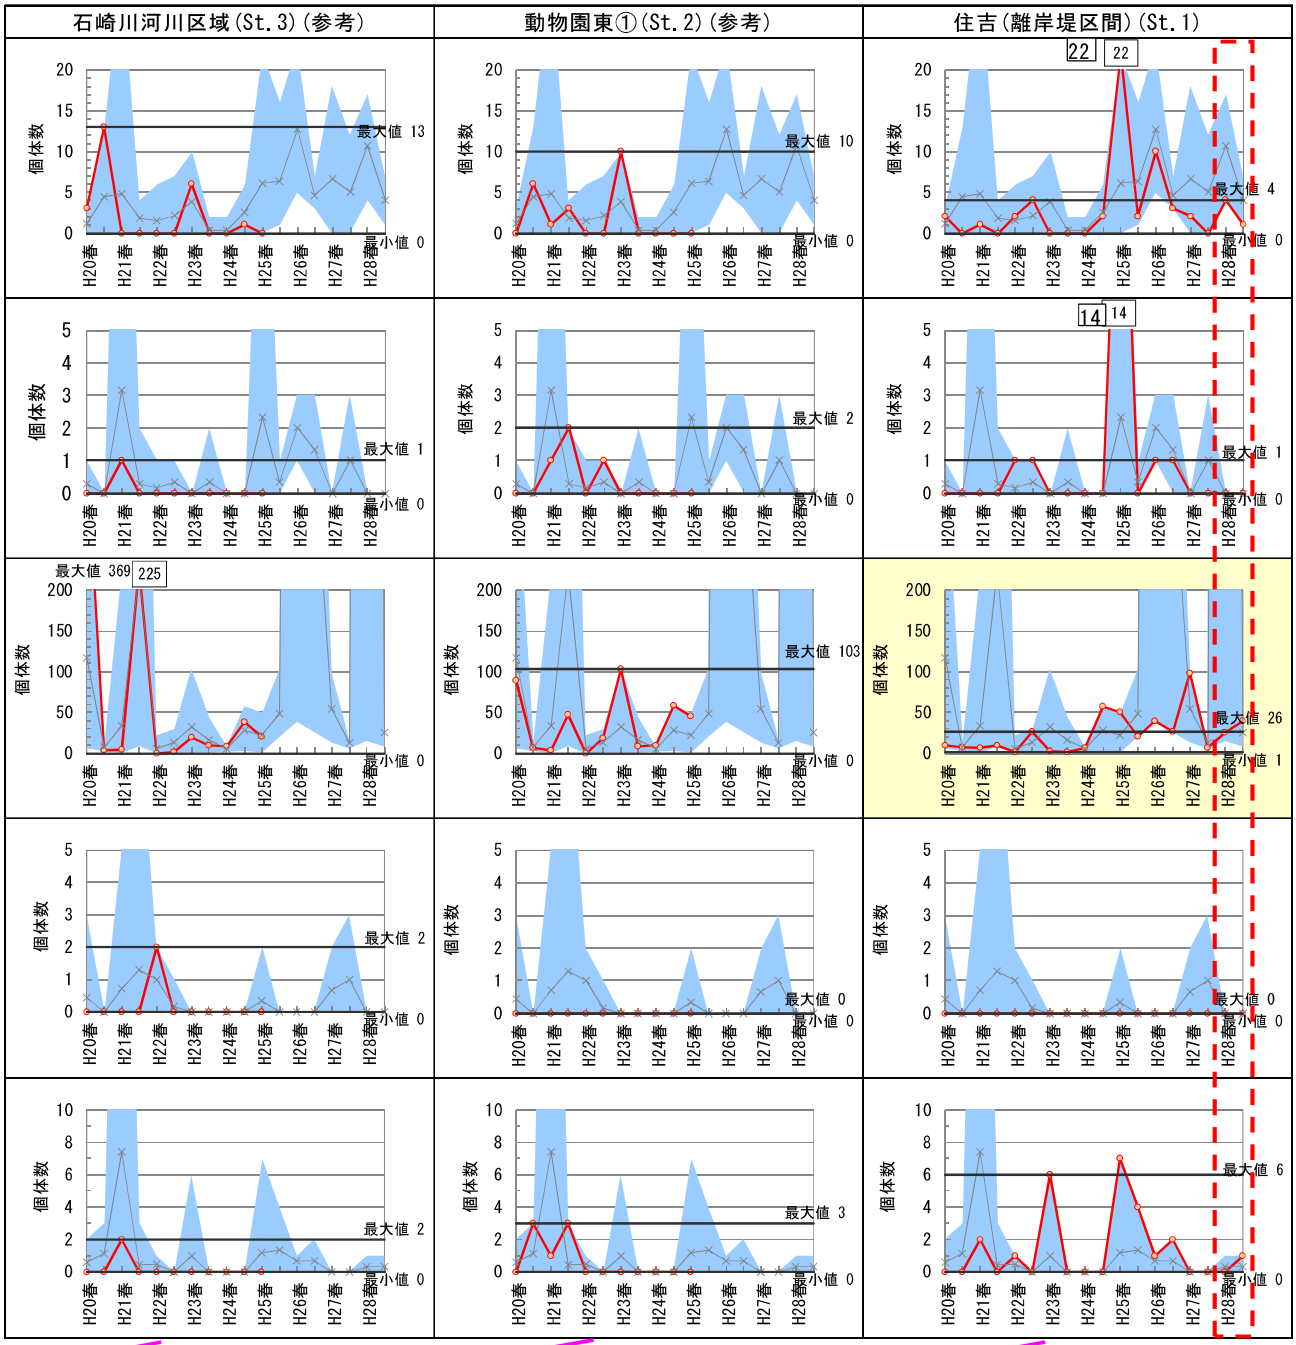

表－ 4.53　汀線付近（ソリネッ

：当該地点の出現種数、　：当該時期の沿

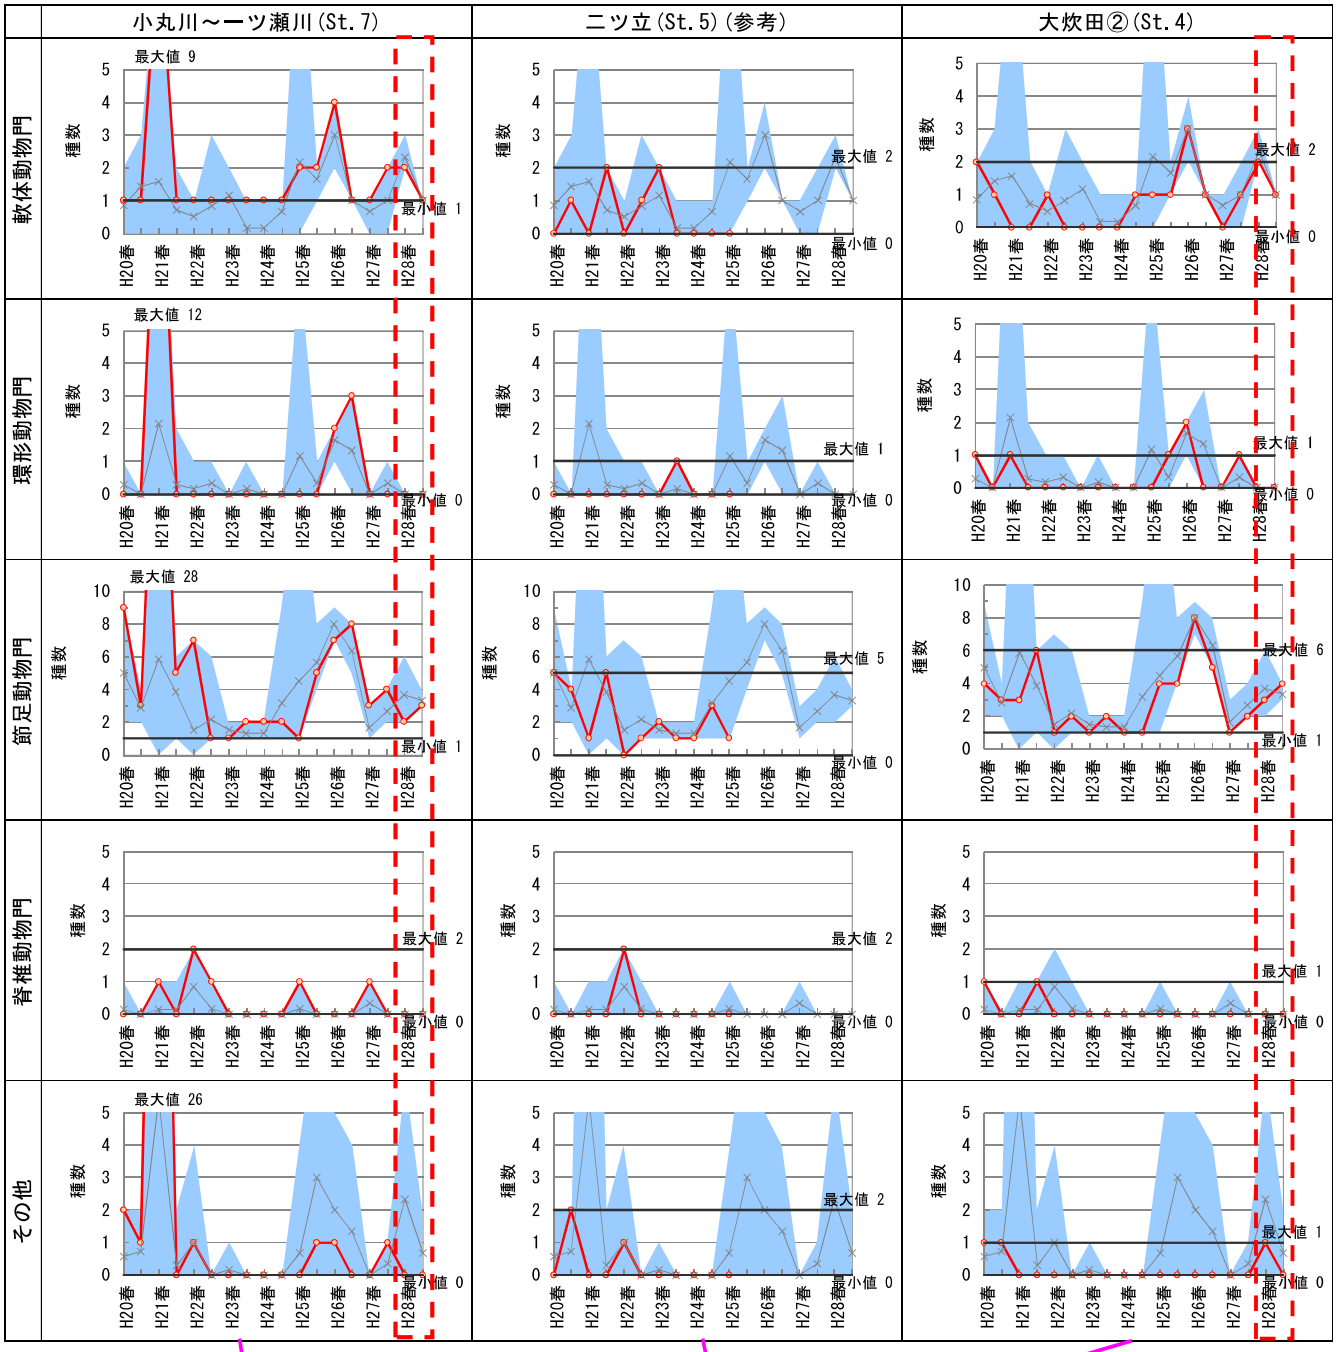

ト）　門別出現種数の変動状況

岸での出現種数分布範囲、×：当該時期の平均出現種数

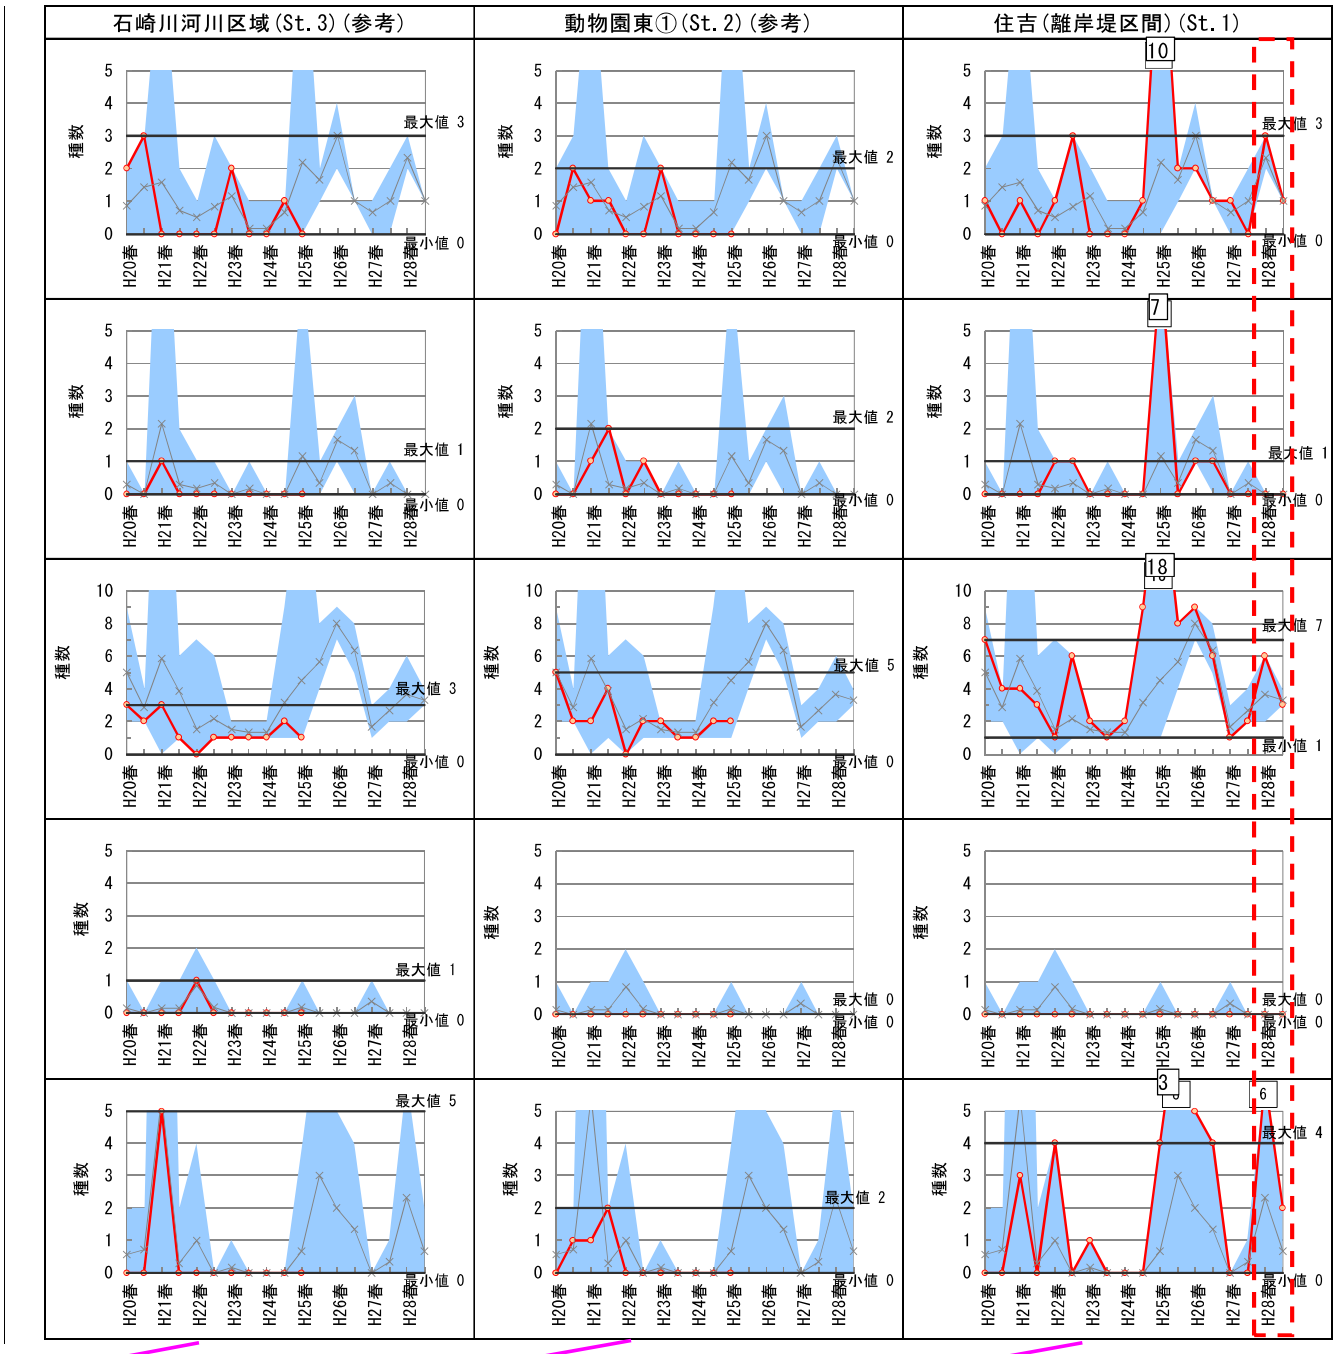

表－ 4.54　汀線付近（ソリネ

：当該地点の湿重量、 ：当該時期の沿岸で

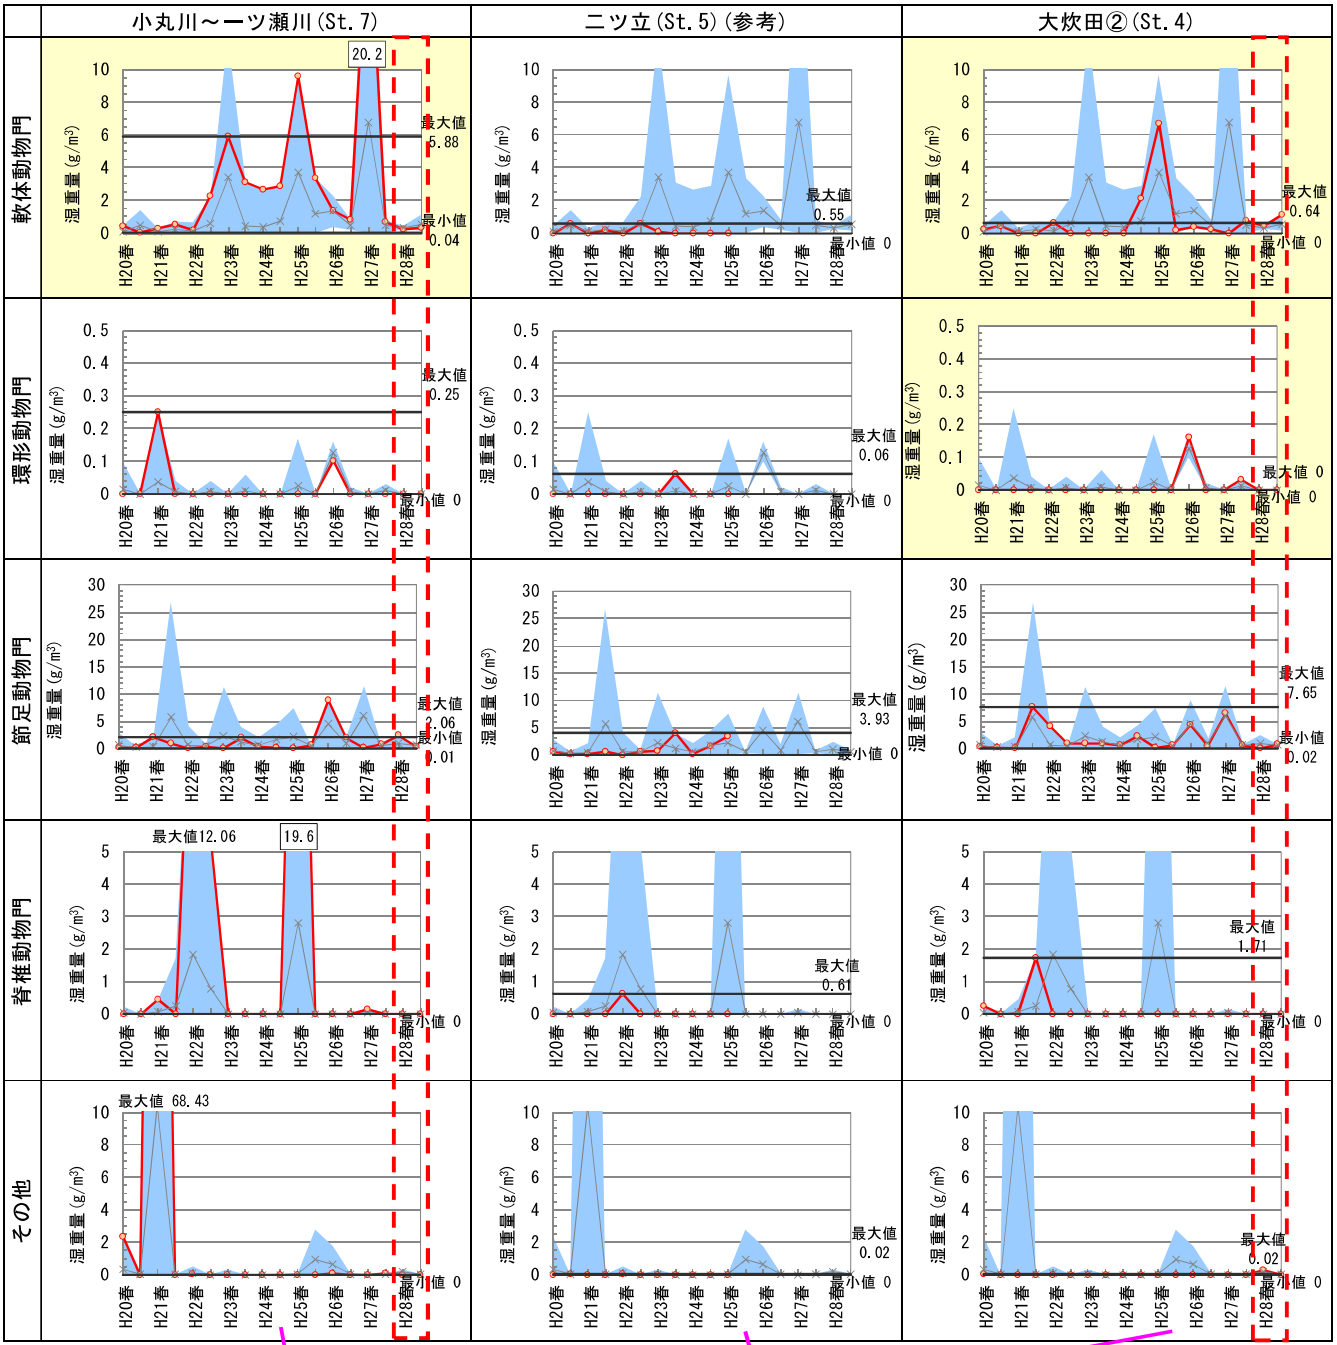

ット） 門別湿重量の変動状況

での湿重量分布範囲、×：当該時期の平均湿重量

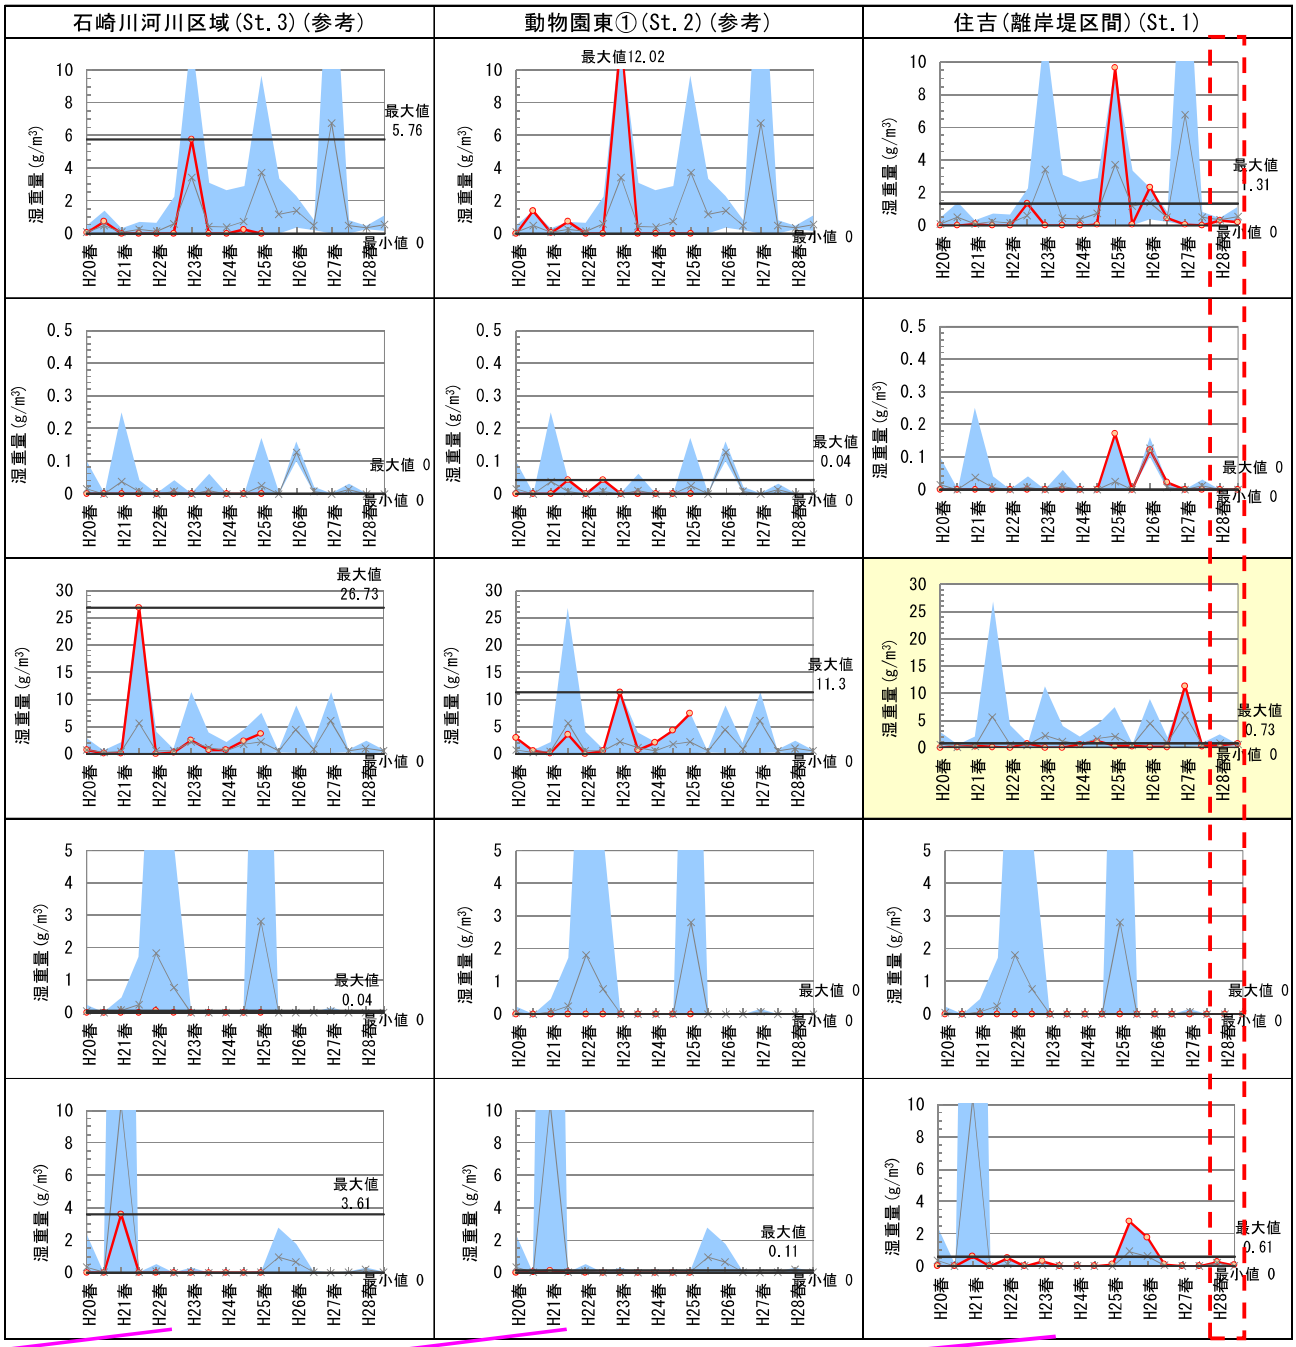

4.4.2 石崎川河口域

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 底生生物の出現状況

(B) 現象

- 特に多様な生物の生息場である石崎川河口域の底生生物の出現状況が、既往の調査結果と異ならないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
底生生物の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 特に多様な生物の生息場である石崎川河口域の、①砂泥干潟、②砂干潟、③ヨシ原、④護岸･ブロック、⑤水深の深い場所の 5 区分とする。

3) 調査時期

- 季節変動を考慮して、5 年おきに 2 回/年とする。

4) 調査結果の整理方法

- D フレームネット等を用いた定性採取法による底生生物の採取･解析を実施する。
- 調査結果と指標範囲の比較結果から、出現種数を整理し、指標範囲と比較する

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 2007(H19)年度～2009(H21)年度の定性採取法による石崎川河口の底生生物調査結果より、出現種数を整理する。定性調査であるため、個体数等の絶対量ではなく、種数で評価する。
- 整理結果から出現数の最大値､最小値及び平均値を算定し､指標として設定する。なお、データの蓄積が少ないため振れ幅は設定しない。

表－ 4.55 底生生物調査(石崎川河口域)に関する指標範囲

	巻貝類（腹足綱）	二枚貝類（二枚貝綱）	ゴカイ類（ゴカイ綱）	エビ･カニ類（エビ目）	その他
採取した総種数	26	23	24	37	26
最大	18	19	18	23	17
最小	5	3	11	6	11

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は調査非実施である。

≪参考：2015(H27)年度の底生生物調査結果≫

- 2015(H27)年度はエビ・カニ類（エビ目）、巻貝類（腹足綱）で指標範囲を上回った。

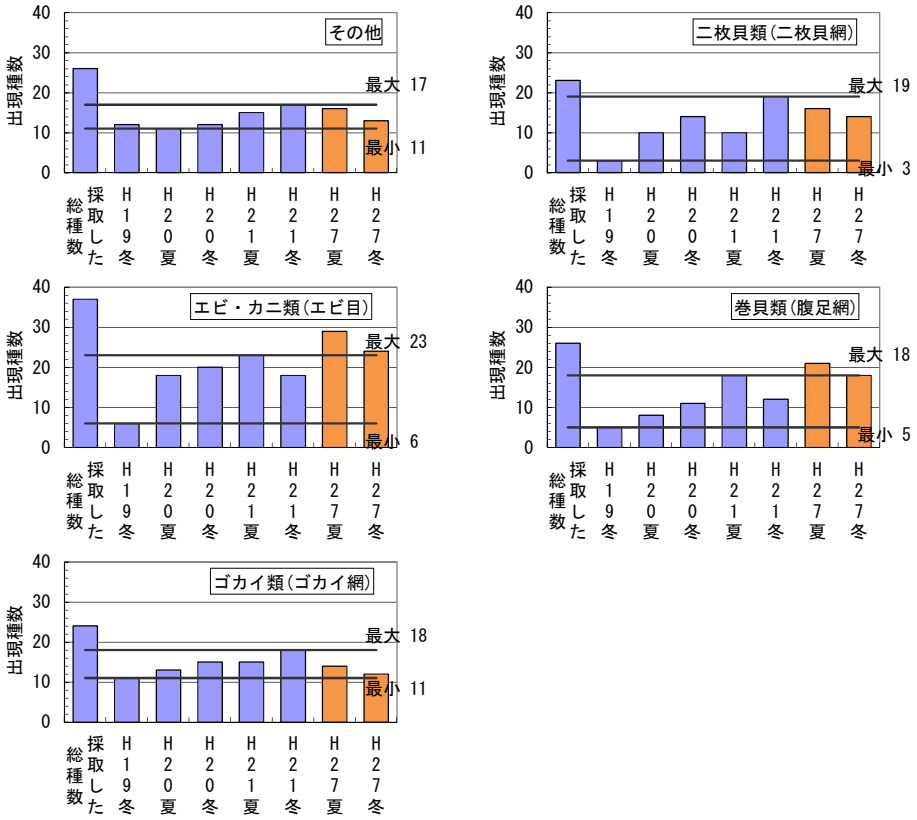

図－ 4.15　底生生物調査(石崎川河口域)の経年変化

- 2014(H26)年度は調査非実施である。

4.5 魚介類

4.5.1 魚介類調査（地元漁法による採取）

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 魚介類の出現状況

(B) 現象

- 魚介類の出現状況が、既往の調査結果と異ならないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
魚介類の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 比較対象として一ツ瀬川左岸を含んだ 6 地点(小丸川～一ツ瀬川(St.7)．二ツ立(St.5)，大炊田②(St.4)，石崎川河川区域(St.3)，動物園東①(St.2)，住吉(離岸堤区間)(St.1))とする。
- 第 2 回効果検証分科会における「調査の効率化」で 2013(H25)年度冬季より 3 地点に変更した。

3) 調査時期

- 春季(5～6 月)及び冬季(12～1 月)の 2 回/年とする。

4) 調査結果の整理方法

- 定点での地元漁法(ケタ網漁法、底曳網漁法、まき刺網漁法)による採取、調査結果と指標範囲の比較結果から 1km 程度に区分したブロックに対応する地点毎に、門別の出現状況を整理し、指標範囲と比較する。
- 出現数の変動状況を既往の調査結果の最大値、最小値と比較して時系列で確認する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 2007(H19)年度～2011(H23)年度の魚介類調査から、地点別の調査結果について、門毎に出現個体数及び出現種数を整理する。
- 整理結果から出現数の最大値､最小値及び平均値を算定し､指標として設定する。なお、データの蓄積が少ないことから振れ幅は設定しない。

表－ 4.56　魚介類調査(地元漁法による採取)に関する指標範囲

出現個体数（ケタ網）

出現個体数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門(腹足綱)	最大値	109	223	240	111	165	87
	最小値	2	3	3	1	1	0
	平均値	47.8	76.0	87.4	40.7	58.3	31.4
環形動物門(二枚貝綱)	最大値	627	494	334	670	561	265
	最小値	2	0	0	2	1	0
	平均値	96.4	79.4	69.7	89.3	87.7	49.0
節足動物門	最大値	837	203	169	208	220	497
	最小値	35	2	16	3	4	1
	平均値	220.8	64.4	64.8	54.9	47.3	70.7
棘皮動物門	最大値	193	2047	652	685	533	392
	最小値	1	1	1	1	4	2
	平均値	56.4	274.0	140.0	150.0	114.2	74.7

出現種数（ケタ網）

出現種数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門(腹足綱)	H24冬	4	4	5	6	5	4
	最大値	6	5	5	5	5	5
	最小値	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0
環形動物門(二枚貝綱)	H24冬	2	1	1	2	3	3
	最大値	3	5	4	6	4	5
	最小値	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
節足動物門	H24冬	6	4	5	6	4	6
	最大値	7	8	9	10	6	8
	最小値	3.0	2.0	1.0	3.0	2.0	1.0
棘皮動物門	H24冬	2	2	2	3	2	1
	最大値	3	4	3	3	3	4
	最小値	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

湿重量（ケタ網）

湿重量(g/m^3)		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門(腹足綱)	最大値	812	1,466	1,352	506	960	501
	最小値	15	13	10	1	2	0
	平均値	291	496	541	213	360	156
環形動物門(二枚貝綱)	最大値	1,223	812	435	559	431	146
	最小値	2	0	0	2	1	0
	平均値	174	127	90	80	83	30
節足動物門	最大値	769	665	466	277	320	437
	最小値	46	1	20	0	11	0
	平均値	261	134	107	88	65	89
棘皮動物門	最大値	786	5,586	1,826	1,310	925	359
	最小値	7	1	10	2	11	9
	平均値	219	886	497	362	306	120

出現個体数（底曳網）

出現個体数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門(腹足綱)	最大値	14	210	45	17	6	9
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	3.7	26.7	10.2	3.1	1.8	2.1
環形動物門(二枚貝綱)	最大値	9	30	6	2	1	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	1.1	3.9	0.8	0.2	0.1	0.0
節足動物門	最大値	1015	435	428	222	178	194
	最小値	1	4	2	7	3	1
	平均値	204.7	113.9	97.7	91.3	68.9	77.3
棘皮動物門	最大値	133	381	1295	58	280	50
	最小値	0	0	1	0	0	0
	平均値	19.9	61.3	176.1	17.3	42.9	11.6

出現種数（底曳網）

出現種数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門(腹足綱)	最大値	3	3	3	3	2	3
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	1.0	1.4	0.9	1.0	0.8	1.1
環形動物門(二枚貝綱)	最大値	1	2	1	1	1	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0
節足動物門	最大値	11	8	8	9	9	7
	最小値	1	1	1	1	1	1
	平均値	5.1	5.0	4.1	4.1	5.0	3.6
棘皮動物門	最大値	3	3	3	3	3	3
	最小値	0	0	1	0	0	0
	平均値	1.6	2.0	2.0	1.6	1.3	1.6

湿重量（底曳網）

湿重量(g/m^3)		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門(腹足綱)	最大値	145	3482	826	109	51	121
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	33.6	436.6	144.0	26.3	13.2	20.3
環形動物門(二枚貝綱)	最大値	12	59	150	2	1	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	1.4	12.0	17.4	0.2	0.1	0.0
節足動物門	最大値	6194	2612	2200	1513	1034	1053
	最小値	6	22	5	15	11	2
	平均値	1048.8	675.2	698.4	555.6	478.4	329.8
棘皮動物門	最大値	1186	3035	7910	470	12108	764
	最小値	0	0	13	0	0	0
	平均値	223.6	875.3	1394.6	221.9	1404.8	156.3

出現個体数（まき刺網）

出現個体数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門(腹足綱)	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
環形動物門(二枚貝綱)	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
節足動物門	最大値	8	1	0	4	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	1.8	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0
棘皮動物門	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

出現種数（まき刺網）

出現種数		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門(腹足綱)	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
環形動物門(二枚貝綱)	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
節足動物門	最大値	2	1	0	1	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
棘皮動物門	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

湿重量（まき刺網）

湿重量(g/m^3)		住吉(離岸堤区間)	動物園東①	石崎川河川区域	大炊田②	二ツ立	小丸川～一ツ瀬川
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.7
軟体動物門(腹足綱)	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
環形動物門(二枚貝綱)	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
節足動物門	最大値	54	14	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	10.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
棘皮動物門	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

a) 出現個体数

- ケタ網漁は、軟体動物門【腹足綱】（大炊田②）で指標範囲を上回った。
- 底曳網漁は、軟体動物門【腹足綱】（大炊田②）で指標範囲を上回った。

b) 出現種数

- ケタ網漁は、軟体動物門【腹足綱】（大炊田②）、軟体動物門【二枚貝綱】（住吉(離岸堤区間)）、節足動物門（住吉(離岸堤区間)）で指標範囲を上回った。
- 底曳網漁は、軟体動物門【腹足綱】（住吉(離岸堤区間)）、軟体動物門【二枚貝綱】（住吉(離岸堤区間)）、棘皮動物門（住吉(離岸堤区間)）で指標範囲を上回った。

c) 湿重量

- ケタ網漁は、軟体動物門【腹足綱】（大炊田②）、節足動物門（大炊田②）で指標範囲を上回った。
- 底曳網漁は、軟体動物門【腹足綱】（大炊田②）、軟体動物門【二枚貝綱】（住吉(離岸堤区間)）で指標範囲を上回った。

表－ 4.57　魚介類調査(地元漁法による採取)に関する指標範囲との比較結果

指標		調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
項目	細別					
ケタ網漁	出現個体数	住吉海岸～小丸川	2016(H28)年夏季、冬季	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 大炊田②
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 大炊田② ■軟体動物門【二枚貝綱】 住吉(離岸堤区間) ■節足動物門 住吉(離岸堤区間)
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 大炊田② ■節足動物門 大炊田②
底曳網漁	出現個体数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 大炊田②
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 住吉(離岸堤区間) ■軟体動物門【二枚貝綱】 住吉(離岸堤区間) ■棘皮動物門 住吉(離岸堤区間)
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 大炊田② ■軟体動物門【二枚貝綱】 住吉(離岸堤区間)
まき刺網	出現個体数	調査実施なし	調査実施なし			
	出現種数					
	湿重量					

≪参考：2015(H27)年度の魚介類調査結果≫

a) 出現個体数

- ケタ網漁は、軟体動物門【腹足綱】（住吉(離岸堤区間)、大炊田②）で指標範囲を上回った。特に軟体動物門【腹足綱】の大炊田②では、5 季連続して指標範囲を上回っているため、今後の動向を注視する必要がある。
- 底曳網漁は、いずれも指標範囲内だった。

b) 出現種数

- ケタ網漁は、軟体動物門【腹足綱】(小丸川～一ツ瀬川)、軟体動物門【二枚貝綱】（住吉(離岸堤区間)）で指標範囲を上回った。軟体動物門【二枚貝綱】(住吉(離岸堤区間)）は、4 季連続して指標範囲を上回っていたが、H27(2015)年冬に指標範囲内に戻った。
- 底曳網漁は、いずれも指標範囲内だった。

c) 湿重量

- ケタ網漁は、軟体動物門【腹足綱】(全地点)、節足動物門（大炊田②、小丸川～一ツ瀬川）で指標範囲を上回った。特に軟体動物門【腹足綱】の大炊田②では、出現個体数と同様 5 季連続して指標範囲を上回っているため、今後の動向を注視する必要がある。
- 底曳網漁は、節足動物門（大炊田②）で指標範囲を上回った。

表－ 4.57　魚介類調査(地元漁法による採取)に関する指標範囲との比較結果

指標		調査位置	調査実施状況	指標範囲	2015(H27)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
項目	細別					
ケタ網漁	出現個体数	住吉海岸～小丸川	2015(H27)年夏季、冬季	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 住吉(離岸堤区間) 大炊田②
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 小丸川～一ツ瀬川 ■軟体動物門【二枚貝綱】 住吉(離岸堤区間)
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 住吉(離岸堤区間) 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川 ■節足動物門 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川
底曳網漁	出現個体数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■節足動物門 大炊田②
まき刺網	出現個体数	調査実施なし	調査実施なし			
	出現種数					
	湿重量					

≪参考：2014(H26)年度の魚介類調査結果≫

a) 出現個体数

- ケタ網漁は、軟体動物門【腹足綱】(住吉(離岸堤区間)、大炊田②)、棘皮動物門(住吉(離岸堤区間)、大炊田②)で指標範囲を上回った。特に軟体動物門【腹足綱】の大炊田②では、3 季連続して指標範囲を上回っているため、今後の動向を注視する必要がある。
- 底曳網漁は棘皮動物門（大炊田②、小丸川～一ツ瀬川）で指標範囲を上回った。節足動物門(大炊田②)では、指標範囲を下回った。

b) 出現種数

- ケタ網漁は、軟体動物門【腹足綱】(大炊田②)、軟体動物門【二枚貝綱】(住吉(離岸堤区間)) で指標範囲を上回った。特に、軟体動物門【二枚貝綱】(住吉(離岸堤区間)) は、3 季連続して指標範囲を上回っているため、今後の動向を注視する必要がある。
- 底曳網漁は、いずれも指標範囲内だった。

c) 湿重量

- ケタ網漁は、軟体動物門【腹足綱】(全地点)、節足動物門(住吉(離岸堤区間))、棘皮動物門(大炊田②)で指標範囲を上回った。特に軟体動物門【腹足綱】の大炊田②では、出現個体数と同様 3 季連続して指標範囲を上回っているため、今後の動向を注視する必要がある。
- 底曳網漁は、棘皮動物門（大炊田②、小丸川～一ツ瀬川）で指標範囲を上回った。

表－ 4.58　魚介類調査(地元漁法による採取)に関する指標範囲との比較結果

指標		調査位置	調査実施状況	指標範囲	2014(H26)年度調査結果	調査結果と指標範囲の比較結果
項目	細別					
ケタ網漁	出現個体数	住吉海岸～小丸川	2014(H26)年夏季、冬季	次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 住吉(離岸堤区間) 大炊田② ■棘皮動物門 住吉(離岸堤区間) 大炊田②
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 大炊田② ■軟体動物門【二枚貝綱】 住吉(離岸堤区間)
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■軟体動物門【腹足綱】 住吉(離岸堤区間) 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川 ■節足動物門 住吉(離岸堤区間) ■棘皮動物門 大炊田②
底曳網漁	出現個体数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■棘皮動物門 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川 下記で範囲外↓ ■節足動物門 大炊田②
	出現種数			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	指標範囲内
	湿重量			次頁以降グラフ参照	次頁以降グラフ参照	下記で範囲外↑ ■棘皮動物門 大炊田② 小丸川～一ツ瀬川
まき刺網	出現個体数	調査実施なし	調査実施なし			
	出現種数					
	湿重量					

表－ 4.60　ケタ網漁法　[illegible]

：当該地点の出現個体数、　：当該時期の沿岸

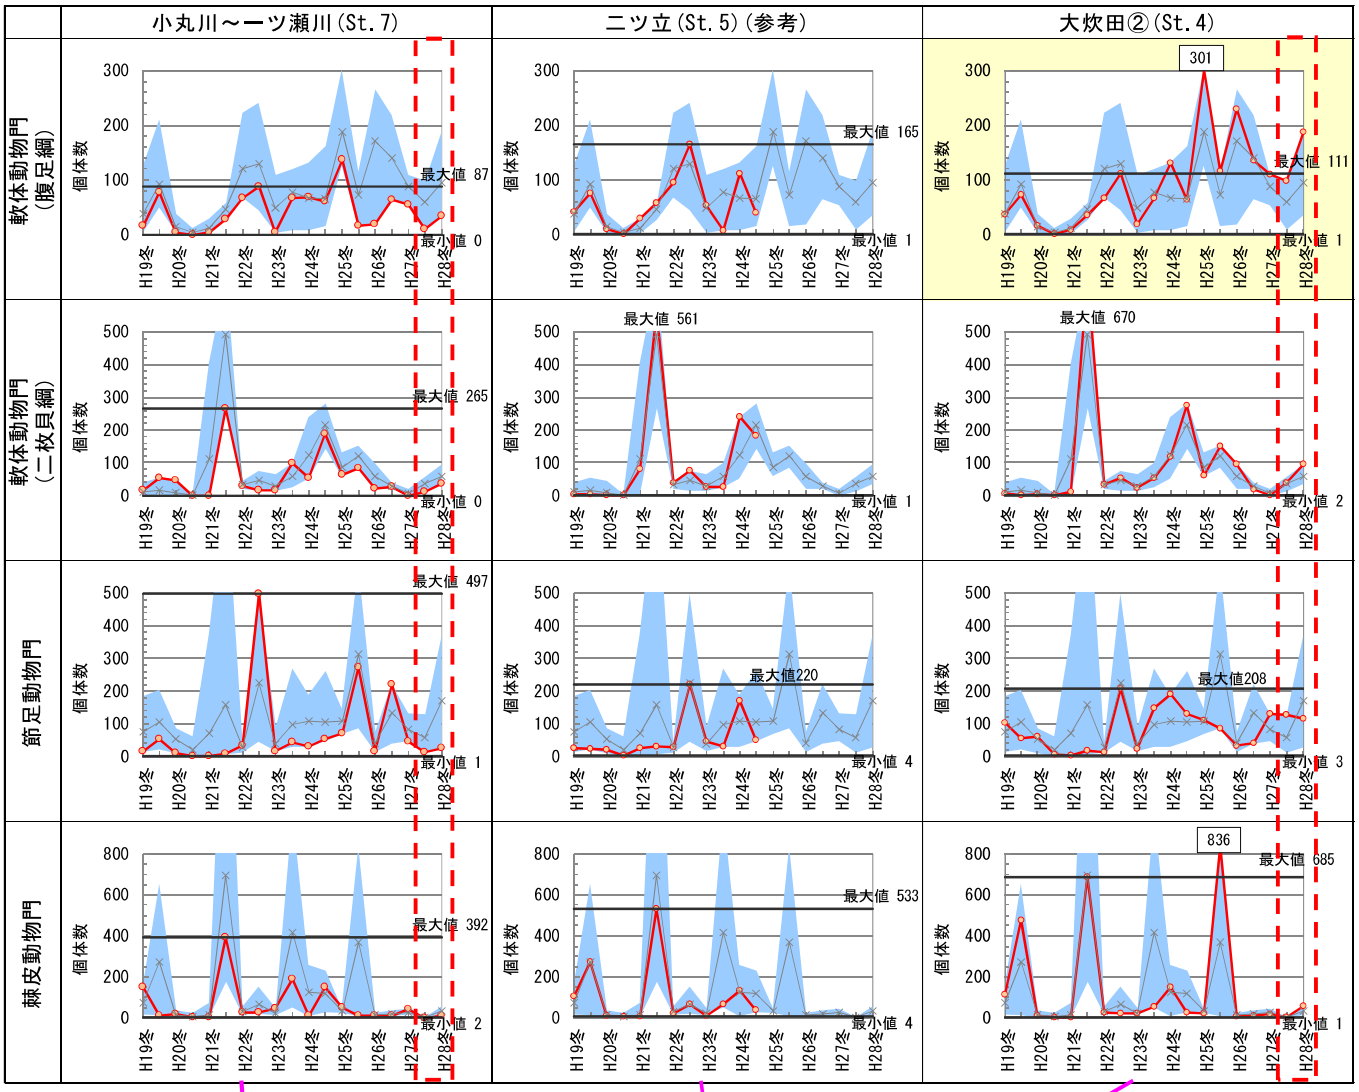

門別出現個体数の変動状況

ﾐでの出現個体数分布範囲、×：当該時期の平均出現個体数

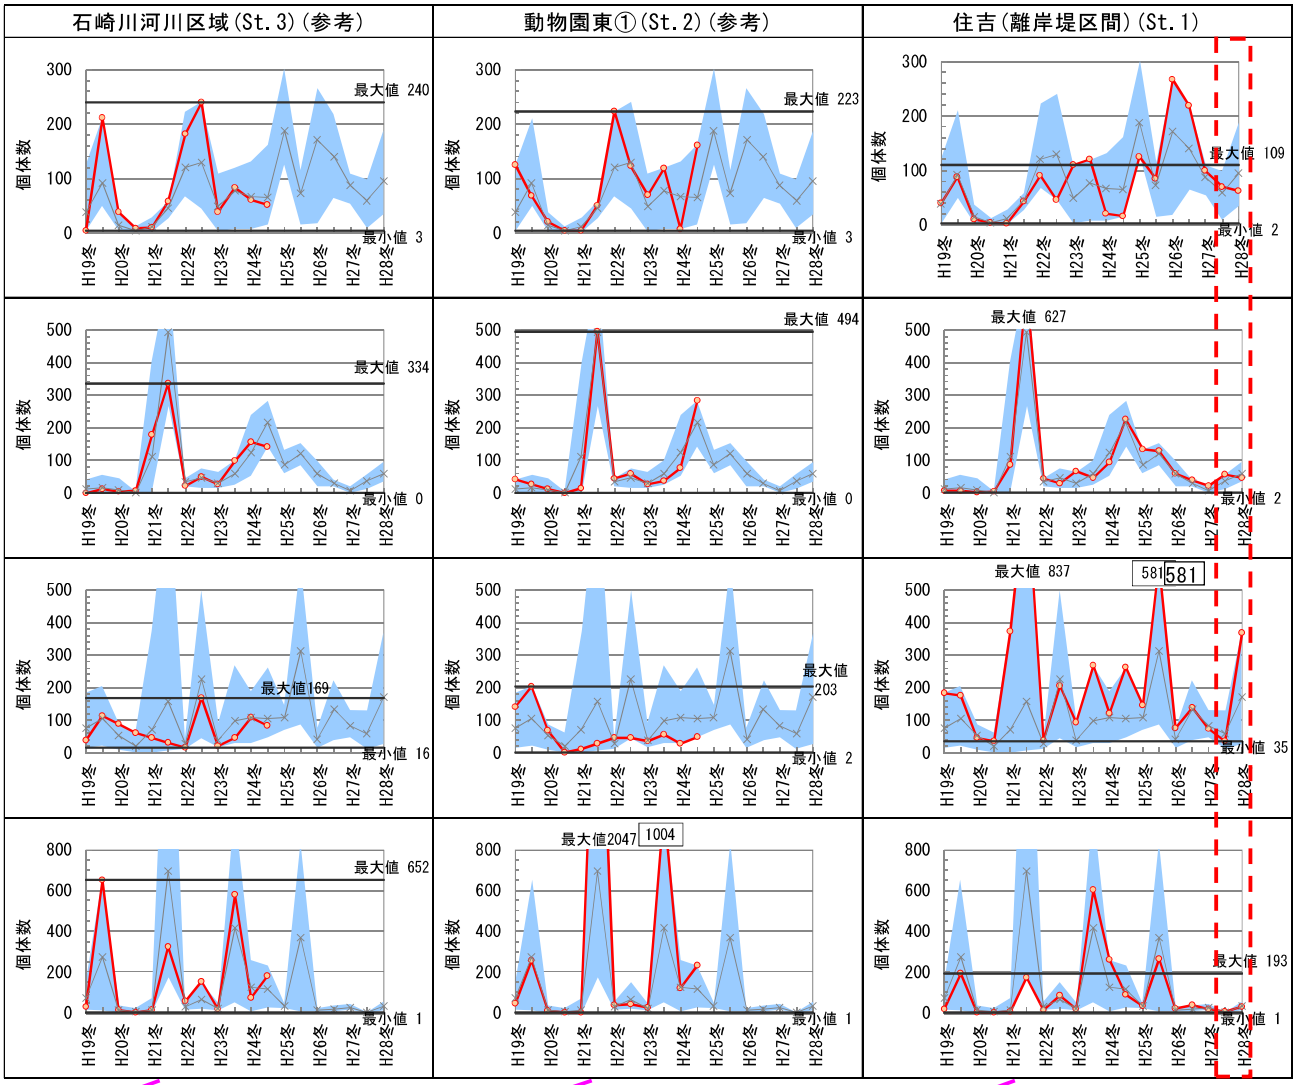

表－ 4.61　ケタ網漁法

：当該地点の出現種数、 ：当該時期の沿

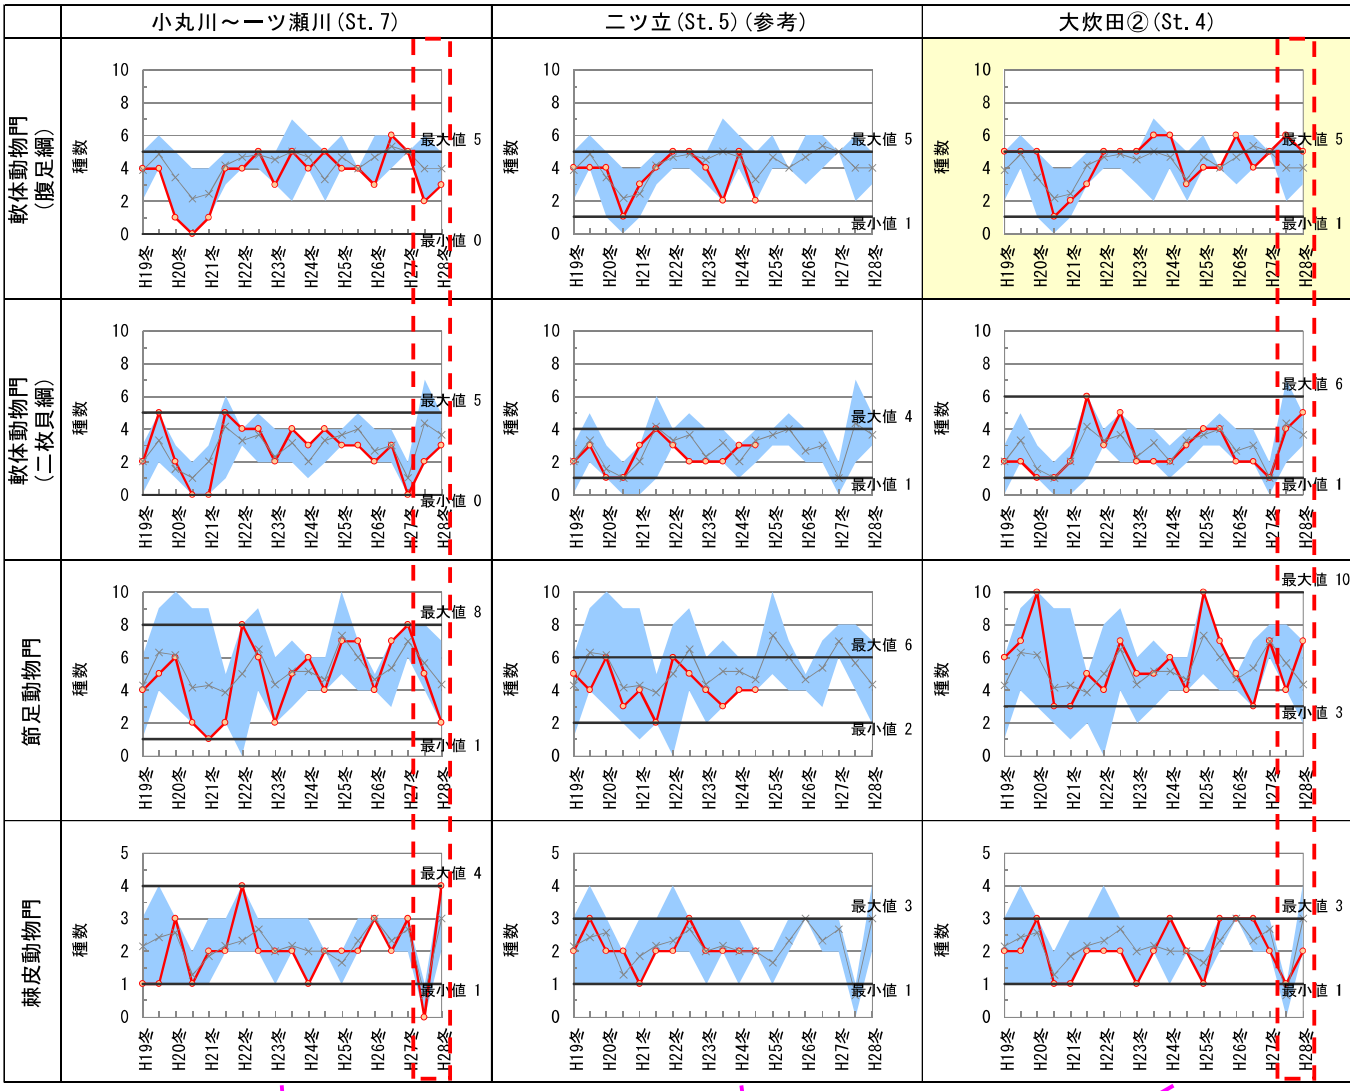

門別出現種数の変動状況

岸での出現種数分布範囲、×：当該時期の平均出現種数

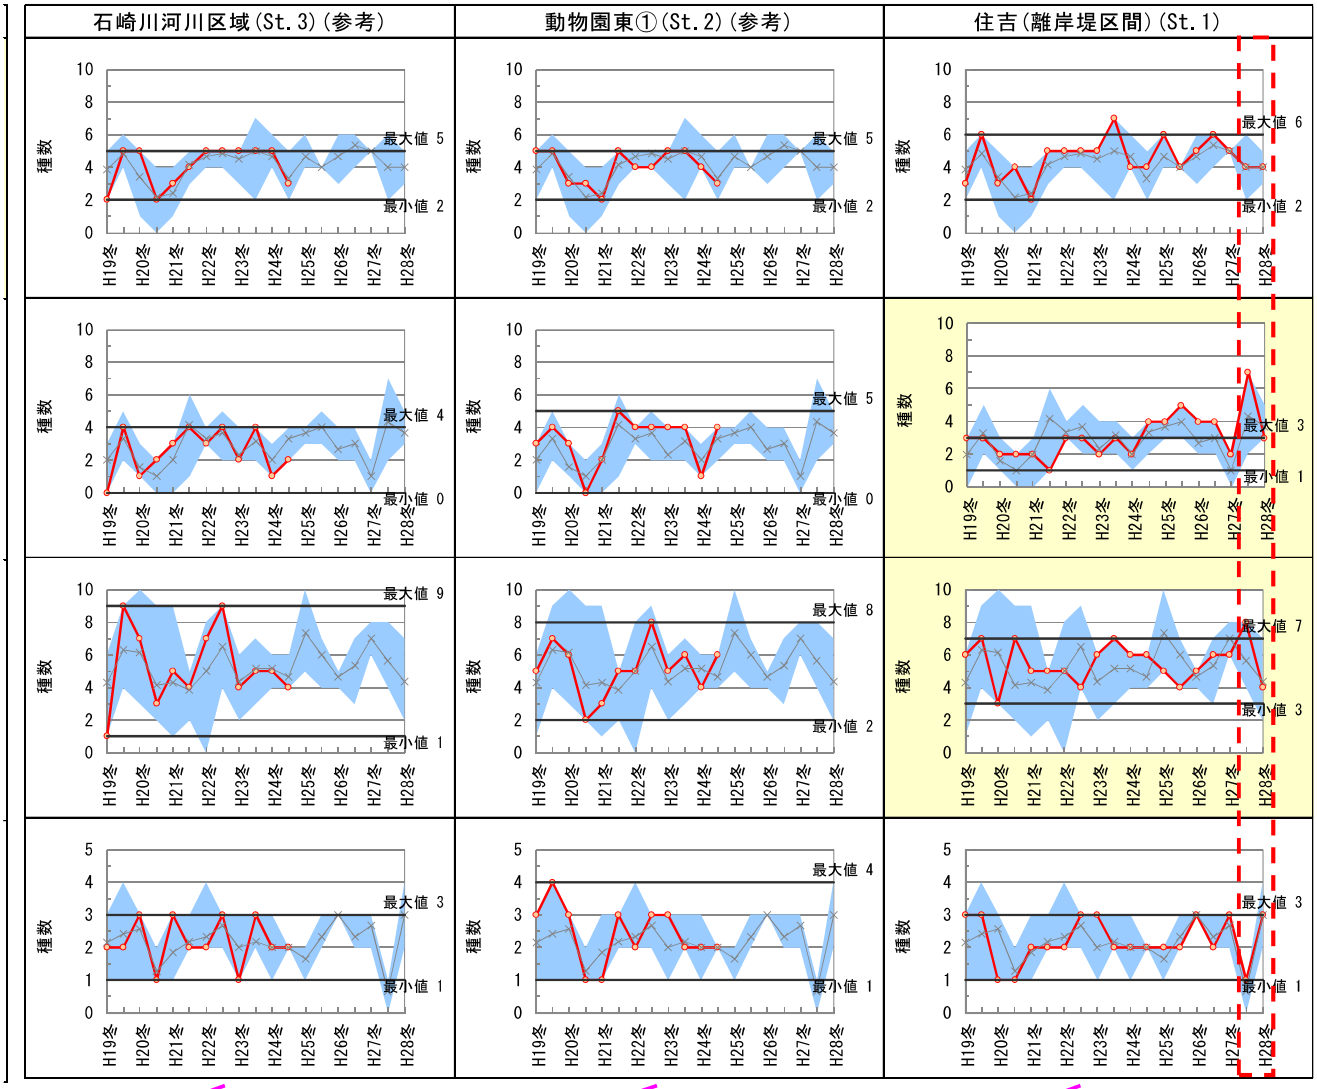

表－ 4.62　ケタ網漁法

：当該地点の湿重量、 ：当該時期の沿岸で

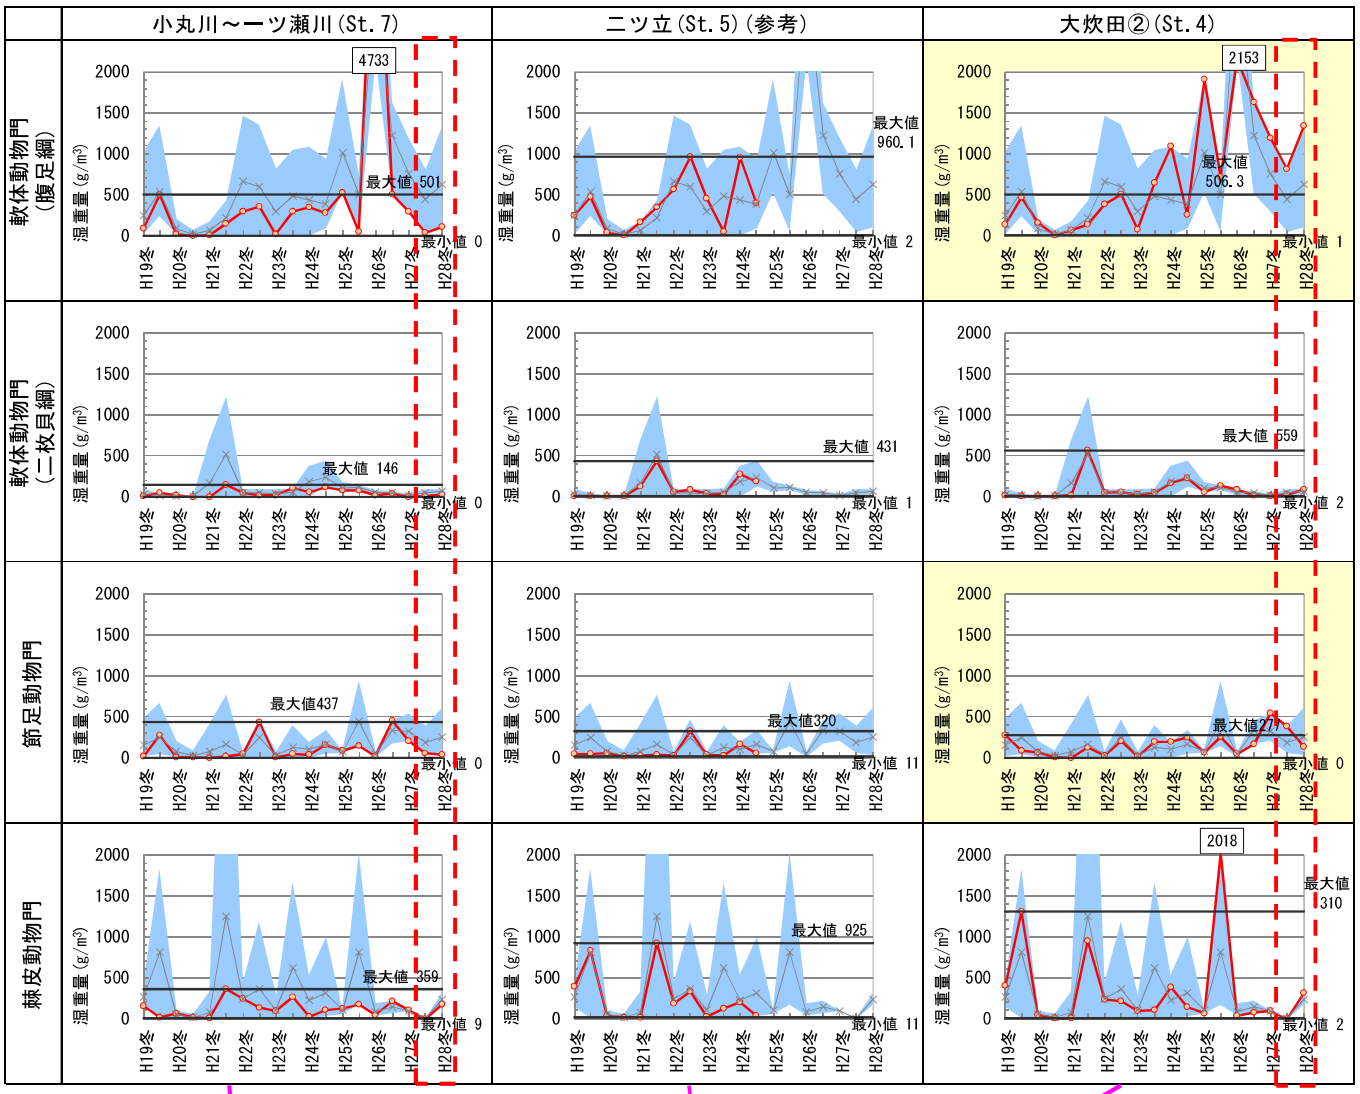

門別湿重量の変動状況

での湿重量分布範囲、×：当該時期の平均湿重量

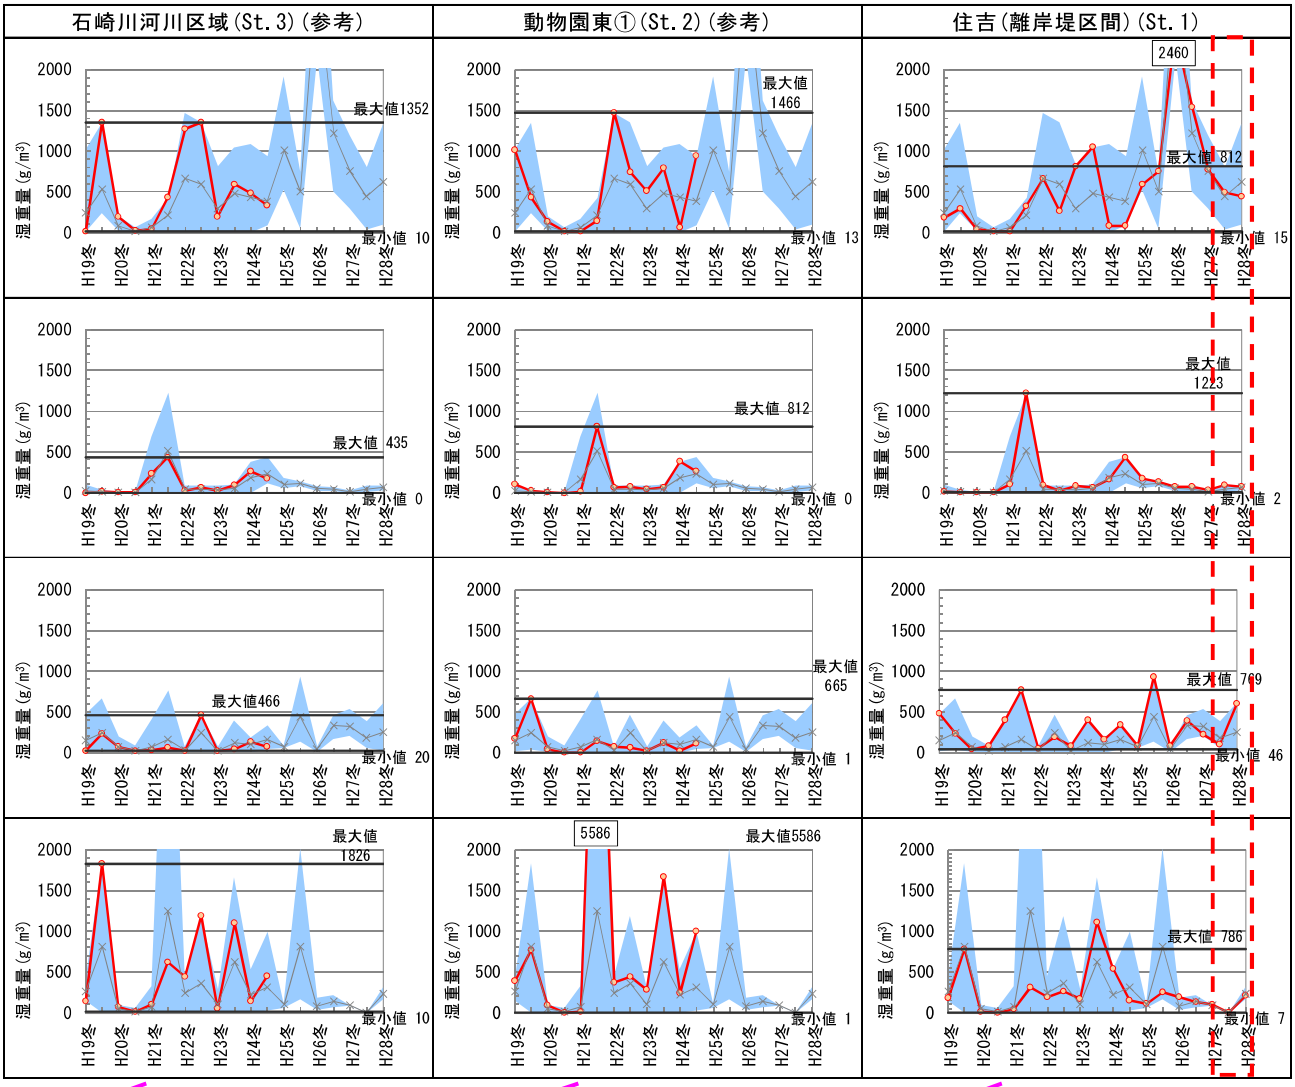

表－ 4.63　底曳網漁法　[illegible]

：当該地点の出現個体数、　：当該時期の沿岸

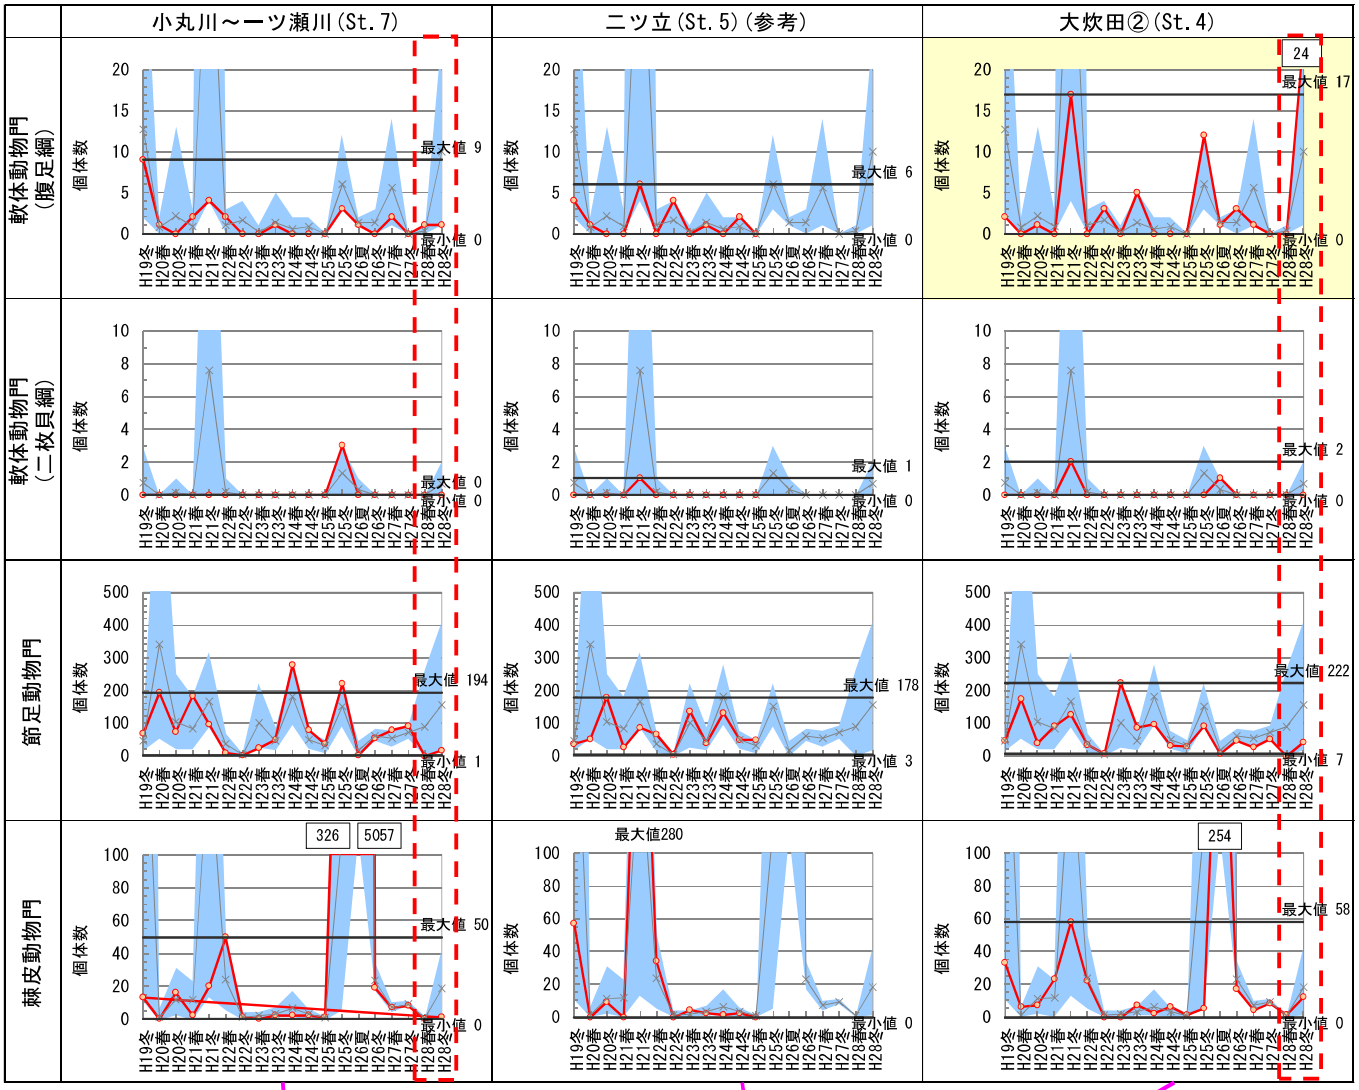

門別出現個体数の変動状況

までの出現個体数分布範囲、×：当該時期の平均出現個体数

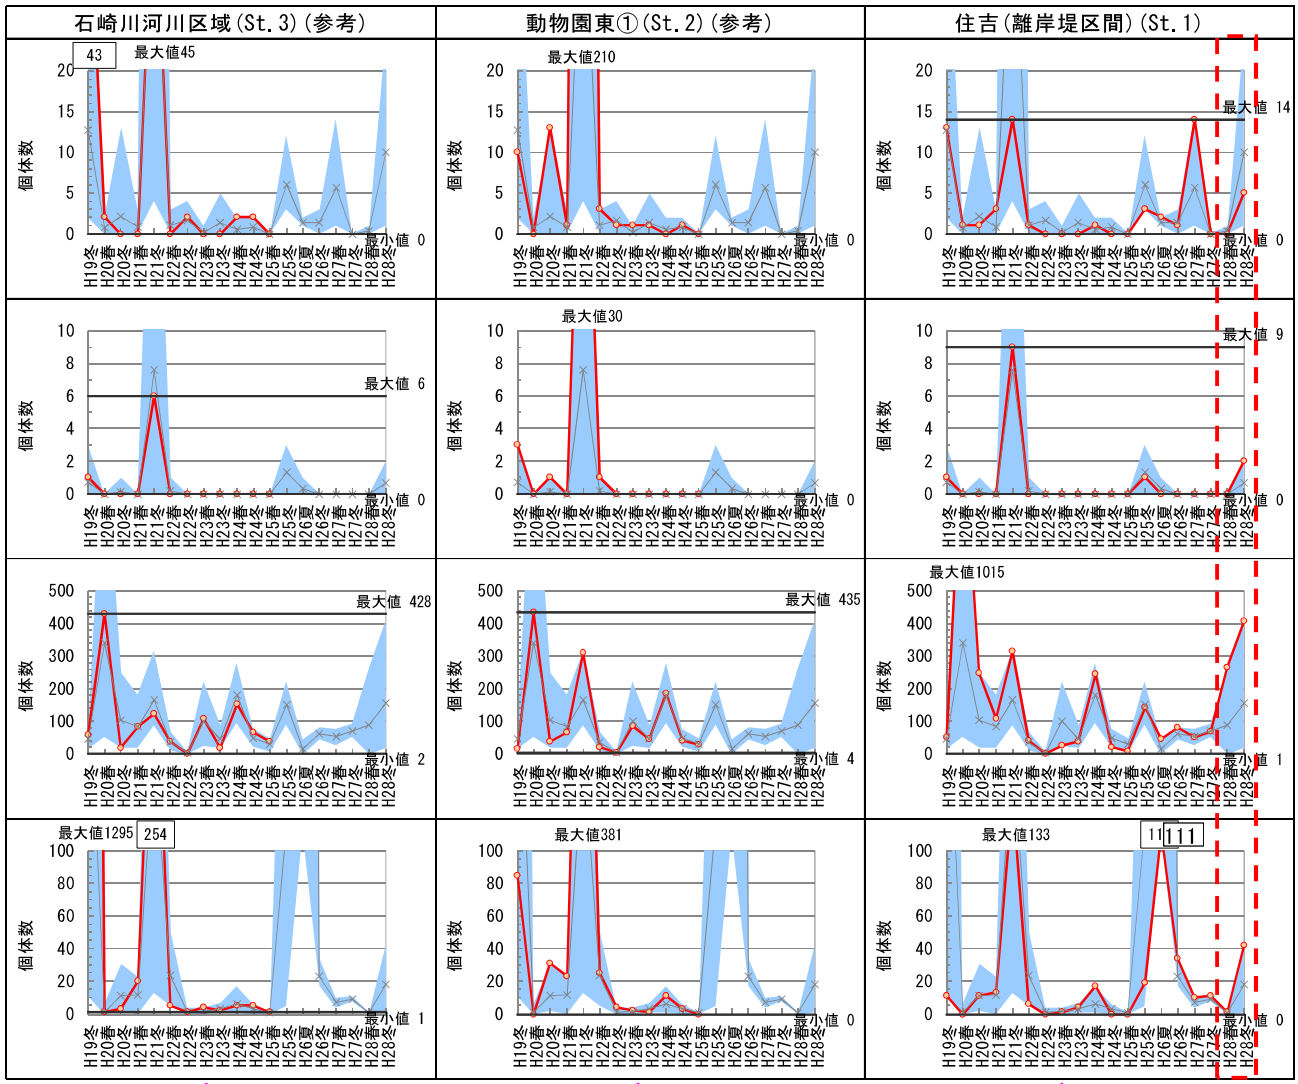

表－ 4.64　底曳網漁法

：当該地点の出現種数、 ：当該時期の沿

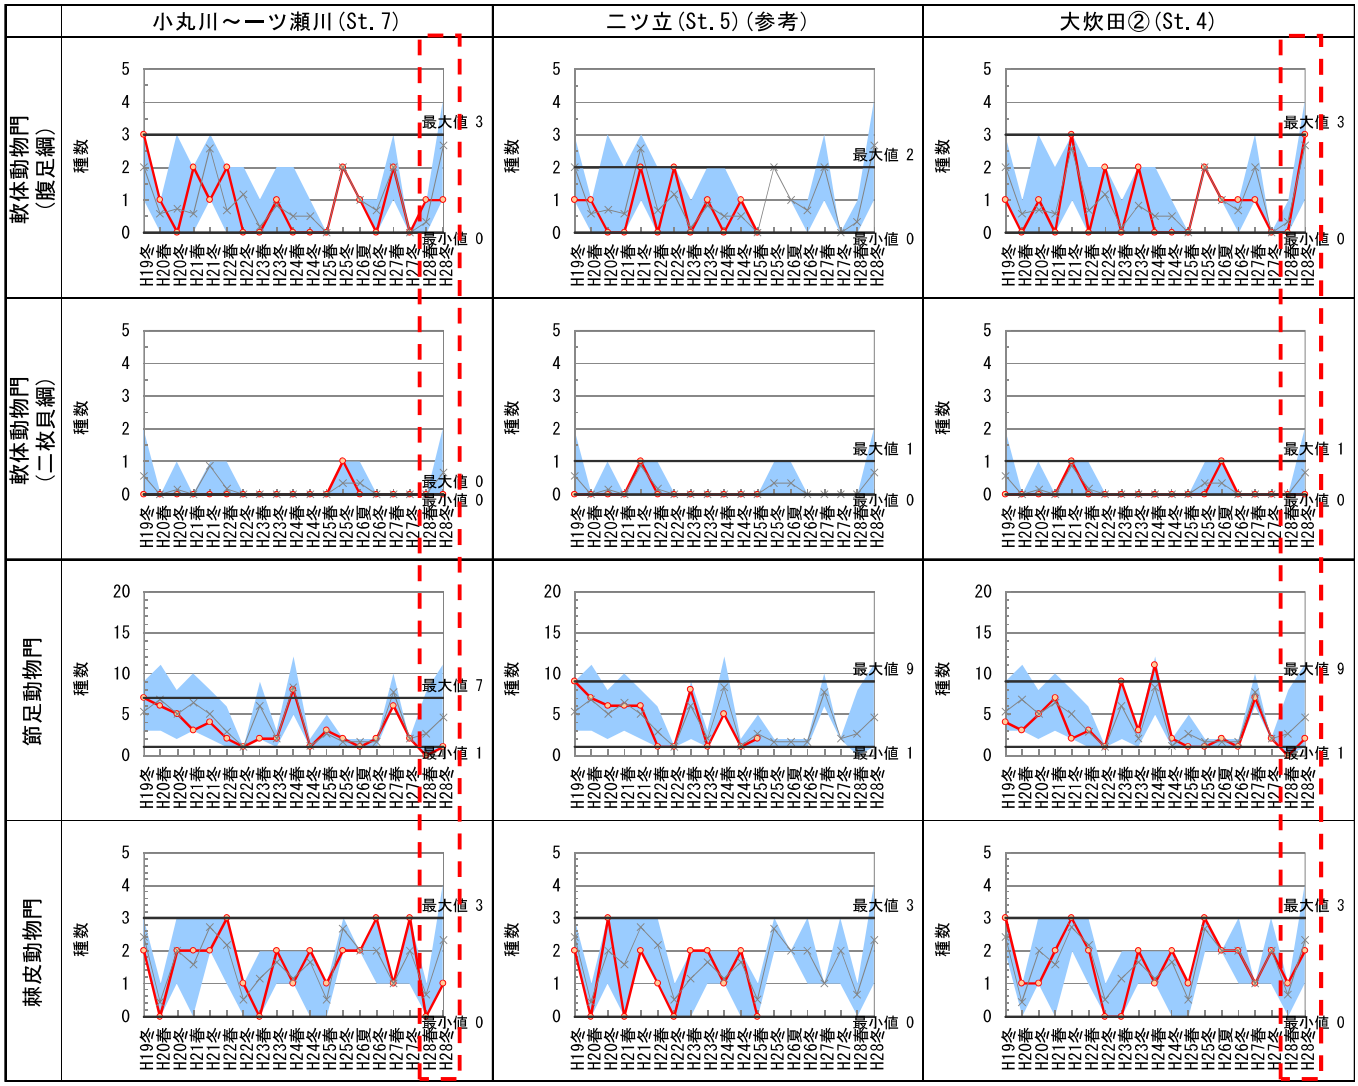

門別出現種数の変動状況

岸での出現種数分布範囲、×：当該時期の平均出現種数

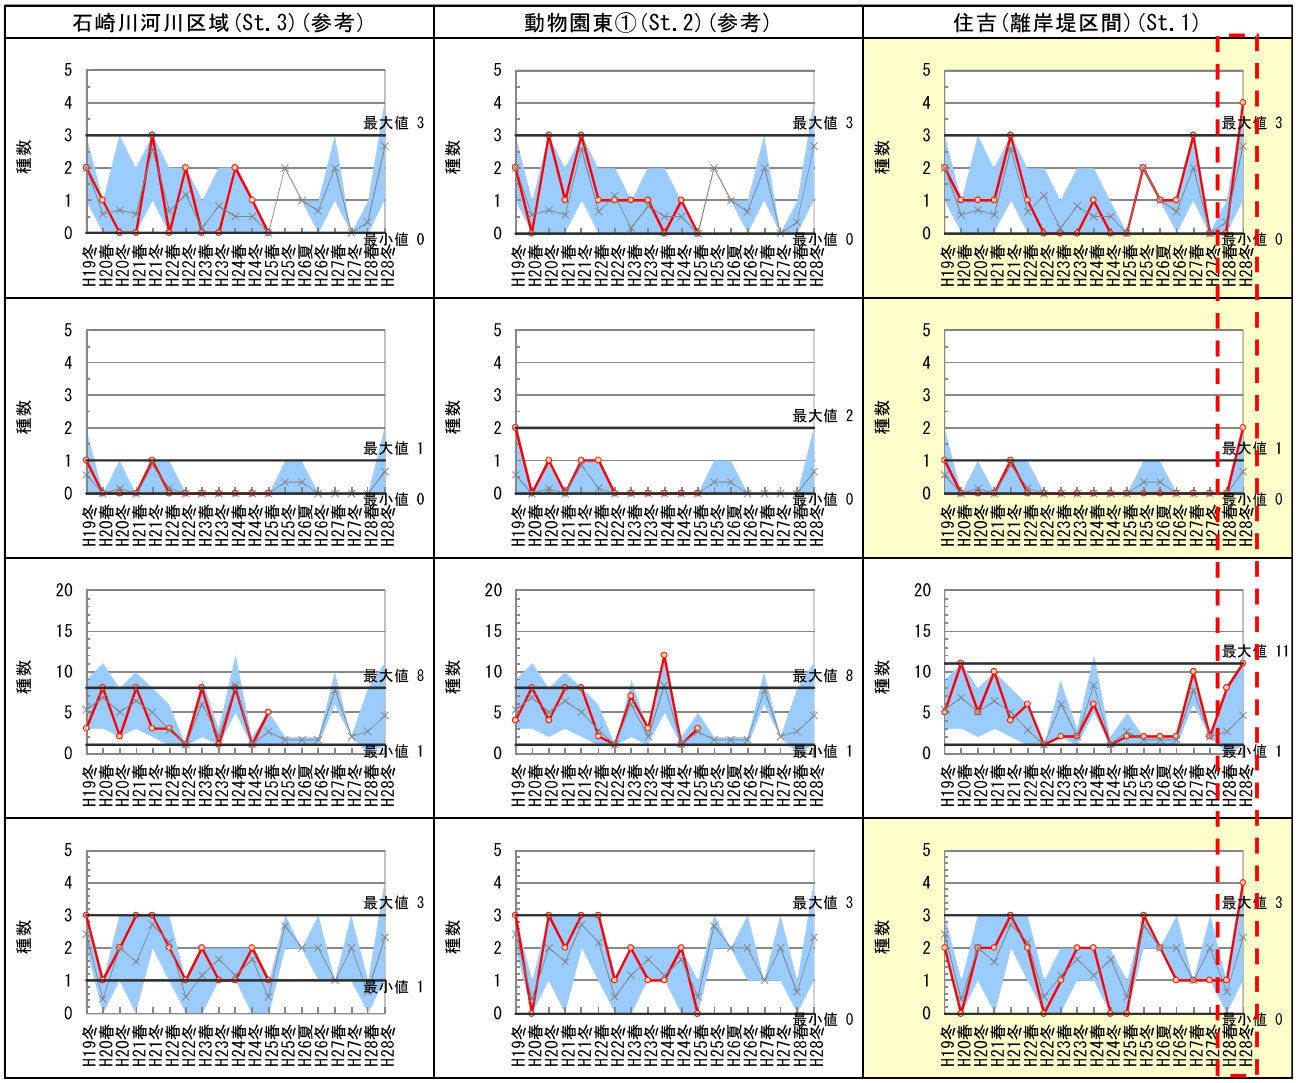

表－ 4.65　底曳網漁法

：当該地点の湿重量、 ：当該時期の沿岸で

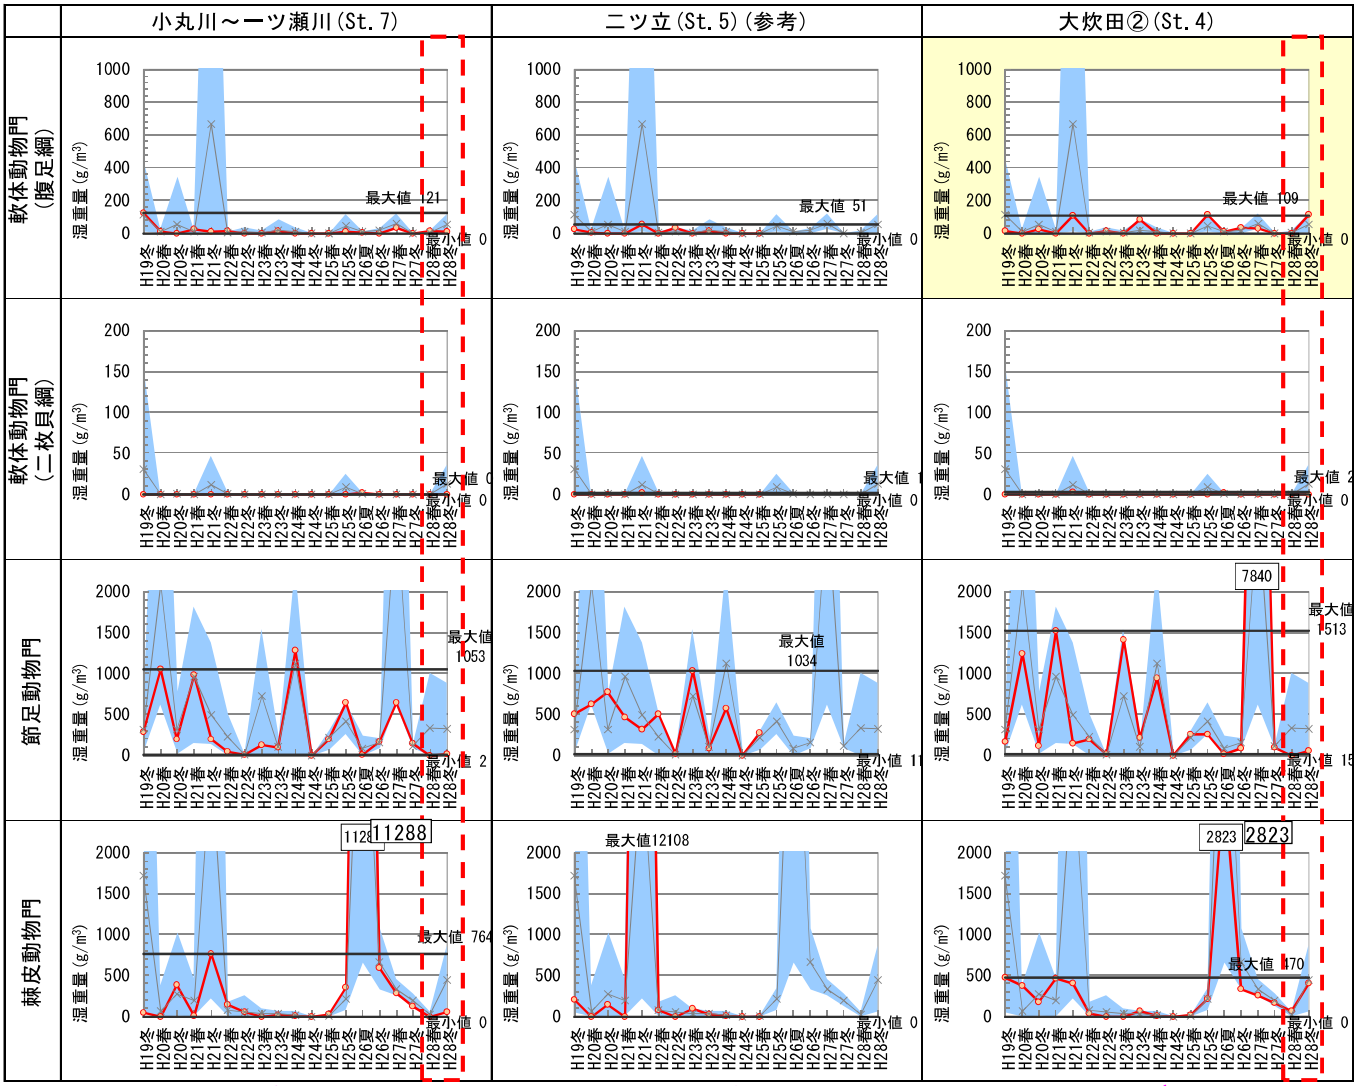

門別湿重量の変動状況

での湿重量分布範囲、×：当該時期の平均湿重量

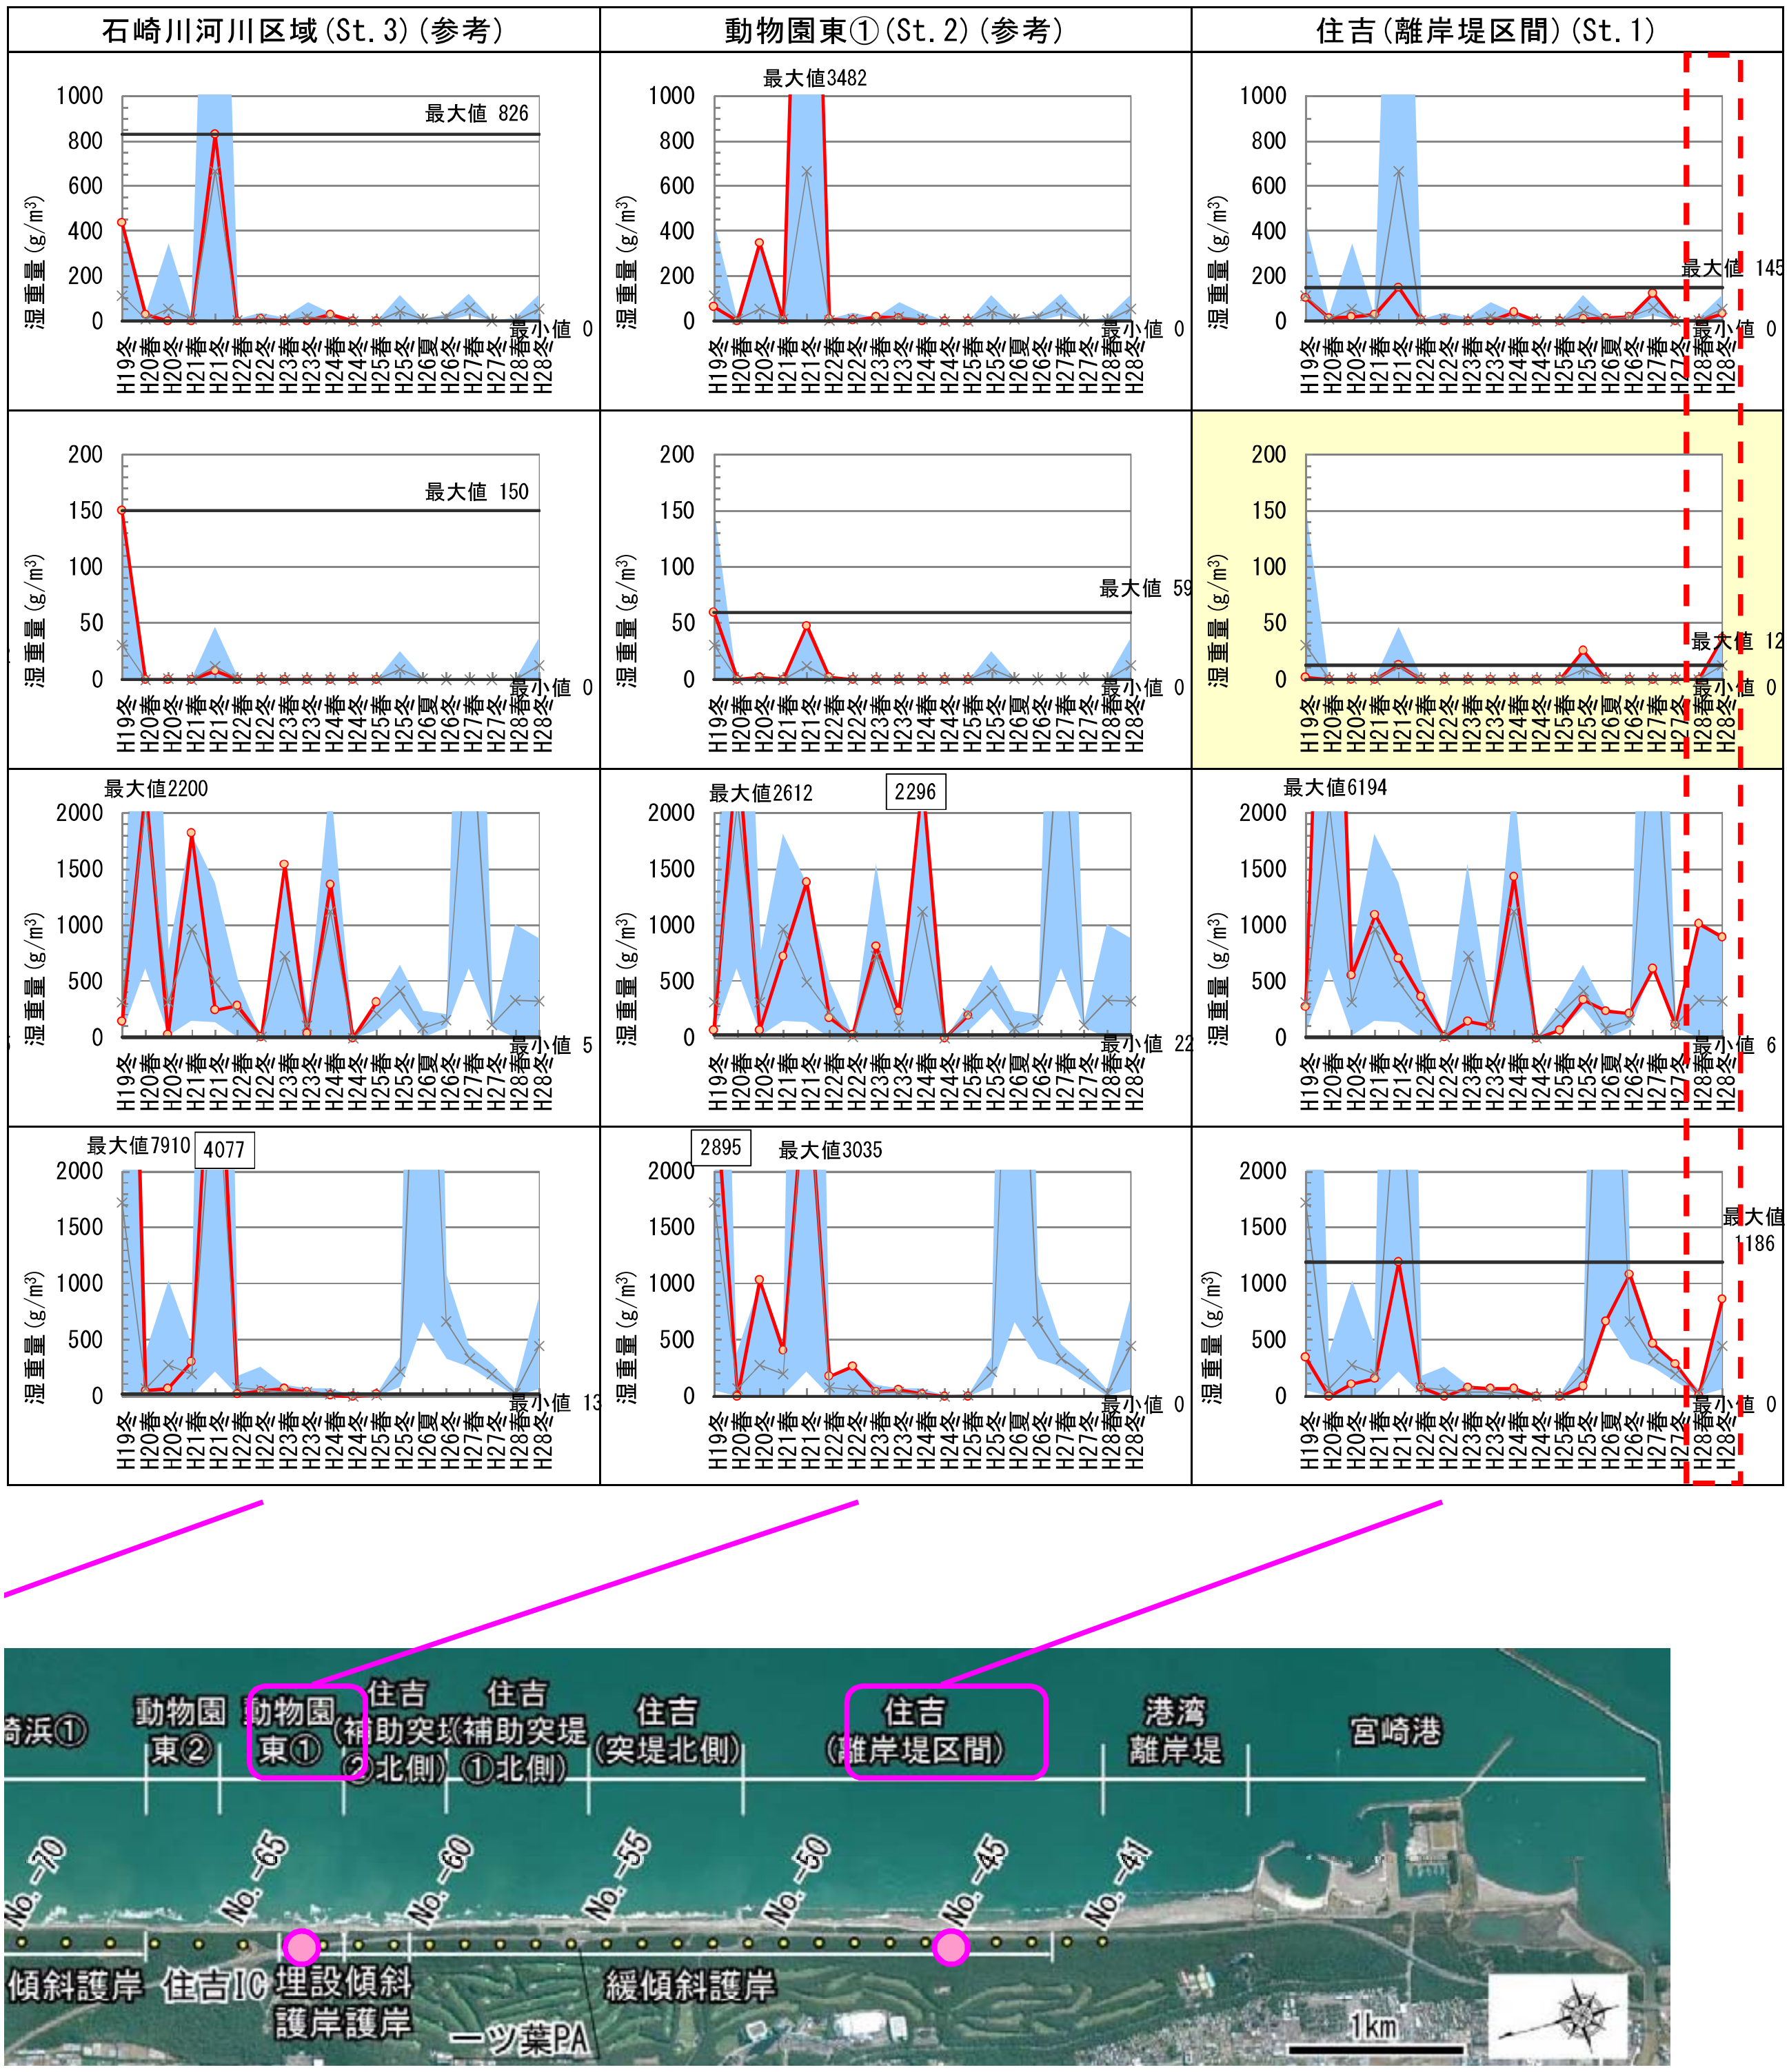

4.5.2 魚介類調査（大型サーフネットによる採取）

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 魚介類の出現状況

(B) 現象

- 魚介類の出現状況が、既往の調査結果と異ならないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
魚介類の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 突堤位置及びその比較地点として動物園東地点の 2 エリアのサーフゾーンとする。

3) 調査時期

- 夏季(7 月頃)及び冬季(1 月頃)の 2 回/年とする。

4) 調査結果の整理方法

- 出現種数、出現個体数およびその組成、出現湿重量およびその組成と、代表種を整理して示す。

5) 指標範囲の設定

- 2012(H24)年度から調査が行われているため、今後データを蓄積し、指標を設定する。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 次頁以降に 2012(H24)～2016(H28)年度の調査結果を示す。

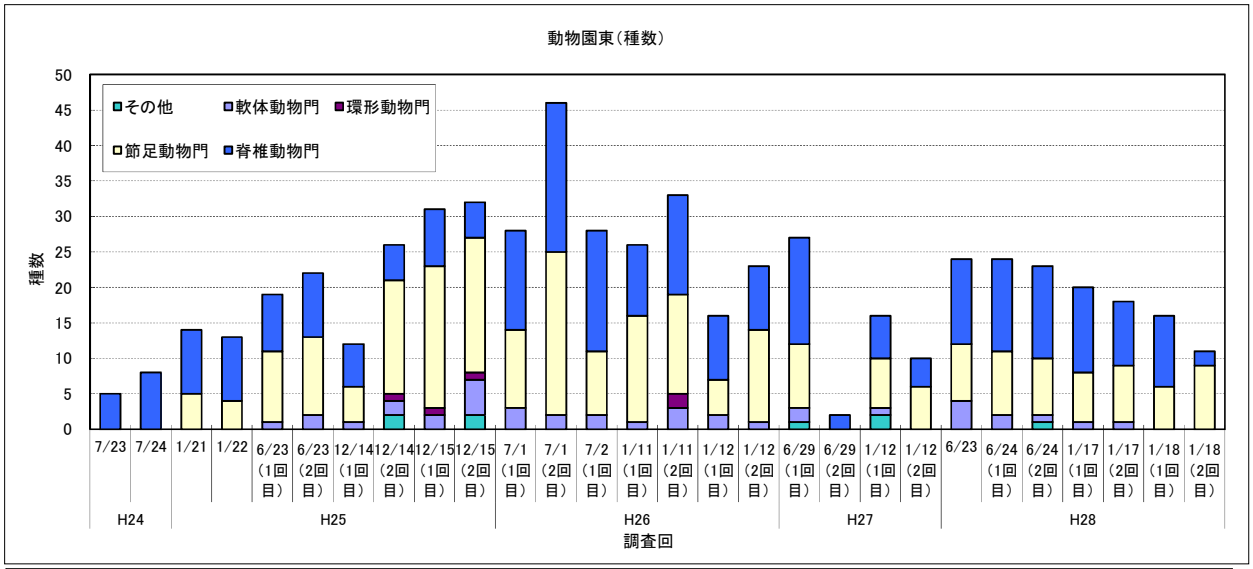

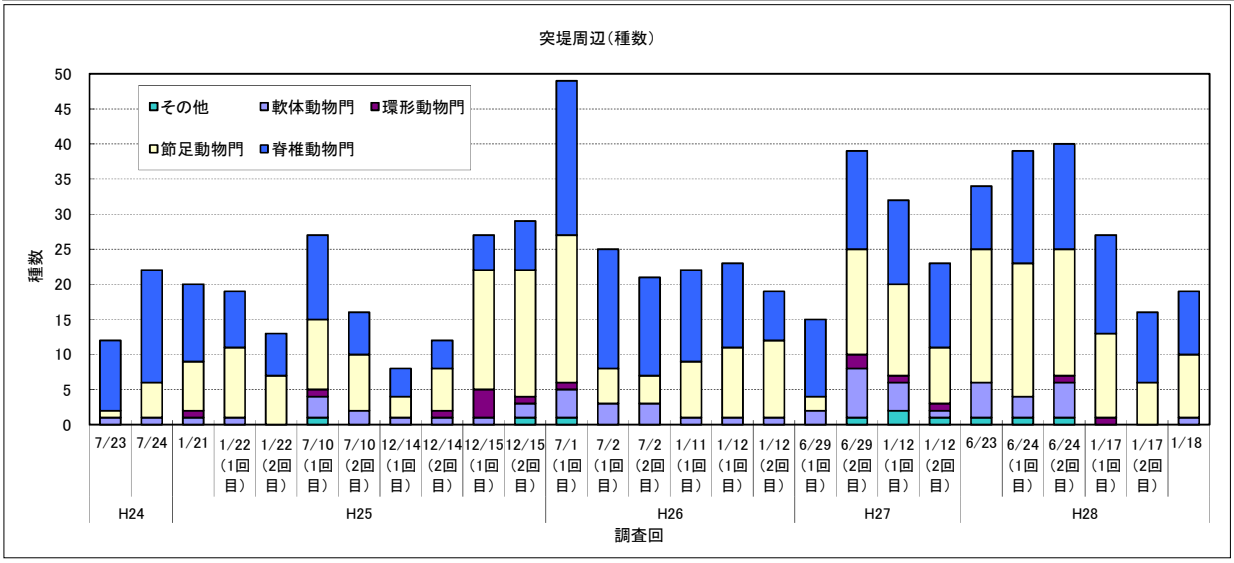

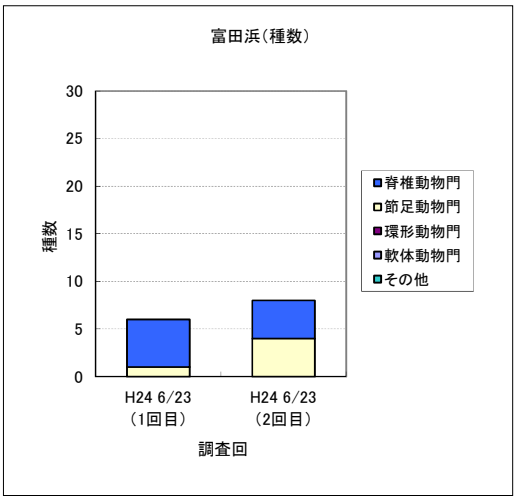

※経年比較の観点から、高さ 2m のネットの結果を用いて整理した。

図－ 4.16　調査時期・調査地点別の出現種数

表－ 4.66(1)　調査時期・調査地点別の個体数

地点	2012(H24)年度夏期		2012(H24)年度冬期			2013
動物園東						
突堤施工箇所付近						
一ツ瀬川左岸						

地点	2014(H26)年度夏期				2014(	
動物園東						
突堤施工箇所付近						
一ツ瀬川左岸						

※平成 25 年度の 12 月 15 日突堤 3 回目、平成 26 年度の 7 月 2 日動物園東 2 回目および 1 月 11 日突堤 2 回目、平成 27

数の割合(2012(H24)年夏期～2015(H27)年夏期)

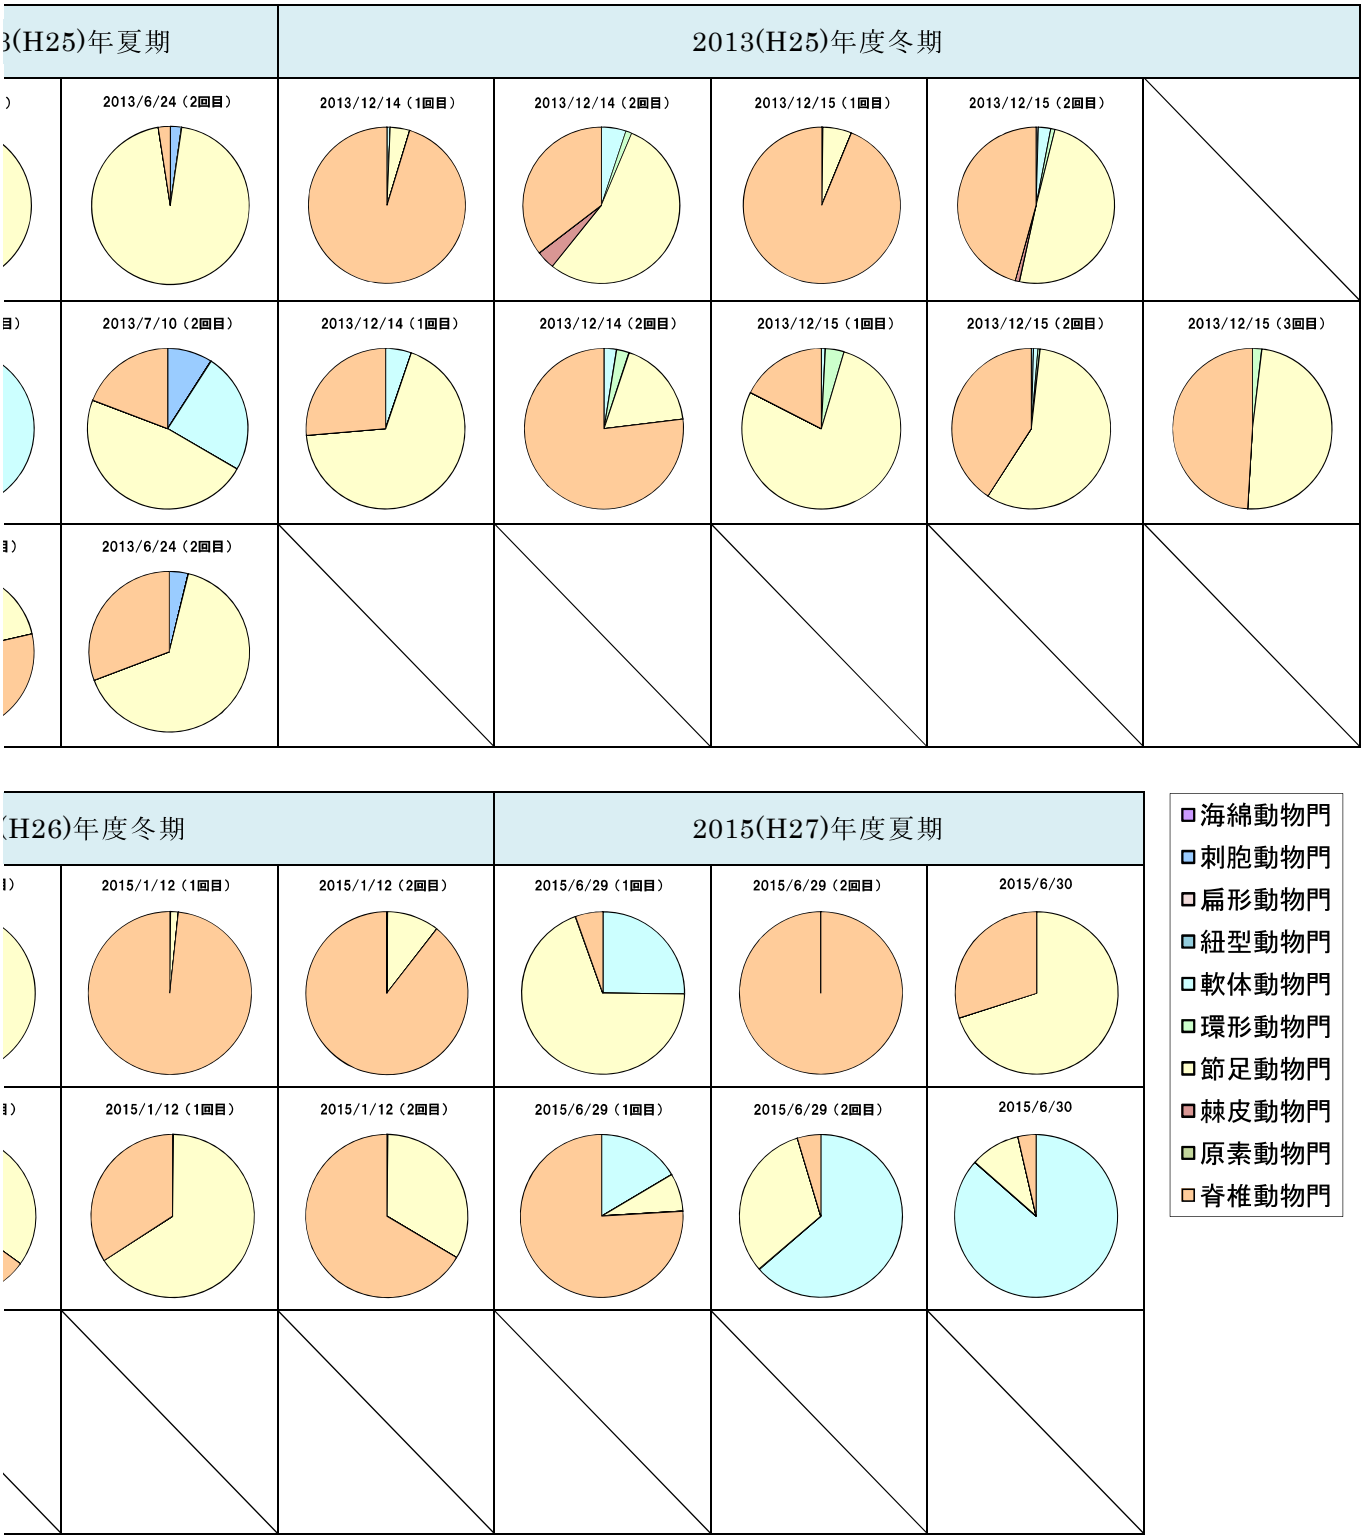

7年度の6月30日および1月13日は、高さ4mの大型サーフネットを使用している。

表－ 4.66(2)　調査時期・調査地点別

地点	2015(H27)年度冬期			2016(H28)年度夏期		
動物園東						
突堤施工箇所付近						

※平成 25 年度の 12 月 15 日突堤 3 回目、平成 26 年度の 7 月 2 日動物園東 2 回目および 1 月 11 日突堤 2 回目、平成 27
平成 28 年度の 6 月 24 日動物園東 3 回目および 1 月 17 日動物園東 3 回目は、高さ 4m の大型サーフネットを使用し

]の個体数の割合(2015(H27)年冬期～)

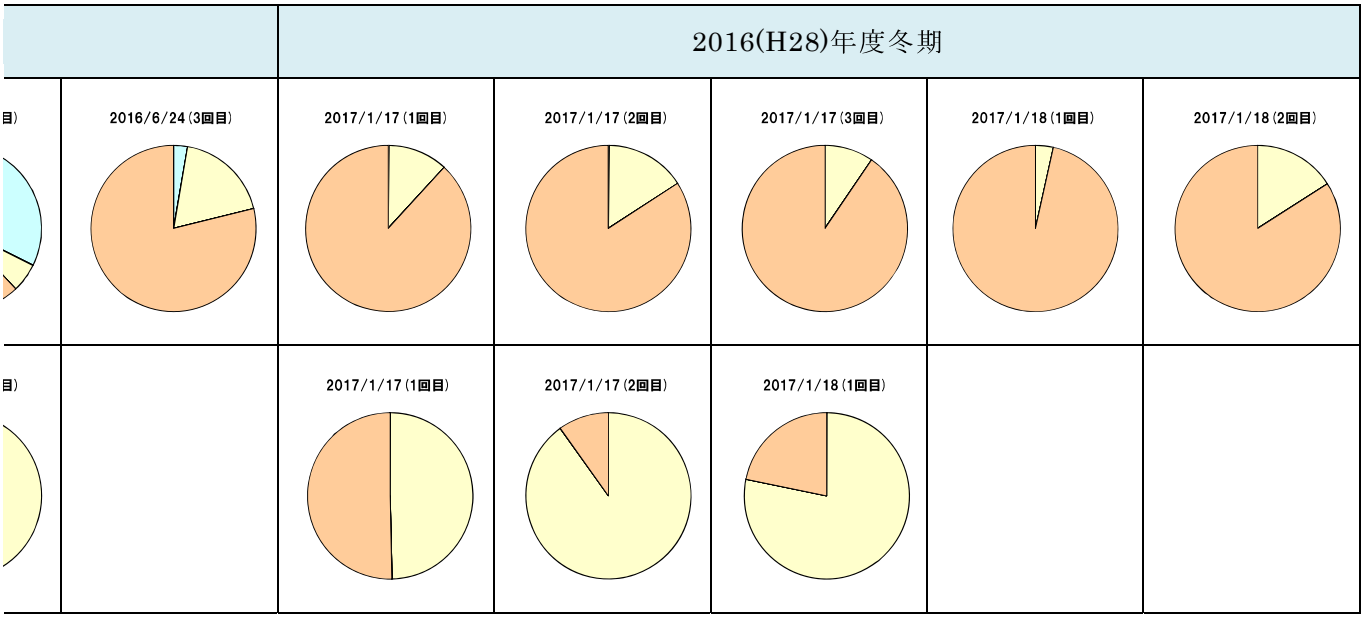

7年度の6月30日および1月13日、

ている。

表－ 4.67(1)　調査時期・調査地点別の湿重量

地点	2012(H24)年度夏期		2012(H24)年度冬期			2013
動物園東	2012/7/23 	2012/7/24 	2013/1/21 	2013/1/22 		2013/6/24（1回目 
突堤施工箇所付近	2012/7/23 	2012/7/24 	2013/1/21 	2013/1/22（1回目） 	2013/1/22（2回目） 	2013/7/10（1回目 
一ツ瀬川左岸						2013/6/24（1回目 

地点	2014(H26)年度夏期				2014(	
動物園東	2014/7/1（1回目） 	2014/7/1（2回目） 	2014/7/2（1回目） 	2014/7/2（2回目） 	2015/1/11（1回目） 	2015/1/11（2回目 
突堤施工箇所付近	2014/7/1 	2014/7/2（1回目） 	2014/7/2（2回目） 		2015/1/11（1回目） 	2015/1/11（2回目 
一ツ瀬川左岸						

※平成 25 年度の 12 月 15 日突堤 3 回目、平成 26 年度の 7 月 2 日動物園東 2 回目および 1 月 11 日突堤 2 回目、平成 27

量の割合(2012(H24)年夏期～2015(H27)年夏期)

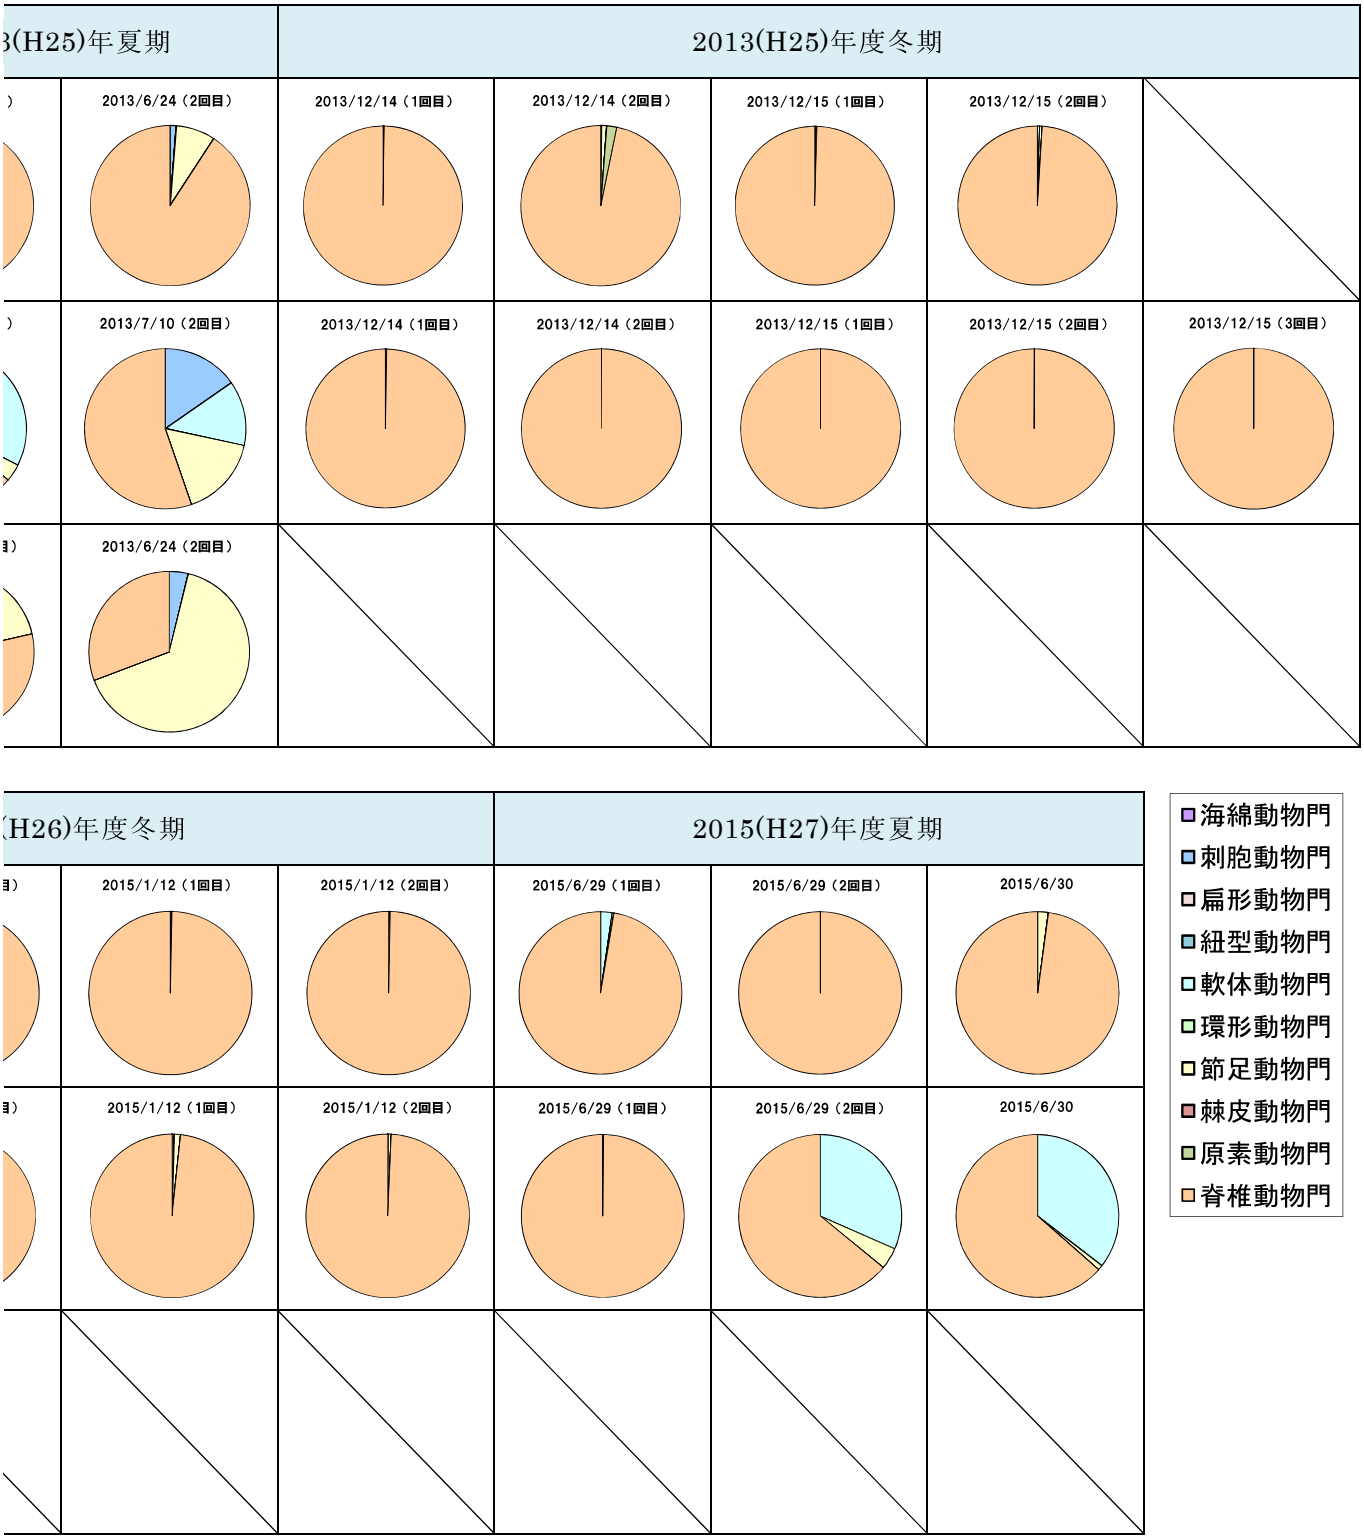

7年度の6月30日および1月13日は、高さ4mの大型サーフネットを使用している。

表－ 4.67(2)　調査時期・調査地点別

地点	2015(H27)年度冬期			2016(H28)年度夏期		
動物園東						
突堤施工箇所付近						

※平成 25 年度の 12 月 15 日突堤 3 回目、平成 26 年度の 7 月 2 日動物園東 2 回目および 1 月 11 日突堤 2 回目、平成 27

]の質重量の割合(2015(H27)年冬期～)

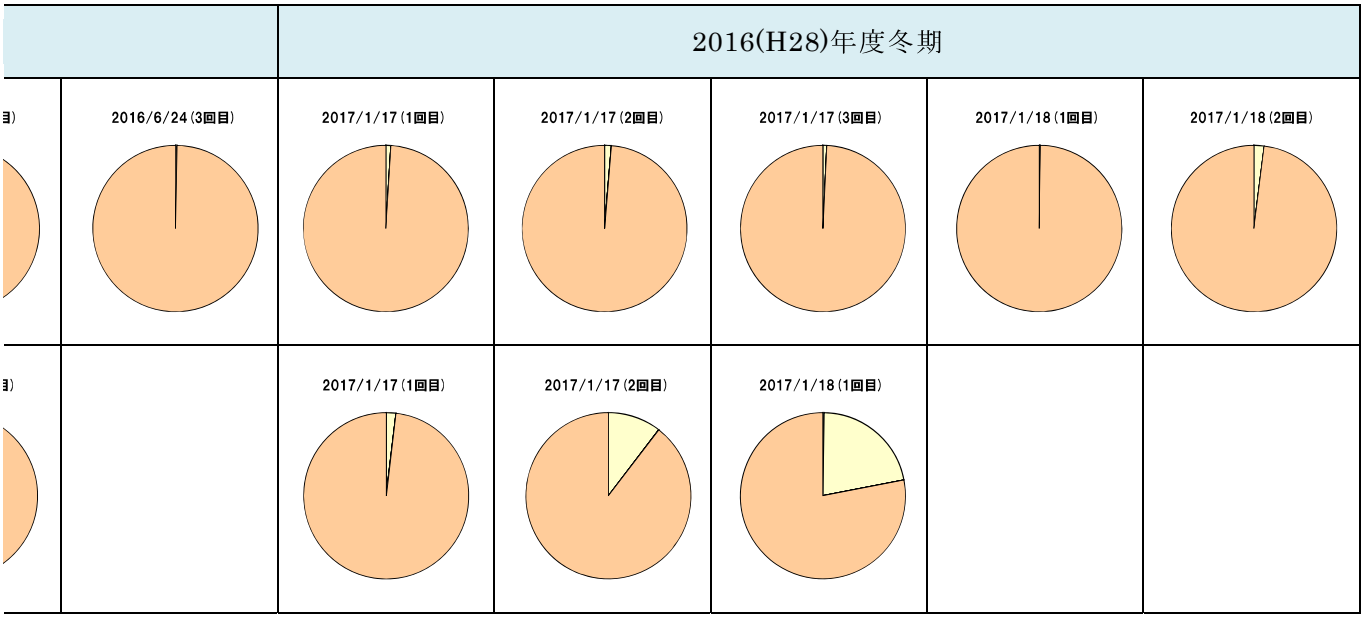

7 年度の 6 月 30 日および 1 月 13 日は、高さ 4m の大型サーフネットを使用している。

4.5.3 潜水目視観察

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 魚介類の出現状況

(B) 現象

- 突堤建設に伴い、周辺での魚介類の出現状況が、既往の調査結果と異ならないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
魚介類の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 突堤付近とする。

3) 調査時期

- 季節変動を考慮して、春季(6 月頃)、夏季(8 月頃)、秋季(11 月頃)、冬季(2 月頃)の 4 回/年とする。
- 第 2 回効果検証分科会における「調査の効率化」で、2013(H25)年度後期調査以降は夏季(8 月頃)および冬季(2 月頃)の 2 回/年に変更した。

4) 調査結果の整理方法

- 突堤施工箇所の北側側面において、潜水目視観察により消波ブロック周辺に生息する魚介類の出現種数を整理し、指標範囲と比較する。
- 出現種数の変動状況を、既設離岸堤地点での調査結果より設定した指標範囲と比較して時系列で確認する。

5)　指標範囲の設定

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 既設離岸堤地点の潜水目視観察結果(2008(H20)年～2013(H25)年実施)から、出現種数を整理する。
- 整理結果から出現数の最大値、最小値及び平均値を算定し、指標として設定する。なお、データの蓄積が少ないことから振れ幅は設定しない。

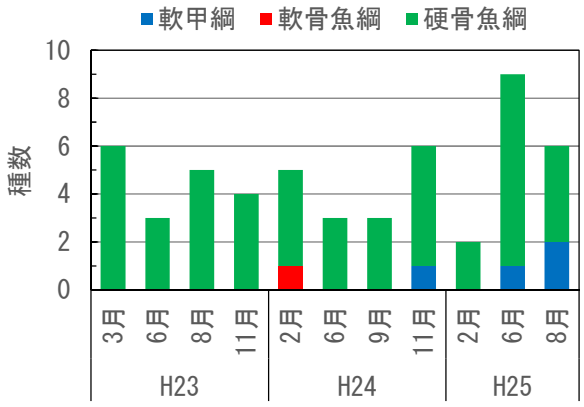

出現種数	軟甲綱	軟骨魚綱	硬骨魚綱	合計
最大値	2	1	8	9
最小値	0	0	2	2
平均値	0.36	0.09	4.27	4.73

図－ 4.17　既設離岸堤地点の潜水目視調査結果と、潜水目視調査に関する指標範囲

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 冬季調査では魚介類が確認されず、これまで離岸堤周辺で観察された最小の種数を下回った。継続して観察されていたクサフグも見られていない。これは、調査実施時の波浪条件によるものであると考えられる。
- 夏季および冬季の突堤南端部でもこれまで離岸堤周辺で観察された最小の種数を下回った。夏季は、突堤南端部に砂が堆積したことにより調査範囲が狭まっていたことが要因であると考えられる。
- これまで見られなかったニザダイ、ナベカが見られた。

≪参考：2015(H27)年度の潜水目視観察結果≫

- 冬季調査では魚介類が確認されず、これまで離岸堤周辺で観察された最小の種数を下回った。継続して観察されていたクサフグも見られていない。これは、調査実施時の波浪条件によるものであると考えられる。
- 夏季および冬季の突堤南端部でもこれまで離岸堤周辺で観察された最小の種数を下回った。夏季は、突堤南端部に砂が堆積したことにより調査範囲が狭まっていたことが要因であると考えられる。
- これまで見られなかったニザダイ、ナベカが見られた。

≪参考：2014(H26)年度の潜水目視観察結果≫

- 夏季の突堤先端部でこれまで離岸堤周辺で観察された最大の種数を上回った。
- 突堤南部でこれまで離岸堤周辺では見られなかった頭足綱(マダコ)が見られた。
- これまで離岸堤周辺では見られなかったモズクガニ､アミ類､ホウボウ科の１種、イサキ、イシダイ、イシガキダイ、ニベ、アゴハゼ、ヌエハゼが見られた。
- これまで突堤周辺では見られていなかった依存性種である軟甲綱(モズクガニ､アミ類)が見られた。

表－ 4.68　突堤周辺の潜水目視観察結果

綱名	目名	和名	離岸堤周辺	H25年度			H26年度		H27年度		H28年度		(参考) H26年3月		(参考) H26年6月		(参考) H27年1月		(参考) H27年6月		(参考) H28年2月		(参考) H28年9月		(参考) H29年1月		依存性
			H23~H25	6月	8月	3月	6月	1月	6月	2月	9月	1月	南側	先端部	南側	先端部	南側	先端部	南側	先端部	南側	先端部	南側	先端部	南側	先端部	
頭足綱	八腕形目	マダコ	－								1				1												
軟甲綱	十脚目	トゲアシガニ	○								2	2					2							4	3		有
		イソガニ	○																								有
		モズクガニ	－					1									1										
		ワタリガニ科の1種	－								2																
		イワガニ上科の1種	－																				1	1			
	アミ目	アミ類	－					600									500										
軟骨魚綱	エイ目	アカエイ	○																								
硬骨魚綱	ニシン目	カタクチイワシ	○																			1					
	カサゴ目	カサゴ	○																								有
		ハオコゼ	○																								有
		ホウボウ科の1種	－					1																			
		マゴチ	○																								
	スズキ目	ヒラスズキ	○																								
		マアジ	○													5											
		アジ科の1種	－								5																
		クロダイ	○				4				2	2				1									1		有
		キチヌ	○																								
		タイ科の1種	－																		1						
		オオニベ	－									1												7			
		ニベ	－				5		1							1											
		タカノハダイ	○						7		2				4	16				1		2				3	有
		シマスズメダイ	○																								有
		スズメダイ科の1種	－																					1			
		カゴカキダイ	○				9																				有
		メジナ	－			10		57	40					1	3	8	10	30						10			有
		オヤビッチャ	－								8												4	2			
		イサキ	－													50											
		シマイサキ	○				2		4		1					1											
		イシダイ	－													2											
		イシガキダイ	－				1									3											
		ニザダイ	－						1							3											
		ニザダイ科の1種	－								4					3								10			
		キュウセン	○																								有
		イソギンポ	○					1									1										有
		カエルウオ	○																								有
		ニジギンポ	○																								有
		ナベカ	－						1																		有
		イソギンポ科の1種	－			1					4													1			有
		アゴハゼ	－																								
		ヌエハゼ	－												2	2											
		アカオビシマハゼ	○			1			1			2															有
		ハゼ科の1種	○			1			1		2	2		2				1							2	1	
		ギンユゴイ	－																			1					
	カレイ目	ヒラメ	○																			1					
		ウシノシタ科の1種	○			1							1					1									
		カレイ目の1種	○																								
	フグ目	**コモンフグ**	－								1																
		クサフグ	○	2	1	3	9	2	4				12	9	3	18	9	2	1	2		3					有
4綱	9目	個体数		2	1	17	30	662	60	－	34	9	13	12	13	113	523	34	1	3	1	8	5	36	6	4	-

注：「依存性」には、離岸堤を生息域、餌場、隠れ家として利用すると考えられる種を選定した。
　　種名の太文字は今回初確認の種を示す。

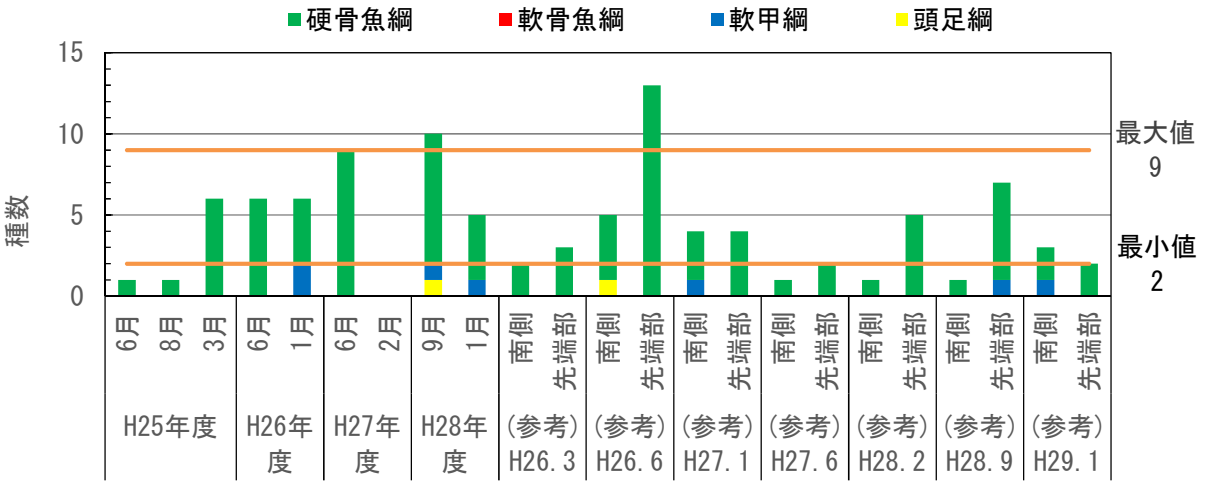

※「依存性」には、離岸堤を生息域、餌場、隠れ家として利用すると考えられる種を選定した。

4.5.4 漁獲調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 魚介類の出現状況

(B) 現象

- 魚介類の出現状況が、既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
魚介類の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 宮崎県沿岸とする。

3) 調査時期

- 通年の調査結果を使用する。

4) 調査結果の整理方法

- 統計データから漁獲量を整理し、過去の変動範囲内であるか確認する。

5) 指標範囲の設定

- 指標タイプは定性評価とする。
- 1989(H1)年～の宮崎農林水産統計年報（農林水産省　九州農政局宮崎地域センター）から漁獲量を整理する。漁獲量は、漁法、漁獲努力量等に依存し、これらは技術進歩や市場での価格により変化するものであることから、明確な指標、振れ幅は設定せず、変更傾向を定性的に確認する。
- なお、統計データ公表時期の都合上、効果検証の対象時期より 1 年前のデータを使用している。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2015(H27)年 1～12 月は過去の変動の範囲内であった。

≪参考：2014(H26)年度の漁獲量調査結果≫

- 2014(H26)年 1～12 月は過去の変動の範囲内であった。

≪参考：2013(H25)年度の漁獲量調査結果≫

- 2013(H25)年 1～12 月は過去の変動の範囲内であった。

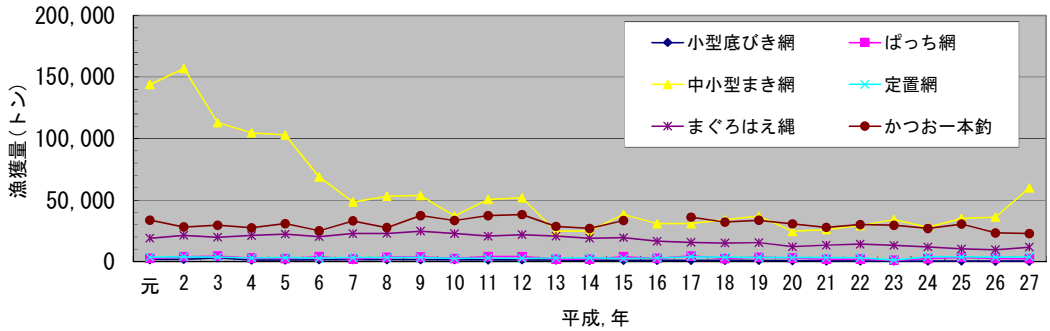

魚種別漁獲量の経年変化

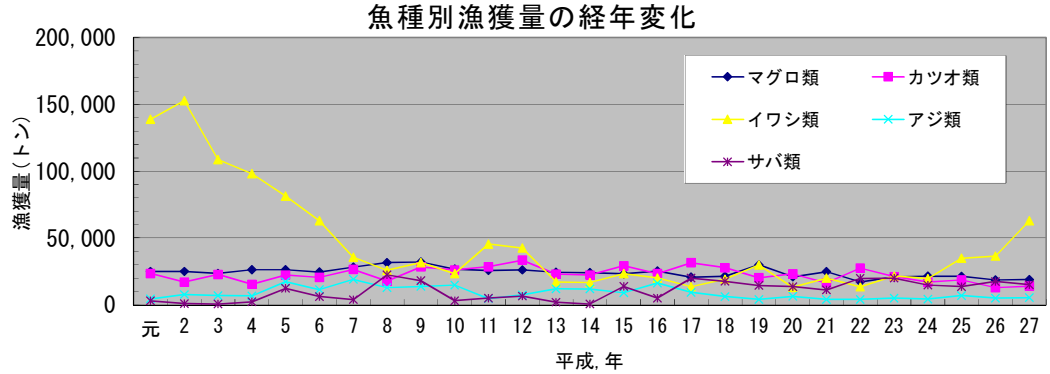

魚業種別漁獲量の経年変化

図－ 4.18　宮崎県内　漁獲量の経年変化

（宮崎農林水産統計年報（農林水産省　九州農政局宮崎地域センター）より作成

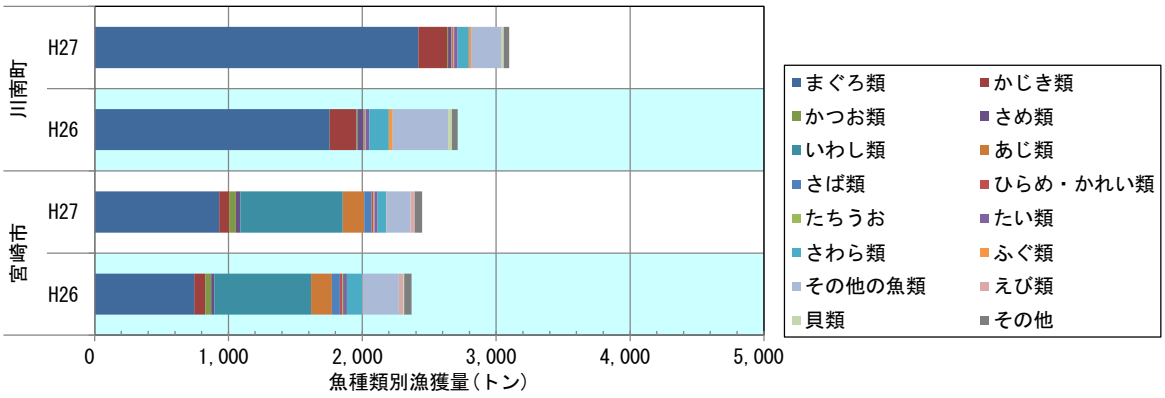

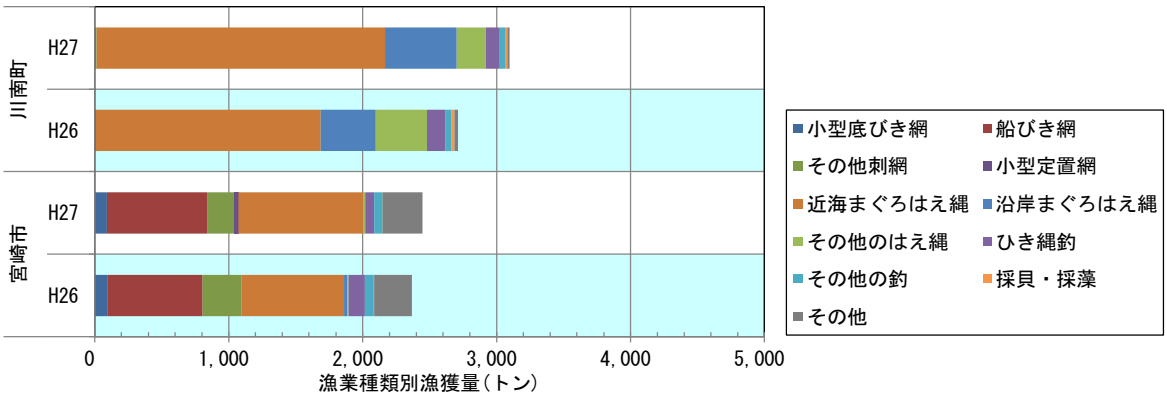

図－ 4.19　市町別漁獲量（宮崎市、川南町）

（宮崎農林水産統計年報（農林水産省　九州農政局宮崎地域センター）より作成）

4.6 植　物

4.6.1 植生断面調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 植生の分布特性

(B) 現象

- 植生の分布特性が、既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
植生の分布特性が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 比較対象として一ツ瀬川左岸を含んだ 6 測線（小丸川～一ツ瀬川(St.7)．二ツ立(St.5)，大炊田②(St.4)，石崎川河川区域(St.3)，動物園東①(St.2)，住吉(離岸堤区間)(St.1)）とする。

3) 調査時期

- 秋季(9～10 月)に 1 回/年とする。

4) 調査結果の整理方法

- 断面調査結果から植物相と横断形状(植生前線位置)を整理する。また、整理結果の植生前線位置を既往調査結果と比較する。
- 整理結果の植生前線位置と地形・汀線の関係を確認する。また、整理結果の植物相を既往調査結果と比較する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 2008(H20)年(植生断面調査開始)～2011(H23)年の調査結果から、植生帯幅の最大値及び最小値を整理し、指標範囲として設定する。
- 既往調査結果は侵食又は安定状態の海岸の調査であり、今後侵食対策事業の効果により砂浜が回復した際にどのような変化が起こるか予想することが現時点では難しいため、振れ幅は設定しない。

表－ 4.69　植生断面調査に関する指標範囲

植生帯幅(m)		小丸川～一ツ瀬川	二ツ立	大炊田②	石崎川河川区域	動物園東①	住吉(離岸堤区間)
		L-7	L-5	L-4	L-3	L-2	L-1
半安定帯(陸生型)	最大値	20	8	0	12	10	4
	最小値	10	5	0	4	1	2
半安定帯(海浜型)	最大値	20	10	10	70	0	4
	最小値	15	0	0	50	0	2
不安定帯	最大値	12	15	2	42	10	0
	最小値	7	0	0	34	0	0
合計	最大値	45	30	10	114	20	7
	最小値	37	14	0	97	2	6

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- L-1（住吉(離岸堤区間)）、L-3（石崎川河川区域）、L-7（小丸川～一ツ瀬川）において既往最大値を上回った。
- 2015(H27)に植生の回復が見られた L-2（動物園東）、L-5（二ツ立）においては引き続き植生が前進している。

表－ 4.70　植生断面調査に関する指標範囲との比較結果

指標	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
分布特性	小丸川～住吉(離岸堤区間)	2015(H27)年 10 月	下頁参照

≪参考：2015(H27)年度の植生断面調査結果≫

- L-1（住吉(離岸堤区間)）において既往最大値を上回った。
- L-2（動物園東）、L-5（二ツ立）において植生が回復し、指標範囲内に戻っている。

≪参考：2014(H26)年度の植生断面調査結果≫

- L-2（動物園東）、L-5（二ツ立）は、既往最小値を下回った。
- L-1（住吉(離岸堤区間)）、L-3（石崎川河川区域）、L-4（大炊田②）、L-7（小丸川～一ツ瀬川）は、範囲内であった。

植生帯幅と浜幅の関係

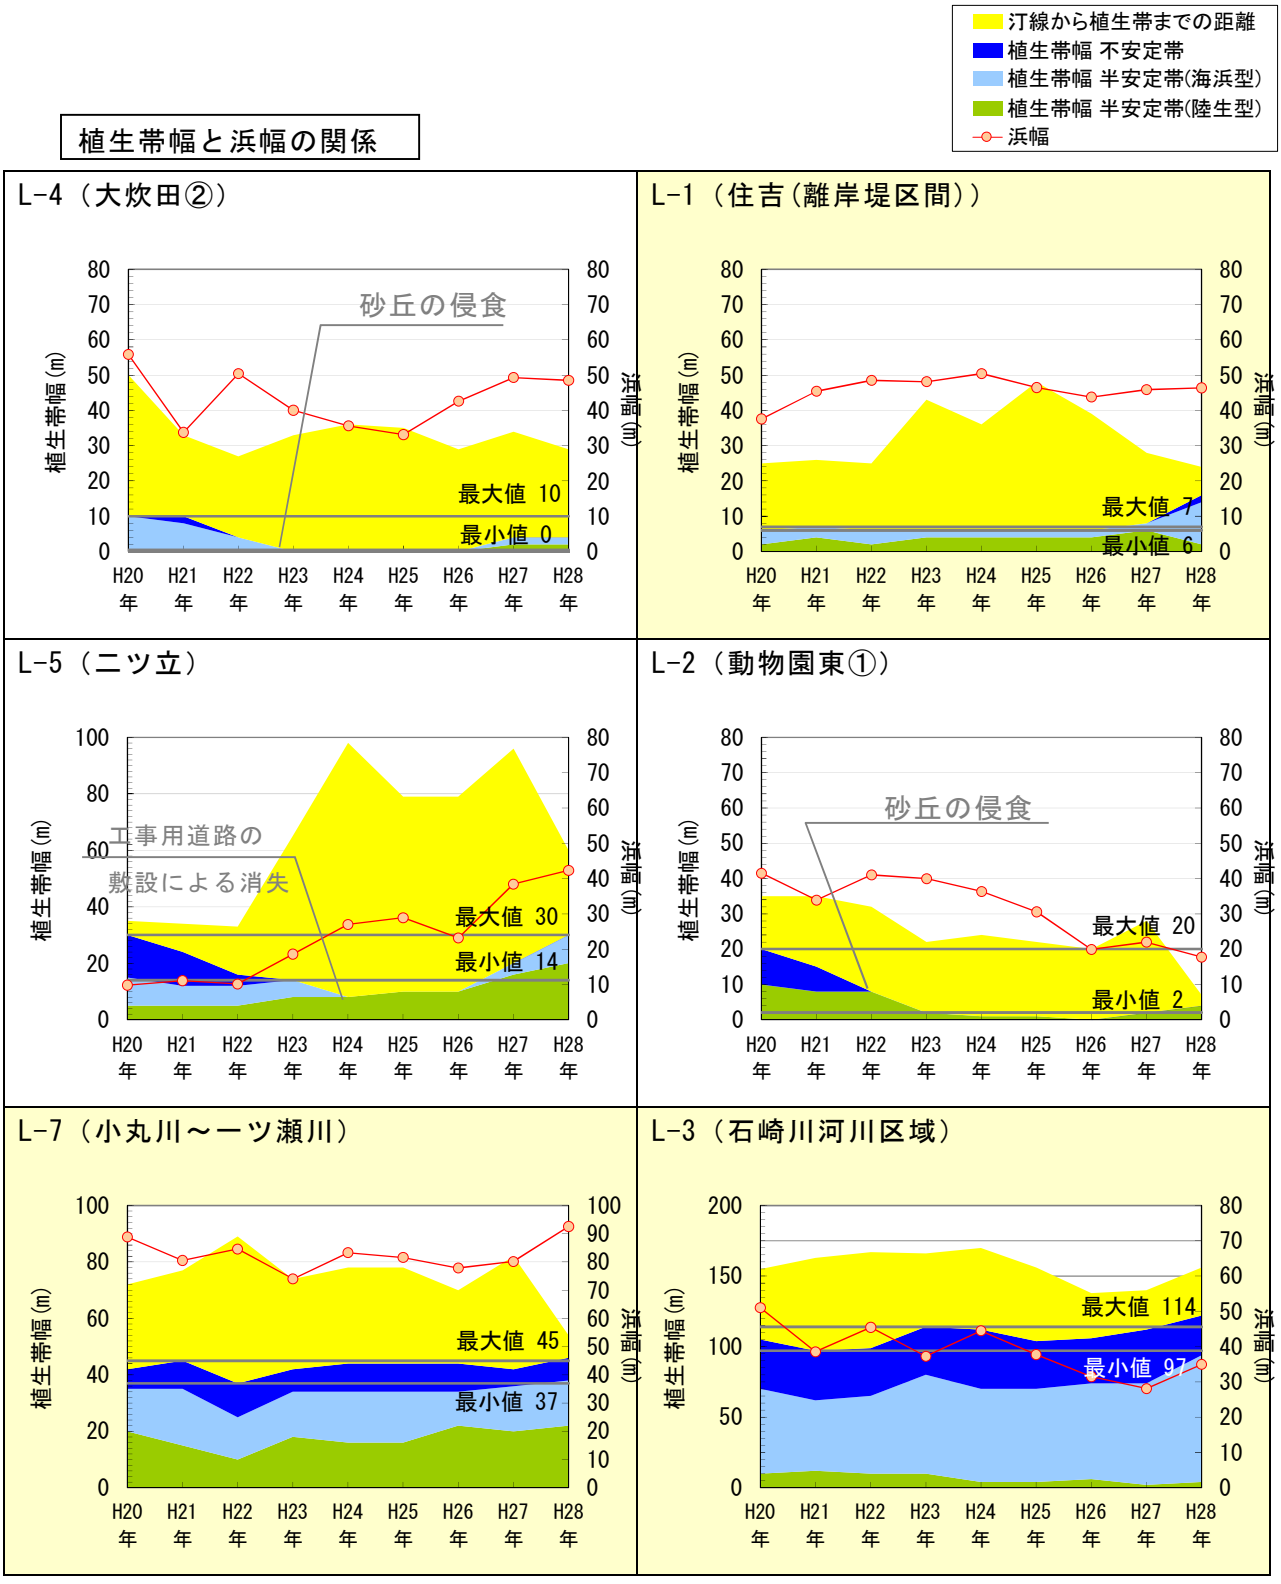

図－ 4.20　植生断面調査結果(植生帯幅と浜幅の関係)

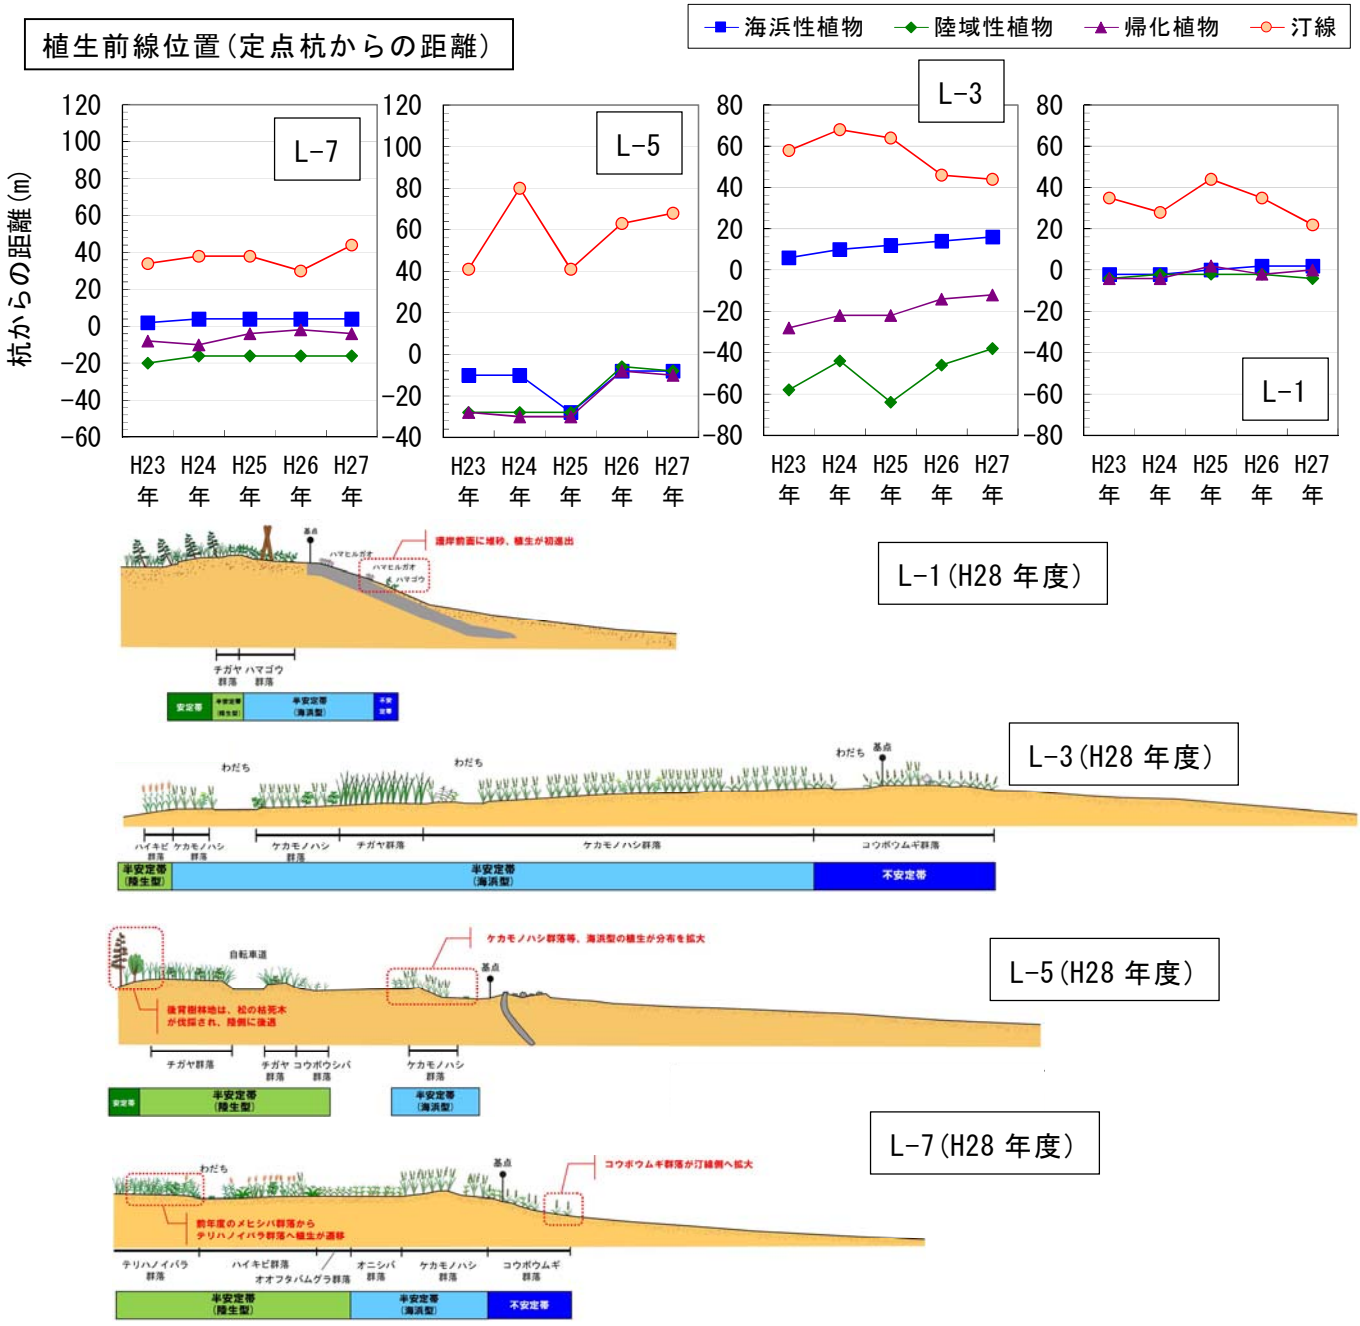

図－ 4.21 （参考）植生前線位置(定点杭からの距離)

図－ 4.22 植生断面調査位置図

4.6.2 植物相調査・植生図作成調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 植生の分布特性

(B) 現象

- 植生の分布特性が既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
植生の分布特性が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 宮崎港サンビーチ北突堤～小丸川左岸までの区間とする。
- なお、侵食対策の効果が顕著に生じると考えられる宮崎港港湾離岸堤区域～一ツ瀬川までの区間については、1km 程度のブロックに区分してブロック毎に分析する。

3) 調査時期

- 秋季(9～10 月)とする。
- 事業の効果・影響の発現が即時性を伴わない項目として、5 年おきに 1 回/年の調査とする。

4) 調査結果の整理方法

- 空中写真をもとに、踏査による目視記録し、調査結果から植物相・植生分布を整理する。
- 整理結果の植生図をもとに、ブロック毎の植生状況を既往調査結果と比較して確認する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 最新の既往成果である、2009(H21)年度の植生図作成調査結果から、海岸侵食対策事業の影響を大きく受けると考えられる砂丘性植物の群落面積をブロック毎に算定する。
- 最新の既往成果である、2009(H21)年度の植生図作成調査結果から、砂丘性植物の種別占有率をブロック毎に算定する。
- 既往調査結果が少ないこと、効果・影響の発現が即時性を伴わない項目として今後の調査頻度を低く設定していることから、最大値、最小値を把握し、比較する。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は調査を実施していない。

≪参考：2014(H26)年度、2015(H27)年度の植生断面調査結果≫

- 2015(H27)年度は調査を実施していない。
- 2014(H26)年度は 2009(H21)と比較して、小丸川～一ツ瀬川、石崎川河川区域、住吉(補助突堤②北側)、住吉(離岸堤区間)で砂丘性植物の群落面積が拡大した。大炊田②、動物園東①、②では、2009(H21)年度には存在した砂丘性植物が消滅していた。

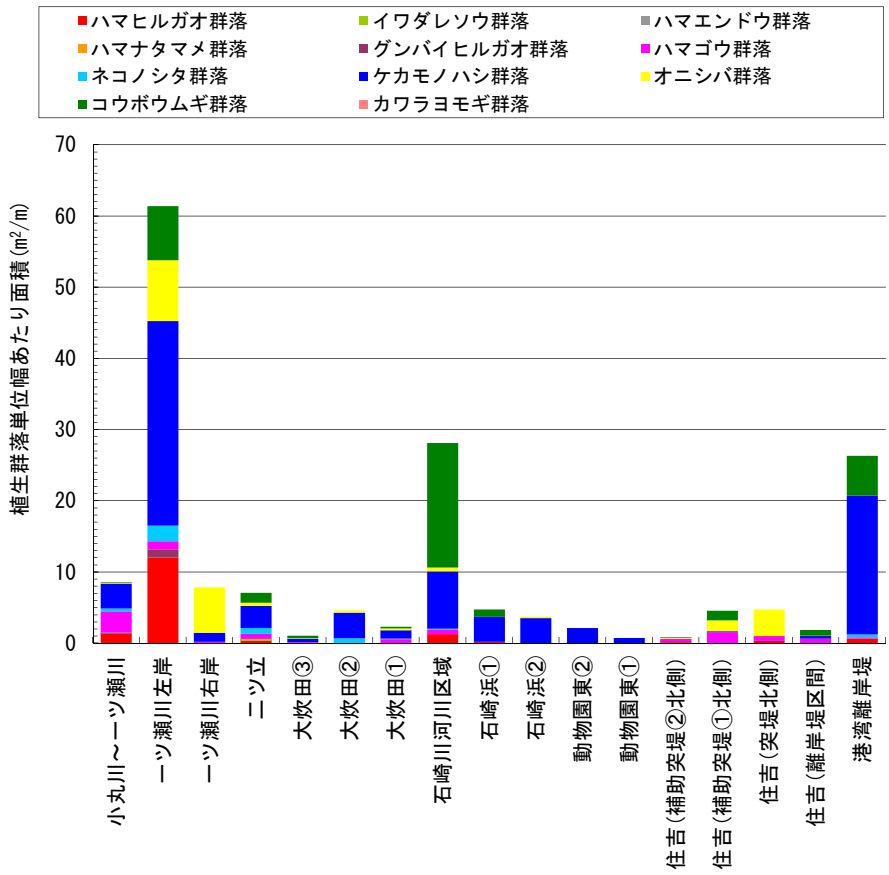

図－ 4.23　砂丘性植物群落面積(2009(H21)年度)

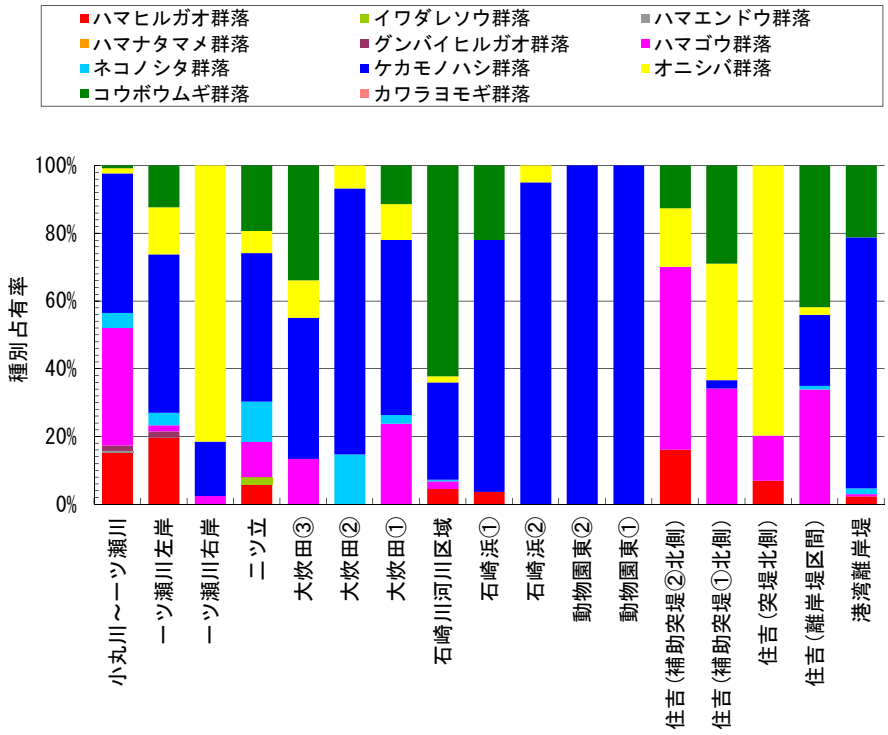

図－ 4.24　砂丘性植物種別占有率(2009(H21)年度)

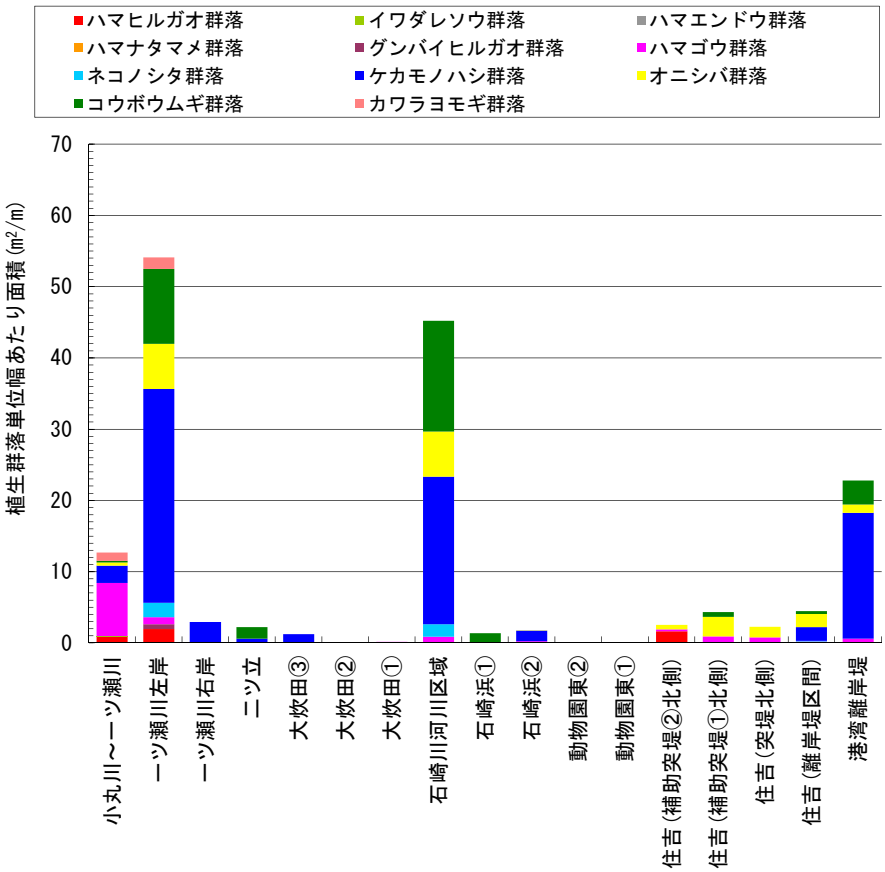

図－ 4.25　砂丘性植物群落面積(2014(H26)年度)

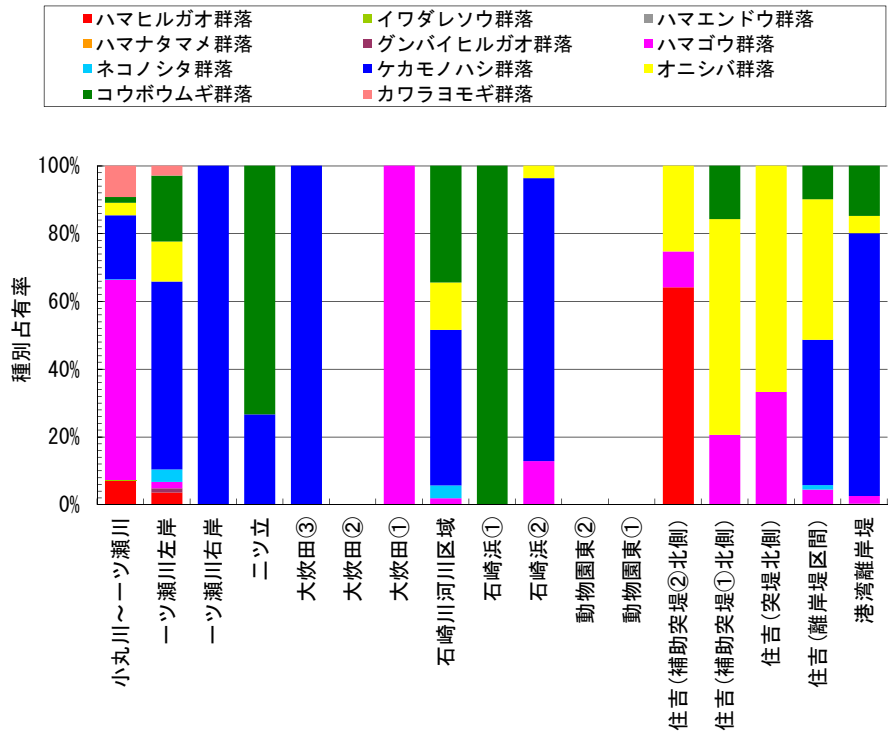

図－ 4.26　砂丘性植物種別占有率(2014(H26)年度)

4.7 昆　虫

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 昆虫の重要種、分布特性

(B) 現象

- 昆虫類重要種が見られなくなっていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
昆虫の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 宮崎港～小丸川(広域 8 地点)とする。

3) 調査時期

- 昆虫の生態を考慮して 2 回/年(幼虫(4 月)、昆虫(7-8 月))とする。
- 事業の効果・影響の発現が即時性を伴わない項目として、5 年おきの調査とする。

4) 調査結果の整理方法

- 任意採集法、ライトトラップ法、ベイトトラップ法による調査を実施し、出現種を整理する。
- 既往調査結果から整理した「宮崎海岸に存在する重要種」が出現していたかどうか確認する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 2008(H20)年度及び 2009(H21)年度調査結果より、下記の選定基準に基づき昆虫類重要種を選定する。

Ⅰ：国・県・市指定の天然記念物・特別天然記念物
国天然：天然記念物、国特天：特別天然記念物、県天然：県天然記念物、
市天然：市天然記念物

Ⅱ：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（1992 年）
国内：国内希少野生動植物種、国際：国際希少野生動植物種、
特定：特定国内希少野生動植物種、危急：危急指定種

Ⅲ：「レッドリスト」　昆虫類（環境省　2007 年）
EX：絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、NT：準絶滅危惧、
DD：情報不足

Ⅳ：「宮崎県版レッドリスト（2007 年改訂版）」（宮崎県　平成 20 年）
EX：絶滅、EW：野生絶滅、CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、VU：絶滅危惧Ⅱ類、
NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、OT：その他保護上重要な種

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は調査非実施である。

≪参考：2014(H26)年度、2015(H27)年度の昆虫調査結果≫

- 2015(H27)年度は指標範囲内であった。

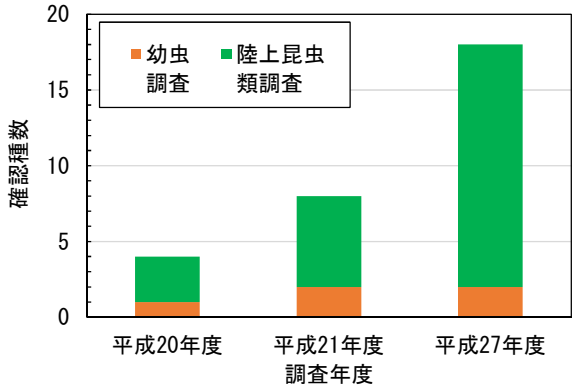

図－ 4.27　重要種確認種数

- 2014(H26)年度は調査非実施である。

4.8 鳥　類

4.8.1 鳥類調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 鳥類の出現状況

(B) 現象

- 鳥類の出現状況が、既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
鳥類の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 宮崎港～小丸川(広域：3 定点を含む)
- 調査範囲を見晴らせる地点(河川河口部等)では一定時間とどまって周囲を観察する定点観察法、定点観察法では確認しづらい林内などは、踏査ルートを設定し任意踏査(ラインセンサス)により実施する。

3) 調査時期

- 鳥類の生態(渡り区分)を考慮し、春季、初夏季、夏季、秋季、冬季の 5 回/年とする。
- 事業の効果･影響の発現が即時性を伴わない項目として､5 年おきの調査とする。

4) 調査結果の整理方法

- 定点観察法及び任意踏査による観察を実施し、調査地点(定点及び踏査ルート)毎に出現種数を整理する。
- 河口部等の地形特性及び背後地の海岸保安林の連続性を考慮して設定した定点及び踏査ルート毎に調査・整理を実施する。
- 整理結果の傾向が既往調査結果と異なっていないか確認する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 既往調査結果より、一年を通じて確認された鳥類の目名別確認種数を調査領域毎に整理する。
- 効果・影響の発現が即時性を伴わない項目として今後の調査頻度を低く設定していることから、予測値や振れ幅は設定せず、出現種数の最大値、最小値を比較対象として使用する。

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は調査非実施である。

≪参考：2014(H26)年度、2015(H27)年度の昆虫調査結果≫

- 2014(H26)~2015(H27)年度は、過去の調査結果と比較して、P-4 富田浜入江および P-2 石崎川河口で出現種数が少なくなった。一方、P-1 一ツ瀬川河口、R-5 富田浜では出現種数が多くなった。

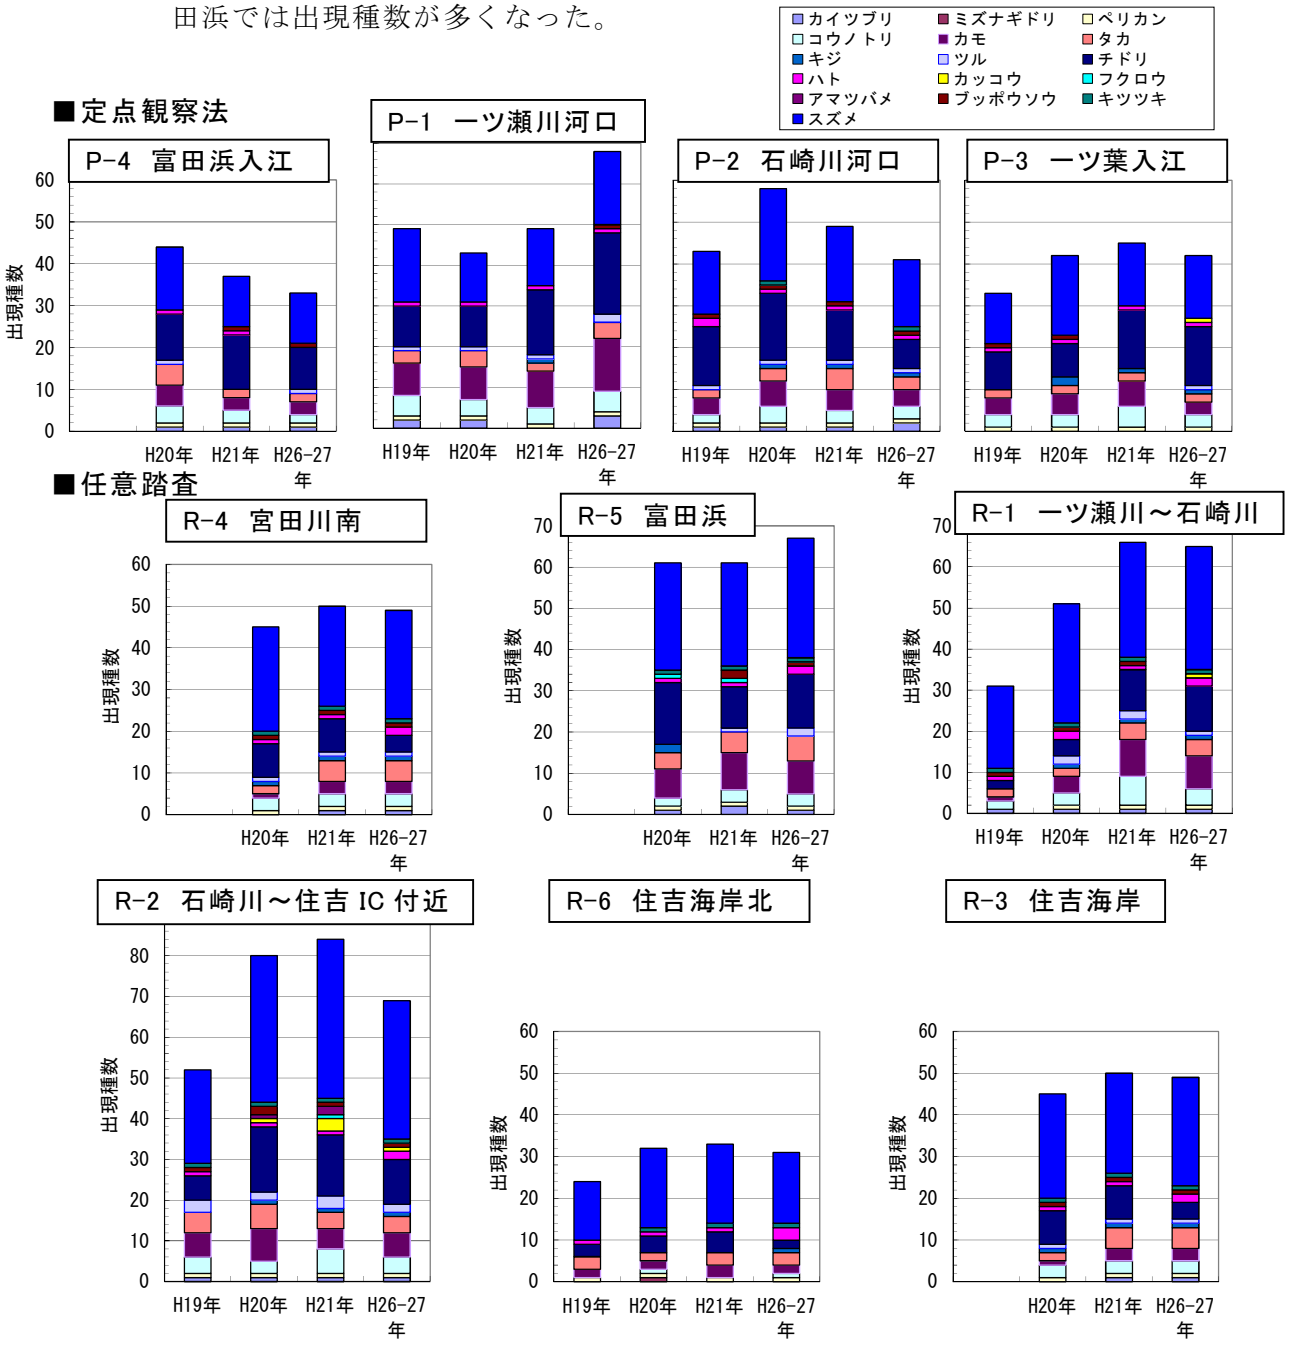

図－ 4.28　鳥類調査結果の経年変化



4.8.2 コアジサシ利用実態調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- コアジサシ繁殖状況

(B) 現象

- 鳥類の中で、宮崎県における重要種であり、下記の通り生息環境が特に侵食対策事業の影響を受けると考えられえるコアジサシの出現状況が、既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
鳥類の出現状況が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 宮崎港～小丸川とする。

3) 調査時期

- コアジサシの繁殖時期である 6～8 月に、各月 2 回の調査を実施する。

4) 調査結果の整理方法

- 定点観察法、任意踏査による観察により、コアジサシの繁殖状況を観察する。
- 結果を営巣・繁殖に大きな影響をおよぼす台風の来襲等を踏まえて整理し、既往調査結果と比較する。
- 近隣の営巣地での繁殖状況に関して情報収集を実施する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは基準値とする。
- 営巣・繁殖の有無を指標とする。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は 5 月、6 月、7 月に現地調査を行い(6 月は環境調査各項目の測線間の移動時に確認)、5 月調査時に一ツ瀬川河口左岸においてコアジサシを確認したが、集団営巣地は確認されなかった。

（参　考）

・コアジサシ（環境省：絶滅危惧Ⅱ類、宮崎県：絶滅危惧ⅠB 類）は、ほぼ毎年宮崎海岸周辺に飛来し、時折、砂礫地に大規模なコロニーを形成する（2010(H22)年以降は一ツ瀬川河口右岸にて繁殖の保護活動が地元有志団体により行われている)。

≪参考：2015(H27)年度のコアジサシ利用実態調査結果(ヒアリング)≫

- 2015(H27)年度は個別現地調査を実施し、海上の飛翔、採餌行動を確認したが、飛来数は少なかった。
- 繁殖・営巣は確認されていない。

≪参考：2014(H26)年度のコアジサシ利用実態調査結果(ヒアリング)≫

- 2014(H26)年は、4 月頃から一ツ葉入江や一ツ瀬川河口、大淀川～タンポリ、みやざき臨海公園でも確認されていた。

表－ 4.71　コアジサシの利用実態の経年変化(2016(H28)年度)

確認地点			一ツ瀬川河口右岸	一ツ瀬川河口左岸（富田浜）	大炊田海岸	石崎川河口	小丸川河口・河川域	備考
H19	現地調査（全体）	営巣・繁殖	－	－	－	－	－	秋季(9月)から現地調査を実施しており、コアジサシの渡来時期を逸しているため確認できず。
		採餌・休憩	－	－	－	－	－	
H20	現地調査（全体）	営巣・繁殖	○	○	－	△	－	上記３ヶ所で営巣・繁殖を確認。 石崎川河口は、営巣地への海岸利用者（釣り、サーフィン、散歩等）の立ち入りなど、人為的な圧力により営巣地を放棄したと推察される。
		採餌・休憩	○	○	－	○	－	
H21	現地調査（全体）	営巣・繁殖	×	×	－	×	－	上記３ヶ所で求愛行動等は確認されたが、営巣・繁殖は確認できず。 営巣地への海岸利用者（釣り、サーフィン、散歩等）の立ち入り、四輪駆動車の走行など、人為的な圧力により営巣地を放棄したと推察される。
		採餌・休憩	○	○	－	○	－	
H22	現地調査（個別）	営巣・繁殖	○	○	－	×	×	一ツ瀬川河口（左岸・右岸）、小丸川で営巣・繁殖を確認した。 一ツ瀬川河口では、1回目は繁殖に失敗したが、2回目に繁殖成功。
		採餌・休憩	○	○	－	○	○	
H23	現地調査（個別）	営巣・繁殖	△	△	－	×	×	一ツ瀬川河口（左岸・右岸）で求愛行動、営巣を確認した。 7月中旬の台風に伴う高波浪により営巣地が水没したため、繁殖に失敗。
		採餌・休憩	○	○	－	○	○	
H24	ヒアリング	営巣・繁殖	△	△	－	－	－	一ツ瀬川河口（左岸・右岸）で求愛行動、営巣を確認した。 6月中旬の台風に伴う高波浪により営巣地が水没したため、繁殖に失敗。
		採餌・休憩	○	○	－	－	－	
H25	ヒアリング	営巣・繁殖	△	△	○	－	△	5月頃から一ツ葉入江や一ツ瀬川河口、小丸川、大淀川、宮崎港周辺でも確認されていたが、いずれも飛来数は少なく、繁殖まで至ったのは一ツ葉入江や大炊田海岸（既設工事区域内）のわずかな個体のみであった。
		採餌・休憩	○	○	○	－	○	
H26	ヒアリング	営巣・繁殖	－	○	×	－	－	H25年に引き続き飛来数は少なかった。 宮崎県内では、このほか日向市の小倉ヶ浜海岸等でコロニーが見られた。
		採餌・休憩	○	○	×	－	－	
H27	現地調査（個別）ヒアリング	営巣・繁殖	－	×	×	×	－	海上の飛翔、採餌行動を確認したが、飛来数は少なかった。繁殖・営巣は確認されていない。
		採餌・休憩	○	○	×	○	－	
H28	現地調査	営巣・繁殖	×	×	×	×	×	5月に、一ツ瀬川河口左岸沖で約50羽が海上を飛翔し、採餌行動を確認した。繁殖・営巣は確認されていない。
		採餌・休憩	×	○	×	×	×	

○：確認（繁殖成功）
△：確認（繁殖失敗）
×：確認なし
－：調査未実施

表－ 4.72　コアジサシの飛来、営巣、巣立ちの全国集計

・環境省がこれまで実施してきたコアジサシの調査結果に基づき、1995 年以降の飛来数、営巣数と立ち雛数を積算した結果を下図に示す。
・年ごとの調査箇所数も異なり、把握されていない飛来地や調査地であっても飛来数が把握できていない場合もあるため、この数字の経年変化が実際の個体数変動を表しているわけではないが、過去の変動を見ても、不安定さが読みとれる。また、大きな営巣地の一つにおいて、巣立ち雛数が把握できなかったため、巣立ち率はグラフの値より若干上がるものと思われる
・平成 23 年度は、台風による大きな影響があったことも示唆されている。

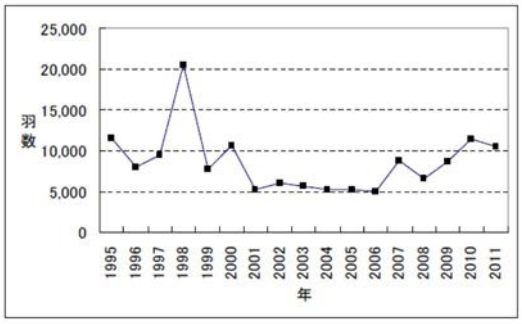

図 9．コアジサシ飛来数の経年変化

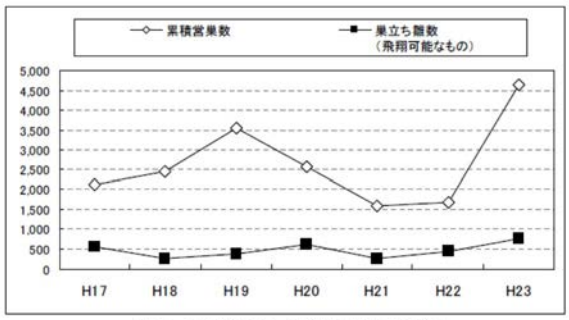

図 10．累積営巣数と巣立ち雛数の経年変化

出典：コアジサシ保全方策検討調査委託業務報告書，環境省自然保護局

※ 定点調査は、平成 23 年度で終了

4.9 アカウミガメ

4.9.1 アカウミガメ上陸実態調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- アカウミガメの上陸・産卵頭数

(B) 現象

- アカウミガメの上陸･産卵頭数が､既往の調査結果と異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
アカウミガメの上陸・産卵頭数が、既往の調査結果と異なる。

2) 調査位置

- 宮崎港～一ツ瀬川の砂浜が存在する範囲とする。
- なお、2012(H24)年度に調査範囲を拡大している。

3) 調査時期

- アカウミガメの産卵ピーク時期である 7 月に、15 日/年とする。
- 2014(H26)年度からは、調査期間を延長しているが、ここでは 7 月の 15 日/年のデータを抽出して整理している。

4) 調査結果の整理方法

- アカウミガメの上陸・産卵痕跡の確認・記録を実施する。
- 上陸・産卵頭数を背後地の構造物状況により分割した区間毎に整理し、既往調査結果と比較する。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 2008(H20)年～2011(H23)年のアカウミガメ調査結果から、区間毎に上陸頭数及び産卵頭数の最小値を算定し、指標範囲として設定する。なお、データの蓄積が少ないことから振れ幅は設定しない。
- アカウミガメは１つの個体が複数回産卵するため、個体数ではなく頭数で整理する。
- 2002(H14)年～2011(H23)年の調査は、年度により調査日数が異なるため、参考として日平均値に換算して整理する。

表－ 4.73　アカウミガメ上陸実態調査に関する指標範囲及び振れ幅

区間	⑧	⑨	⑩	⑪	①-1	①-2	②	③	④	⑤	⑥-1	⑥-2	⑦
地域名	一ツ瀬川河口右岸	二ツ立海岸	大炊田海岸	石崎川河口	石崎浜	石崎浜養浜	石崎浜荘	石崎浜南	動物園東	動物園南	住吉海岸1	住吉海岸2	宮崎港
背後条件	砂浜+導流堤	傾斜護岸	砂浜	砂浜+傾斜護岸	砂浜	砂浜	緩傾斜護岸	傾斜護岸	砂浜	直立壁	緩傾斜護岸	緩傾斜護岸+離岸堤	砂浜+離岸堤
最小産卵頭数					3	3	0	3	9	0	0	2	6
最小上陸頭数					4	6	6	15	14	3	0	2	6

2008(H20)年～2011(H23)年

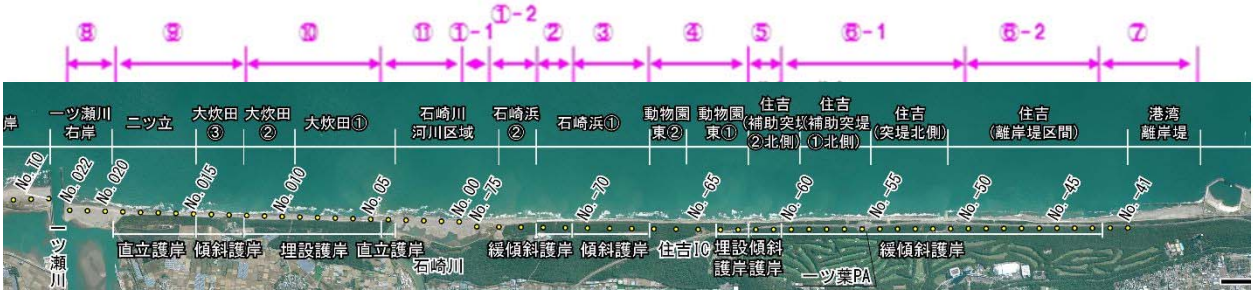

表－ 4.74　広域日平均値(時系列及び最小値)(参考)

実施主体	年度	日平均		
		上陸数	産卵数	非産卵数
宮崎県	H14	2.1	1.4	0.8
	H15	4.3	1.5	2.8
	H16	4.5	2.0	2.6
	H17	3.5	1.4	2.1
	H18	2.2	0.8	1.4
	H19	2.2	0.7	1.5
国交省	H20	7.1	3.9	3.3
	H21	3.3	1.5	1.8
	H22	5.2	3.9	1.3
	H23	10.6	3.5	7.1
最小頭数		2.1	0.7	

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 石崎浜②および動物園東①②、港湾離岸堤で、上陸・産卵頭数が既往最小値を下回った。
- 既往調査では上陸および産卵が見られていた石崎浜①、住吉(補助突堤②北側)で、平成 28 年度は上陸・産卵が見られなかった。

≪参考：2015(H27)年度のアカウミガメ調査結果≫

- 全区間において、上陸・産卵頭数が既往最小値を下回った(既往最小値が 0 の地点では、0 であった)。

≪参考：2014(H26)年度のアカウミガメ調査結果≫

- 石崎浜①で、上陸・産卵頭数が既往最小値を下回った。
- 動物園東①②では、上陸頭数は既往最大値を上回ったものの、産卵頭数が既往最小値を下回った。
- 住吉（補助突堤②北側）では、上陸頭数が既往最大値を上回った。ただし、産卵は見られなかった。
- 宮崎県管理区間(離岸堤背後)では、既往最大値を上回った平成 25 年度から上陸頭数は減少したものの、産卵頭数が既往最大値を上回った。
- 調査開始以降初めて、石崎浜①でアカウミガメの産卵が見られなかった。

表－ 4.75　アカウミガメ上陸実態調査に関する指標範囲との比較結果

指標	調査位置	調査実施状況	調査結果と指標範囲の比較結果
上陸・産卵頭数	宮崎港～一ツ瀬川	2015(H27)年 7 月	下図参照

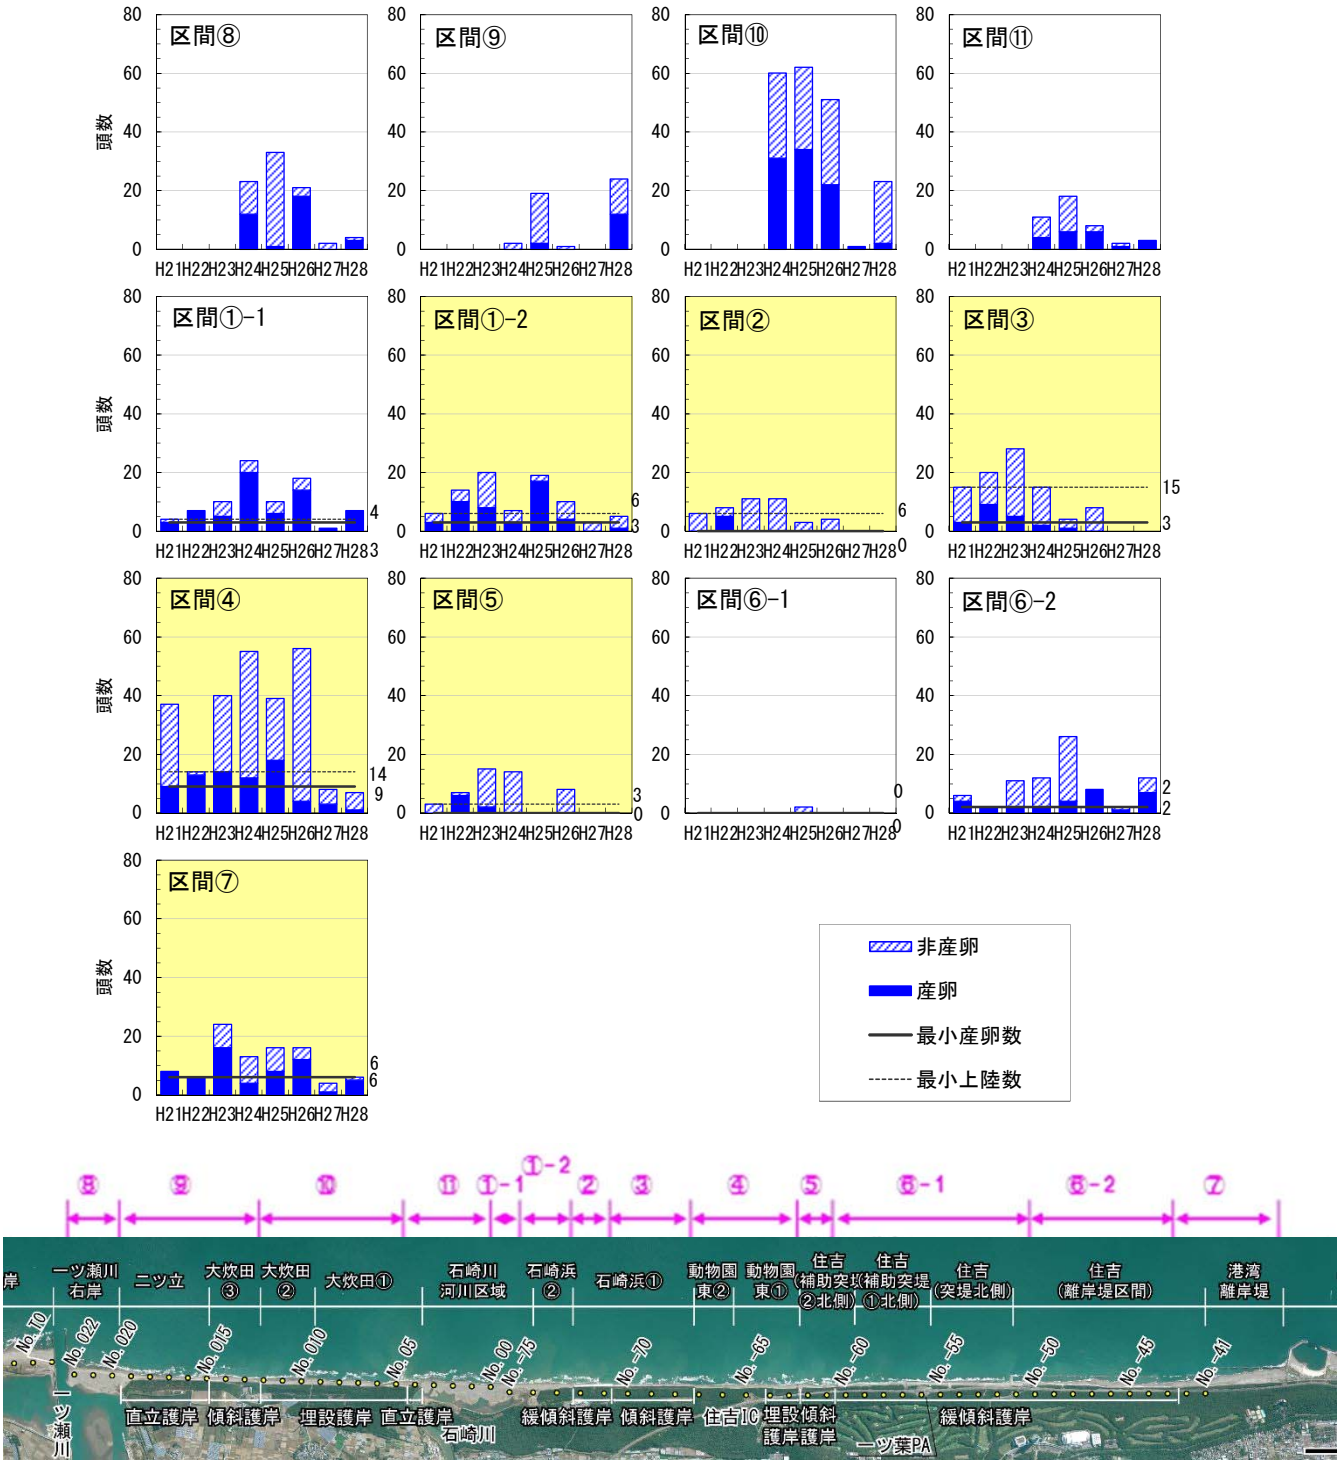

図－ 4.29(1)　アカウミガメ上陸実態調査結果の経年変化
（15 日間の調査結果、区間毎）

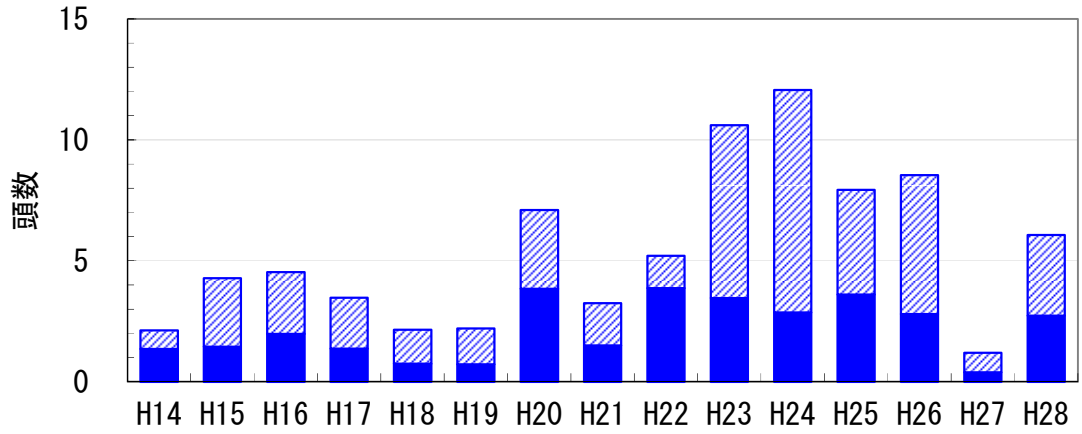

図－ 4.29(2)　アカウミガメ上陸実態調査結果の経年変化（日平均値、区間①～⑦合計）

アカウミガメの産卵回数は 1993 年から 2007 年までは 5,000 回未満であった。(図 3)。2008 年から増加しはじめ、2013 年に上陸 26,139 回・産卵 15,078 回でピークとなった。その後、2014 年と 2015 年は 2 年連続で急に減少し、わずか 3 年でピーク時の 32%(4,901 回)に落ち込んだ。2016 年は 3 年ぶりに増加に転じ、産卵回数は 2015 年よりも 26%増加し 6,254 回となった。2008 年からの増加は、日本アカウミガメの成熟年齢が約 40 年であること、日本のウミガメ保護の機運が 1970 年代より高まったことから、各地域におけるウミガメ保護活動の成果と考えられる。一方で、近年の現象は、その急激な落ち込みから産卵地の悪化というより、母ガメに原因があると推察される。

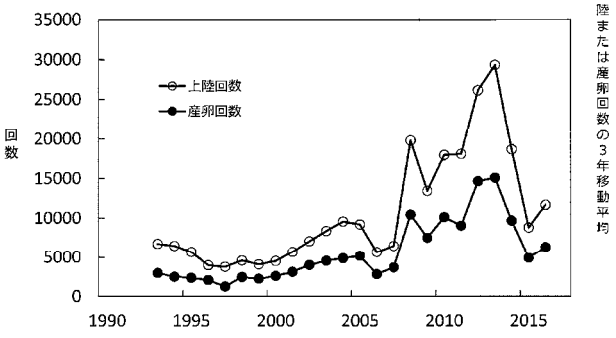

図 3. 日本におけるアカウミガメの上陸・産卵回数の年変化

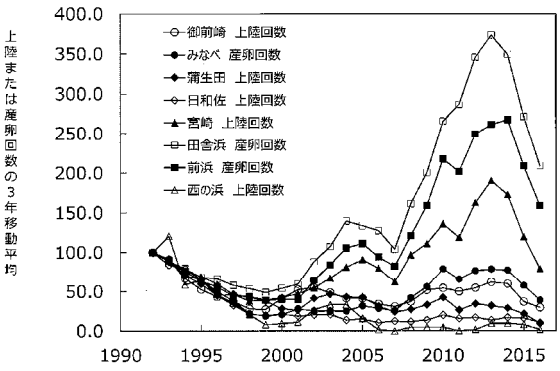

図 4. 日本における主要な産卵地の上陸もしくは産卵回数の 3 年移動平均の相対変化。1990 ～ 1992 年の平均を 100 とした。

出典：日本ウミガメ誌 2016（第 27 回日本ウミガメ会議 in 室戸），
NPO 法人日本ウミガメ協議会、2016 年 12 月 9 日

図－ 4.30　上陸・産卵の経年変化(全国の事例)

4.9.2　固結調査

1)　調査結果で確認する指標と現象

(A)　指標

- 砂浜の固結状況

(B)　現象

- アカウミガメの産卵頭数に大きく影響を与える砂浜の固結状況が指標範囲を超えていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
アカウミガメの上陸・産卵頭数が、既往の調査結果と異なる。

2)　調査位置

- 宮崎港～一ツ瀬川とする。
- 養浜実施箇所及び土砂移動が抑制されると考えられる突堤基部において実施する。

3)　調査時期

- アカウミガメの上陸・産卵期間である 7 月とする。
- 養浜実施箇所は当該年度の養浜後にも実施し、固結度合いの変化も確認する。

4)　調査結果の整理方法

- 養浜施工個所及び突堤周辺において、可搬型測定器を用いた貫入調査を実施し貫入量(cm)を測定する。
- 貫入量を、既往調査結果から得られた産卵可能な軟度の基準と比較し、範囲内に収まっているか確認する。
- 指標は、アカウミガメの生態によるものであり、対策による沿岸方向の違いはないと考え、宮崎海岸全体で一つの値を設定する。
- 2014(H26)年度より、特定非営利活動法人　宮崎野生動物研究会が考案した簡易な手法での測定に変更している。従来の手法による試験結果と、簡易手法の試験結果の間には、下記のような関係が見られるため、これを用いて試験値を換算する。

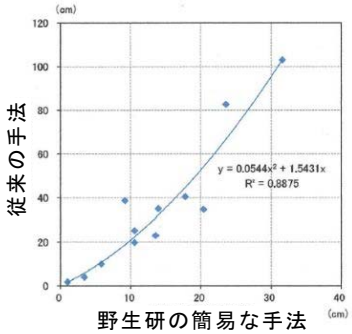

図－ 4.31　従来の手法と野生研手法との測定値の関係

出典　平成 26 年度宮崎海岸等アカウミガメ上陸産卵現地調査

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 2010(H22)年度養浜前の調査結果より、産卵可能な貫入量として図－ 4.32 を指標範囲とする

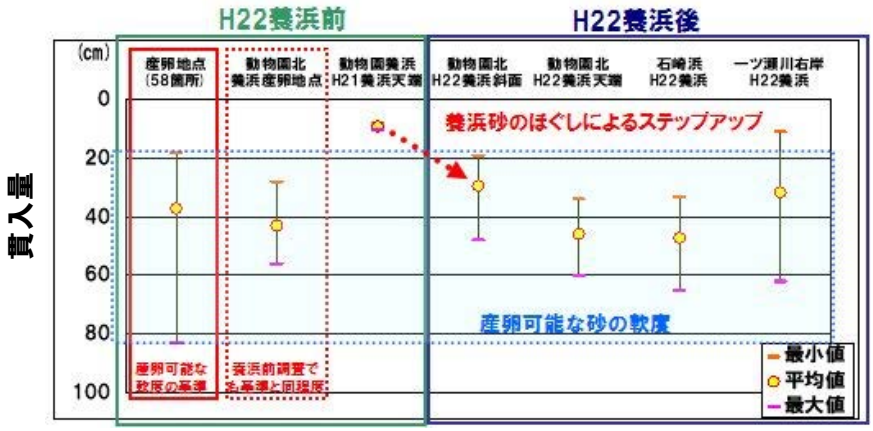

図－ 4.32　固結調査に関する指標範囲

6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 大炊田海岸(埋設護岸設置箇所)および動物園東(養浜実施箇所)の最小貫入量は、指標範囲を下回っている（硬い）箇所があった。

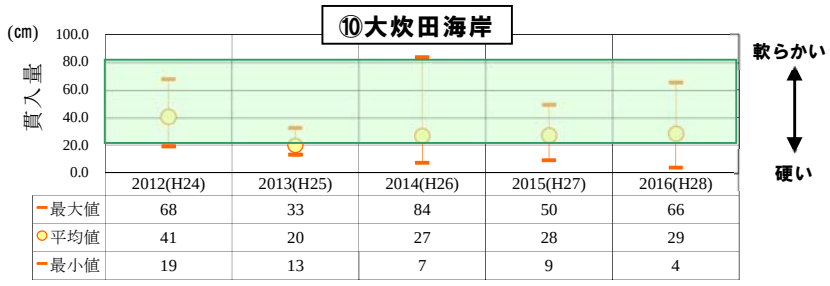

	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)
最大値	68	33	84	50	66
平均値	41	20	27	28	29
最小値	19	13	7	9	4



	2010(H22)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)	2016(H28)
最大値	83	80	85	52	46	80	74
平均値	37	45	39	29	30	34	30
最小値	18	15	17	14	9	9	4

図－ 4.33　固結調査に関する指標範囲との比較結果

2014(H26)、2015(H27)年ともに、産卵箇所の最小貫入量は、指標範囲を下回っている（硬い）箇所があった。

4.10　利用

4.10.1　漁船による操船調査

1)　調査結果で確認する指標と現象

(A)　指標

- 操船への影響

(B)　現象

- 漁船の操業への影響が看過できない規模になっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
操船への影響が看過できない。

2)　調査位置

- 突堤周辺とする。

3)　調査時期

- 突堤の延伸を検討する際に、漁業者との協議に基づき実施を判断する。

4)　調査結果の整理方法

- 漁業者の協力を得て、突堤周辺で操船調査を実施する。
- 現況と突堤延伸予定地点を迂回した場合に複数の漁業者による操船を実施し、影響についてヒアリングする。

5) 指標範囲の検討

- 今後の課題とし、実施に向けて検討する。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は、調査非実施である。
- なお、2015(H27)年度、2014(H26)年度も調査非実施である。

4.10.2 海岸巡視

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 利用状況、市民意見

(B) 現象

- 事業実施に伴い、利用状況に変化が生じていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
海浜利用者の快適性に問題が生じる。
海浜利用者の安全性に問題が生じる。

2) 調査位置

- 一ツ瀬川～住吉海岸離岸堤とする。
- 突堤、埋設護岸の施工個所等に着目する。

3) 調査時期

- 通年(月 2 回以上)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 海岸巡視の際、利用状況を観察し、事業実施に伴う状況変化を把握する。
- 海岸巡視は宮崎海岸出張所が実施していたが、2015(H27)年度より業務として委託しており、初年度は観察内容が既往調査と一部異なっている。
- 状況変化が認められた際には、適宜、利用の快適性、安全性について、聞き取り調査を実施し、結果を整理する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小評価とする。
- 巡視結果を、1km 程度に区分したブロック毎に整理する。



6)　調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は、2016(H28)年 4 月 14 日から 2017(H29)年 3 月 27 日の間に計 51 回、巡視により目視点検を実施している。
- 利用者は、動物園東①、石崎浜①・②で多く見られた。
- 利用の種類で見ると、釣りの利用が最も多く、サーフィン、散歩の順であった。
- 場所と利用の関係を見ると、釣りや散歩は石崎浜周辺以北で多く、サーフィンは動物園東①以南で多く見られた。

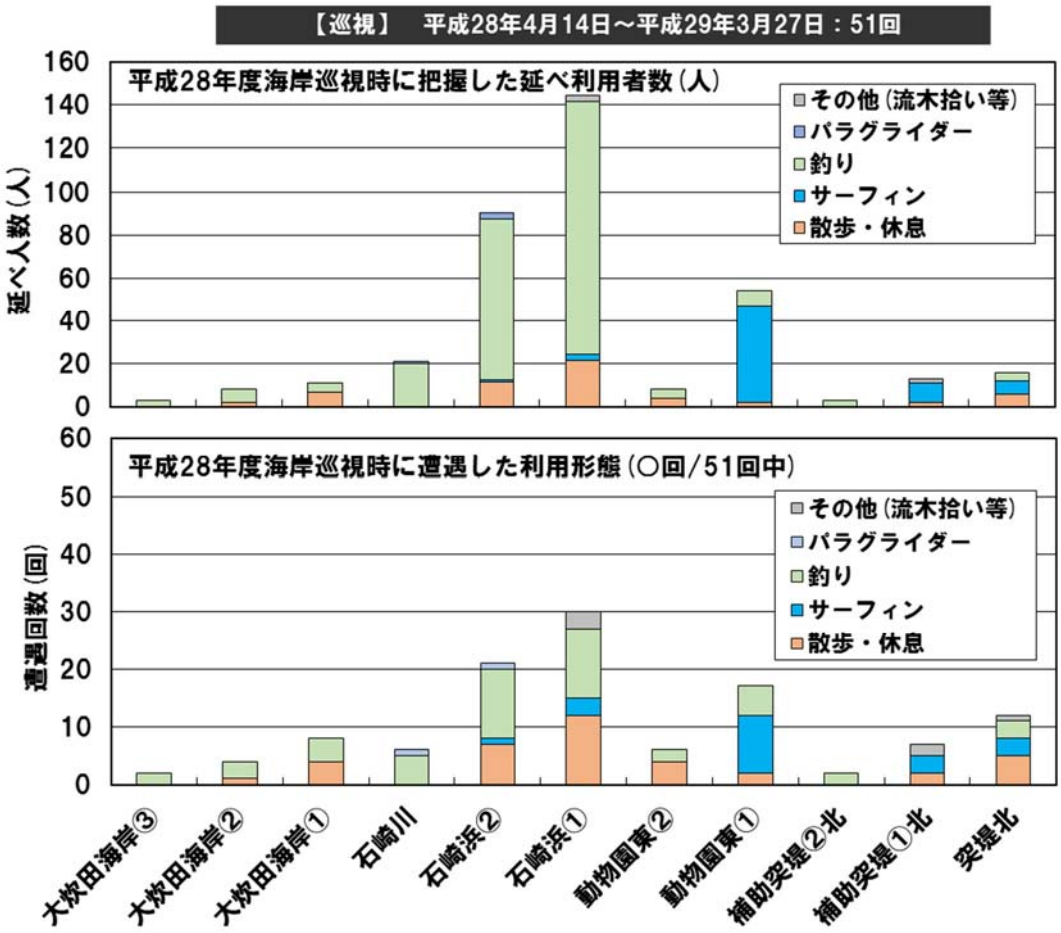

図－ 4.34　海岸巡視による利用調査結果(2016(H28)年度)

表－ 4.76　海岸巡視による利用調査結果(2016(H28)年度)

巡視回	2016 (H28) 年度	大炊田海岸③	大炊田海岸②	大炊田海岸①	石崎川	石崎浜②	石崎浜①	動物園東②	動物園東①	補助突堤②北	補助突堤①北	突堤北
1	4月14日											
2	4月20日											
3	4月28日											
4	5月6日											
5	5月12日											
6	5月18日											
7	5月24日											
8	5月31日											
9	6月8日											
10	6月14日											
11	6月22日											
12	6月28日											
13	7月5日											
14	7月12日					釣り 2						ｻｰﾌｨﾝ 2
15	7月19日					釣り 1	ｻｰﾌｨﾝ 1				ｻｰﾌｨﾝ 2	
16	7月26日					釣り 1			ｻｰﾌｨﾝ 1			
17	8月2日								ｻｰﾌｨﾝ 4		ｻｰﾌｨﾝ 5	
18	8月9日				ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰ 1		その他 1					
19	8月16日											
20	8月24日											
21	8月30日											釣り 1
22	9月5日		休息 2				散歩 1					散歩 1
23	9月13日					ｻｰﾌｨﾝ 1	その他 1		ｻｰﾌｨﾝ 6		ｻｰﾌｨﾝ 2	ｻｰﾌｨﾝ 1
24	9月21日					ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰ 3						
25	9月27日											散歩 1
26	10月6日										散歩 1	
27	10月12日											
28	10月18日					散歩 1						散歩 1
29	10月25日					散歩 2						その他 1
30	11月1日											
31	11月8日											散歩 1
32	11月15日						散歩 1		ｻｰﾌｨﾝ 5			
33	11月22日			休息 1	釣り 1	釣り 1	その他 1			釣り 1		
34	11月29日		釣り 1	散歩 1	釣り 4		ｻｰﾌｨﾝ 1					
							釣り 2					
35	12月6日				釣り 10				ｻｰﾌｨﾝ 1			釣り 1
36	12月14日						散歩 1		ｻｰﾌｨﾝ 9	釣り 2		
							釣り 3					
37	12月20日			釣り 1	釣り 30							
38	12月27日						散歩 4	釣り 3	ｻｰﾌｨﾝ 16			
							釣り 2		釣り 3			
39	1月5日						釣り 25				その他 1	
40	1月11日		釣り 3	釣り 1		釣り 23			釣り 1			
						散歩 3						
41	1月17日			釣り 1		釣り 31			釣り 1			釣り 2
						散歩 4						
42	1月24日			釣り 1		釣り 25			散歩 1			
				散歩 3		散歩 3						
43	1月31日					釣り 14			ｻｰﾌｨﾝ 1			散歩 1
						散歩 6			釣り 1			
									散歩 1			
44	2月7日	釣り 2	釣り 2			釣り 18		散歩 1				
						散歩 1						
45	2月14日	釣り 1					釣り 16	釣り 1	釣り 1		その他 1	
								散歩 1	ｻｰﾌｨﾝ 1			
46	2月21日						散歩 3					
							ｻｰﾌｨﾝ 1					
47	2月28日				釣り 2			散歩 1	ｻｰﾌｨﾝ 1			
48	3月7日					釣り 1						ｻｰﾌｨﾝ 3
49	3月14日						散歩 2				散歩 1	
50	3月21日											
51	3月27日			散歩 2			散歩 1	散歩 1				

ﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰ
ｻｰﾌｨﾝ
釣り
散歩
休息
その他(流木拾い等)

≪参　考　2015(H27)年度の結果≫

- 2015(H27)年度は、2015(H27)年 4 月 1 日から 2016(H28)年 3 月 29 日の間に計 52 回、巡視により目視点検を実施している。
- 2015(H27)年度は、観察内容の変更により、散歩・休息・ランニングの利用者をカウントしていないため参考値として取り扱う必要がある。
- 利用者は突堤北、動物園東①で比較的多い。

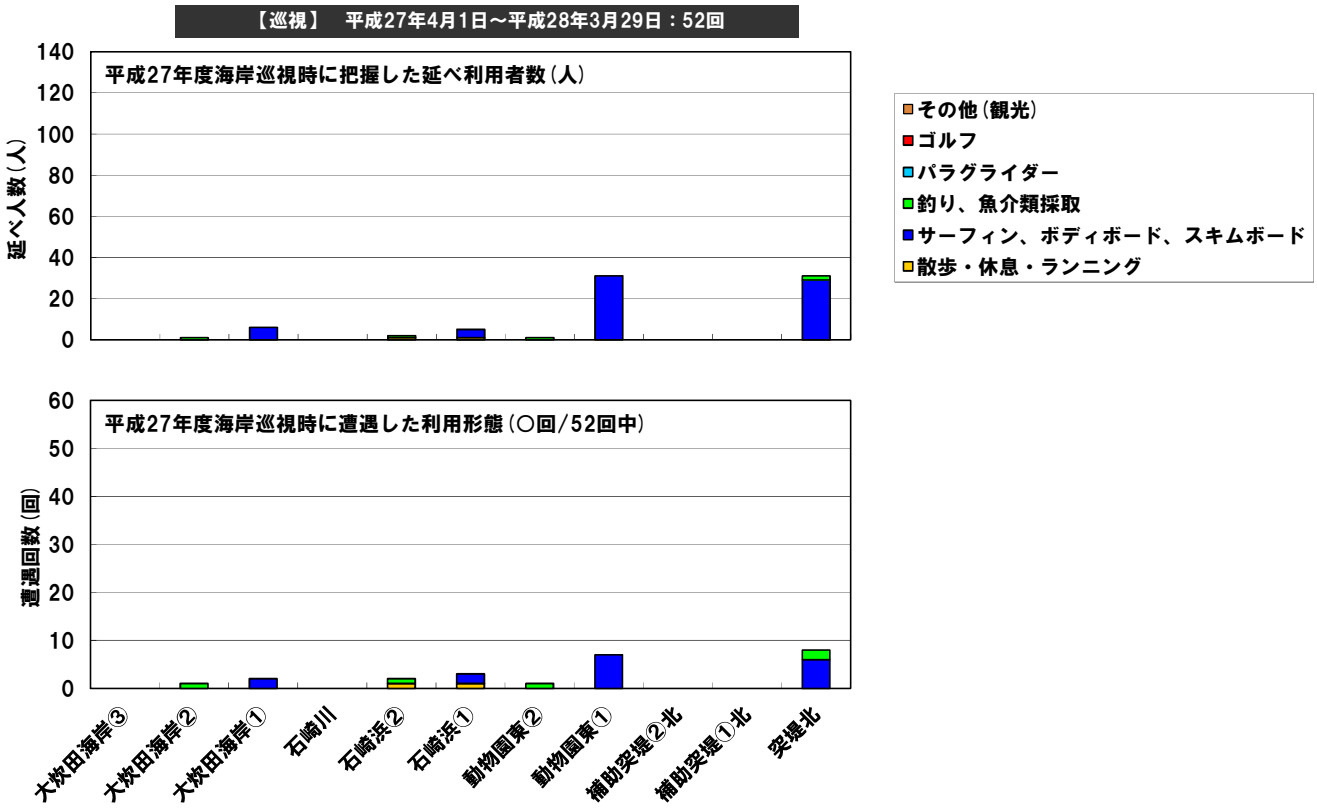

図－ 4.35　海岸巡視による利用調査結果(2015(H27)年度)

≪参　考　2014(H26)年度の結果≫

- 2014(H26)年度は、2014(H26)年 4 月 22 日から 2015(H27)年 3 月 25 日の間に計 36 回、宮崎海岸出張所職員の巡視により目視点検を実施している。
- 利用者は突堤北、動物園東①、石崎浜①で多い。
- 2013(H25)年度に引き続き、埋設護岸の工事が実施されて海岸への立ち入りが制限された大炊田海岸①で利用者数が減少している。
- 突堤北を除く全域で、10 月以降の利用頻度が低い。

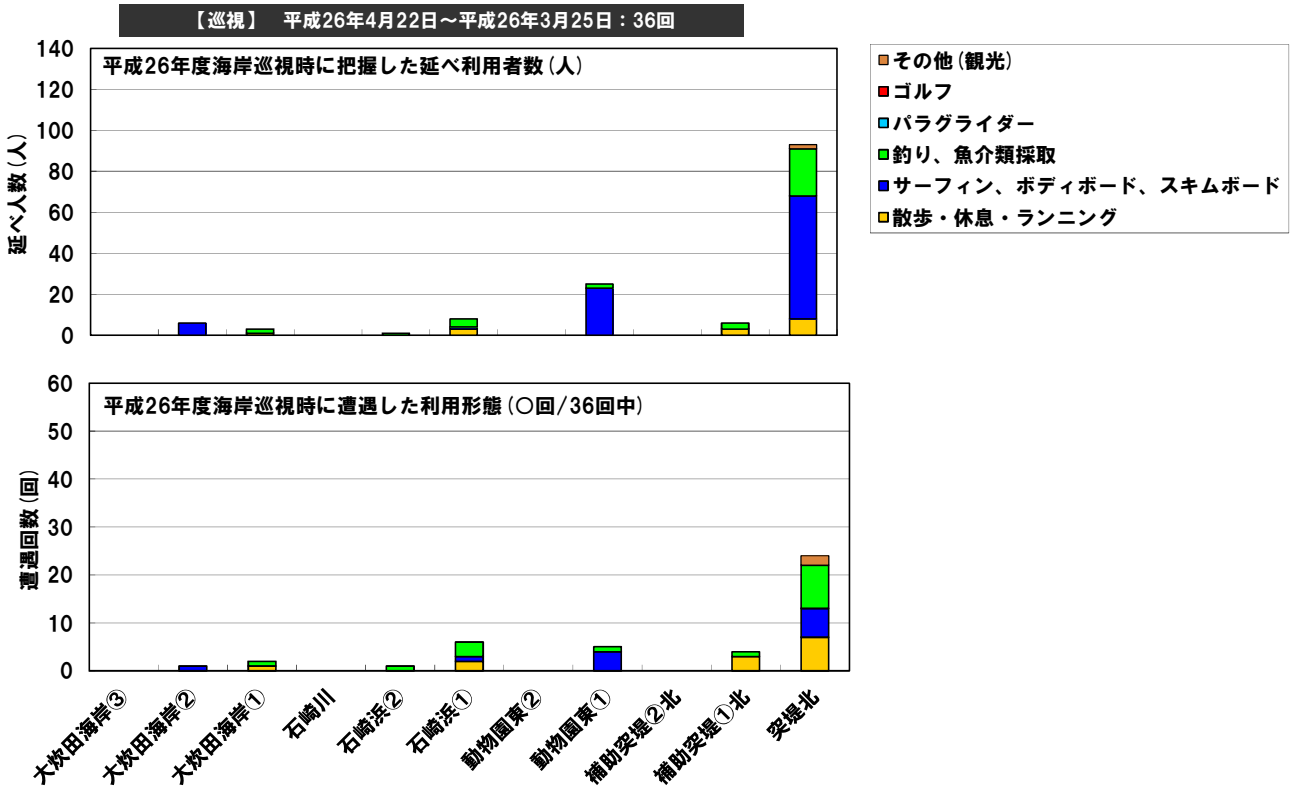

図－ 4.36　海岸巡視による利用調査結果(2014(H26)年度)

4.10.3 利用調査

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 市民意見、利用状況

(B) 現象

- 海浜利用の傾向が既往の調査結果と比較して異なっていないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
海浜利用者の快適性に問題が生じる。
海浜利用者の安全性に問題が生じる。

2) 調査位置

- 宮崎港～一ツ瀬川とする。
- 特に養浜、突堤、埋設護岸の施工個所に着目する。

3) 調査時期

- 海岸巡視等において、事業実施に伴う利用状況変化が認められた場合、実施する。
- 季節変化を考慮して 6 回以上/年とする。

4) 調査結果の整理方法

- 分布・聞き取り調査を実施し、利用形態ごとの利用者数(1 日の延べ人数)を整理して、事業実施前の利用形態と比較する。
- 利用形態の整理は、事業実施前の調査に倣い背後地状況や砂浜の連続性を考慮したエリアごとに調査・整理を実施する。
- 海岸利用の快適性について聞き取り調査を実施し、結果を整理する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは最大・最小とする。
- 既往成果である、2010(H22)～2011(H23)年度の利用分布調査結果を背後地状況や砂浜の連続性を考慮したエリアごとに整理する。
- 既往調査結果が 1 年分しかないこと及び調査の必要性が判断されてはじめて実施する調査であることから、予測値や振れ幅は設定せず、最大値、最小値を把握し、比較する。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は、調査非実施である。
- なお、2015(H27)年度、2014(H26)年度も調査非実施である。

≪参　考　2010(H22)～2011(H23)年度の結果≫

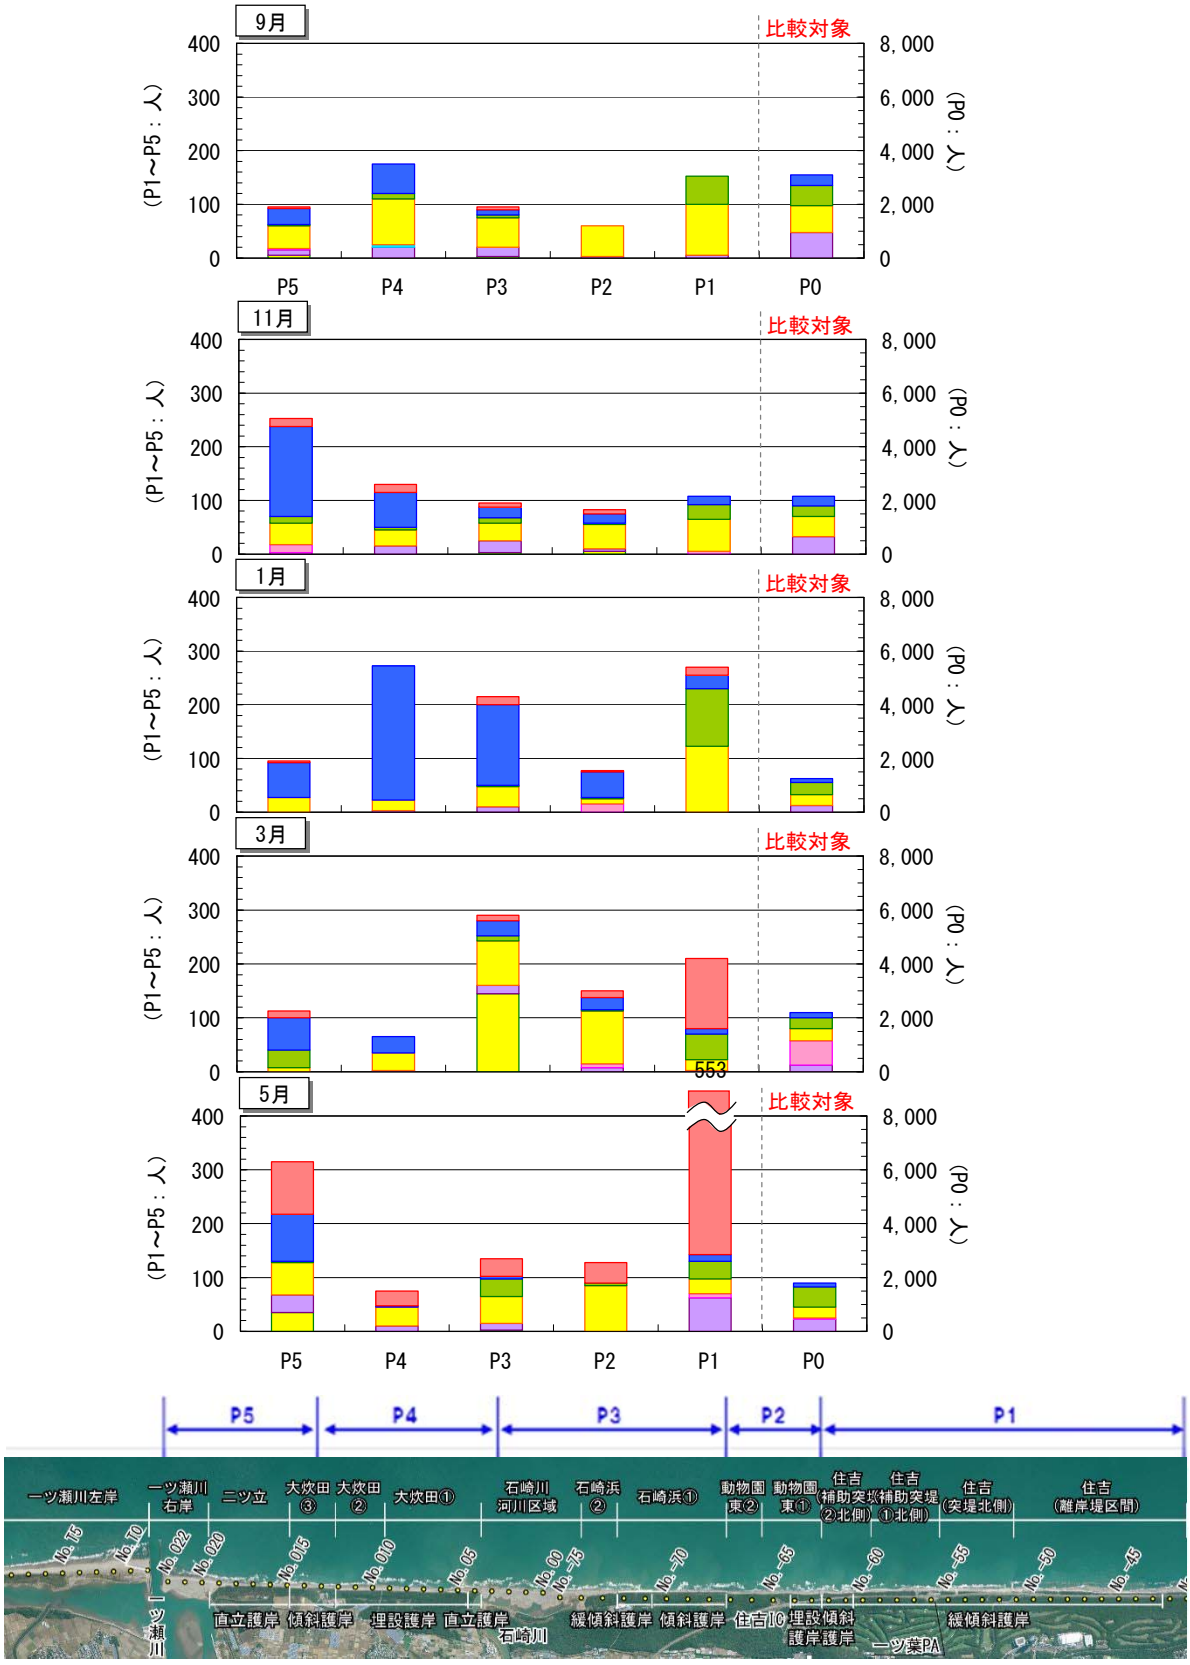

図－ 4.37　利用調査結果(2010(H22)～2011(H23)年度調査結果)

4.11 景　観

4.11.1 視点場からの目視および写真撮影

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 突堤の被覆材の色彩、材料、形状、寸法、堤体と地形形状のすり付けのなめらかさ
- 埋設護岸の埋没の有無、材料の色彩、性質、形状

(B) 現象

- 侵食対策の構造物(突堤と埋設護岸)が目立ちすぎて周囲の景観を阻害していないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
突堤が目立ちすぎて周囲の景観を阻害する。
埋設護岸が目立ちすぎて周囲の景観を阻害する。

2) 調査位置

- 突堤及び埋設護岸の施工箇所とする。

3) 調査時期

- 適宜とする。
- なお、突堤、埋設護岸等の工事の進捗が進んだ段階で、定期的に実施するかを改めて検討する。
- 第 13 回侵食対策検討委員会(平成 26 年 11 月)での委員指摘(「ヒアリングのみで景観を適切に評価することは難しいと考える。整備前後の写真比較による景観の変化も調査項目として追加し、ヒアリング結果と総合して景観の評価を行うことにより突堤の整備・延伸による景観変化を正しく把握できると考える」)を受け、平成 26 年 12 月より、1~2 週間に 1 度の海岸巡視時に視点場からの写真撮影を実施することとした。

4) 調査結果の整理方法

- 下記の視点場からの突堤とその周りの風景の写真を海岸巡視時に撮影し、風景との馴染み感を確認する。
  - ・一ツ葉有料道路レストハウスの海岸へのアクセス箇所
  - ・一ツ葉有料道路レストハウス前面の護岸天端上
  - ・一ツ葉有料道路シーガイア北側駐車帯
  - ・突堤、補助突堤①、補助突堤②周辺(北側、中央、南側)
- 施工完了直後および年に 2 回程度、宮崎シーガイア　シェラトン・グランデ・オーシャンリゾートより突堤とその周りの風景の写真を撮影し、風景との馴染み感を確認する。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは定性評価とする。
- 『宮崎海岸らしい』景観づくりに向けて、宮崎海岸の景観特性を整理する。なお、景観検討委員会が別途開催されており、その検討結果も参考にする。

表－ 4.77　目指すべき景観の方向性(景観カルテ：海-23-001-001)

宮崎海岸の基調をなす開放的で美しい直線状の海岸景観を尊重する

砂浜・汀線・海岸林の連続性・一体性を確保し、長大な砂浜が広がり、開放的で美しい、宮崎海岸らしい直線状の海岸景観をできる限り尊重した景観形成を行う

宮崎海岸の自然環境との調和を図る

構造物の存在をできる限り少なくするとともに、コンクリート構造物はできる限り露出しないよう、安全性・耐久性をクリアした上で構造物の形状・素材にもこだわりつつ、自然環境と調和した景観形成を行う

海岸利用者に配慮した景観形成を図る

構造物の設置に際しては、できる限り利用に支障が生じないよう配慮するとともに、構造物のみを目立たせることなく、周辺の海岸景観になじむデザインを採用するなど、眺望にも配慮した景観形成を行う

表－ 4.78　景観に関する基礎情報－景観特性(景観カルテ：海-23-001-001)

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は、突堤の天端面のブロックを新たに設置したことにより、護岸とのすりつけ等の見た目は改善されたと考えられるが、法面の既設ブロックとの色合いに差が生じている。
- 補助突堤①、②が設置された。補助突堤①は海面に近いところでブロックのエイジングが進み、風景に馴染みつつあると考えられる。

補助突堤②	補助突堤①
南側	南側
中央	中央
北側	北側

突堤	
一ツ葉有料道路ｼｰｶﾞｲｱ北側駐車帯	南側
一ツ葉有料道路ﾚｽﾄﾊｳｽ前面の護岸天端上	中央
一ツ葉有料道路ﾚｽﾄﾊｳｽの海岸へのｱｸｾｽ箇所	北側

図－ 4.38　視点場からの写真例　平成 29 年 3 月 27 日撮影

≪参考：2015(H27)年度の調査結果≫

- 2015(H27)年度は、突堤が目立ちすぎて周囲の景観を阻害するような状況は見られなかった。

一ツ葉有料道路レストハウスの 海岸へのアクセス箇所	一ツ葉有料道路レストハウス 前面の護岸天端上
一ツ葉有料道路 シーガイア北側駐車帯	突堤周辺(北側)
突堤周辺(南側)	突堤周辺(中央)

図－ 4.39　視点場からの写真例　平成 28 年 2 月 3 日撮影

≪参考：2014(H26)年度の調査結果≫

- 2014(H26)年度は、突堤が目立ちすぎて周囲の景観を阻害するような状況は見られなかった。

一ツ葉有料道路レストハウスの 海岸へのアクセス箇所	一ツ葉有料道路レストハウス 前面の護岸天端上
一ツ葉有料道路 シーガイア北側駐車帯	突堤周辺(北側)

図－ 4.40　視点場からの写真例　平成 27 年 2 月 18 日撮影

4.11.2 ヒアリング・アンケート等

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 突堤の被覆材の色彩、材料、形状、寸法、堤体と地形形状のすり付けのなめらかさ
- 埋設護岸の埋没の有無、材料の色彩、性質、形状

(B) 現象

- 侵食対策の構造物(突堤と埋設護岸)が目立ちすぎて周囲の景観を阻害していないか把握する。

計画変更につながる可能性がある現象
突堤が目立ちすぎて周囲の景観を阻害する。
埋設護岸が目立ちすぎて周囲の景観を阻害する。

2) 調査位置

- 突堤及び埋設護岸の施工箇所とする。

3) 調査時期

- 適宜とする。
- なお、突堤、埋設護岸等の工事の進捗が進んだ段階で、定期的に実施するかを改めて検討する。

4) 調査結果の整理方法

- 調査場所・対象者・方法および結果の整理方法は、実施都度検討する。
- 必要に応じて専門家の助言を受ける。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは定性評価とする。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は、調査非実施である。

≪参考：2015(H27)年度のアンケート調査結果≫

平成 27 年度は突堤についてアンケート調査を実施した。平成 27 年度に実施したアンケート調査の概要を以下に示す。

(A) 調査概要

a) 調査目的

- 本調査は、宮崎海岸に設置した突堤(L=75m)の利用・景観面からの効果・影響把握の一環として、利用者の感想や印象、意向等の把握を目的とした。

b) 調査対象

- 主な対象者は、突堤周辺を利用するサーファーとする。
- また、調査時間内に突堤付近を訪れた散歩、釣り等の利用者も対象とする。

c) 調査日時、場所

◎日時：平成 27 年 8 月 2 日(日)、3 日(月)
　　平成 28 年 2 月 5 日(金)、6 日(土)

◎調査場所：宮崎海岸突堤付近

図－ 4.41　現地調査状況写真

(B) 調査内容

a) 調査方法

- 調査員が利用者に対して、以下の項目についての聞き取り調査を実施する。

①属性
②利用頻度
③突堤整備による利用状況の変化
④突堤の景観
⑤事業に関する認知度
⑥突堤整備に対する要望(苦情)
⑦その他海岸整備、海岸利用等に対する要望(苦情)

調査にあたっては、以下の資料等を準備した。なお、参考資料は、ヒアリング時に見せるだけにとどめた。

□アンケート用紙（聞き取り結果を調査員が記載）

□景観用の参考資料（突堤設置前写真：近景でないもの：図－ 4.42）

□事業の認知度に関する参考資料（基本方針、侵食対策：図－ 4.43）

図－ 4.42　突堤設置前写真（平成 22 年 7 月）

出典：第 26 回宮崎海岸市民談義所　配布資料

図－ 4.43　宮崎海岸保全の基本方針、宮崎海岸の侵食対策

b)　調査実施状況

- 平成 27 年 8 月調査、平成 28 年 2 月調査とも快晴で波は静穏な日であった。
- 平成 27 年 8 月調査では、調査時期に突堤北側の砂浜が流出していたため、緩傾斜護岸基部の根固ブロックがむき出しになっていた。
- 平成 28 年 2 月調査では、調査時期に突堤北側の砂浜が回復しており、緩傾斜護岸基部の根固ブロックはほぼ砂で隠れた状態であった。

(C)　調査結果

【平成 27 年 8 月調査】

・利用属性は、以下の円グラフのとおりである。

・突堤が周囲の景観になじんでいるとの意見が約 9 割を占め、突堤整備に対する景観配慮の効果が確認できた。

・一方、利用面については、あまり有効な回答が得られなかった。原因は、調査時期に突堤北側の砂が流出し、緩傾斜護岸基部の根固ブロックがむき出しになっていたため、サーフィン利用のアプローチが難しかったことに加え、波が静穏だったことから、訪れたサーファーも車から降りずに引き返す方が大部分で、殆どサーフィン利用がなされなかったためである。

・しかし、調査当日は、動物園東、木崎浜ともサーフィン利用が見られたことから、波の条件が同じとすれば、地形の関係で利用に差が出たと考えられる（砂の流出による突堤付近の水深増大、砕波位置の岸側への移動）。

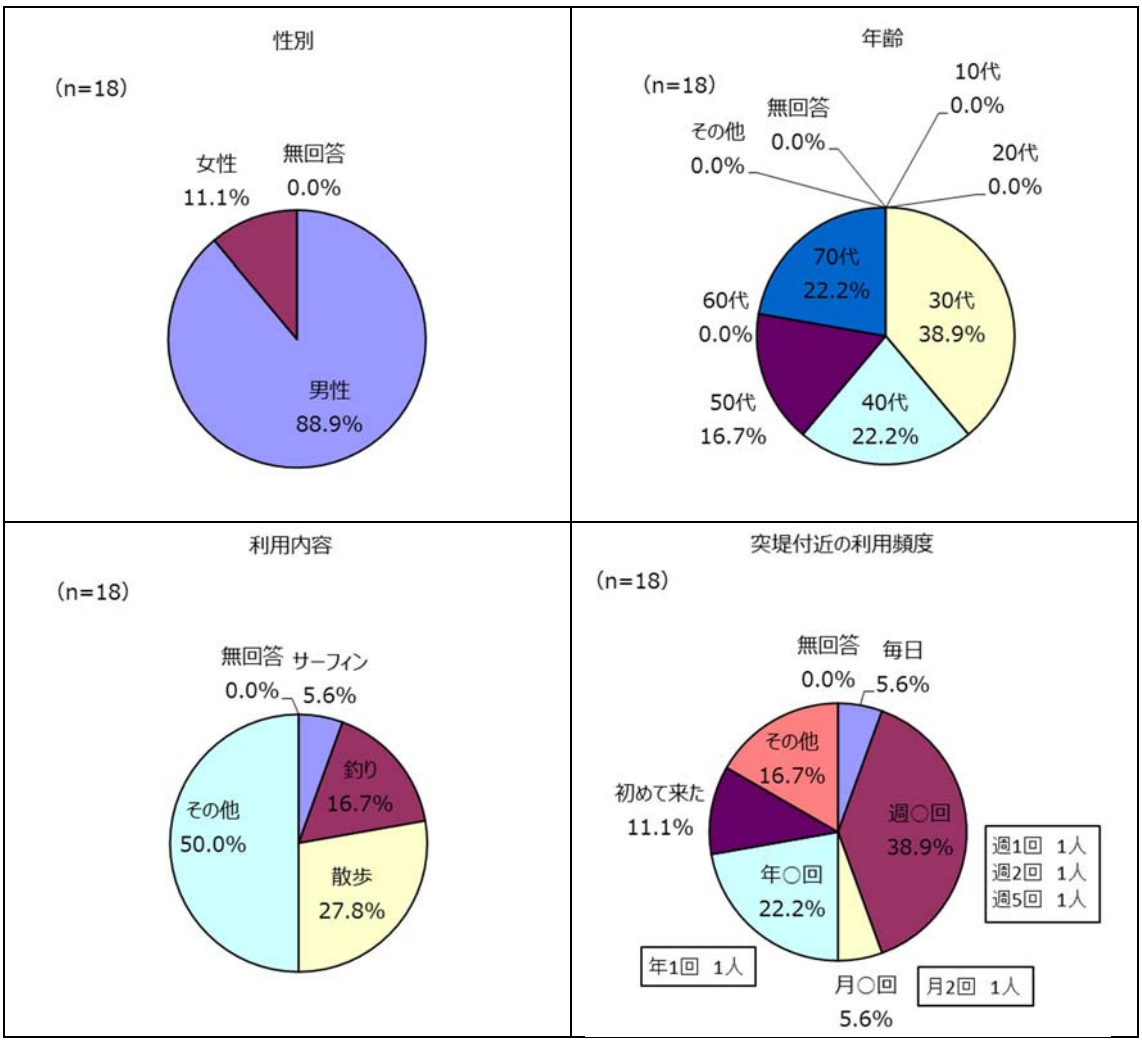

図－ 4.44(1)　調査結果のまとめ(平成 27 年 8 月)

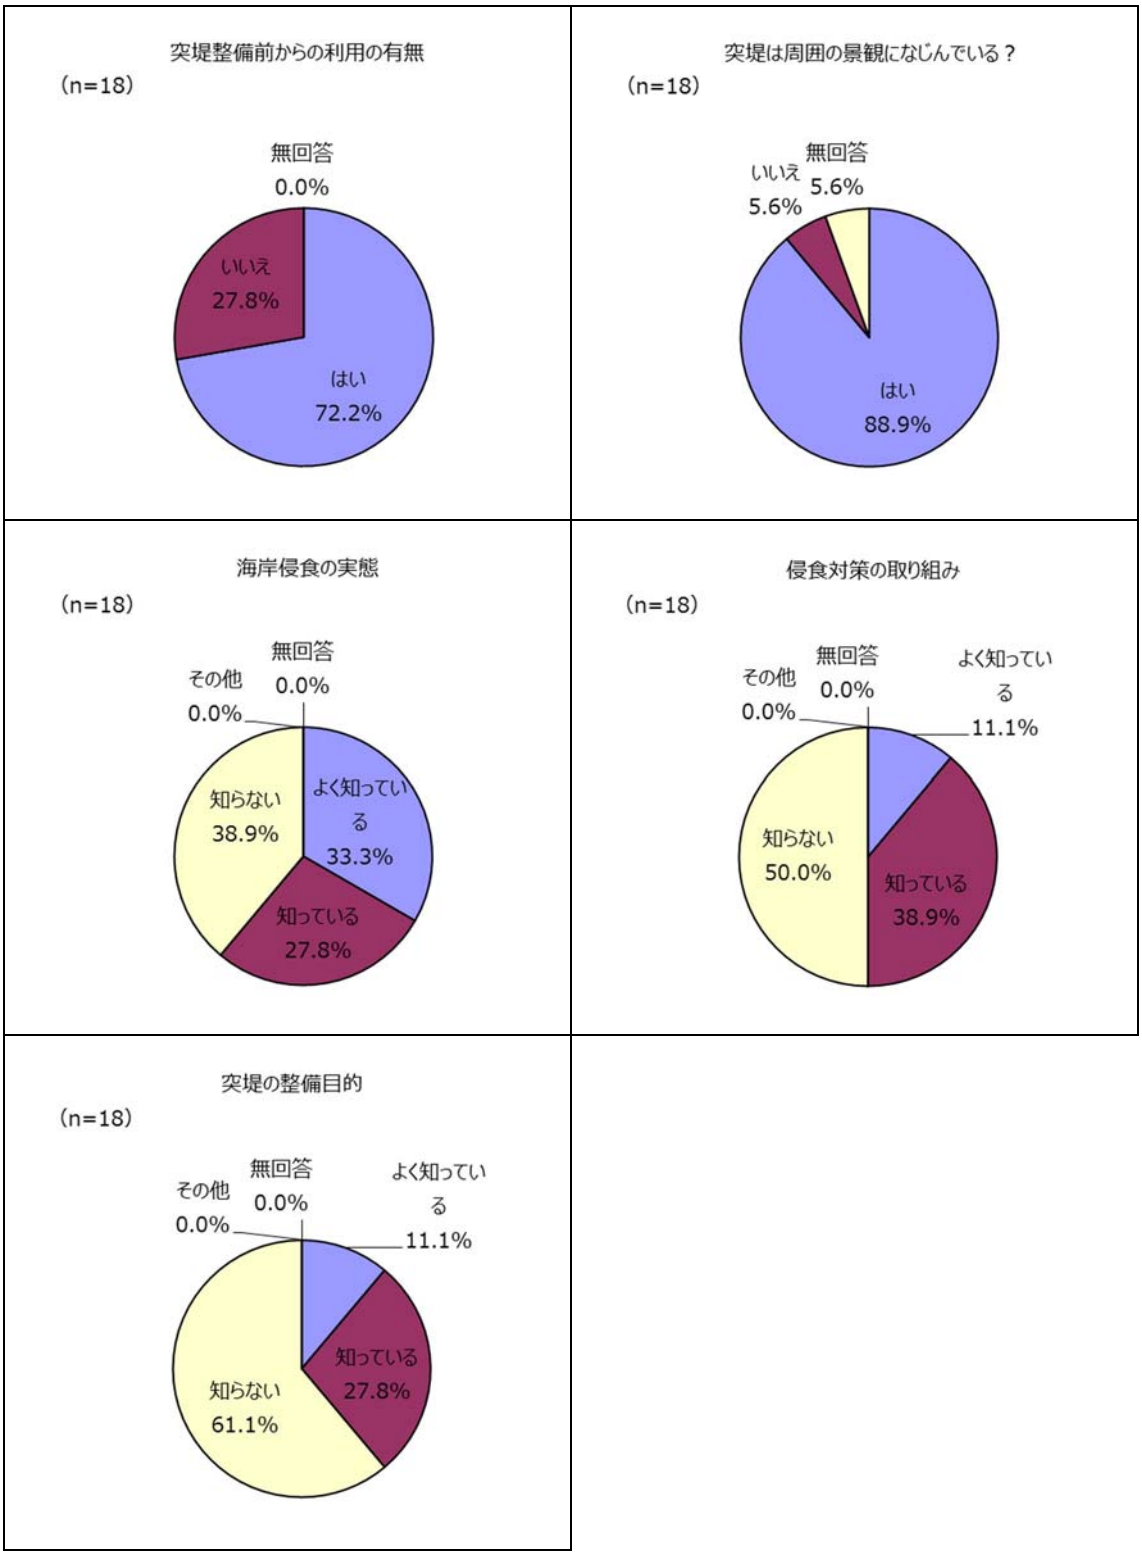

図－ 4.44(2)　調査結果のまとめ(平成 27 年 8 月)

【平成 28 年 2 月調査】

・利用属性は、以下の円グラフのとおりである。

・夏季調査とは異なり、突堤北側の砂浜が回復しており、緩傾斜護岸基部の根固ブロックはほぼ砂で隠れた状態での調査であった。

・突堤が周囲の景観になじんでいるとの意見は約 8 割を超え、夏季調査に引き続き、突堤整備に対する景観配慮の効果が確認できた。

・利用面についても、突堤整備により砂浜が回復し、突堤北のポイントでサーフィンができるようになった、利用範囲が若干北側にも拡がったとの意見を得られるなど、全体的に歓迎的な意見が多かった。

・ただし、サーフィン利用者は、突堤北側が砂の侵食・堆積が激しい場所だということも理解しており、安定した利用には突堤の延伸も含めた砂浜の維持・回復が必要であるという理解であった。

・釣りの利用者も多く、突堤利用を許可して欲しいという意見が多かった。

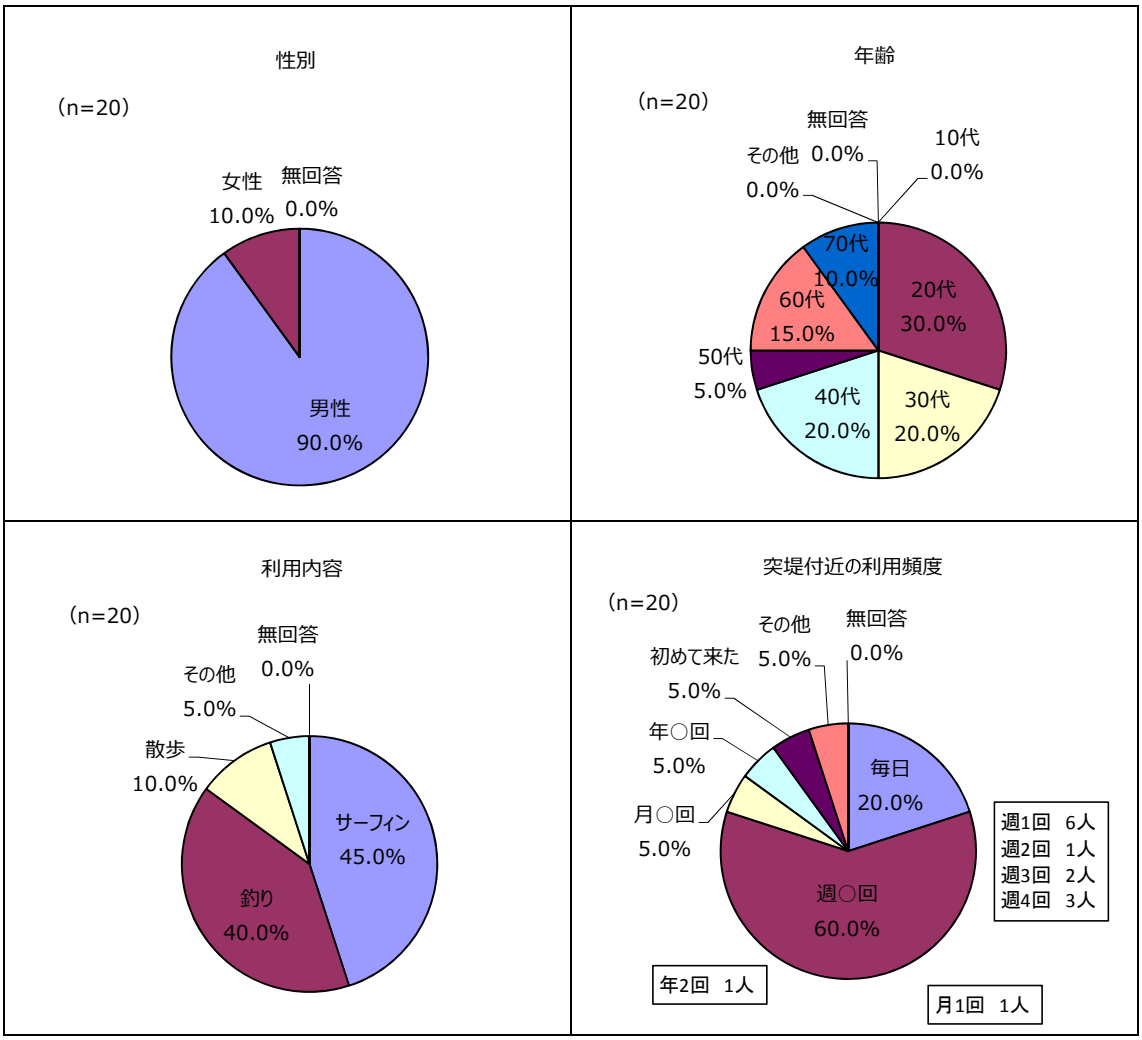

図－ 4.45(1)　調査結果のまとめ(平成 28 年 2 月)

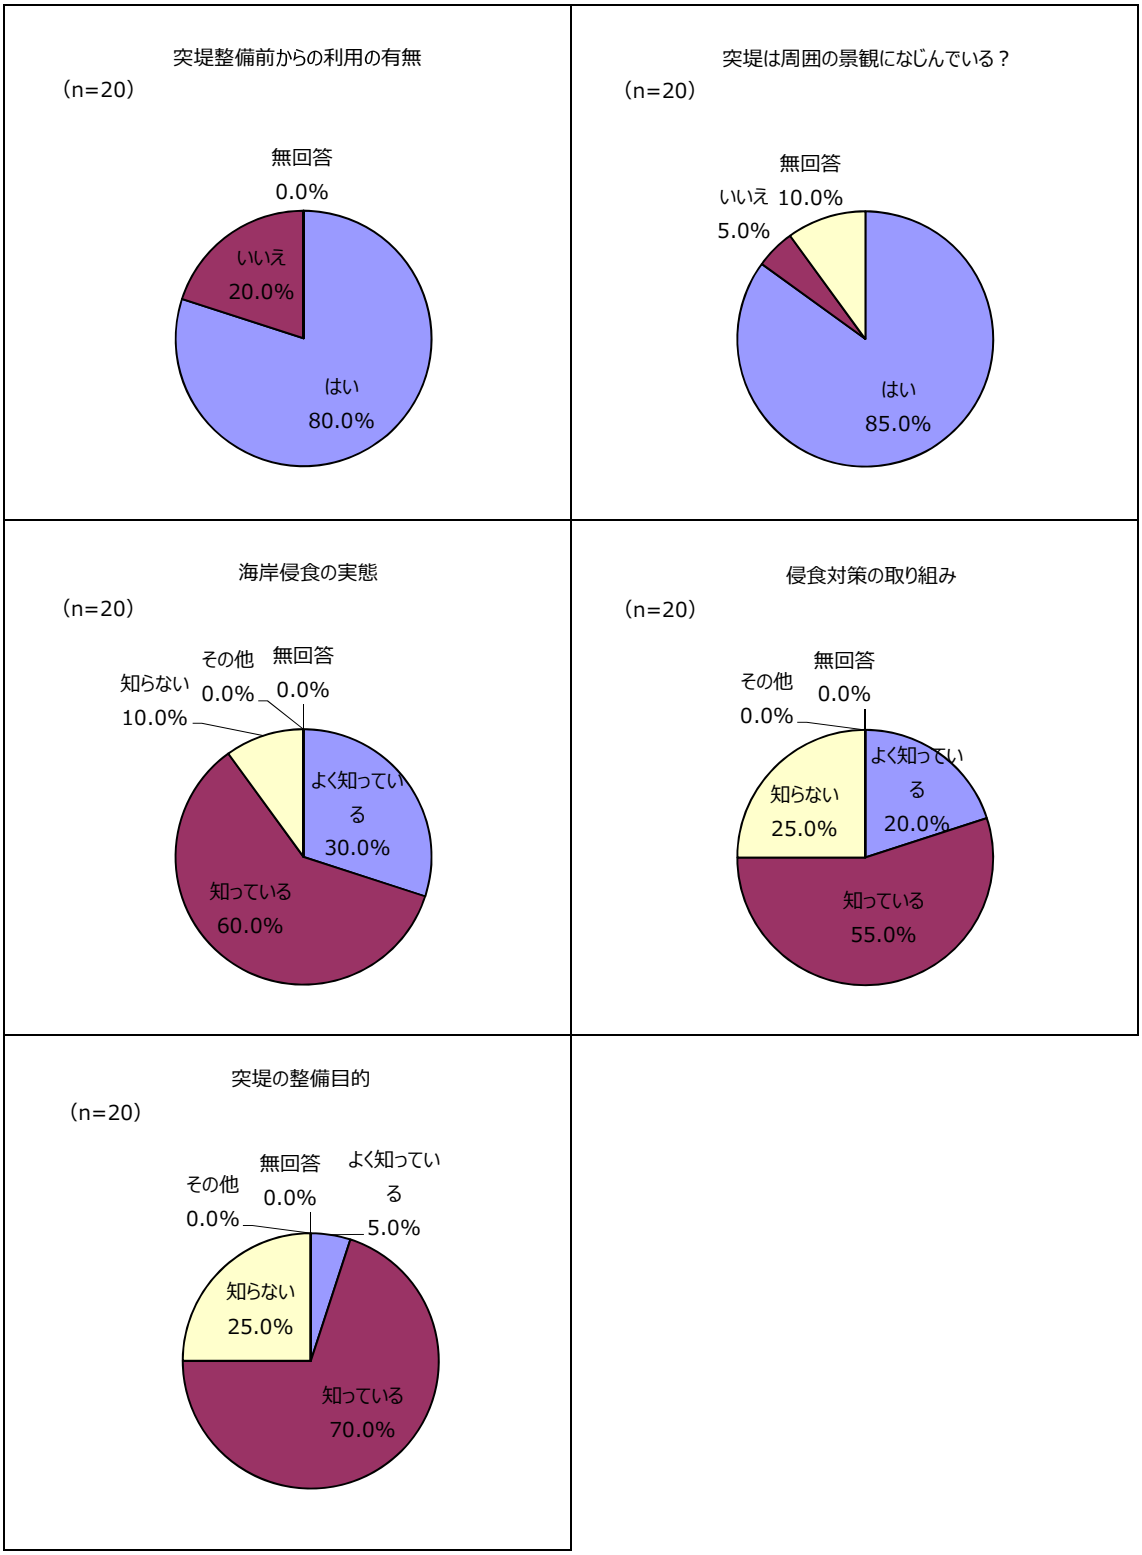

図－ 4.45(2)　調査結果のまとめ(平成 28 年 2 月)

≪参考：2014(H26)年度のアンケート調査結果≫

平成 26 年度は大炊田海岸の埋設護岸についてアンケート調査を実施した。平成 26 年度に実施したアンケート調査の概要を以下に示す。

(A) 調査概要

a) 調査目的

➢ 本調査は、景観に配慮して実施した宮崎海岸侵食対策事業の事後評価や維持・補修方法の検討に向けて、下記に関する市民や団体の感想や印象、意向等を把握することを目的に実施した。

①サンドパック工法に関する感想
②サンドパックの整備前後の景観に対する印象
③今後の大炊田海岸の利用に関する意向

b) 調査対象

➢ 本調査の対象者は、広瀬西小学校区地域づくり協議会と宮崎河川国道事務所・同宮崎海岸出張所で企画している「第 9 回ウォーキングフェスタ」の参加者とする。

c) 調査日時、場所

➢ 「第 9 回ウォーキングフェスタ」の概要と調査場所を以下に示す。

◎日時：平成 26 年 11 月 24 日（祝日・月）
・９時３０分～第１グループ（約１００名）
・１０時００分～第２グループ（約３０名）
◎集合場所：大炊田海岸 KDDI タワー工事用道路海岸入り口
◎コース：第１グループ　①大炊田海岸→②自転車道経由→③観鯨館
第２グループ　①大炊田海岸→②自転車道
◎調査場所：大炊田海岸を歩いた後の１箇所目のチェックポイント①周辺

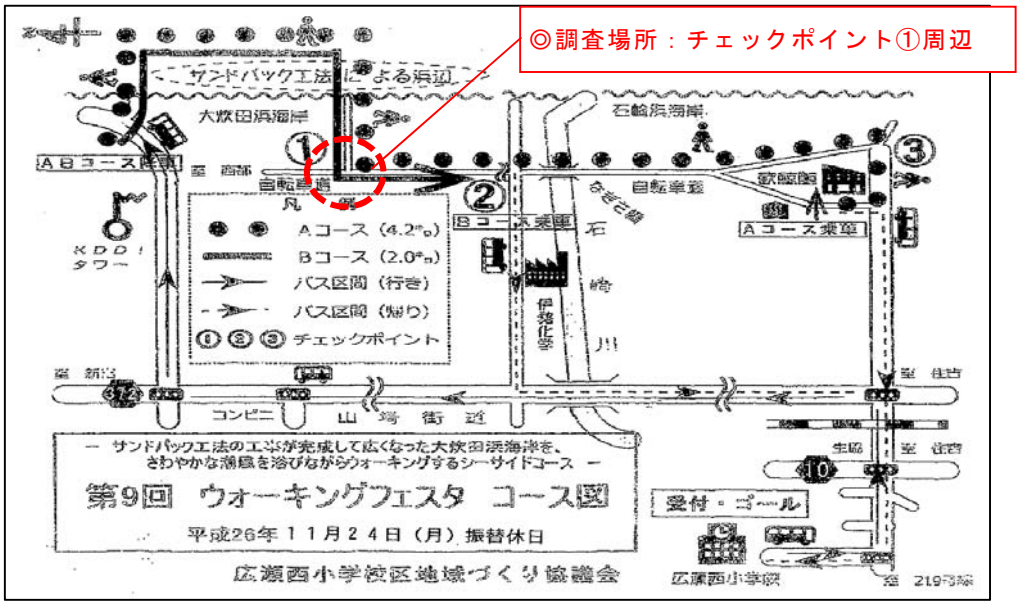

図－ 4.46　第 9 回ウォーキングフェスタ　コース図

(B)　調査内容

a)　調査方法

- ウォーキング開始前に、チェックポイント①で調査する旨を説明した。
- 質問と回答欄を印刷した調査用パネル（A1 横×1 枚）と整備前後の定点写真パネル（A1 横×1 枚）を設置し、参加者に該当する回答欄にシールを貼っていただく方式とした。
- 参加者から用意した回答以外の意見がある場合は､調査員がメモ用紙に記入する。混雑・渋滞を避けるため、調査パネルは 3 つとした。

表－ 4.79　調査に用いたパネル

b)　調査実施状況

- 当日は好天に恵まれ、概ね 170 名程度がウォーキングに参加し、ほぼすべての参加者がアンケートの回答を行った。

図－ 4.47　調査実施状況

(C)　調査結果

質問１：サンドパック工法について
侵食対策として採用されたサンドパック工法についてどう思いますか？

砂丘の侵食防止というサンドパックの基本的な機能が発現されていることについて理解と評価を頂いた。

サンドパックの景観面や環境への配慮面についても一定の評価を頂いた。

サンドパックが露出した際の見え方が悪い、あるいはコンクリートよりも脆弱で損傷しやすいという印象をお持ちの参加者もいた。

⇒概ねサンドパック工法について良好な評価を得ることができたが、パック露出時の景観対策や耐久性の向上対策が今後の課題として挙げられる。

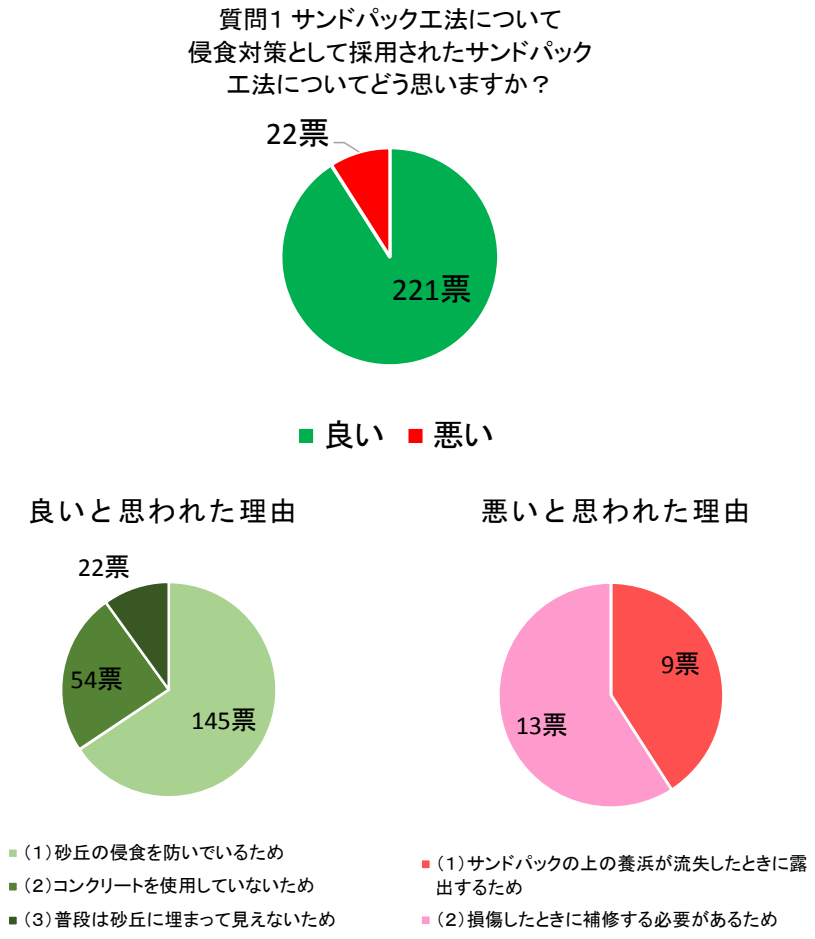

図－ 4.48　質問１の回答結果

質問２：景観について
サンドパック整備後の大炊田海岸の景観についてどう思いますか？
【整備前後の定点写真を参考に】

砂丘の侵食防止というサンドパックの基本的な機能が発現されていることについて理解と評価を頂いた。

サンドパックの景観面や環境への配慮面についても一定の評価を頂いた。

サンドパックが露出した際の見え方が悪い、あるいはコンクリートよりも脆弱で損傷しやすいという印象をお持ちの参加者もいた。

サンドパックが露出した時の人工的な景観が悪いと回答される参加者もいた。

⇒概ねサンドパック工法について良好な評価を得ることができたが、パック露出時の景観対策や耐久性の向上対策が今後の課題として挙げられる。

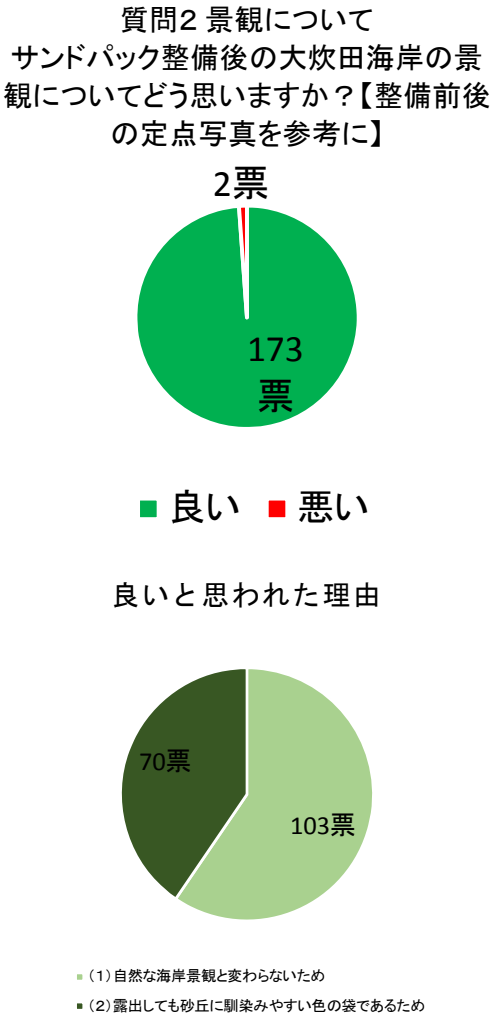

図－ 4.49　質問２の回答結果

質問３：活用頻度・利用形態について
整備前に比べて大炊田海岸を利用したいと思いますか？
また、どのような利用をしたいですか？

サンドパックの景観性について良好な評価を頂いた。

⇒概ねサンドパックの景観性について良好な評価を得ることができたが、
質問１と同様、パック露出時の景観対策が今後の課題として挙げられる。

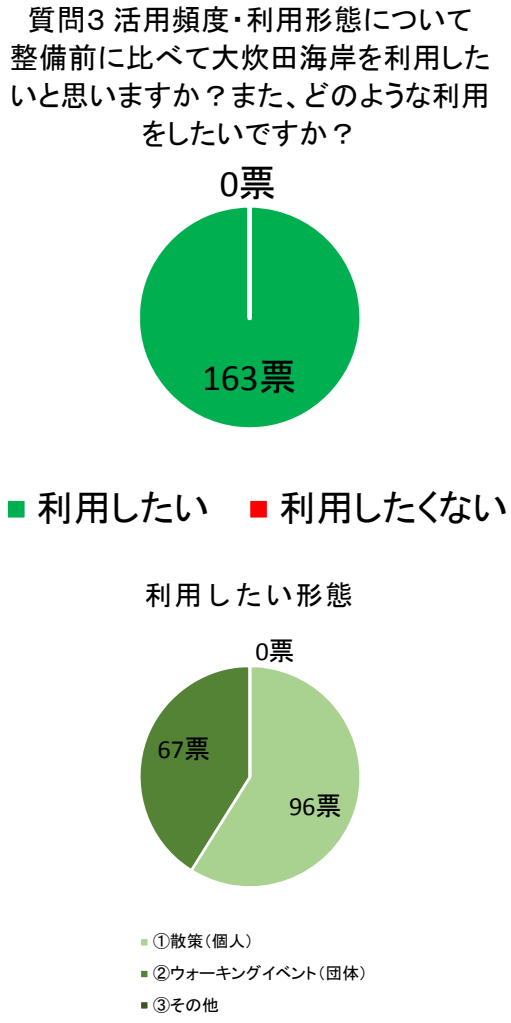

図－ 4.50　質問３の回答結果

4.12 市民意見

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 市民意見

(B) 現象

- 宮崎海岸保全の基本方針に示されているとおりの「宮崎海岸トライアングル」の考え方に基づいた対策となっているか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
養浜に関して市民から要望、苦情が出る。
突堤に関して市民から要望、苦情が出る。
埋設護岸に関して市民から要望、苦情が出る。

2) 調査位置

- 問題が生じた場所及びその周辺とする。

3) 調査時期

- 随時とする。

4) 調査結果の整理方法

- 市民談義所、よろず相談所、個別ヒアリング等で聞き取り調査、書面等の確認を実施する。意見や質疑を一覧表として整理する。

5) 指標範囲の検討

- 指標タイプは定性評価とする。

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は、6 月 17 日(第 31 回)、7 月 29 日(第 32 回)、11 月 1 日(第 33 回)、1 月 31 日(第 34 回)、2 月 26 日(第 35 回、現地見学会と同時開催)の 5 回、市民談義所を開催し、宮崎海岸の侵食対策事業に関する市民、行政、専門家等による談義を行っている。
- 第 31 回市民談義所では、現在の宮崎海岸の状況について、空撮をみながら共有するとともに、主に動物園東の里道前面の開口部(サンドパック未設置区間)の対策方針について、利用面も含めて談義し、サンドパックで閉じて背後地の安全性を高める方向性を共有した。また、小さなサンドパックを用い、砂浜におりやすくすることを検討すること、サンドパックが露出したときには早く砂を被せて段差をなくすことで海辺への近づきやすさを担保するということを共有した。突堤の効果や施工順序について意見がだされ、計画の考え方やその実施状況について改めて共有していくことが今後の課題として示された。
- 第 32 回市民談義所では、主に平成 26 年度に実施した対策の効果検証について、波浪の来襲状況、地形変化、環境・利用面の効果・影響を説明するとともに、宮崎海岸の状況について空撮をみながら共有した。実施した対策の効果・影響については、事業主体の評価と市民の認識に大きなギャップがないことを共有した。養浜事業の効果や今後の砂浜回復に関する事項や、海底地形の変化、台風が来襲した際の安全性等について談義した。
- 第 33 回市民談義所では、9 月に開催された侵食対策検討委員会の結果を報告した。事業の効果や評価について談義所で共有するためにも、わかりやすい絵やデータを写真の上に落とすなどの表現の方法を工夫していくことが大切なことだということを共有した。その後、漁業者から漁業の実態等についてさまざまな情報提供を頂き、漁業者が懸念していることについて共有した。
- 第 34 回市民談義所では、宮崎海岸の地形変化状況、工事状況や効果等について共有した。事業が進んでいる中で対策などの効果を確認しながら次のステップに進んでいくときには、その根拠を共有し、それに基づいて納得しながら事業を進めていくことをしっかりやっていくことが必要であることを確認した。海岸全体のことや他の事例、漁業、利用のことなどの情報を共有しながら勉強していく機会は必要になってくると認識した。
- 第 35 回市民談義所では、現地見学会後に現地で談義を行い、それぞれの意見や考えていることを共有した。波の音を聞きながら談義をするということは非常に良く、課題となっている対策の効果の見せ方にもかかわってくるため、今後もいろいろな工夫をして、海岸事業の進捗やこれからの海岸について議論・共有していくことが望ましいと考えられた。

≪参考：2015(H27)年度の主な市民意見≫

- 2015(H27)年度は、7 月 10 日(第 26 回)、8 月 4 日(第 27 回)、10 月 16 日(第 28 回)、12 月 4 日(第 29 回)、1 月 30 日(第 30 回、現地見学会と同時開催)の 5 回、市民談義所を開催し、宮崎海岸の侵食対策事業に関する市民、行政、専門家等による談義を行っている。
- 第 26 回市民談義所では、須田効果検証分科会委員長による砂浜の生態系に関する講義を開催した。
- 第 27 回市民談義所では、事前に募集した希望者による市民発表を実施した。
- 市民意見としては、各種工事についての意見・要望が出された。また、突堤延伸に向けての今後の進め方についても質問があった。
- 2016(H28)年度は、8 月 30 日時点で、6 月 17 日(第 31 回)、7 月 29 日(第 32 回)の 2 回、市民談義所を開催し、宮崎海岸の侵食対策事業に関する市民、行政、専門家等による談義を行っている。

≪参考：2014(H26)年度の主な市民意見≫

- 2014(H26)年度は、9月7日(第23回)、12月9日(第24回)、1月14日(第25回)の3回、市民談義所を開催し、宮崎海岸の侵食対策事業に関する市民、行政、専門家等による談義を行っている。
- 3回とも、2013(H25)年度に大炊田海岸で施工された埋設護岸の効果と、台風期の一部変状についての説明をテーマとした市民談義所であったため、これに対する意見・要望が大半を占めていた。

表－ 4.80(1)　2016(H28)年度の市民との主な協議事項(第 31 回市民談義所)

市民からの主な意見	
・毎年 20～30 万 m3 ということは、5 年間で 100 万 m3～150 万 m3 海浜土砂量は減少する。これに対して、約 100 万 m3 養浜しているならば、計算上は収支がトントンでないといけないが、実際には浜崖の後退が見られるなど侵食は進んでいる。この理由を教えていただきたい。	
・宮崎港の浚渫量は約 10 万 m3 海中養浜をしたと説明があったが、第 28 回市民談義所資料によると、海中養浜は 31.9 万 m3 となっている。この数字について丁寧に教えていただきたい。また、・過去に他の参加者も発言していたが、養浜の投入位置がレストハウス前では効果がないので、もっと北側に養浜してほしいと再三申し入れているが改善されていない。	
・この 4 年間、年度ごと事業費がいくらかかったかというのを教えてほしい。	
・海浜の傾斜が強い(急勾配)ときは、波が強くなると前浜をすいていく。だから壊れる(侵食が進む)。海浜の勾配は 10° 以内でないと侵食が発生する。勾配が強いほど問題があると考える。	
・動物園東の北側の浜崖はだいぶ後退したが、今後この箇所はどうするつもりか教えてほしい。	
・以前の事務局の説明では、住民の要望によってコンクリートの階段を造ろうと思っていたが、住民の要望がどこから出たかも分からないし、必要ないというのであれば、(コンクリート護岸の計画はなくして)袋詰め玉石も撤去するということだった。	
・現在置かれている袋詰め玉石は、既に下の方は袋が破れて石が露出している。この区間をサンドパックで対応してもらえるのであればそれに越したことはない。 ・住吉海岸のうち、動物園東の約 1km 区間は唯一コンクリートの構造物がない海岸である。できるだけ残してほしいという強い気持ちがある。	
・何回も発言しているが、港に年間 22 万 m3 の砂が溜まるというのはおかしいと考えている。3 万 m3 の砂の量はダンプトラックで約 6,000 台分と言われていることを考えると、22 万 m3 の砂が港に毎年溜まるといったら、すごい量である。 ・砂は、水深 12m より浅いところを動くと事務局は説明している。手前でしか砂が動かなくて、本当に年間 22 万 m3 の土砂が港湾に溜まるほど砂が動いているのであれば、75m の突堤を造ったときに、それだけの砂が突堤周辺に溜まって良いはずである。現在はほとんど砂が付いていない。	
・突堤を 300m 伸ばして沖合の砂を止めることが前提で砂浜を 50m 回復するという説明を聞いていたのに、今はやみくもに突堤を追加して景観を破壊して、「砂が付くであろう」という想定だけで進んでいるように思う。このことについて納得のいく説明が欲しい。 ・当初、補助突堤はあくまで補助であると聞いていた。本突堤(南端の突堤)ありきの補助突堤だと思う。本突堤は、先ほど技術分科会長からも少しでも伸ばさないと、効果も分からないという話があった。だが、補助突堤の出来上がりの見通しばかりが進んでいき、本突堤の延伸の見通しが一切出てこないというのはおかしいのではないかと思う。 ・補助突堤に関してのみ、効果検証を飛ばして設置を先行しているのはおかしいのではないかと思う。 ・本突堤を次に伸ばすのはいつなのか。	
・前回から、突堤延伸の阻害になっているのは漁業者の反対だという話があったと思う。この阻害因子を取ることを、どのように進めるのかを明確にしてほしい。	
・具体的な数字を出して説明してもらえると、素人でも分かる。次回は、予測計算上、何年待てばどのくらいの高さの砂浜が付く、というような結果を示してほしい。	

	事務局回答
	・台風の影響等も受けて場所によって侵食したり堆積したりしている状況だと考えている。測量成果から見ても、1983 年からの変化を示した資料ではあるが、一ッ瀬川河口右岸で土砂が増えていたり、大炊田海岸については経年的に土砂が減っていたりという傾向が見て取れる。侵食傾向は進んでいるという事実だけは把握しているというところである。
	・2008(平成 20)年～2013(平成 25)年の間に、港湾から持ってきた土砂をレストハウス前(一ッ葉パーキングエリア前)に養浜として入れた量を合計したものである。
	・総事業費としては、230 億円で考えているところである。年度によってでこぼこが出ているが、概ね、年間 7 億円程度執行している。
	・養浜で土砂量を増やすことによって、砂浜の勾配も適切に保ちながら砂浜を回復していくことができると考えている。さらに、将来的には川から自然に土砂が流れてくることを目指しているのがこの侵食対策である。
	・動物園東の南端は、だいぶ浜崖がえぐられた状況であるが、これに沿うようにサンドパックをおき、その前にさらにサンドパックを置く計画で対策を進めている。 ・今後も災害が起こる可能性はあるので、我々としても災害が拡大しないように、備蓄材等いろいろなものを用意しているところである。
	・談義の手法として良かったかどうかは分からないが、地元を回って意見を収集したことがある。このときに、浜に下りる手段は必要ということで御意見は伺っている。談義所の中でも、「何かできないのか」という御意見は出ていた。
	(コーディネータ)ここに階段を作ったりするのではなく、サンドパックを入れて砂をかぶせ、砂浜がある状態の時にアクセスするという方針については、反対意見はないか。事業主体と市民の共通の認識が取れていると考えて良いか。 ・サンドパックの大きさを変えられるかについてはこれから検討していくということで良いか。
	・港湾に年平均 22 万 m3 の土砂が堆積しているというのは、測量成果から数値として出てきた事実である。 ・突堤周辺への土砂の堆積については、冬場の波が落ち着いたときには事業主体の方でも確認している。昨年の台風は、これまでと少し傾向が違った可能性があり、これまでは北から南への土砂の動きが卓越していたが、昨年度は南から北への波浪が多く出ていたので突堤から北側へ土砂が移動している状況である。 ・(技術分科会長)波向きに応じて土砂は移動するので、台風がどの経路を通るかということがこの海岸では微妙な結果を生んでいる。 ・突堤のところに砂が付いていないのは、基本的に突堤が短すぎることが原因である。突堤の効果を出すためには、補助突堤の建設も重要ではあるが、南側の突堤を伸ばしていく努力をしないとなかなかいい結果に結びつくことはないのではないかと、技術分科会でも話しているところである。
	・Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期と分けて事業を進めている。養浜の施工はずっと継続していく。突堤は、伸ばすとかなりのインパクトがあるという意見もあって、段階的に伸ばしていく必要があると考えている。 ・今回、突堤 75m、補助突堤①42m、補助突堤②50m をつくって、砂の付き方を検証していく。効果が確認され、周囲に与える影響が少ないという結果が出てくれば、利用者との調整に配慮しながら、突堤の先の延長を伸ばしていくという計画である。 ・300m の突堤の計画に対して、一気に 300m つくるということは、かなり周囲に与えるインパクトが大きいので、そういったことは避けていくというのが宮崎海岸の「効果検証をしながら事業を進めていく」やり方である。 ・効果検証に当たっては、さらに、関係者のいろいろな意見を聞かないといけない。これが宮崎海岸トライアングルだと捉えている。利用者に配慮しながら、平成 29 年を目標にⅠ期の施工を終え、次のステップに進みたいという考えである。
	[コーディネータ] ・漁業者が突堤の延伸を止めているわけではなく、漁業者にとってもいいような事業をしていく必要があるということである。 ・前々回より、漁業関係者との調整がすごく難しいという話はしているが、「漁業者の反対がネックになっている」という言い方は少し違うと考えている。漁業者も住民であるので、彼らにもほかの市民と同様に納得が必要である。 ・漁業者や住民、いろいろな人と話し合うのが市民談義所であり、この事業の進め方なので、誰かを悪者にするとか、誰かをターゲットにするのではなく、進め方を慎重に考えながら進めていければと考えている。
	[コーディネータ] ・突堤の効果や施工順序についても、どういった背景・どういった根拠で計画を決めているのかということを談義所で分かりやすく説明してみんなで共有していくことが、今後もっと強化していかなければならない課題だということで挙がった意見かと思う。

表－ 4.80(2)　2016(H28)年度の市民との主な協議事項(第 32 回市民談義所)

市民からの主な意見	
・動物園東は、毎年浜が洗われて松林まで崩れるような状況になっている。サンドパックによる埋設護岸を施工されたが、それも台風のときは全部あらわになっている。サンドパックは侵食の速度を緩める効果しかなく、浜に砂をつけるためには突堤が必要なのだと思う。突堤の工事を早くやってもらって、その間に浜が侵食しないようにサンドパックを施工してもらいたい。	
・国土交通省としては 30 億円かけて砂が付いたと考えているのかどうか、お聞きしたい。	
・『砂防工学概論(矢野義男)』で、ハマボウあるいは耐潮性の植物が核となって砂丘をつくるということを学んだ。また、『実務者のための海岸工学(豊島修)』には、「草を生やして一人前、天然の砂浜に勝る砂防施設はない」と書かれている。そういうことを考えたとき、この海岸は 30 億円もかけても草が生えていない。これで砂が付いたと言えるのか。	
・一ッ瀬川の突堤南側は 2008 年から 2015 年の間に 8.9 万 m3 養浜して、砂浜が回復している。一方で、横軸の 1.65km～2km くらいまでの間(石崎浜～動物園東)では、合計約 33 万 m3 養浜しているのに砂浜は付いていない。この違いはどのように説明するのか。	
・見えない部分の地形の変化と砂浜の地形の変化で連動するような何か調査結果があるかどうか説明してほしい。	
・大炊田海岸のサンドパックが終わったので、次は他のところの対策を進めてほしい。今でも、サンドパックは何箇所か露出して肌が見えている。	
・資料別紙(対策の評価に関する資料)p.9～10 を見ると、魚介類の数が調査されている。突堤を作ることによって魚介類が増えるということは、漁業者に対する説得材料になるのではないかと思う。突堤が増え、魚種が増えると収穫にプラスになるのではないかと推測する。	

	事務局回答
	・サンドパックは露出すると被災しやすくなることがこれまでの経験でわかったことから、今年はサンドパックが台風等で露出した際には砂を可能な限り投入していく対策を実施していく。これにより、結果として浜に下りる通路も確保できることになるのではないかと考えている。 ・また、浜に下りる手段として砂の投入だけでは確保できず、サンドパックの露出が長期間継続してしまい、浜に下りることができない状況が出てきた場合は、別途対策を検討することを考えている。
	・砂が付いているところもあるが、付いていないところもある。対策に対して、一定の評価をできる部分はあるが、まだ効果が出ていない部分については、海の中の漂砂を捕捉する施設である突堤を、周囲に悪影響が出ないことを確認しながらすこしずつ伸ばしつつ、合わせて補助突堤①、②をつくって浜幅の確保を目指していくということで進めている。
	・（村上先生）安定した海岸には植生が生えている。しかし、植生が宮崎海岸で起きているような海岸の侵食を抑えるということはちょっと考えにくい。砂浜が十分安定した地形になればそこに植生が繁茂する。例えば目標である浜幅 50m を達成すれば、結果として植生が生え、砂浜海岸の安定に貢献することになるかと思う。それを目指すということかと思う。
	・昨年度は、波浪が南から入射する頻度が比較的多かったので、南から流れてきた土砂が北側の導流堤手前に溜まる現象が見られた。ただし、波浪はいろいろな方向から入ってくるので、侵食・堆積の要因は一概には言えない。
	・水深 10m くらいまでは砂の動きがあるというのは把握しているので、現在の突堤の長さではまだ土砂を捕捉しきれていない部分があるということが現在の事業主体としての評価である。
	・埋設護岸については、これまで浜崖の急激な低下を防ぐ効果を発揮しているので、なるべく早期に埋設護岸を整備して浜崖を守る対策を完成させたいと考えている。
	・漁業者にとっては漁獲対象が絞られていることから、漁獲対象の魚が増えてくれば今の段階で「良い」という判断はできるが、魚種が増えたということのみで、今の段階ですべて漁業者の利益に直結するのではないと思う。 ・魚種が増えているという効果は、漁業者に説明していく。

表－ 4.80(3)　2016(H28)年度の市民との主な協議事項(第 33 回市民談義所)

市民からの主な意見	
・浜山コンクリート護岸災害復旧の端部のサンドパックとの境目の処理の議論はどうなったのか。	
・サンドパック端部の処理は、今回提示したやり方で満足できる(被害が生じない)と考えているのか。	
・本突堤延長について、以前の市民談義所で漁業者は突堤の延伸に反対で、そこをクリアしないと伸ばせないという話があったが、漁業者との協議は進んだのか。	
・ドローンだけではなくて、超音波を漁船から出して調べたり、GPSを使ってブイを浮かべて海面の動きがどうなっているのかを調べる等新技術を使っていくのが良いと思う。 ・漁業操業のコースをデータとして取っておけば漁業者に対する説得力も出てくると先に指摘したが、データはまだ取っていないとのことだが、突堤 300mを計画した時点で、そういうデータを持って漁業者に協力を求めるのが当然と思う。	
・養浜はほぼ順調と説明があったが、文章で言われても私たちは納得できない。具体的に地図上に、ここは溜まっている、ここは深掘れしていると示して欲しい。	
・宮崎港から突堤までの砂浜に離岸堤が設置されており、その離岸堤の陸側には砂が溜まっている。侵食が厳しい箇所には離岸堤を設置したほうがいいと思う。	
・工事の進行が遅いということはないということだが、中途半端に工事を中断しているのではないか。海の波は砂を取るばかりの動きを毎日している。中断する間にやられて、毎年養浜しているようにみえる。	

	事務局回答
	・サンドパックの端部は弱部であるため、二重にサンドパックを設置している。さらに前面に根固め的な要素を持った、壊れてもいいようなサンドパックを置いて端部の処理として、委員会で了承を得ている。さらに、県が浜山護岸前面の保護のために作成しているブロックも自然浜前に延伸して置いており、また、グラベルマットという沈下防止材も入れている。
	・「絶対」というものはないので、約束できるものではないが、技術分科会等での議論を経て満足できるのではないかと考えている。
	・資料 p.11 に示しているとおり、3 期に分けて事業を進めており、突堤の効果や、突堤より南側のほうに影響が及ばないかということも含めて検証しながら段階的に整備をしていく。
	・[参加者]（漁業者）ほとんどの漁船はGPSを付けている。GPSの使用は漁師が一番古い。車よりはるか昔から使っている。
	・[コーディネータ]委員会では、現時点では工法を大きく変える必要があるような悪い状況ではないということで、突堤と養浜と埋設護岸のセットで対策を継続していくことになった。現時点では離岸堤について検討する状況ではない、というのが委員会で議論された。ただし、観測の結果、今の工法が悪くなることがあれば、効果検証分科会や委員会で工法の見直しについて議論をする可能性あるということを委員会の委員長が説明していたことをここで確認・共有しておきたい。
	・[コーディネータ]効果検証と関連するが、1年目から完璧な状態にすることは難しく、現場の状況に対応しながら少しずつよくなっているという評価であると思う。もちろん課題もある。 ・[コーディネータ]先ほどの市民からの意見に関連するが、事業の目標がどのぐらいで今どのレベルにいるのか、100 のうち 20 達成されたのか 30 達成されたのか、そういう見せ方を工夫する必要がある、ということが委員会でも指摘されている。事務局はしっかりと表現の仕方を検討していくと思う。

表－ 4.80(4)　2016(H28)年度の市民との主な協議事項(第 34 回市民談義所)

市民からの主な意見	
・浜山コンクリート護岸の工事について、消波ブロックは、今ようやく埋まってきているが、そこに消波ブロックを追加する、ということか。 ・過去に消波ブロックが設置されたときには護岸の前の砂浜が消波ブロックで覆われてしまい、動物園東の自然浜から南側の砂浜にいけなくなった。今回、消波ブロックを追加することにより、また、南側の砂浜にいくことができなくなるのではないかと心配している。 ・ある程度の将来予測はしていて、それを踏まえて消波ブロックを置くということが決定事項という認識でよいか。	
・浜山コンクリート護岸が壊れたということについて、設計基準やその安全率についてどのように考えているのか。	
・私の読んだ書物においては、砂に強い草が砂嘴をつくって、それが発達して砂浜ができていると書かれていた。また、豊島修先生は砂防や海岸を扱う者は、「草を生やして一人前」、「天然の砂浜にまさる施設はない」とおっしゃっていたが、今の現場を見たら草が生えていない。	
・アメリカでは、砂はいろいろなところにあり、陸送も容易であることから容易に砂が確保できるため単純に比較はできないが、宮崎海岸では圧倒的に養浜の絶対量が足りないと思う。	
・ダムから土砂がでてくる可能性はあると思うが、河道内に滞留するためすぐには出てこないことも考えられる。養浜が足りない場合の策も考えておくべきではないか。	
・砂の供給は、本来ならば前浜から行うべきであるのに、どうして後ろから入れるのか。余計な費用がかかっているのではないか。	
・千葉県の九十九里浜に行った。昔は突堤があったが今は突堤がなくなっていた。突堤は効果がないのではないか。また、海岸工学の書物を読んだが、今、宮崎海岸で実施していることと違っていると感じた。さらに、赤江海岸でも突堤は失敗している。それでも突堤を実施していくのか。	
・一ッ瀬川の導流堤は堤長が長いが、大きく迂回しているのか。本突堤 300mの延伸を考える上で調べておくことが必要ではないか。 ・侵食対策が完了し、浜幅 50m が回復することによって、漁をする水深帯も沖合に出るということも考えて、漁業者に説明をしなくてはいけないと考える。	
・漁業者に対して、背後地住民の防災、安全性の確保が必要であることも強く伝えて欲しい。国土保全、防災の観点が最も重要であると思う。	

	事務局回答
	・護岸にあたる波の力を弱めるために、もとの高さまで消波ブロックを積み増すことを考えている。 ・突堤が完成し砂がついてくれば、将来的には砂がついてくるだろうという見込みである。
	・平成 27 年に護岸が被災したときの波高データは設計基準以下であった。調査の結果、砂を運ぶうねりが長期間にわたって作用していたことがわかり、これが被災要因のひとつであったと考えている。設計基準以下の波高で被災していることから、護岸の高さ自体はもとの高さを確保することが妥当と判断した。
	・（技術分科会長）植物は飛砂を抑制する効果はあり、ある程度浜がある砂浜において、風が吹いて砂が飛ばされることを抑制する効果は植物に期待することはできる。ただし、浜のないところに植物が生えて、そこに砂がついてくる、といった事例は聞いたことがない。ある程度砂浜が回復し、ドライなところが確保された後に植物が生え、それが少しずつ浜を増やしていく効果をもたらす、そういうことか思う。
	・養浜砂の確保については、宮崎県の河川改修で発生した土砂の活用など、県内関係機関で構成する調整会議にて連携を行い、粒径等材料的なものも考えながらコスト縮減を図りつつ実施しているところである。
	・長期的に養浜量が確保できるのかということについては継続的に検討しているところであり、海岸工学の専門家の意見をききつつ、現地の状況も確認しながら事業を進めて行きたいと考えている。
	・航路維持のための浚渫は船で砂を運ぶため、海中養浜を行っているが、陸上から養浜を行っている箇所もある。これらの効果については測量を行い、効果検証をしながら進めているところである。
	・（技術分科会長）赤江海岸では、十何年くらい前に台風で浜が大きく後退し、4 区間程度、突堤と離岸堤の複合したような施設が造られた経緯がある。その場所は宮崎空港が沖にせり出したこともあり、漂砂供給がほとんどなく、突堤でかろうじて汀線の維持を図っている。突堤が壊れて汀線がさらに後退しているということはなく、ぎりぎりのところで今どうにかこうにか頑張っている。同じような状況に宮崎海岸がならないように、宮崎海岸では突堤の基数、堤長、間隔を考えつつ、養浜も合わせて実施しているため、赤江海岸と同じ状況にならないのではないかと考えている。
	・漁業者から聞いた話であるが、一ツ瀬川の導流堤の南側までが漁区として定められている。チリメン漁は、宮崎港から一ツ瀬川導流堤までを網を曳き、そこで一旦網を曳くのをやめているため、導流堤を越えて漁はしていない、と聞いているが、事実確認は今後していきたい。

表－ 4.80(5)　2016(H28)年度の市民との主な協議事項(第 35 回市民談義所)

市民からの主な意見	
・普段、松林の間の歩道でウォーキングしている。砂浜がなくなって松林のところまで波がくるのを心配していたが、この事業により砂がとどまるということをきいて、事業を早く進めてほしいと思った。また、松が元気のないところもあるので松も元気になって歩きやすいようになればよいと思った。	
・昨年は緩傾斜護岸の前に波が直接あたっていたが、今日は砂浜があり、勾配も昨年より緩いように感じた。今日見た区間では砂がついてきている印象を受けた。	
・補助突堤の北側は砂浜がついているが、南側は波に洗われているように見えた。	
・養浜に道路工事や砂防工事で発生した粘性土などを使用することは難しいのか。今後、長い期間、養浜をやっていくことになると思うが、粘性土等を入れた場合にどのような影響があるかについてわかっていることがあれば教えてほしい。	
・以前の市民談義所で市民から提案されていた、投入した砂が抜け出しにくい透過構造の突堤についてはどう考えているか。	
・突堤 3 基で砂浜が回復するのか。いろいろな海岸工学の専門書で勉強しているが、例えば豊島修先生の著書の“実務者のための海岸工学”では「草を生やして一人前」と書かれている。しかし、今の現場では草が一本も生えていない。こういったことを担当技術者に指導してほしい。無駄な税金が使われているのではないか。私であれば 15km の海岸を 5 億円、半年の期間で砂浜を回復させることができる自信がある。	
・宮崎海岸の事業費はいくらなのか。公開されていないのではないか。	
・突堤と補助突堤①の間の養浜の効果や評価の仕方、シミュレーションと実測の比較をしてほしい。また、今は冬場なので砂のつくときだと思うが一番厳しい夏場でどうなるのかということを考えている。	
・みんなで談義して効果が出たところを少しずつ評価し、本当に正しいかどうかわからないかもしれないが、現時点でわかるところを評価していくのが良いと思う。	
・昨年の現地見学会時には、磯に棲むタカアシガニの死骸が打ち上げられていたことから、この海岸が磯のような環境であったと考えられる。今日は貝やゴミが打ちあがっていたため、磯のような環境から脱しつつあると考えられるが、砂浜に棲むカニは見られなかった。砂浜に棲むカニが見られるようになれば砂浜が回復したと評価できると考えている。	
・今日見たら浜山護岸の前には 40m 程度の広い砂浜があった。養浜もしているとの説明であったが、突堤の区間には砂がほとんどなく、浜山護岸の前だけに砂浜があることにびっくりした。また、補助突堤①の南側にも養浜がされていたが、川からの土砂がなければ養浜した砂もいずれなくなるのではと思った。	
・災害復旧は原型復旧、ということは理解しているが、ちょっとした修正や変更はできるはずである。談義所で意見を聞きながらやっているので、それが反映されていないことは残念に思った。	
・今後砂浜が定常的に付いてくると、コンクリート護岸が砂浜の中で浮いてしまうようになると思うので、好ましくないのではないか。	
・突堤の予定は「状況によっては実施」となっている。事業はあと 10 年くらいと思うが、今のような漁業者等関係者との調整状況で今後突堤を造っていくことはできるのか。突堤は事業のかなめだと思うのでしっかりと取り組んでほしい。	
・新しくできた看板(一ッ葉 PA 内の看板)には一ッ葉 PA 付近の海岸名が「住吉海岸」と書かれているが直轄事業区間は「宮崎海岸」と呼ぶことで統一したように記憶している。海岸名表記が混在しているのではないか。 ・この海岸は白砂青松百選では「一ッ葉海岸」とされている。	
・突堤の周辺や動物園東ではサーフィンが盛んに行われているため、サーファーから砂のつき方などの情報も挙げてもらい、共有することが必要と思う。漁業の操業についても情報の共有が必要と思う。	
・流砂系についてであるが、突堤に砂がついても流砂系が進んでいかなければ、養浜をし続けなければならなくなる。海岸については議論が良くされているように感じるが川の流砂系については足踏みしているように感じる。海岸サイドから河川サイドにプッシュするようなことも考えたほうが良いのではないか。	

	事務局回答
	・宮崎海岸は全体的に北から南へ砂が動いている。この砂の動きを制御するために突堤を設置している。一方、突堤で砂を止めるとその南側は砂がつきにくい状態になると考えている。これに対しては養浜により適宜対応していく計画である。
	・シルト分では粒径が細かくてとどまりにくいことや、大きい粒径はウミガメの産卵にも影響がある可能性があることなどから、現在は砂を用いている。ただし、サンドパックの陸側には粘性土等も使えると考えている。また、砂以外の土砂についても影響を確認しながら有効活用することを今後考えていきたい。
	・さまざまな検討を行った結果、短期かつ効果的に砂をためるために不透過構造を採用している。
	・[コーディネータ]植生が生える、ということについては、これまでも談義所で議論してきたが、草が生えたから砂がつくのではなく、砂浜が安定した結果として草が生える、ということを共有してきている。事業にかけているお金についても談義所、委員会、技術分科会、効果検証分科会で議論しながらステップアップの考え方で確認しながら進めてきており、決して無駄に税金が使われているわけではない。 ・宮崎海岸では北から南に向かう砂の流れがあるため、それを制御し、砂浜を回復して背後地を守る計画である。この計画では突堤 300m、補助突堤①150m、補助突堤②50m と 280 万 m3 の養浜で浜幅 50m を回復することをシミュレーション等も行い、設定している。埋設護岸は国土保全の観点から砂浜が回復するまでの期間に浜崖頂部が低下しないように設置しているところである。この 3 点セットで景観や利用も考えながら事業を進めている
	・九州地方整備局のホームページで年度ごとの事業費を公開している。
	・[コーディネータ]事業の効果の見せ方については委員会等でも意見が出されており、みんなでいかにして情報を共有するかということが非常に重要であると思う。今後の談義のテーマのひとつであると感じているところである。どういった見せ方が良いかということや工夫の仕方について意見があれば今後の談義所でも意見を挙げてほしい。
	・浜山護岸の南側は護岸が海側に少し出ているので、突堤のように砂を止める効果があると考えている。昨年も冬場には砂が少しついていた。さらに今年は補助突堤②も設置したため、今日は浜が広かったとも考えられる。砂は北から南に流れているが、砂がないと回復しないので養浜は必要であると考えている。
	・砂がついた後にコンクリート護岸をどうするのか、ということについてはまだ議論をしていない。今後、どうして行くのかを議論すべきと個人的には感じているところである。
	・全体の計画は第Ⅰ期～第Ⅲ期まである。現在は計画の中の第Ⅰ期であり、「突堤 3 基に着手する」という計画である。第Ⅱ期は平成 30 年度からであり、それまでの間に効果・影響をしっかりと把握し、利用に支障を与えないようなことについて協議をしていく。突堤の延伸は第Ⅱ期から効果検証により生物環境への影響も確認しながら順次進めていくことを考えている。
	・国の事業としての対象区間を「宮崎海岸」と呼んでいる。一方、いろいろな呼び名があり、それに基づいた法定文書も出されているため、それぞれの段階で設置された看板の表記に齟齬が出ている。わかりやすいことが重要だと思うので統一することを検討していきたい。 ・[コーディネータ]過去に勉強会をやっていたときに、海岸の呼び名について多く議論がなされた。海岸事業としては「宮崎海岸」であるが、海岸の呼び名はそれぞれの思い入れがあるということと認識している。
	・[コーディネータ]海岸に対していろいろなかかわり方をしている人が一緒に海岸を歩いて談義することは非常に重要だと思うので、今後もそのような機会を設けてほしい。
	・流砂系はいろいろ難しい課題もあるが、長期的にはしっかりと考えていかなければならないと認識している。特に利用者との調整も必要であり時間もかかると考えている。養浜についてはコストをいかに安くするか、ということが大きな課題であり、流砂系全体の中で議論しながら模索しており、現在も検討中であると認識してほしい。流砂系の検討状況は今後も逐次、報告していく。

表－ 4.80(6)　第 35 回市民談義所における付箋紙に記入いただいた意見

分類	記載内容
事業の進め方	事業の見通し（資料）を見ると「状況によっては実施とあるが要の突堤がそんな状況では50mは無理だ。
	50m復活には、突堤が絶対必要であり、いかに早く漁業の方々の了承を得るかが課題。現在どうなっているのか。
	初めてとっていを見てこんなことをやっているんだなと感じました。今まで知らなかったので知れてよかったです。
	あと10年、国の工事の期間で300mの突堤が出来ますかね。無理っぽい。
浜山護岸	熊本地震の災害復旧に関与していますが、原形復帰しかダメという中でいろいろ工夫して良いものをつくる努力をしている。
	1年ぶりに参加して県の災害復旧地点のパラペットがなくなっているので工法を変えたのかと喜びましたが、更に高いパラペットを作るのですね。
	林務災害の防潮堤が異物となるような砂浜再生を願う。
	砂が40m位ついていたのはびっくり。50m復元の位置も教えてもらって頭の中に入れました。
流砂系	150m（現42m）の隣に50mの養浜中を見て川からの砂が無いので近い将来なくなるのでは…と憶測する。
その他	立ふだを見ると宮崎海岸と住吉海岸が混在している。
養浜	突堤間の養浜を今後増やしていくのか？
	砂利や粘性土もどんどん養浜に使うのはまだ厳しいですか？（道路工事、砂防工事）
	突堤の南側が砂が流されている気がする。
砂浜	寝ていると波の音が聞こえます。砂の留まる方法に安全不安が減ってきます。松林の歩道の改善（影が増える）歩きやすくなることを楽しみにしております。
	砂の付き方を見守りたい。
	砂が思ったより着いていてよかった。継続（維持）出来ることを願う。引き続き事業に努力します。
	昨年1月の見学に比べ砂が増えた印象です。
	突堤の北側は養砂されている気がする。
突堤	入れた（入ってきた）砂が抜け出しにくい突堤の構造が必要では？
	突堤3基で砂が堆積するのか疑問である。砂の堆積には植生が自生する工法が必要
サンドパック	サンドパックの不等沈下は解決済みですか？
効果・見せ方	本突堤と第1突堤の美浜効果検証してください。
	浜幅50mのラインをブイで示すと理解しやすい、ある測点間隔で
	突堤の効果をどう評価しますか？
	現場に来ることで砂浜の状況を自分の目で見ることが出来、良かったです。
	国の事業期間中に有料道路の安全性はどう評価できますか？
	本突堤、第1、第2突堤でのシミュレーションし実際の砂浜の比較を次の談義所で示して欲しい。
	風向きと強さ砂の流れに分析が必要と思いますか。
	今回の突堤3基で（①75m+②45m+③50m）どれくらいの効果が出るか推移を見守りたい。
	砂にカニが住みだすと評価できる
	沖は波がなさそうなのに岸では砕けて砂が動いていく。砕け方も北からもあれば南からもあり簡単に説明できない難しさ。

第5章　目視点検における指標設定及び分析すべき指標の洗い出し

5.1 目視点検

1) 調査結果で確認する指標と現象

(A) 指標

- 養浜形状の変化
- 被覆ブロック及び捨石の移動
- 覆土地形の変化
- 護岸の破損及び変状
- 護岸越波

(B) 現象

- 現地で海岸の状況を点検し、問題が生じていないか確認する。

計画変更につながる可能性がある現象
養浜形状が変化し、応急対策の袋詰石が露出、移動する。
被覆ブロック・捨石が移動し、施設形状が変形する。
覆土地形が流出して護岸が露出する。
護岸が破損、変状して材料が流出する。
波が護岸を越えて浜崖に作用する。

2) 調査位置

- 一ツ瀬川～住吉海岸離岸堤とする。
- 特に、突堤天端及び法面(陸上部)、埋設護岸設置箇所に注視する。

3) 調査時期

- 通年(月 2 回以上)とする。

4) 調査結果の整理方法

- 月 2 回以上、宮崎海岸出張所職員による巡視を実施とする。
- 2015(H27)年度より巡視を業務として委託している。
- 変状を確認したら、一覧表に整理する。

5)　指標範囲の検討

- 指標タイプは定性評価とする。

表－ 5.1　海岸巡視日誌（巡視内容記録表及び巡視結果記録票）の例

別表－３－１

海岸巡視日誌（巡視内容記録表）

宮崎海岸出張所

●実施日　平成25年2月6日　（水）　天候　：　晴れ

巡視員	水上　誠
	堀之内　亨　太

●実施した巡視の内容

	巡視内容	巡視ルート / 巡視範囲 / 巡視場所	巡視手段
午　前（9:00 ～ 12:00）	海岸保全施設の管理状況及び不法行為等の状況	ｰツ葉有料道路ｼｰｻﾞｲﾔIC立体交差～動物園東～石崎川右岸河口 / 2k006～7k023 /	徒歩
午　後（13:00 ～ 16:00）	海岸保全施設の管理状況及び不法行為等の状況	石崎川左岸河口～大炊田工事用道路～宮崎市佐土原町浄化ｾﾝﾀｰ / 8k331～10k170 /	徒歩

●確認事項

No,	確認位置					記事
整理番号 1	海岸	海浜	2k100 ～	浜辺		突堤工事の土砂投入状況
2	海岸	海浜	2k350 ～	浜辺		有料道路ｽﾛｯﾌﾟ壁面の落書き
3	海岸	海浜	4k400 ～	浜辺		養浜工事の土砂投入状況
4	海岸	海浜	4k400 ～	浜辺		鳥(ｳﾐﾈｺ)
5	海岸	海浜	4k500 ～	浜辺		海岸利用者(ｻｰﾌｨﾝ11名)
6	海岸	海浜	4k800 ～	浜辺		鳥の死骸
7	海岸	海浜	5k100 ～	浜辺		海岸利用者(散歩1名)
8	海岸	海浜	5k200 ～	浜辺		浜崖の後退
9	海岸	海浜	5k500 ～ 5k800	浜辺		浜砂の流出
10	海岸	海浜	6k200 ～	浜辺		海岸利用者(釣り1名)
11	海岸	海浜	8k700 ～	浜辺		海岸利用者(ｺﾞﾙﾌ練習1名)
12	海岸	海浜	8k900 ～	浜辺		浜崖の形成
13	海岸	海浜	9k400 ～ 9k900	浜辺		養浜工事の袋詰め石露頭補修
14			～			
15			～			
16			～			
17			～			
18			～			
19			～			
20			～			

出張所長	事務係長	技術係長

【摘要欄】
指示事項　：　本庄出張所　矢野所長が同行
午前　干潮、風向き　東、波向き　東、波高さ　H=1,000
午後　満潮、風向き　東、波向き　東、波高さ　H=1,450
※14:40:津波注意報発令

別表－３－２

海岸巡視日誌（巡視結果記録票）

整理番号
9

記録日	平成25年2月6日	曜日	時刻
記入者	堀之内　亨　太	（水）	11:25

位置図見取図

大項目	（2）海岸保全区域の土地の形状の把握
中項目	(2)_ア　土地の形状(海岸の侵食を含む)
小項目	

区域	区分	位置
海岸	海浜	5k500 ～ 5k800

記事	浜辺	
	波浪の影響による浜砂の流出状況を確認した。	

出張所の判断

処置経過

処置日	記入者	処置（対応）

関係者・関係機関

関係者名	連絡先

写真１

5k500

写真２

5k800

6) 調査結果と指標範囲の比較結果

- 2016(H28)年度は、2016(H28)年 4 月 14 日から 2017(H29)年 3 月 27 日の間に計 51 回、巡視により目視点検を実施している。
- 目視点検の結果により、動物園東①、大炊田海岸①・②ブロックにおいて、養浜・覆土地形の変化、埋設護岸の変状につながる可能性のある事象（サンドパック、As マット、G マットの露出）、動物園東②、石崎浜②ブロックにおいて養浜箇所の侵食を確認した。

表－ 5.2　海岸巡視による防護に関する目視調査結果
(2016(H28)年 4 月 14 日～2017(H29)年 3 月 27 日)

巡視回	2016(H28)年度	大炊田海岸③	大炊田海岸②	大炊田海岸①	石崎川	石崎浜②	石崎浜①	動物園東②	動物園東①	補助突堤②北	補助突堤①北	突堤北
1	4月14日			SPの露出					SP露出			
2	4月20日											
3	4月28日											
4	5月6日											
5	5月12日											
6	5月18日								南端復旧工事			
7	5月24日											
8	5月31日											
9	6月8日		SP北端・袋詰め玉石露出									
10	6月14日											
11	6月22日											
12	6月28日								SP露出			
13	7月5日		ガリ侵食，袋詰め玉石露出	養浜箇所ガリ侵食，SPの露出								
14	7月12日					養浜箇所ガリ侵食			SP・GM露出，養浜箇所ガリ侵食			
15	7月19日								SP・GM露出，養浜箇所ガリ侵食			
16	7月26日								SP・GM露出			
17	8月2日			SP露出								
18	8月9日											
19	8月16日											
20	8月24日			養浜箇所侵食，SP露出					SP露出，養浜箇所侵食			
21	8月30日								SP・GM露出，養浜箇所侵食			
22	9月5日							養浜箇所侵食				
23	9月13日											
24	9月21日					養浜箇所侵食						
25	9月27日		ガリ侵食，SP北端露出						SP・GM・AM露出，養浜箇所侵食			
26	10月6日											
27	10月12日											
28	10月18日							養浜箇所侵食	SP露出，養浜箇所侵食			
29	10月25日		ガリ侵食，養浜箇所侵食，SP露出						SP露出			
30	11月1日								SP・GM露出，養浜箇所侵			
31	11月8日							養浜箇所侵食	SP露出			
32	11月15日								SP露出，養浜箇所侵食			
33	11月22日											
34	11月29日								SP・AM露出，養浜箇所侵食			
35	12月6日											
36	12月14日											
37	12月20日											
38	12月27日		SP北端露出									
39	1月5日								SP露出，養浜箇所侵食			
40	1月11日											
41	1月17日											
42	1月24日											
43	1月31日											
44	2月7日											
45	2月14日											
46	2月21日											
47	2月28日			養浜箇所侵食								
48	3月7日					養浜箇所侵食						
49	3月14日											
50	3月21日											
51	3月27日											

：範囲外↑↓

≪参考：2015(H27)年度の目視点検結果≫

- 2015(H27)年度は、2015(H27)年 4 月 1 日から 2016(H28)年 3 月 29 日の間に計 52 回、巡視により目視点検を実施している。
- 目視点検の結果により、動物園東①、大炊田海岸①・②ブロックにおいて、養浜・覆土地形の変化、埋設護岸の変状につながる可能性のある事象（サンドパック、As マットの露出・変形）、動物園東②、石崎浜②ブロックにおいて浜崖侵食、補助突堤②北ブロックにおいて既設 Co 護岸の被災を確認した。
- また、過年度より突堤北ブロックにおいて確認されていた突堤の被覆ブロックのズレ(移動・沈下)について、目視点検とは別に 2015(H27)年 6 月 17 日に実施された突堤のブロック変状調査結果によると、図－ 5.1 に示すように突堤側面に設置している被覆ブロックの下層部で移動が生じてブロック間に開きが出てきていることが確認された。
- また、2015(H27)年 12 月 2 日に本突堤近傍上空から撮影した写真－ 5.1 によると、突堤先端近くの被覆ブロック未設置箇所において、天端上の捨石が大きく移動していることが確認された。捨石は、先端部に仮設しているブロックの陸側が掘れてその陸側が盛り上がっていることから、波の打ち込みにより陸側に移動したものと推察された。

≪参考：2014(H26)年度の目視点検結果≫

- 2014(H26)年度は、大炊田海岸では、4 月にガリ侵食およびサンドパック・As マットの露出を確認した。7 月には砂の堆積を確認したものの、8 月に別途現地踏査により埋設護岸の変状を認めたあと、10 月～12 月にも As マットの露出やサンドパックの変状を確認した。動物園東では、10 月に砂丘の侵食を確認した。また、1 月には、石崎浜～突堤北の広い範囲で、護岸の前面に砂が堆積しているのを確認した。

表－ 5.3(1)　海岸巡視による防護に関する目視調査結果

(2015(H27)年 4 月 1 日～7 月 29 日)

	2015(H27)年度	大炊田海岸③	大炊田海岸②	大炊田海岸①	石崎川	石崎浜②	石崎浜①	動物園東②	動物園東①	補助突堤②北	補助突堤①北	突堤北
1	4月1日											
2	4月15日		養浜材の侵食状況を確認	養浜材の侵食状況を確認 (H=3.0m) ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ下段の露出を確認					養浜材の侵食状況を確認 (H=3.0m)			
3	4月22日			アスファルトマット露出有					ガリ侵食有			
4	5月1日		浜天端部路肩が4/30の雨天によりガリ侵食発生（応急処理にて施工した範囲）	浜天端部路肩が4/30の雨天によりガリ侵食発生（応急処理にて施工した範囲）		石崎浜南端付近にて侵食による段差発生確認			浜天端付近及び通路が4/30の雨天によりガリ侵食発生（応急処理にて施工した箇所） 浜辺へ流れる排水土管周りの侵食発生			
5	5月7日			浜天端部路肩がガリ侵食発生（応急処理にて施工した範囲）					浜崖天端部及び浜辺へ流れる排水土管周りの侵食が前回と同等			
6	5月14日			浜天端部路肩がガリ侵食監視継続（応急処理にて施工した範囲）					浜崖天端部及び浜辺へ流れる排水土管周りの侵食が前回と同等			
7	5月20日			前日の雨によるガリ侵食（前回と同等）					波浪による侵食有 浜崖天端部及び浜辺へ流れる排水管周りの侵食（前回と同等）			
8	5月27日			波浪が原因と思われるサンドバックの露出を確認					波浪が原因と思われる養浜材の消失状況を確認			
9	6月3日		雨によるガリ侵食を確認 (H=400 W=1000)	雨によるガリ侵食を確認								
10	6月10日			雨によるガリ侵食を確認					雨によるガリ侵食を確認 (H=1500 L=50m)			
11	6月17日			雨天によるｶﾞﾘ侵食を確認								
12	6月24日		波浪が原因と思われるｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸの露出を確認	波浪が原因と思われるｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸの露出を確認 (L=200m)					波浪が原因と思われるｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸの露出を確認			
13	7月1日											
14	7月7日								雨天が原因と思われるｶﾞﾘ侵食を確認 (L=100m)			
15	7月13日								波浪が原因と思われるｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄの露出 ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸの変形を確認			
16	7月22日			波浪が原因と思われるｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄの露出を確認					波浪が原因と思われる法面の崩壊・養浜材の露出を確認	既設Co護岸歩道部分の陥没、波返しからの乗離状況を確認		
17	7月29日											

：範囲外↑↓　　侵食・後退に関する事象　　堆積・前進に関する事象　　サンドパック変状、浜崖侵食など対応が必要な事象

表－ 5.3(2)　海岸巡視による防護に関する目視調査結果

(2015(H27)年 8 月 5 日～12 月 28 日)

	2015(H27)年度	大炊田海岸③	大炊田海岸②	大炊田海岸①	石崎川	石崎浜②	石崎浜①	動物園東②	動物園東①	補助突堤②北	補助突堤①北	突堤北
18	8月5日			波浪が原因と思われるｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸの沈下状況を確認					雨天・波浪が原因と思われるｶﾞﾘ侵食状況を確認（経過監視箇所）			
19	8月12日											
20	8月19日					波浪での侵食による防風林の転落状況を確認						
21	8月26日			ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ(SP24)の上段・海側下段の沈下状況を確認 ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ(SP35)の上段・海側下段の沈下状況を確認					波浪が原因と思われるｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄの露出を確認 波浪が原因と思われるｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄの露出を確認 台風による浜崖侵食状況を確認			
22	9月4日			波浪によるｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸの変形状況を確認								
23	9月9日							波浪が原因と思われる浜崖の消失状況を確認				
24	9月16日		波浪が原因と思われる砂の消失状況を確認	SP24～29,SP32～34,SP36・37の範囲で、ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ周辺に砂がついているのを確認					波浪が原因と思われるｶﾞﾘ侵食状況を確認(経過監視箇所)			
25	9月25日			SP24～29,SP32～34,SP36・37の範囲で、ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ周辺に砂がついているのを確認				波浪が原因と思われる砂の流出による緩やかな段差の形成を確認(H=1m,W=2m)	SP4～7までの範囲で、ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ周辺に砂がついているのを確認			
26	9月30日							波浪が原因と思われる砂の流出による段差の形成を確認(H=1.6m,W=1m) 波浪が原因と思われる浜崖の侵食を確認				
27	10月7日											
28	10月14日								波浪による浜崖の侵食を確認			
29	10月21日			波浪が原因と思われる砂の流出を確認				松の倒木状況を確認	砂の流出によるｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄの露出を確認 松の倒木状況を確認			
30	10月28日			砂の流出によるｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄの露出を確認					砂の流出によるｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄの露出を確認			
31	11月4日			砂の流出によるｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄの露出を確認					砂の流出によるｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄの露出を確認 SP11のｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸの沈下状況を確認			
32	11月11日			カスプ(SP18～SP23)の状況を確認					カスプ(SP8～SP11)の状況を確認			
33	11月19日		雨天によるｶﾞﾘ侵食状況を確認	カスプ(SP16～SP20)の状況を確認 カスプ(SP45～SP52)の状況を確認		雨天によるｶﾞﾘ侵食状況を確認			カスプ(SP8～SP11)の状況を確認			
34	11月25日			雨天によるｶﾞﾘ侵食状況を確認 カスプ(SP16～SP20)の状況を確認		雨天によるｶﾞﾘ侵食状況を確認		雨天によるｶﾞﾘ侵食状況を確認				
35	12月2日			カスプ(SP45～SP49)の状況を確認								
36	12月9日											
37	12月17日											
38	12月24日											
39	12月28日			ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸの露出状況を確認								

：範囲外↑↓　　侵食・後退に関する事象　　堆積・前進に関する事象　　サンドパック変状、浜崖侵食など対応が必要な事象

表－ 5.3(3)　海岸巡視による防護に関する目視調査結果

(2016(H28)年 1 月 5 日～3 月 29 日)

	2015(H27)年度	大炊田海岸③	大炊田海岸②	大炊田海岸①	石崎川	石崎浜②	石崎浜①	動物園東②	動物園東①	補助突堤②北	補助突堤①北	突堤北
40	1月5日											
41	1月13日											
42	1月20日											
43	1月28日											
44	2月3日											
45	2月10日											
46	2月19日								悪天候（大荒れ）により浜辺の砂の流出状況を確認			
47	2月24日											
48	3月2日								砂が戻ってきて、砂浜に突出していた排水管であるヒューム管・巻立コンクリートがかくれた			
49	3月10日		波浪による法面侵食を確認	波浪による法面侵食を確認				養浜箇所で、波浪による法面侵食を確認	波浪による法面侵食・サンドパック露出・アスファルトマット露出を確認 砂浜の砂流出による排水管のヒューム管・巻立コンクリート露出を確認			
50	3月16日							養浜箇所で、波浪による法面侵食の進行を確認	波浪による法面侵食の進行を確認 砂浜への砂流入によりアスファルトマット露出箇所は埋没している			
51	3月23日											
52	3月29日			波浪によるサンドパック露出を確認					砂浜の砂流入によるアスファルトマットの埋没を確認 波浪による法面崩壊がさらに進行しており天端の崩壊を確認 砂浜の砂流出による排水管のヒューム管の露出を確認			

：範囲外↑↓　　侵食・後退に関する事象　　堆積・前進に関する事象　　サンドパック変状、浜崖侵食など対応が必要な事象

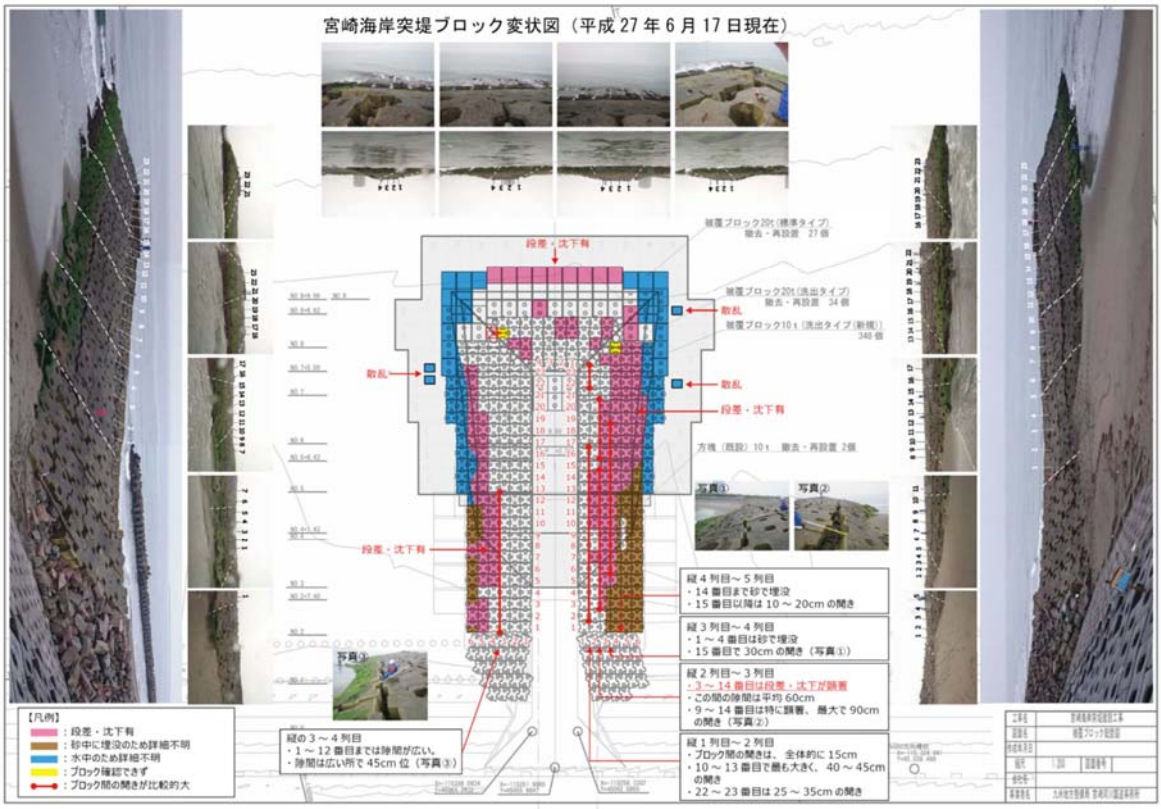

図－ 5.1　突堤ブロック変状図

（H27 宮崎海岸モニタリング環境調査業務，2015(H27)年 6 月 17 日調査）

写真－ 5.1　本突堤天端の捨石移動状況（2015(H27)年 12 月 2 日撮影）

第6章　分 析

6.1 海象・漂砂 6-3

6.2 測量 6-15

6.3 環境・利用 6-51

6.4 目視点検 6-89

6.1 海象・漂砂

海象・漂砂に関する指標において、指標に設定した範囲の範囲外となった項目は、8項目中3項目（波浪(エネルギー平均波：波高・周期・波向)、風速、漂砂捕捉）であった。

以下に、設定範囲外となった指標についての分析結果を示す。

対象外 ー:非実施			小丸川周辺	一ッ瀬川左岸	一ッ瀬川右岸	二ツ立海岸	大炊田海岸③	大炊田海岸②	大炊田海岸①	石崎川
平成27年度侵食対策	養浜（万m³）			ー	ー	0.3(後浜)	ー	2.4(埋設護岸覆土)		ー
	突堤									
	埋設護岸							ー (L=1,580m)		
	関連工事			ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
平成28年度侵食対策	養浜（万m³）			ー	ー	0.5(後浜)	ー	2.9(埋設護岸覆土)		ー
	突堤									
	埋設護岸							機能復旧工L=260m (計L=1,580m)		
	関連工事			ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
海象・漂砂	外力関係	潮位								
		波								エネルギ
		風								
		流れ	ー	ー	ー	ー	ー	範囲内	ー	ー
	漂砂関係	漂砂捕捉								
		沖合流出土砂	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		飛砂	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		河川供給土砂	ー	ー	ー					

検証ブロック区分									
石崎浜②	石崎浜①	動物園東②	動物園東①	補助突堤②北	補助突堤①北	突堤北	県管理区間	港湾離岸堤	宮崎港
1.0(後浜)	ー	3.0 (後浜、埋設護岸覆土)		ー	2.1(海中)	-	-		
				ー	ー	ー (計75m)			
		ー	- (L=280m)						
ー	ー	ー	ー	護岸工事 (災害復旧)	ー	ー	ー	ー	ー
0.7(後浜)	ー	5.8 (後浜、埋設護岸覆土)		ー	0.8(汀線付近) 1.1(海中)	0.6(汀線付近)	-		
				L=50m (計50m)	L=42m (計42m)	天端被覆工 (計75m)			
		ー	L=440m (計L=720m)						
ー	ー	ー	ー	護岸工事 (災害復旧)	ー	ー	ー	ー	ー
範囲内									
ー平均波　波高、周期、波向：範囲外↓									
範囲外↓									
ー	ー	ー	範囲内	ー	ー	ー	ー	ー	ー
				ー	通過土砂無し	通過土砂有り			
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー

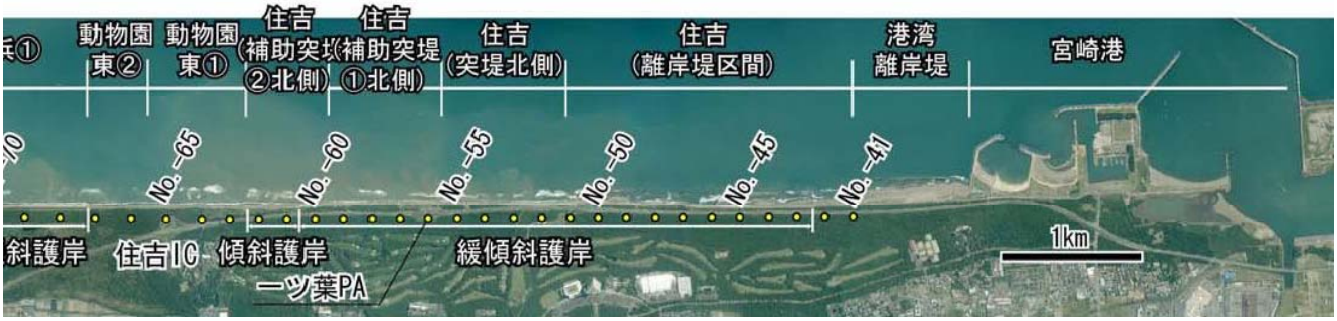

調　査　項　目	海象・漂砂	波浪観測		
要 分 析 指 標	エネルギー平均波			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	~~養浜~~	~~突堤~~	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- エネルギー平均波は、波高は小さく、周期は短く、波向は南よりからと、全ての項目が設定範囲外となる結果であった。これは、波高と周期に関しては 2016(H28)年に来襲する波が小さかった（有義波高 2m 以上の波が少なく、3m 以上の波はほとんど観測されていない）ためである。なお、波向に関しては近年の傾向が継続している状況ではあるが、北寄りにシフトしている。
- 近隣の波浪観測データによるエネルギー平均波の経年変化を確認すると、波高、周期、波向とも年変動が見られその変化傾向は似ている。近年(宮崎海岸(ネダノ瀬)観測開始の2010(H22)年以降)、傾向の一定な変化は見られない。よって、今後も観測を継続し、更なるデータ蓄積により、来襲波浪の変化状況を検証していく必要がある。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。

分析に用いた図表

■エネルギーフラックス比

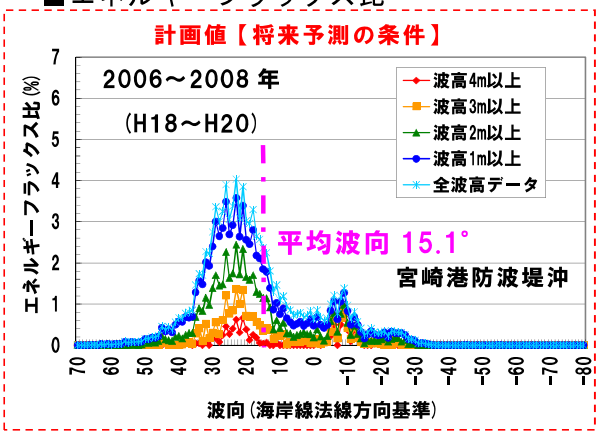

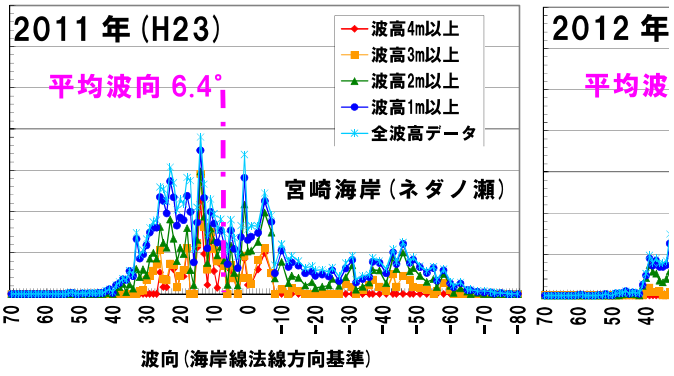

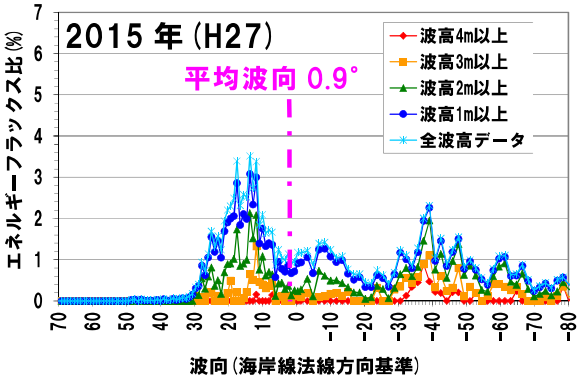

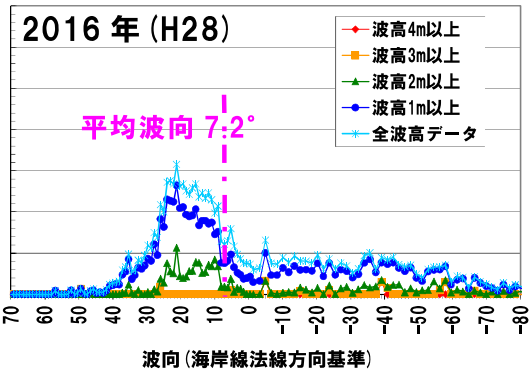

■宮崎海岸（ネダノ瀬）と近隣観測地点のエネルギー平均波の経年変化

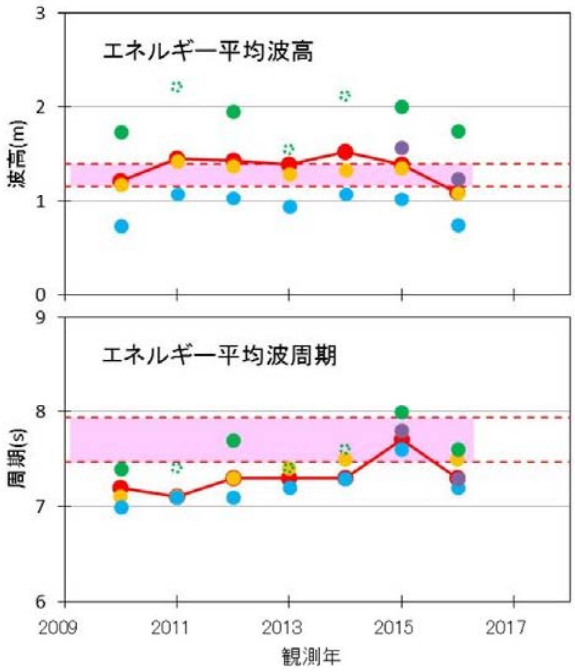

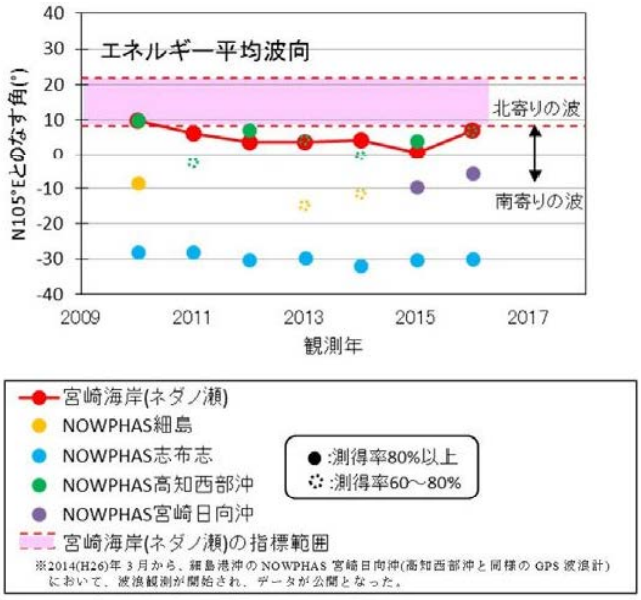

※宮崎海岸(ネダノ瀬)のエネルギー平均波諸元は
宮崎港防波堤沖地点への換算値を用いている。

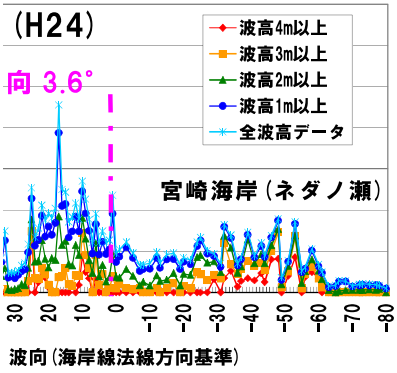

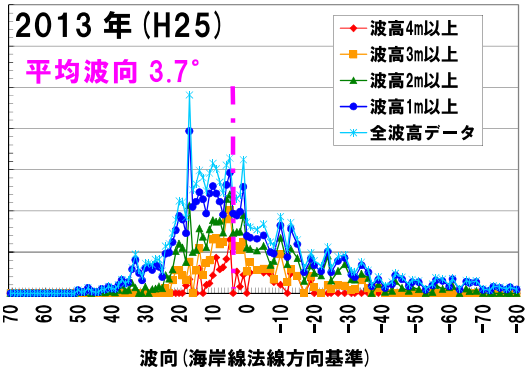

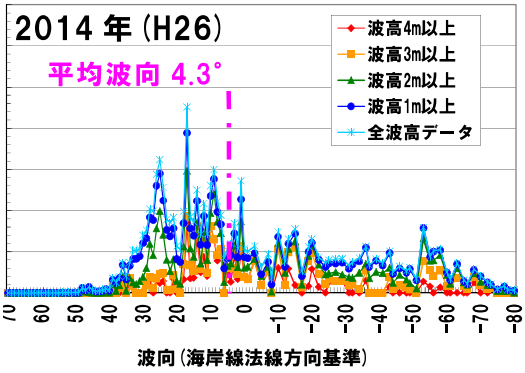

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
②要注視	対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

調　査　項　目	海象・漂砂	波浪観測		
要 分 析 指 標	エネルギー平均波			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	~~養浜~~	~~突堤~~	~~埋設護岸~~

■波高・周期時系列

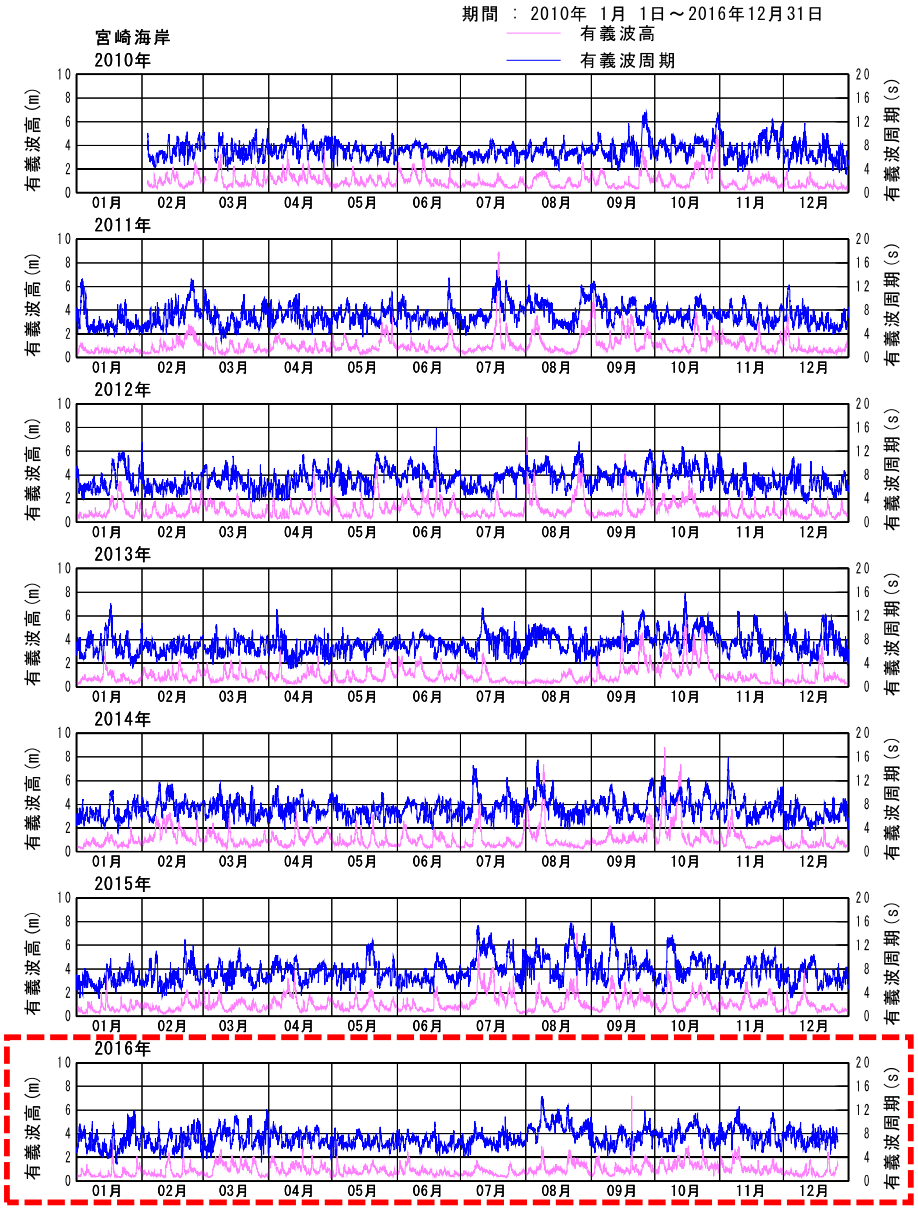

図　近年の有義波時系列(宮崎海岸(ネダノ瀬)観測波浪)

■年別エネルギーフラックス

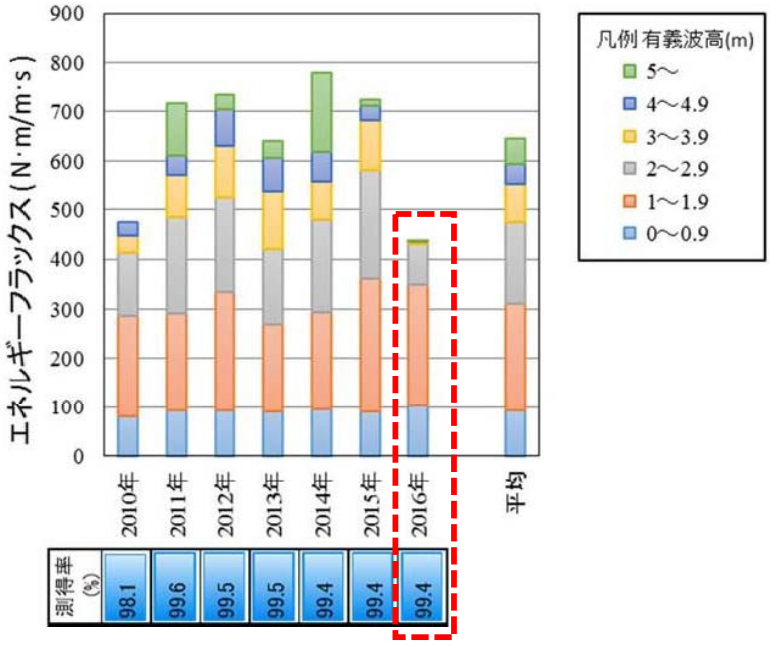

図　近年の年別エネルギーフラックス（宮崎海岸（ネダノ瀬）観測波浪）

調　査　項　目	海象・漂砂	風向・風速観測		
要 分 析 指 標	風向・風速の出現頻度			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	~~養浜~~	~~突堤~~	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 日平均風速が既往の知見で飛砂が発生する可能性があるとされている風速 8m/s 以上となる日数は設定範囲外(0 日)であった。
- 海岸背後の一ツ葉有料道路において、飛砂等による道路への被害や影響は無かった。
- なお、オフショア（陸から海方向への西風）の時に風速 8m/s 以上が 8 日観測されており、風速 8m/s 以上の出現状況だけで見ると、過年度と比較して来襲頻度が極端に減少しているといった傾向は見られなかった。
- 対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。

分析に用いた図表

■一ツ葉有料道路の飛砂による通行止め実績(1974(S49)～2016(H28)年)

平成28年7月(宮崎県道路公社提出資料に一部加筆)

年 度	月　日	飛砂による通行止めの実績	根　拠
S49	8月26日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
S51	9月21日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
S56	7月31日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
S57	8月27日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
S60	9月13日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
S62	9月8日	通行止め無し	飛砂除去工事を実施
H元	9月14日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H2	ー	通行止め無し	飛砂除去工事未実施
H3	10月15日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H4	8月8日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H5	8月9日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
〃	9月3日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H6	7月24日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H7	ー	通行止め無し	飛砂除去工事未実施
H8	7月18日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
〃	8月14日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H9	9月16日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H10	10月17日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H11	7月27日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
〃	9月24日	通行止めの有無は不明	飛砂除去工事を実施
H12	不明		
H13	不明		
H14	不明		
H15	不明		

年 度	月　日	飛砂による通行止めの実績	根　拠
H16	8月30日	通行止め有り	飛砂
〃	9月17日	通行止め有り	飛砂
〃	9月30日	通行止め有り	飛砂
〃	10月20日	通行止め有り	飛砂
H17	9月5日	通行止め有り	飛砂
H18	ー	通行止め無し	ー
H19	7月14日	通行止め有り	飛砂
H20	ー	通行止め無し	ー
H21	ー	通行止め無し	ー
H22	ー	通行止め無し	ー
H23	ー	通行止め無し	ー
H24	ー	通行止め無し	ー
H25	ー	通行止め無し	ー
H26	ー	通行止め無し	ー
H27	ー	通行止め無し	ー
H28	ー	通行止め無し	ー

※H11以前は工事台帳からの抽出しており、通行止めの実績は不明。
　ただし、当時を知る公社内職員への聞き取りによれば、すくなくとも昭和年代は料金を償還する観点から、飛砂による通行止めを行っていなかったとのこと。
※H12～H15は工事台帳からの判断が不明。
※H16以降は飛砂による通行止めの実績。H20以降は飛砂による通行止めの実績無し。

■赤江地点
風速時系列
（2010～2016 年）

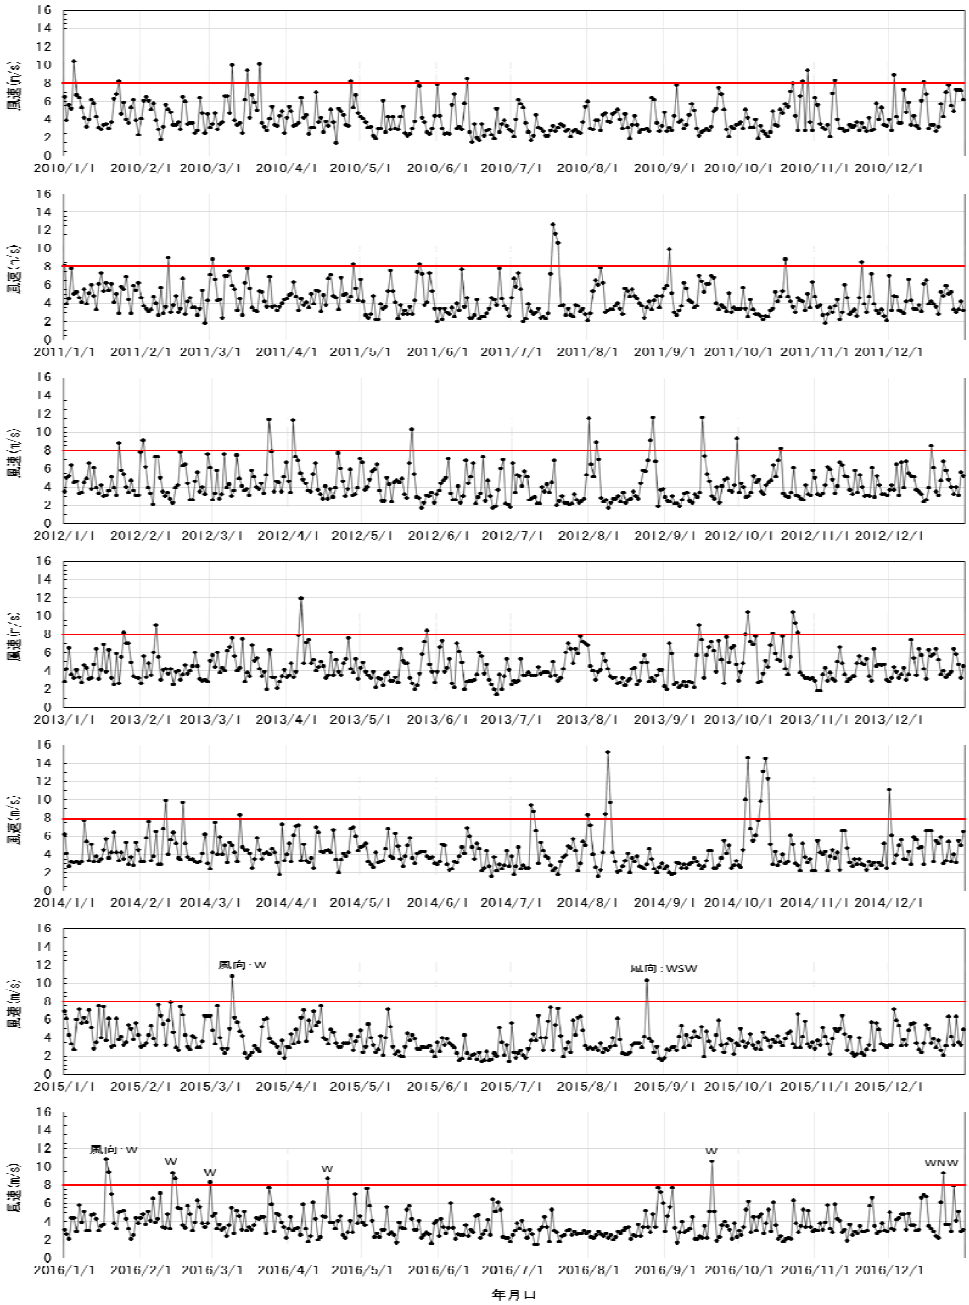

分　析　結　果

①要観察	対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

調　査　項　目	海象・漂砂	漂砂捕捉調査（トレーサー調査）		
要 分 析 指 標	突堤周辺の土砂移動			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	~~養浜~~	突堤	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 2016(H28)年 12 月～2017(H29)年 1 月の 2 ヶ月間（期間中の最大有義波高 2.46m）における本突堤および補助突堤①周辺のトレーサー調査結果によると、本突堤北側に投入した着色砂は、本突堤を越えた南側で検出されたが、補助突堤①北側に投入した着色砂は、補助突堤①の南側では検出されなかった。
- 調査期間中においては、補助突堤①を南側に越えるトレーサーは確認されていないが、調査期間前後の測量によると、突堤よりも沖側で地形変化が生じており、また、本突堤および補助突堤①ともに先端水深は T.P.-2～-3m と浅いため、現状では土砂は突堤を越えて移動しているものと考えられる。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。

分析に用いた図表

■突堤周辺の等深線変化(2016(H28)年 12 月と 2017(H29)年 2 月)

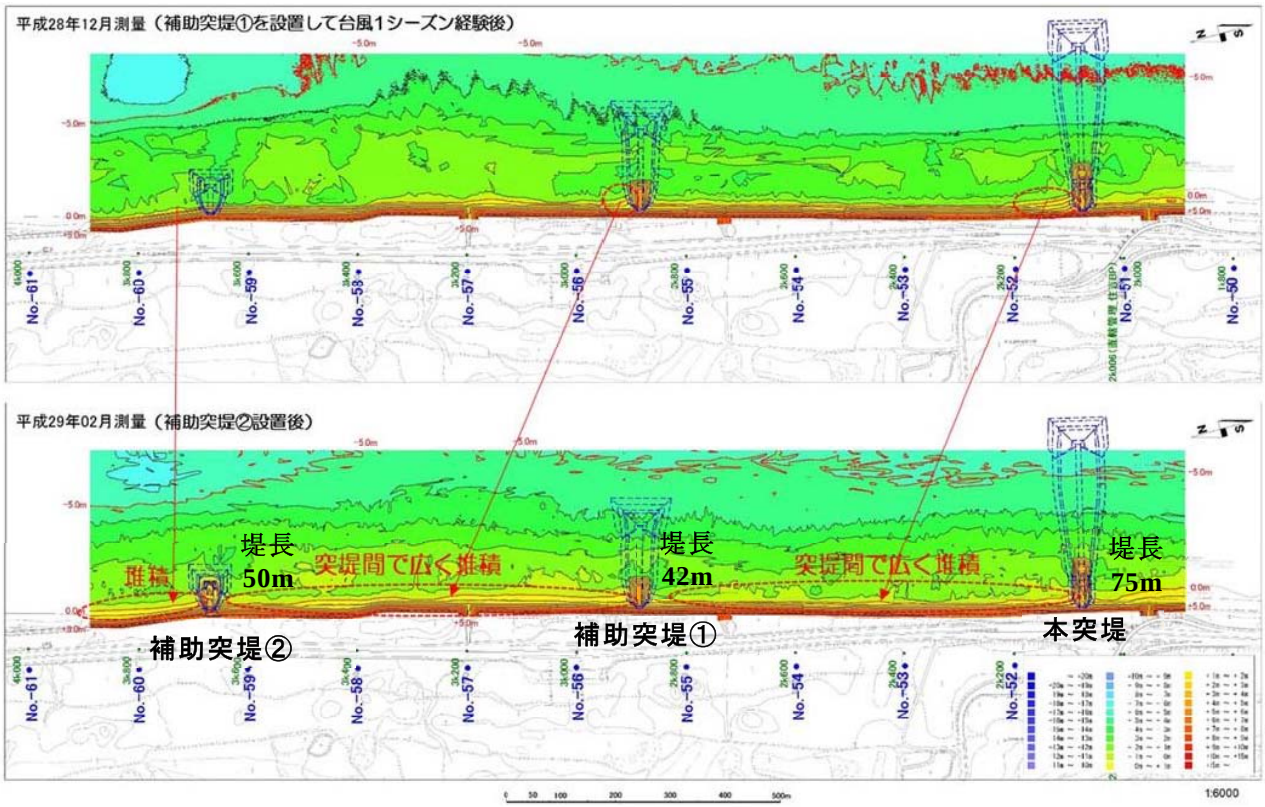

■調査期間中の外力(2016(H28)/11/30～2017(H29)/1/25)

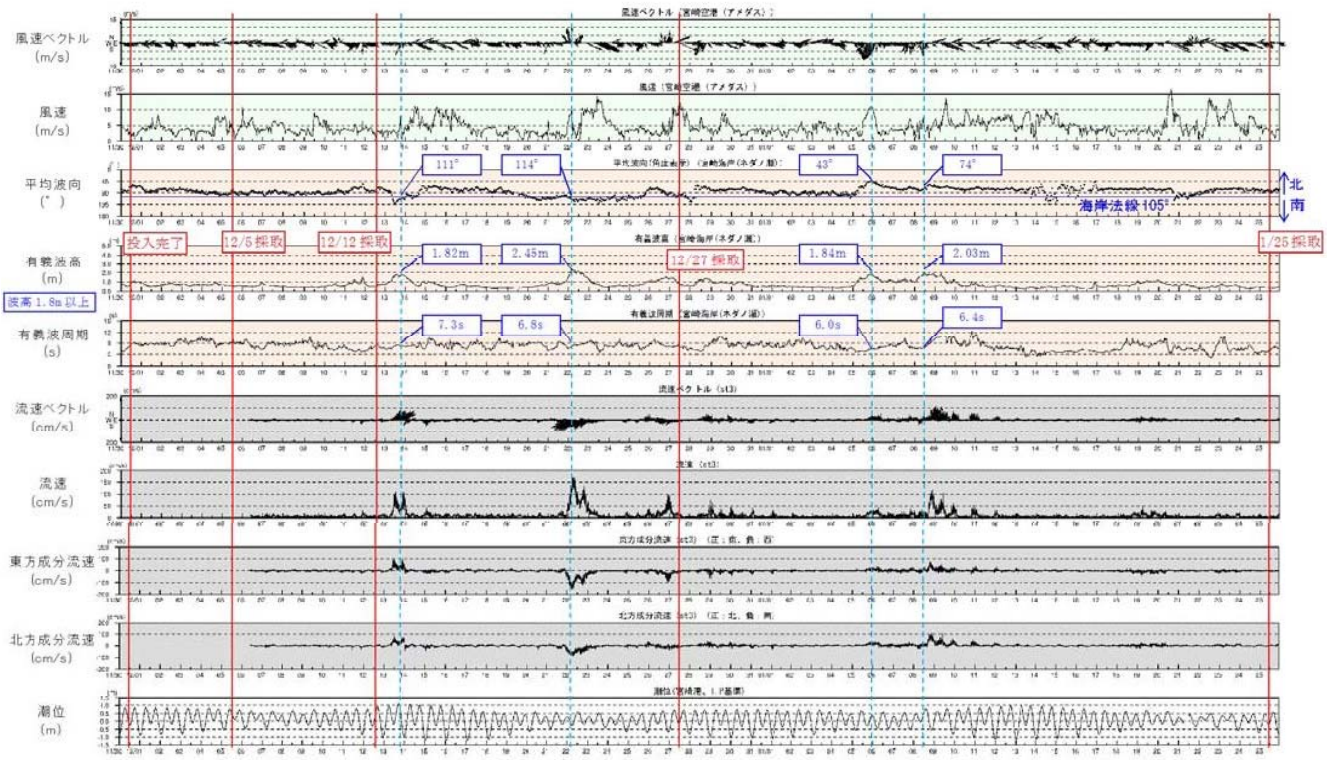

図 2-7.2-9　期間中の海象状況

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
②要注視	対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

6.2 測量

測量に関する指標において、指標に設定した範囲の範囲外となった項目は、13 項目中 7 項目（汀線変化(測量、カメラ観測)、目標浜幅、浜崖形状の変化、前浜勾配、等深線変化、施設点検(埋設護岸)）であった。

以下に、設定範囲外となった指標についての分析結果を示す。

			小丸川周辺	一ッ瀬川左岸	一ッ瀬川右岸	二ツ立海岸	大炊田海岸③	大炊田海岸②	大炊田海岸①	石崎川
平成27年度侵食対策	養浜（万m³）			ー	ー	0.3(後浜)	ー	2.4(埋設護岸覆土)		ー
	突堤									
	埋設護岸							ー (L=1,580m)		
	関連工事			ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
平成28年度侵食対策	養浜（万m³）			ー	ー	0.5(後浜)	ー	2.9(埋設護岸覆土)		ー
	突堤									
	埋設護岸							機能復旧工L=260m (計L=1,580m)		
	関連工事			ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
測量	地形測量	汀線変化	範囲外↑	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内
		目標浜幅				範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	ー
		土砂量変化	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内
		海岸全体の土砂収支	範囲内	範囲内			範囲内			
		地形変化限界水深								
		浜崖形状の変化						範囲外↓	範囲外↓	
		前浜勾配	範囲外↑	範囲外↑	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内
		等深線変化				範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓	範囲内	範囲内
	カメラ	（カメラ観測）汀線変化		範囲内			範囲外↑			
		（カメラ観測）短期変動幅								範囲
	（施設点検）離岸堤									
	（施設点検）突堤									
	（施設点検）埋設護岸							範囲外↓	範囲外↓	

検証ブロック区分									
石崎浜②	石崎浜①	動物園東②	動物園東①	補助突堤②北	補助突堤①北	突堤北	県管理区間	港湾離岸堤	宮崎港
1.0(後浜)	ー	3.0 (後浜、埋設護岸覆土)		ー	2.1(海中)	-	-		
				ー	ー	ー (計75m)			
		ー	- (L=280m)						
ー	ー	ー	ー	護岸工事 (災害復旧)	ー	ー	ー	ー	ー
0.7(後浜)	ー	5.8 (後浜、埋設護岸覆土)		ー	0.8(汀線付近) 1.1(海中)	0.6(汀線付近)	-		
				L=50m (計50m)	L=42m (計42m)	天端被覆工 (計75m)			
		ー	L=440m (計L=720m)						
ー	ー	ー	ー	護岸工事 (災害復旧)	ー	ー	ー	ー	ー
範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲外↓	範囲内	範囲内	範囲外↑	
範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓	範囲内	範囲外↑	
範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	範囲内	
範囲内								範囲内	
	範囲内								
		範囲外↓	範囲外↓						
範囲内	範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓	範囲内		
範囲内	範囲内	範囲外↑	範囲外↑	範囲外↑	範囲外↑	範囲外↑	範囲外↑		
	範囲内				ー				
囲内									
							範囲内 (県離岸堤)		
				範囲内	範囲内	範囲内			
		ー	範囲外↓						

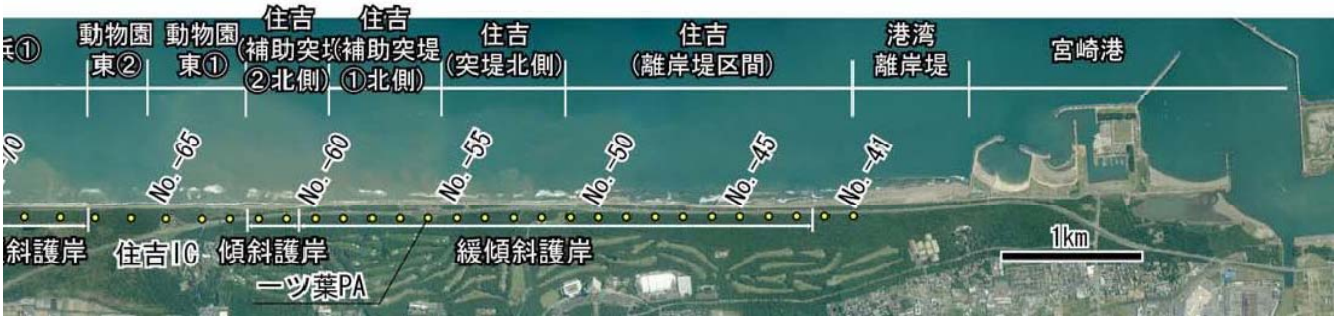

調　査　項　目	測量	地形測量、カメラ観測		
要 分 析 指 標	汀線変化、目標浜幅（測量）、汀線変化			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 宮崎海岸北側の二ツ立、大炊田は浜幅が回復しつつあるが、石崎浜～住吉突堤北側の範囲で目標浜幅 50m を確保できていない。
- 浜幅の変化状況について、予測と実測の汀線変化量の沿岸方向分布を比較した結果、二ツ立で、予測以上に回復している。この理由は、2014 年、2015 年に南からの波の作用が大きく、土砂が北へ移動したこと、2016 年は波が小さかったため堆積した土砂が南に戻ってきていないことが考えられる。一方、石崎浜から突堤までの範囲が、予測ほど回復していない。この理由は、北側に土砂が移動して戻りきってきていないことが考えられる。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

分析に用いた図表

■浜幅の状況

- 2008(H20)年以降で侵食・堆積の傾向が変化した海岸は、大炊田である。
- 直轄区間では、大炊田の一部を除いたほぼ全域で目標浜幅 50m 以下であり、特に石崎浜～動物園東の侵食進行と、住吉海岸の侵食（砂浜消失状態の継続）が顕著である。

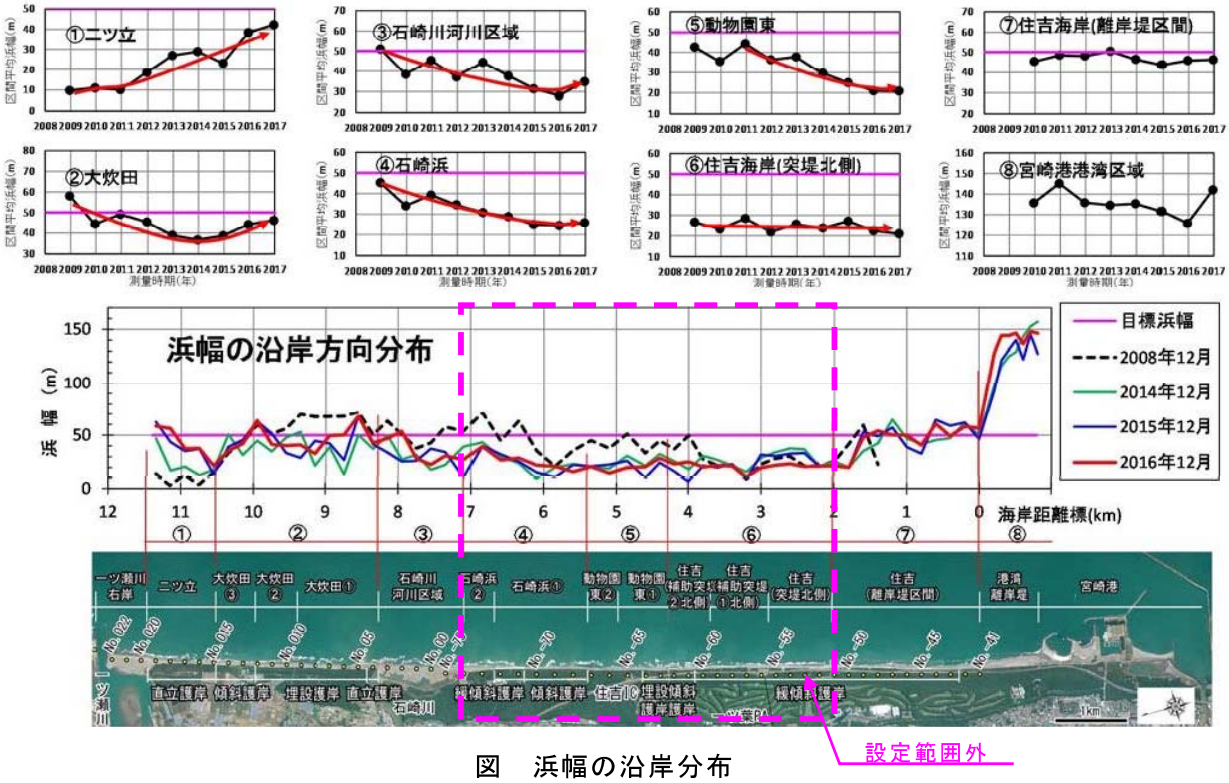

図　浜幅の沿岸分布

■地形変化予測と実測の汀線変化量比較

- 浜幅の変化状況について、予測と実測の汀線変化量の沿岸方向分布を比較した結果、二ツ立で、予測以上に回復している。この理由は、2014 年、2015 年に南からの波の作用が大きく、土砂が北へ移動したこと、2016 年は波が小さかったため堆積した土砂が南に戻ってきていないことが考えられる。
- 一方、石崎浜から突堤までの範囲が、予測ほど回復していない。この理由は、北側に土砂が移動して戻りきってきていないことが考えられる。

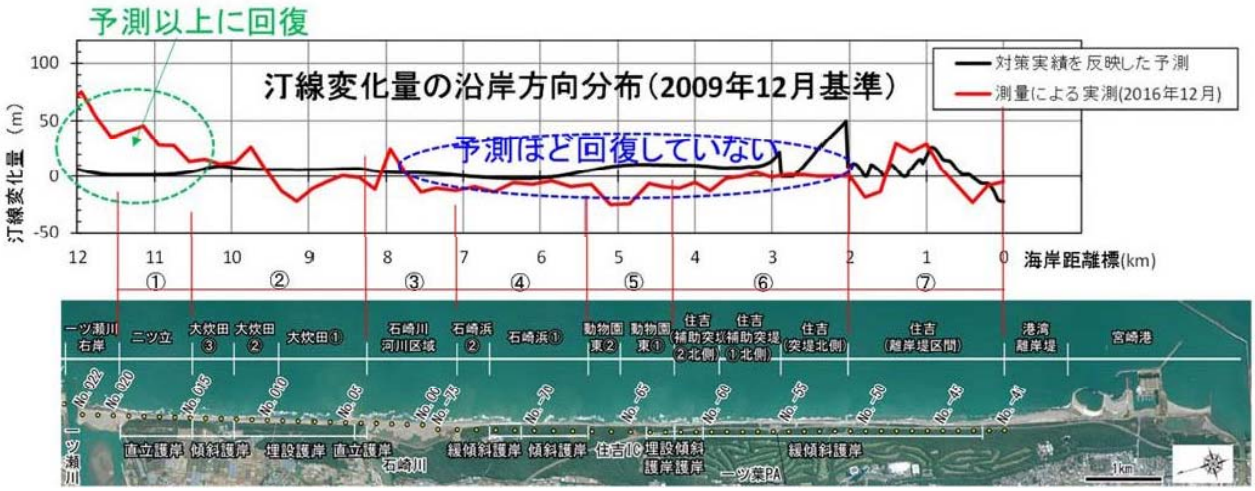

図　汀線変化量の予測と実測の比較（2009 年 12 月基準）

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
③要処置	対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

調　査　項　目	測量	地形測量、カメラ観測		
要 分 析 指 標	汀線変化、目標浜幅（測量）、汀線変化			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■予測結果との時系列比較

- 2016(H28)年の浜幅が範囲外↓となった石崎浜②～補助突堤北②ブロックの範囲は、3 年以上継続して指標の範囲の下限を下回っている状況である。
- 補助突堤①北ブロックと突堤北ブロックの範囲外↓は、前年度に比べて浜幅が狭くなっている。
- ブロック別の浜幅の経年変化から 2016(H28)年の浜幅の変化を全体的に俯瞰すると、宮崎海岸北側に位置する二ツ立ブロックは予測結果より浜幅が広く、大炊田③～①ブロックは概ね予測どおりであるが、その南側に位置する石崎浜②～突堤北ブロックでは予測結果のような回復傾向が見られない状況となっている。

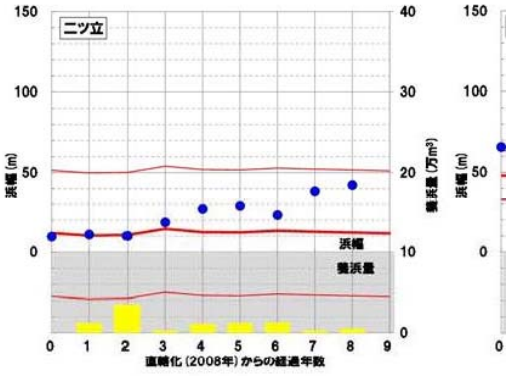

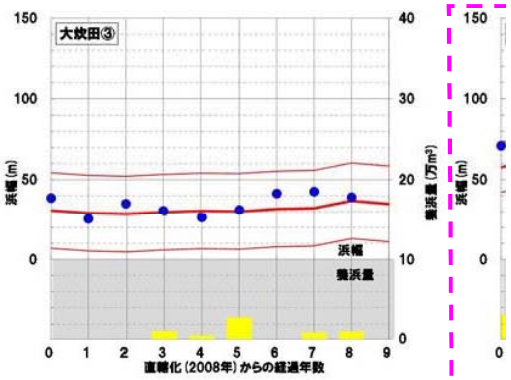

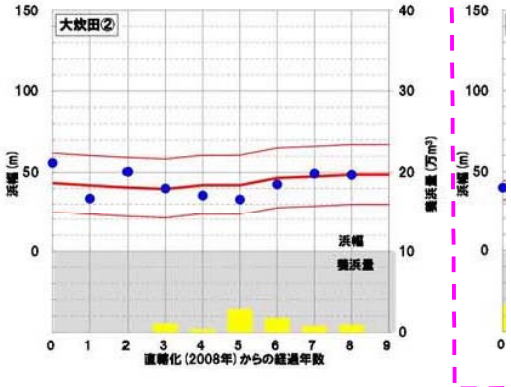



（参考図）

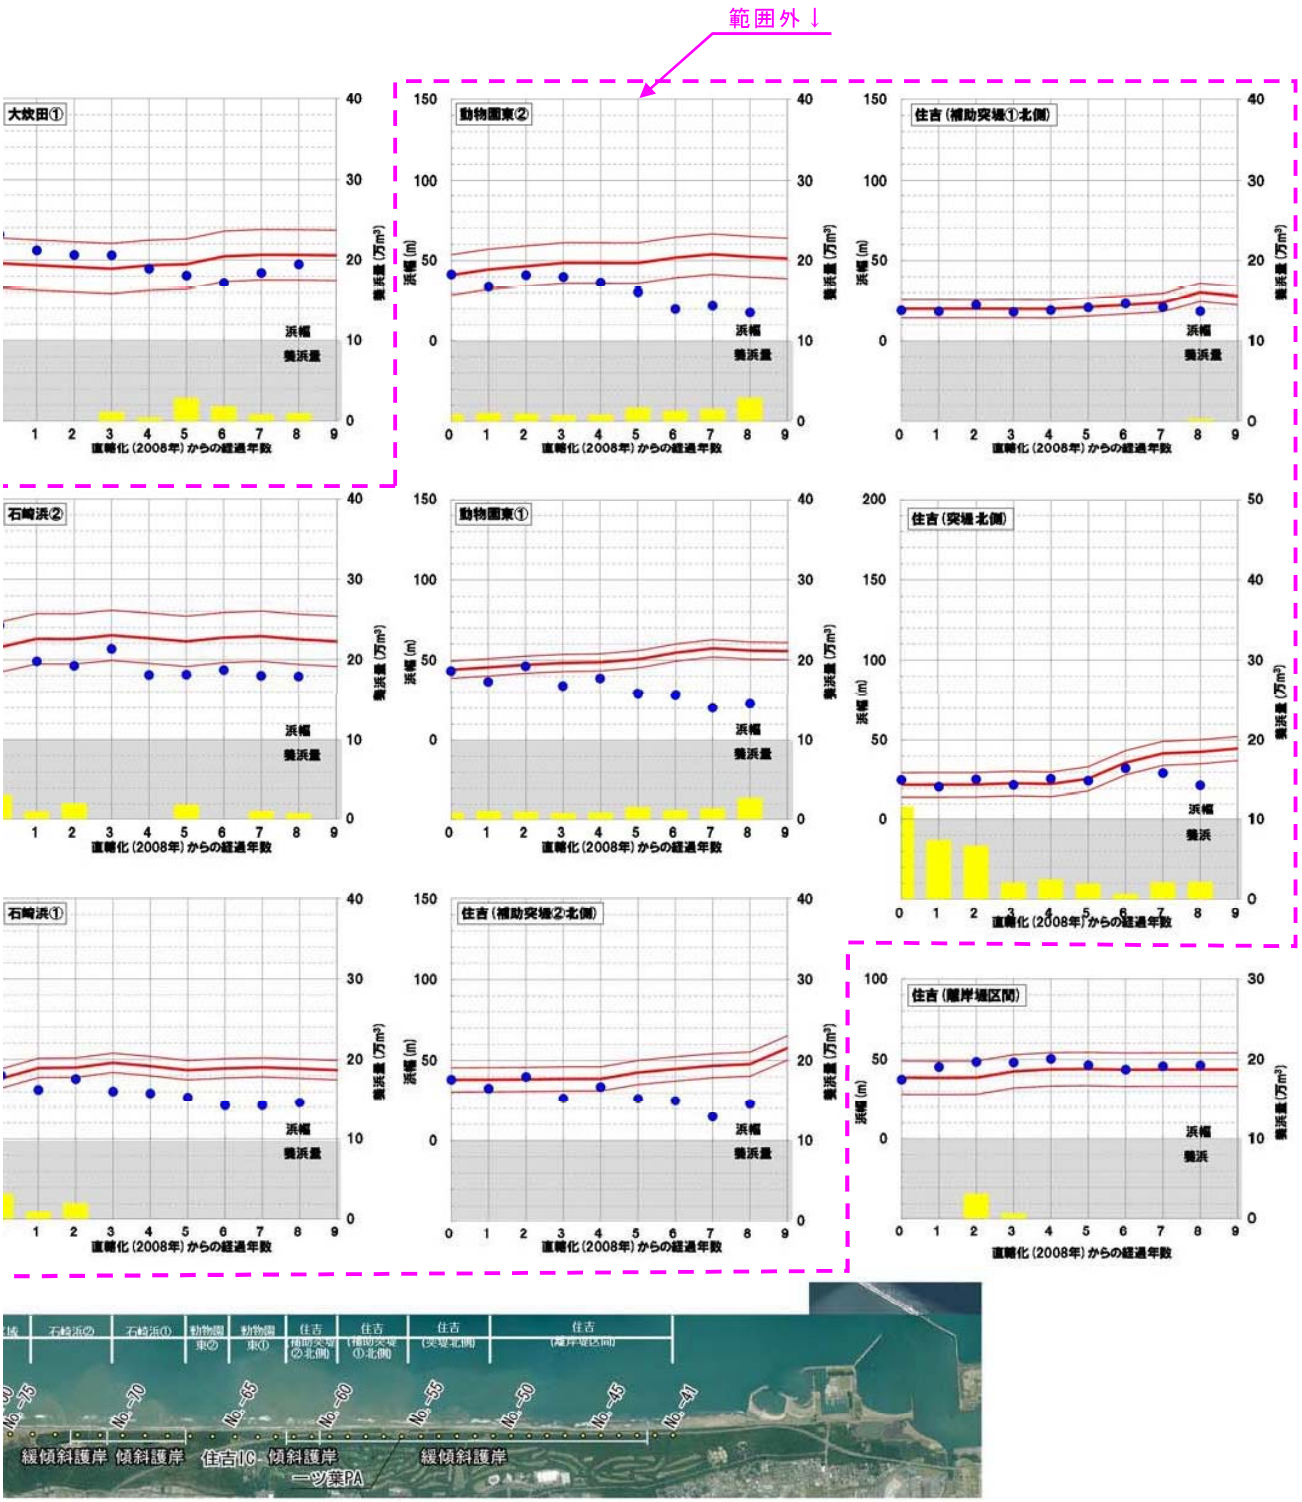

図　ブロック別平均浜幅の経年変化

調　査　項　目	測量	地形測量、カメラ観測		
要 分 析 指 標	汀線変化、目標浜幅(測量)、汀線変化			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■長期の汀線変化

- 汀線の後退は、住吉海岸→動物園東→石崎浜の順に南から北へ伝播している様子が見て取れる。特に石崎浜、動物園東については近年汀線の後退が著しいが、2016(H28)年は安定～やや後退（前年に比べると後退量は小さい）という状況であった。
- 住吉海岸は 2004(H16)年以降安定しているように見えるが、これは緩傾斜護岸前に砂浜が存在しないためである。
- 県管理区間は砂浜が安定している。

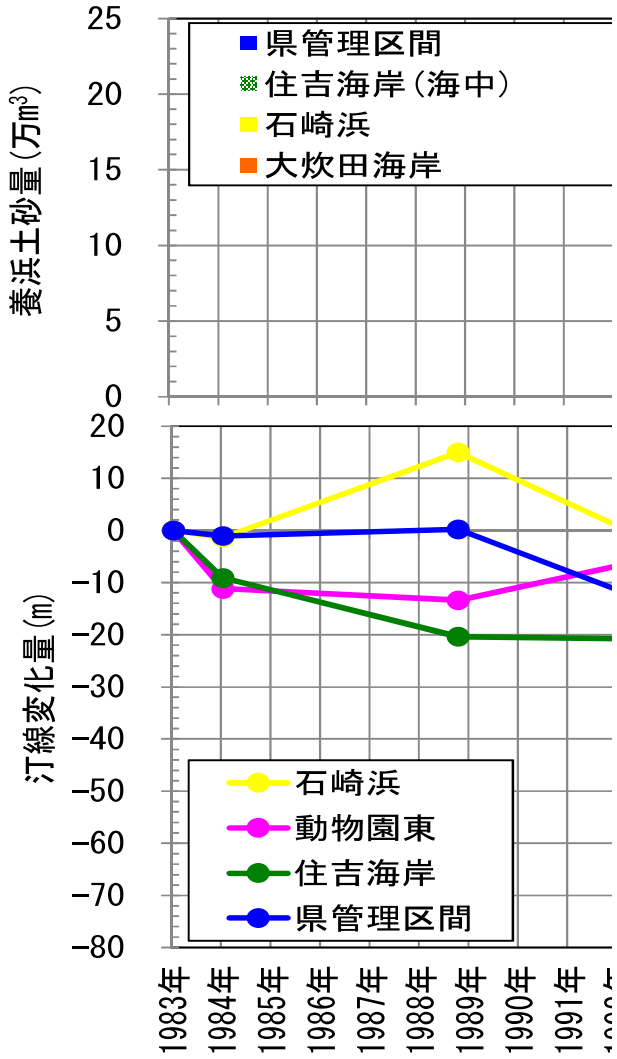

（参考図）

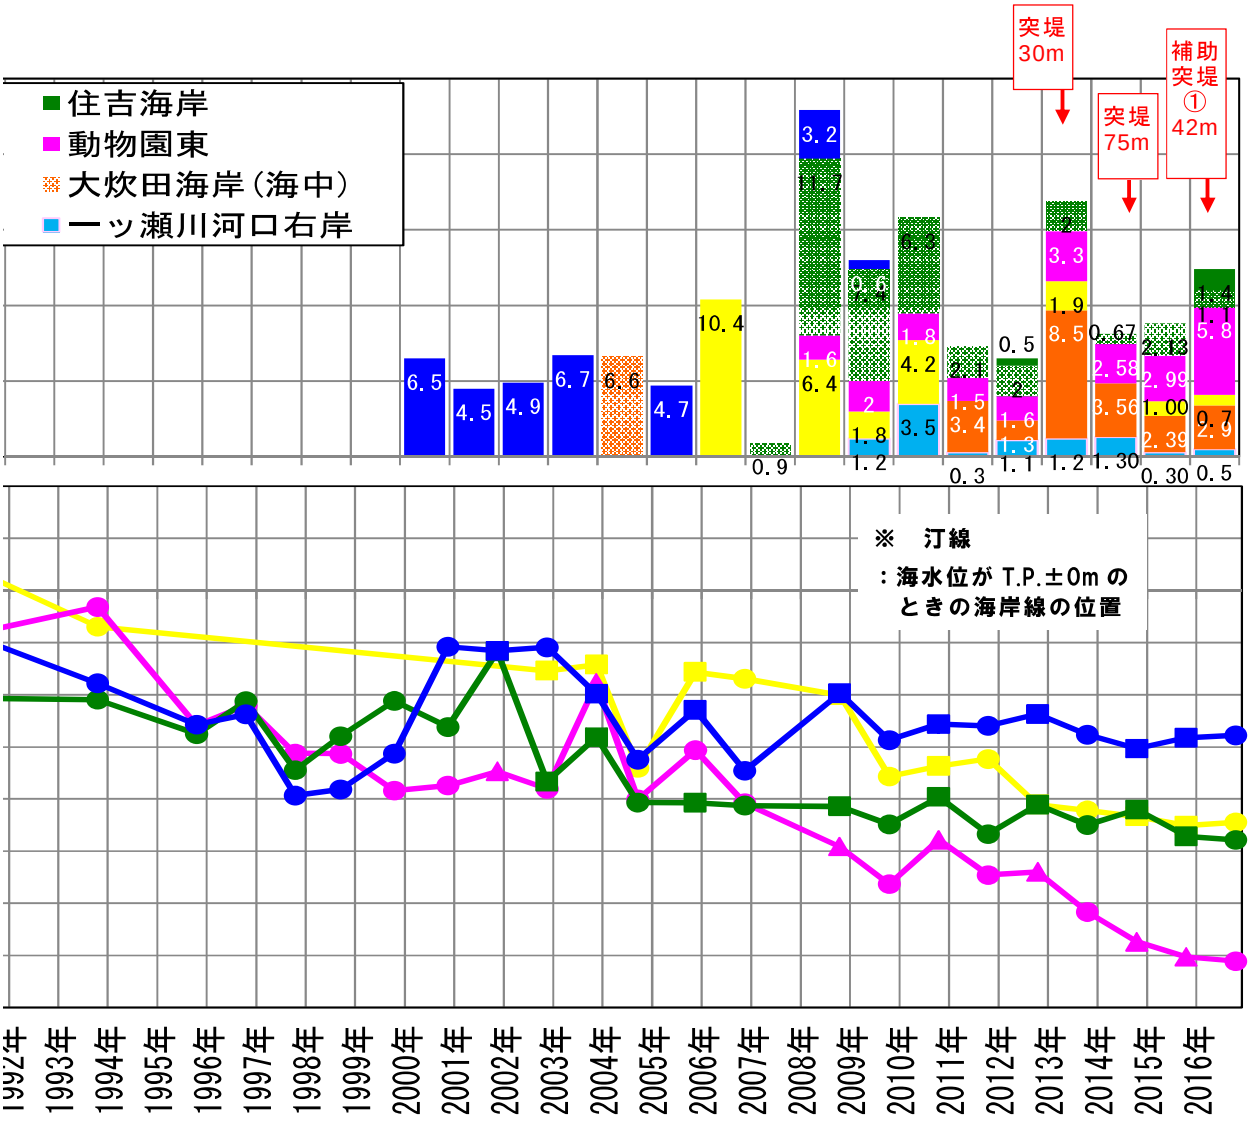

図　宮崎海岸周辺の長期の汀線変化

調　査　項　目	測量	地形測量、カメラ観測		
要 分 析 指 標	汀線変化、目標浜幅（測量）、汀線変化			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■最近の沿岸漂砂の動向

- 汀線位置の汀線変化解析結果によると、宮崎海岸では、年にもよるが夏季に汀線位置が後退し、冬季に前進するパターンの季節変化傾向がみられる。
- ネダノ瀬の波浪観測データによる月別・年別の波のエネルギーフラックス沿岸方向成分を解析した結果によると、2015(H27)年 7 月に北向きに土砂を動かすエネルギーが顕著である。2015(H27)年は、このインパクトが大きかったため、結果として通年でも北向きに移動した土砂が多かったと推察される。
- なお、2016(H28)年は、2014 年以前と同様の傾向であった。

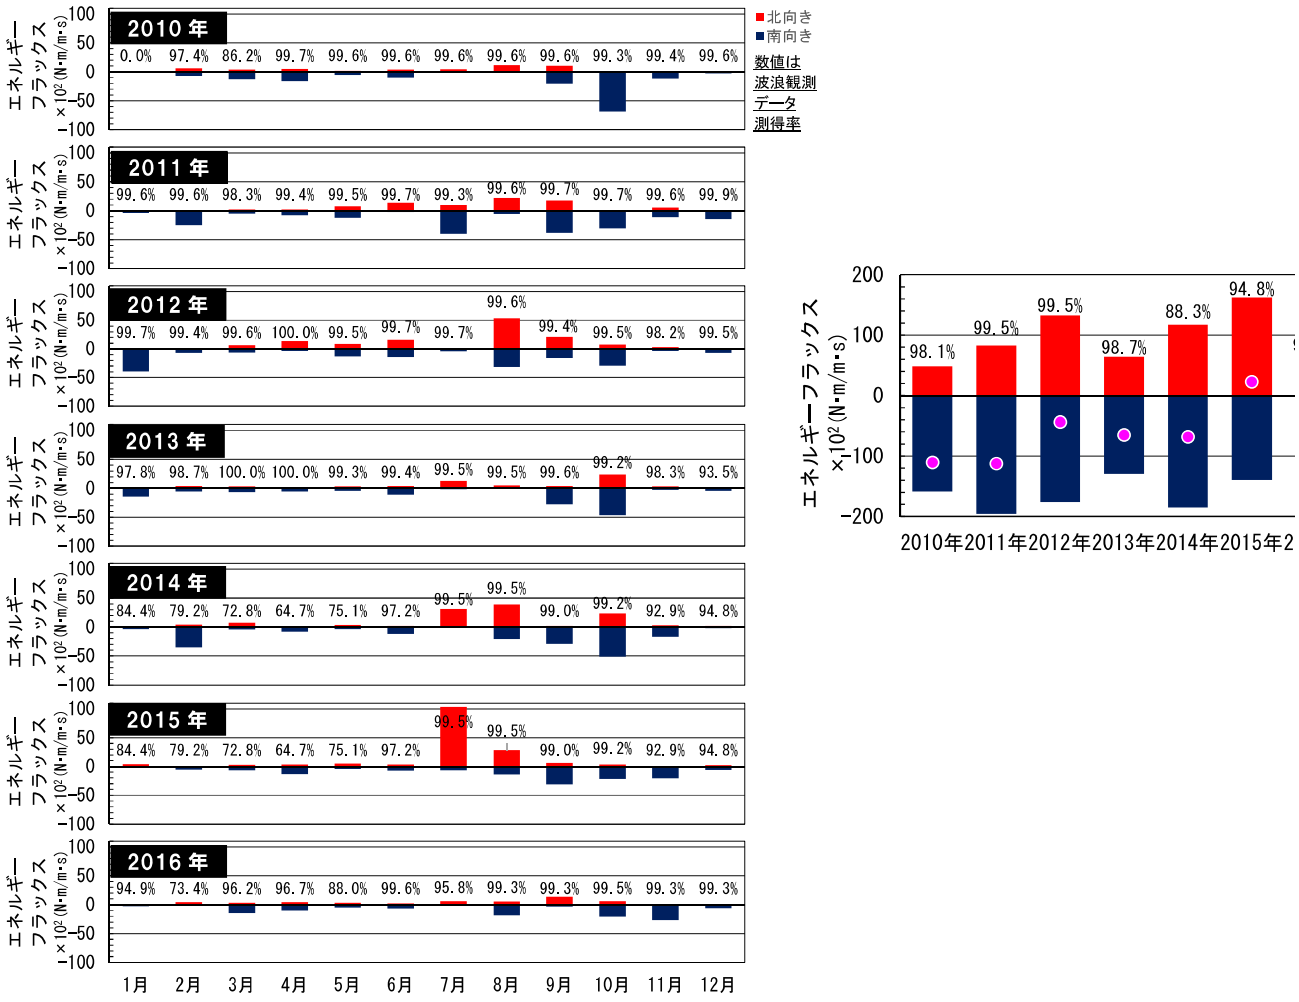

図　近年の月別エネルギーフラックス（宮崎海岸（ネダノ瀬）観測波浪）

（参考図）

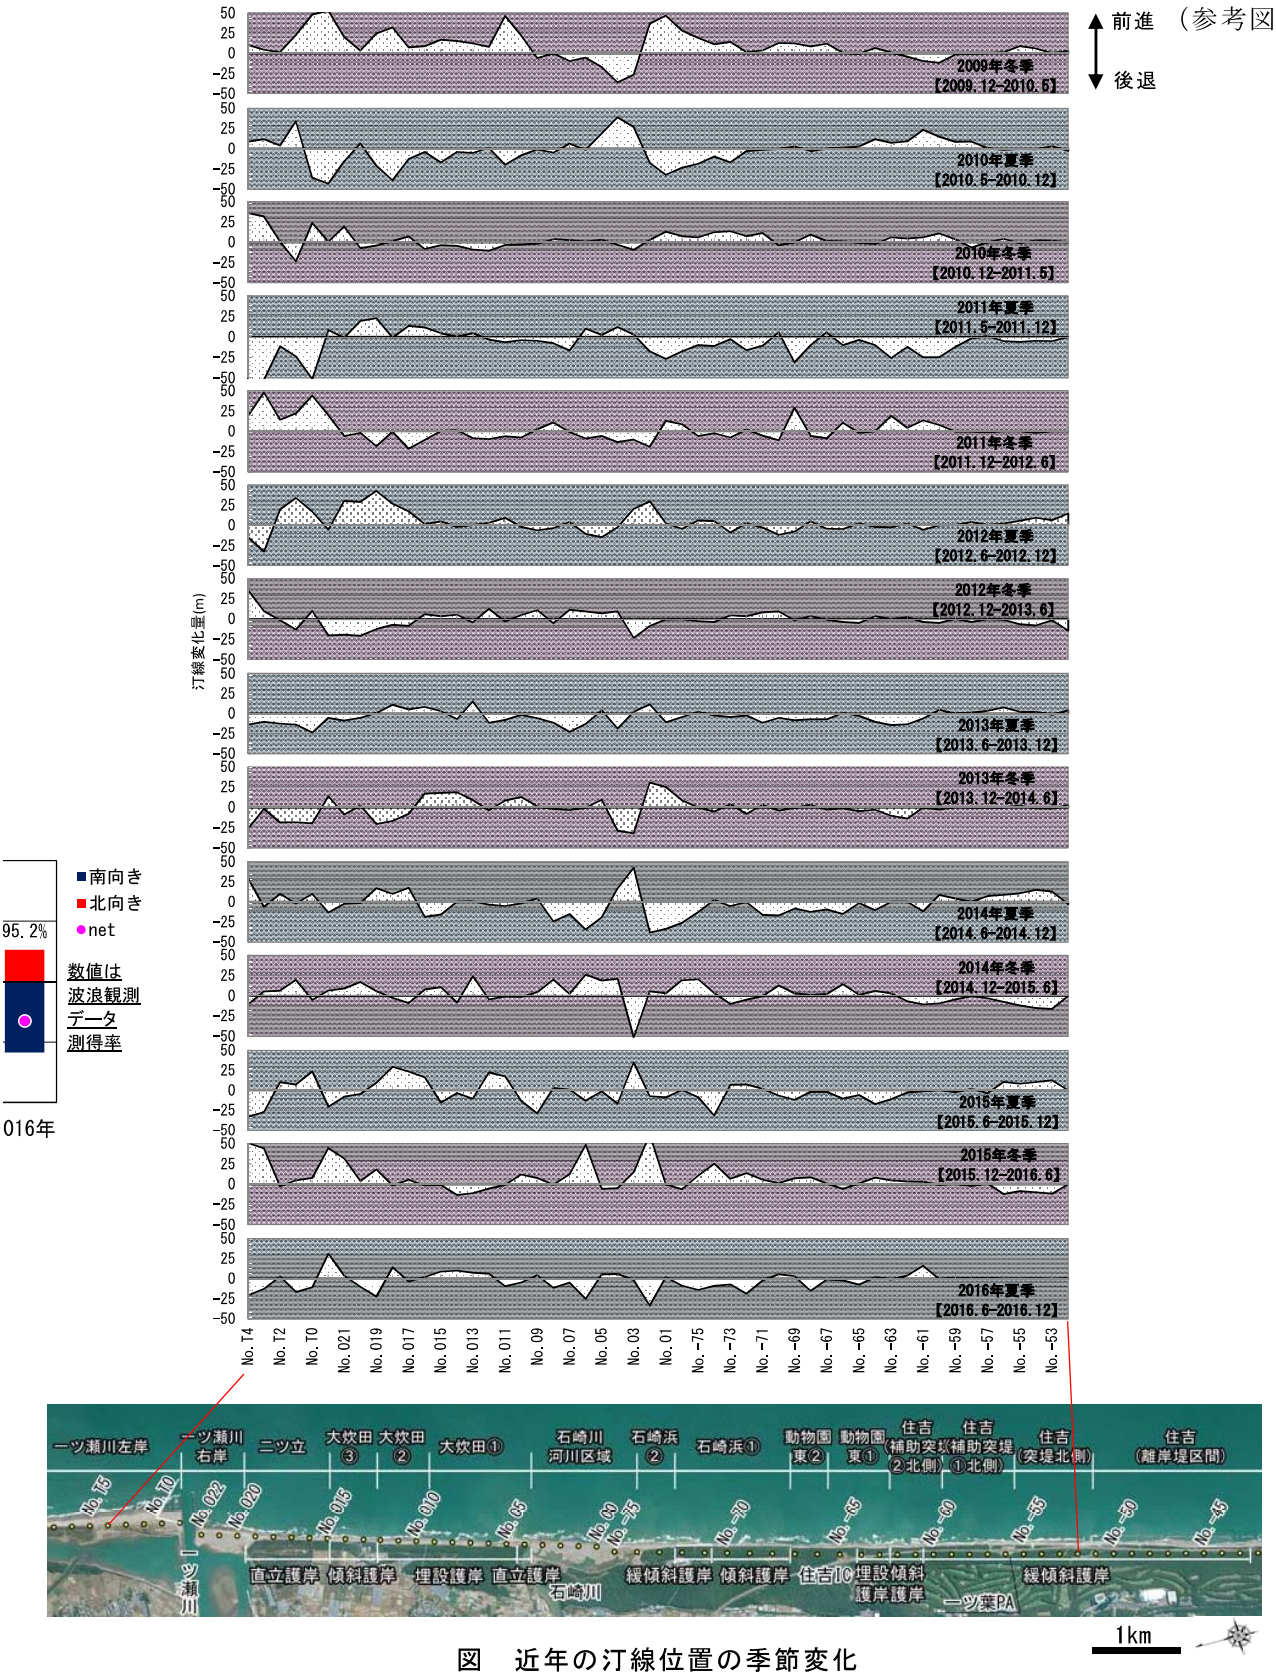

図　近年の汀線位置の季節変化

調　査　項　目	測量	地形測量、カメラ観測		
要 分 析 指 標	汀線変化、目標浜幅（測量）、汀線変化			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■カメラ観測による浜幅の日変動

- 2016(H28)年は、大炊田海岸での砂浜の回復傾向が顕著であり、季節的な変動はあるが年間の平均浜幅に均すと 52m であった。これは観測を開始した 2006(H18)年の年間平均浜幅 50m と同規模となる。
- 一方、他の地点を見ると、一ツ瀬川左岸では 9 月の台風時期に一時的な後退が見られたが、その後回復して年間を通すと維持傾向といえる。また、石崎浜は、微増である。
- このように、2016(H28)年は定点固定カメラ観測地点においては、砂浜は回復・維持傾向にあった。これは、2016(H28)年は高波浪が少ない年であったことが一つの要因と考えられる。
- なお、一ツ葉有料 PA は、カメラの故障により 3 月以降欠測となった。この地点に関しては、突堤(75m)設置後の 2014(H26)年より冬季限定ではあったが、砂浜が確認されるようになってきている。また、この観測地点は突堤に近いことから突堤の効果を把握する有用なデータとなり、突堤の効果や今後の突堤延伸順序等を検討する際の基礎資料となるため、今後の維持管理も踏まえて、先に示したとおり一ツ場有料 PA の CCTV 画像を録画する方式に観測を変更して、12 月より再開してデータを蓄積している。

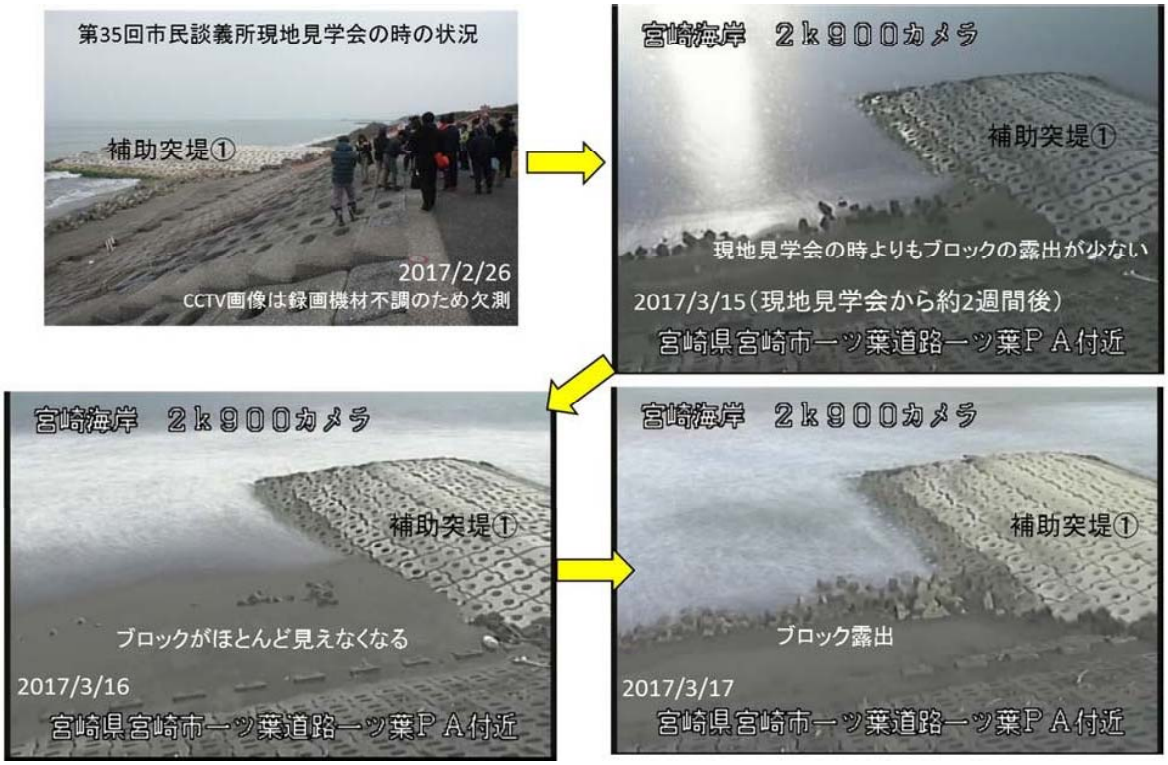

写真　住吉地区　一ツ葉有料 PA　CCTV 画像による砂浜のダイナミックな日変動
（2017/3/15～3/17 の 3 日間の変化，平均潮位時）

（参考図）

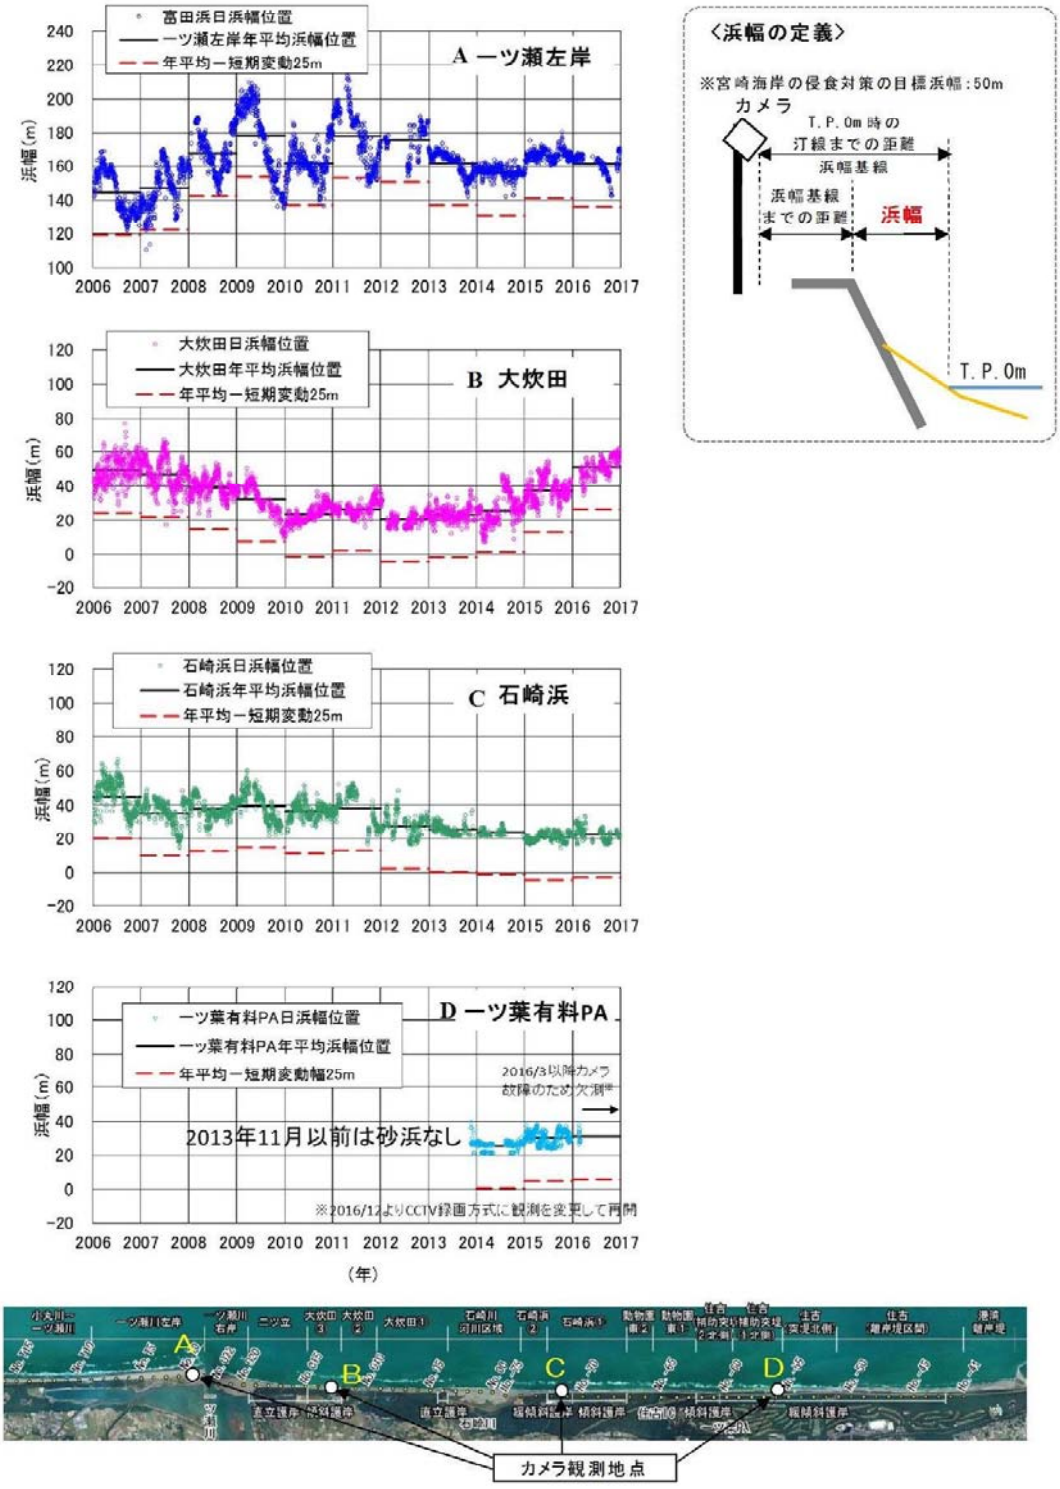

図　カメラ観測による浜幅の日変動状況（2006 年 1 月～2016 年 12 月）

調　査　項　目	測量	地形測量		
要 分 析 指 標	土砂量変化、等深線変化			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 2008(H20 年)の直轄化以降の土砂変化の特徴は、宮崎海岸の北側（一ツ瀬川右岸～大炊田）で堆積傾向となっているが、石崎浜～住吉海岸(離岸堤区間)では、侵食が進行している。ただし、最近は横ばい傾向（回復までには至っていないが侵食を抑制）である。
- 突堤・養浜の効果・影響を把握するために、現状で砂浜が消失している突堤周辺の断面地形の変化状況を確認した。その結果、突堤の沖合いで堆積傾向が見られた。一方、突堤設置範囲（陸側）では、現状で海浜断面の明確な回復傾向は見られなかった。なお、突堤周辺の海中も含めた土砂変化量は、補助突堤①北、補助突堤②北では、回復傾向の兆しが見られたが、浜幅の回復傾向にまでは至っていない。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

分析に用いた図表

■直轄化以降の地形変化状況

- 2009(H21)～2016(H28)年を比較すると、宮崎海岸では、北側（一ツ瀬川右岸～大炊田）で堆積傾向
- 石崎浜～住吉海岸(離岸堤区間)では、侵食が進行しているものの、最近は横ばい傾向（回復までには至っていないもが侵食を抑制）。
- なお、②一ツ瀬川～小丸川(2)ブロックの土砂の堆積は、局所的に堆積しているのではなく、薄く広い範囲に堆積している。

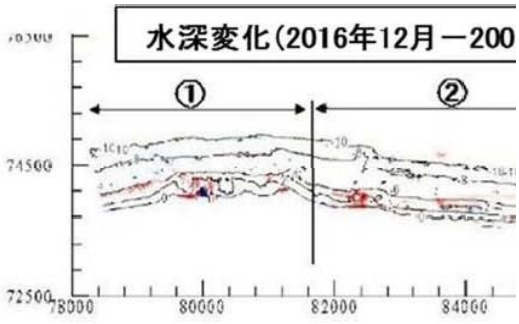

図　小

※2008(H20)年 12 月にも測量が実施されているが、離岸堤周辺の海底地形が取得できていないため、本検討では離岸堤周辺も含めて広範囲でデータを取得している 2009(H21)年 12 月の海底地形を基準データとして用いることとした。

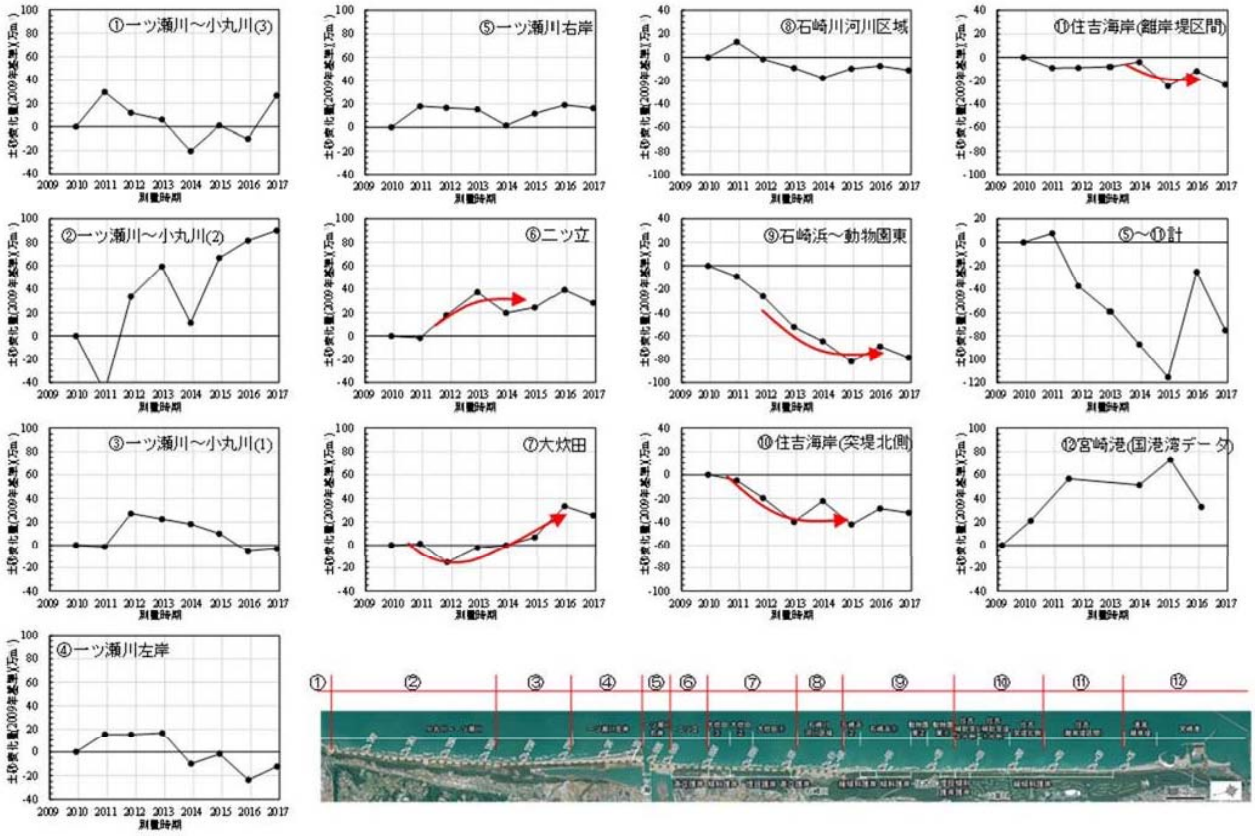

図　沿岸区分毎の土砂変化量の経年変化（2009 年 12 月基準）

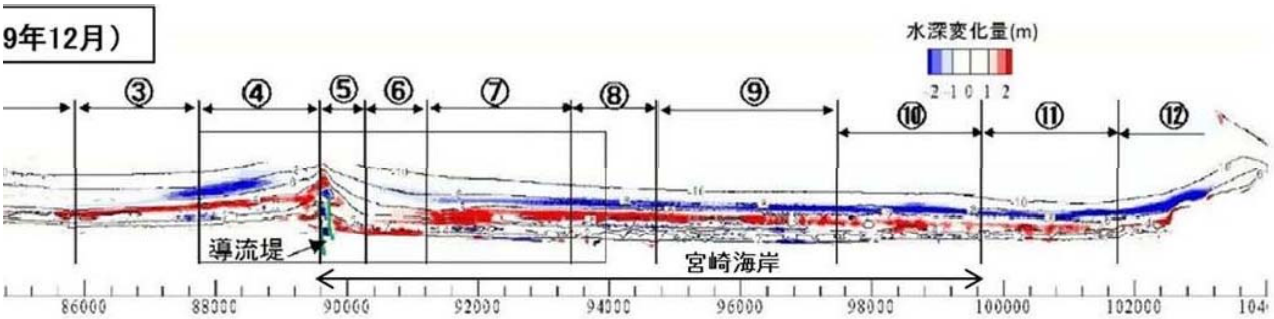

丸川～宮崎港における水深変化量分布（2009 年 12 月～2016 年 12 月）

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
③要処置	対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

調　査　項　目	測量	地形測量		
要 分 析 指 標	土砂量変化、等深線変化			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■突堤周辺の地形変化

- 突堤・養浜の効果・影響を把握するために周辺の断面地形の変化状況を確認した結果、突堤の沖合いで堆積傾向が見られた。一方、突堤設置範囲（陸側）では、現状で海浜断面の明確な回復傾向は見られなかった。
- 突堤周辺の土砂量と浜幅の変化状況を確認した結果、海中も含めた土砂変化量は、補助突堤①北、補助突堤②北では、回復傾向の兆しが見られた。一方、浜幅の回復傾向にまでは至っていない。

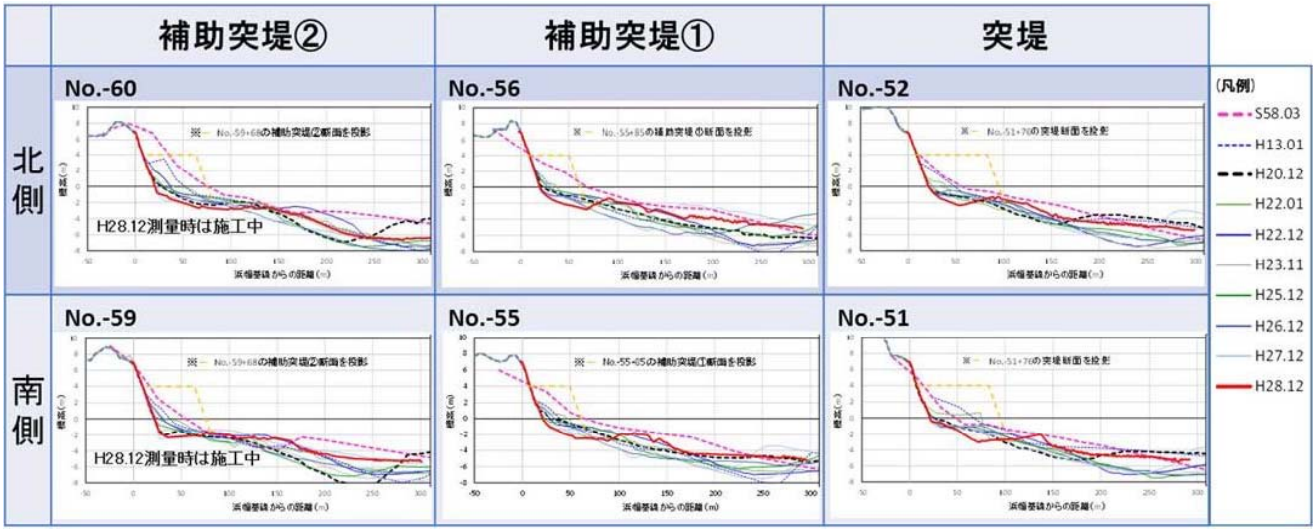

写真　突堤周辺の断面地形変化（1983(S58)年 3 月～2016(H28)年 12 月）

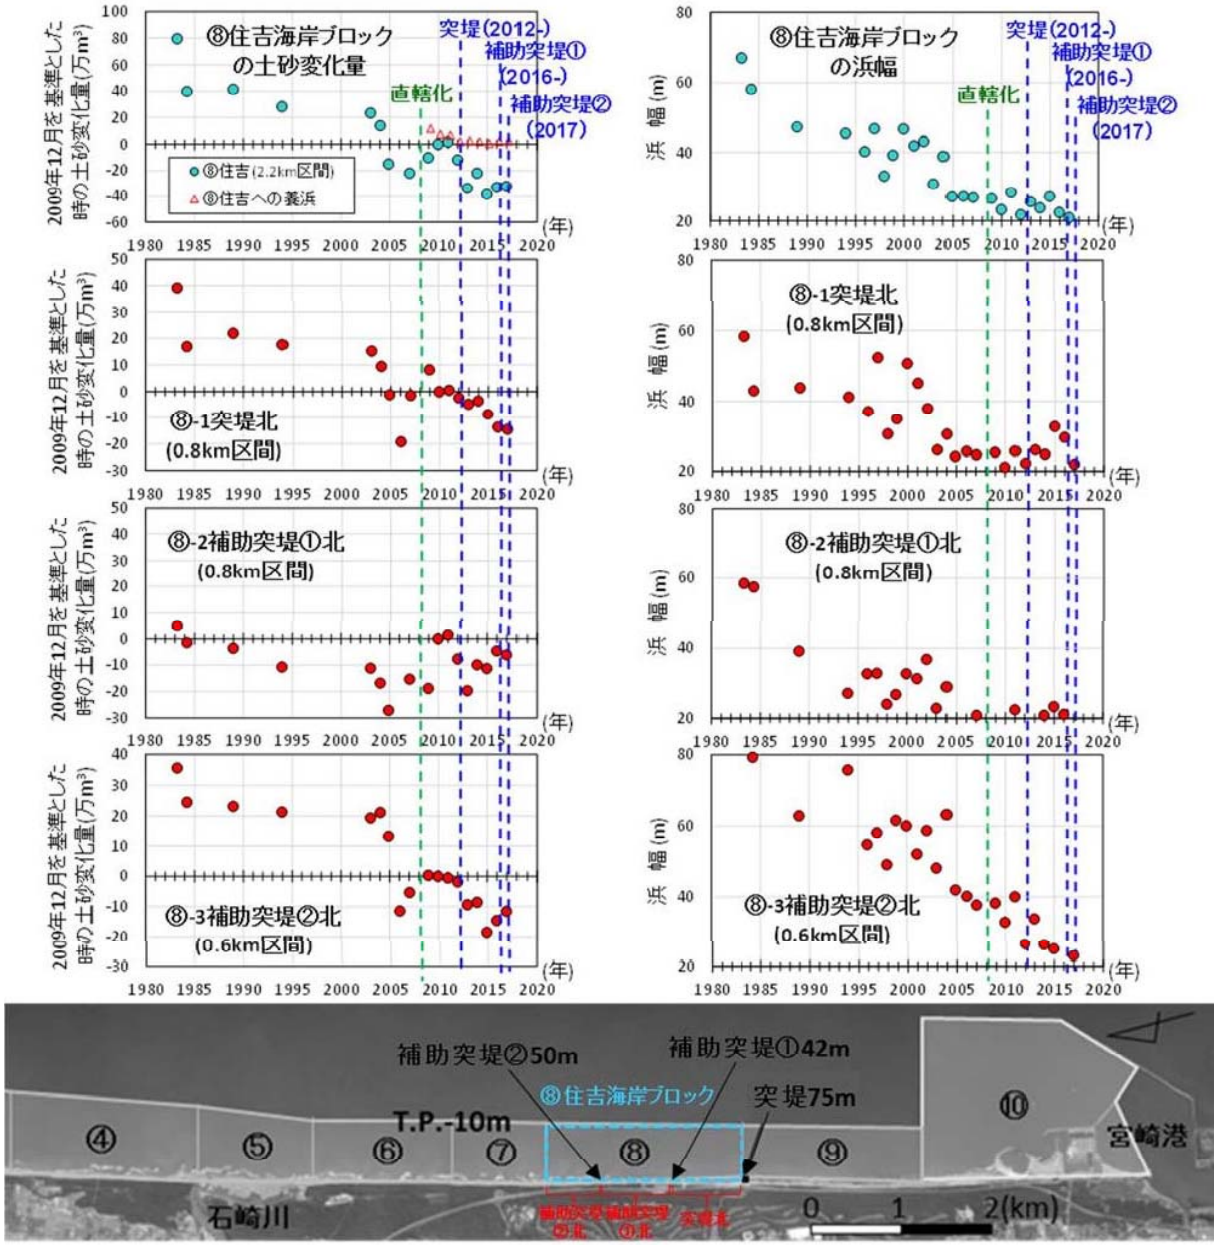

図　突堤周辺の土砂量・浜幅の変化

調　査　項　目	測量	地形測量		
要 分 析 指 標	土砂量変化、等深線変化			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■地形変化予測と実測の海浜断面比較

- 海浜断面の変化状況について、代表位置における予測と実測を比較した結果、石崎浜から突堤までの範囲では陸側に近い範囲で予測ほど回復していない状況が見られたが、沖合の海浜断面は回復している状況が確認されたことから、引き続き養浜を実施し、動向に注視していく。

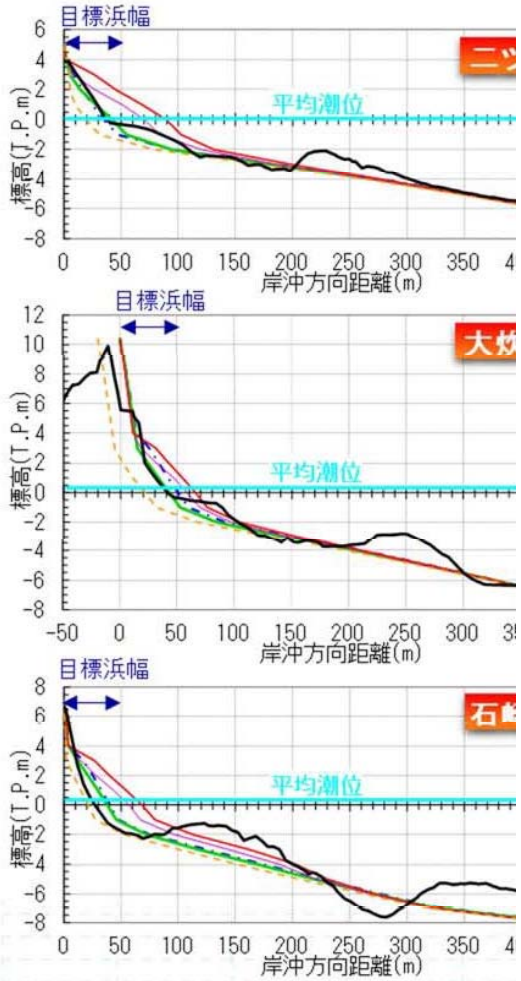

（参考図）

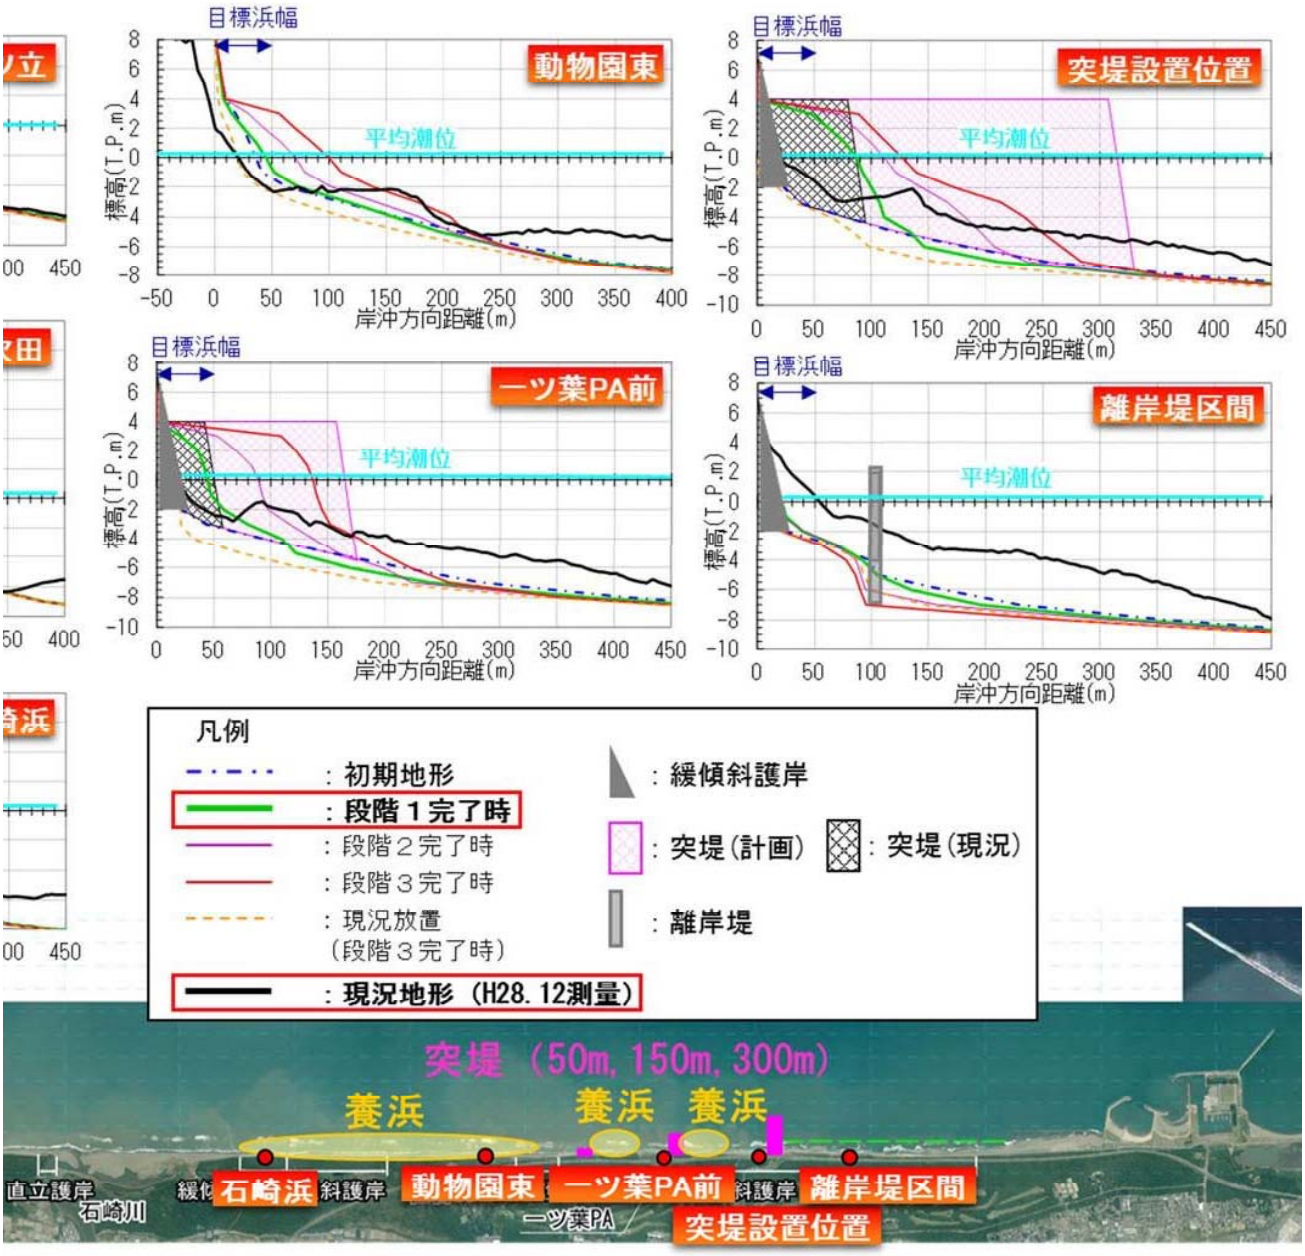

図　地形変化予測と実測の海浜断面比較

調　査　項　目	測量	地形測量		
要 分 析 指 標	土砂量変化、等深線変化			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■長期の土砂量変化

- 1983 年 3 月～2016 年 12 月の約 34 年間における住吉海岸(住吉～石崎浜)の区間の土砂減少量は約 430 万 m^3 である。
- 1983 年 3 月～2017 年 2 月の約 34 年間における宮崎港の土砂堆積量は約 490 万 m^3 である。

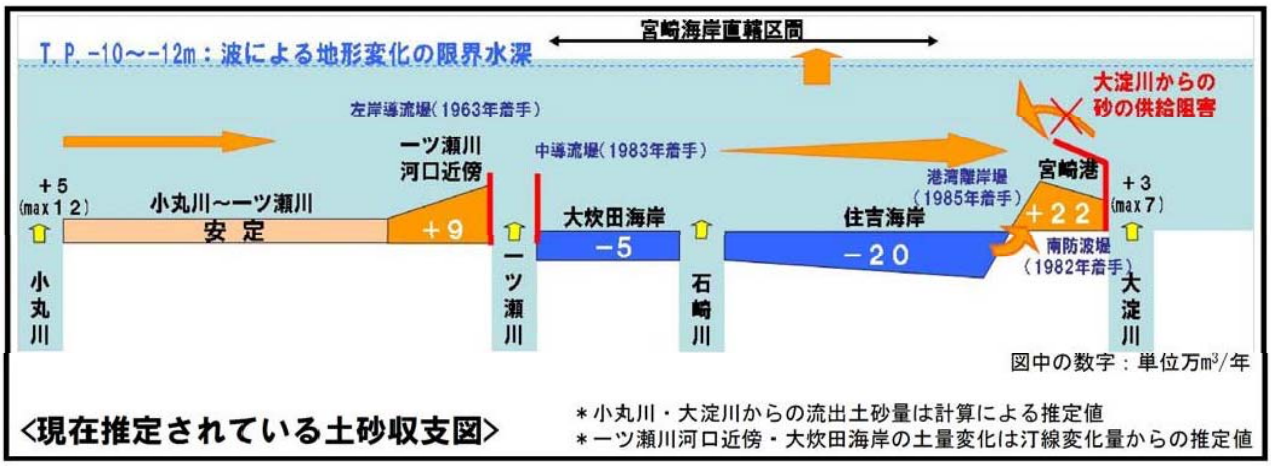

図　宮崎海岸の土砂収支（計画時）

（参考図）

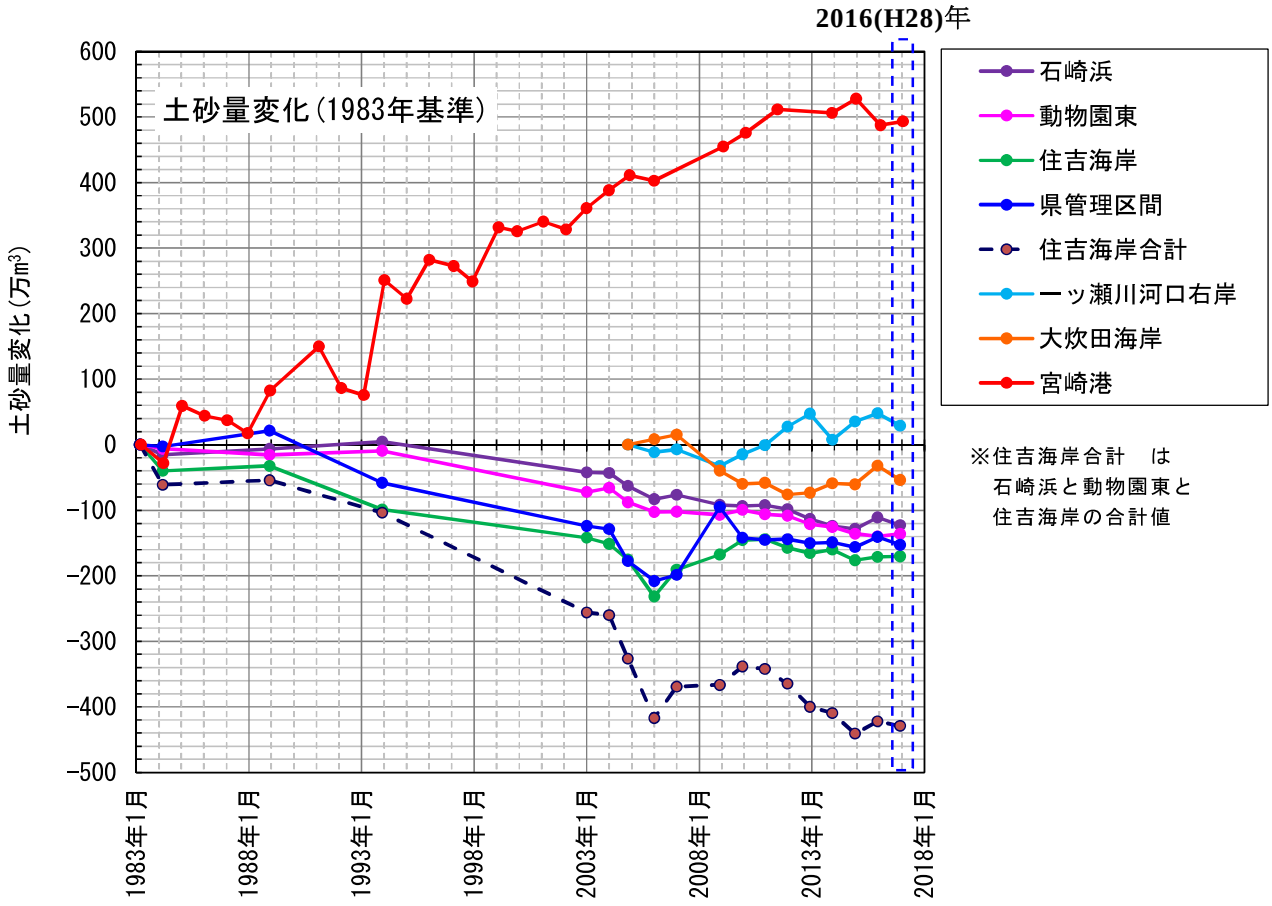

図　宮崎海岸周辺の長期の土砂量変化

調　査　項　目	測量	地形測量		
要 分 析 指 標	土砂量変化、等深線変化			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■一ツ瀬川河口部、小丸川～一ツ瀬川間の地形変化

- 一ツ瀬川河口左岸は 2008(H20)年まで、一ツ瀬川河口右岸は 2011(H23)年まで、土砂量は増加傾向であったが、それ以降は一様な傾向は見られない。
- 小丸川～一ツ瀬川間では、汀線は概ね安定傾向となっている。

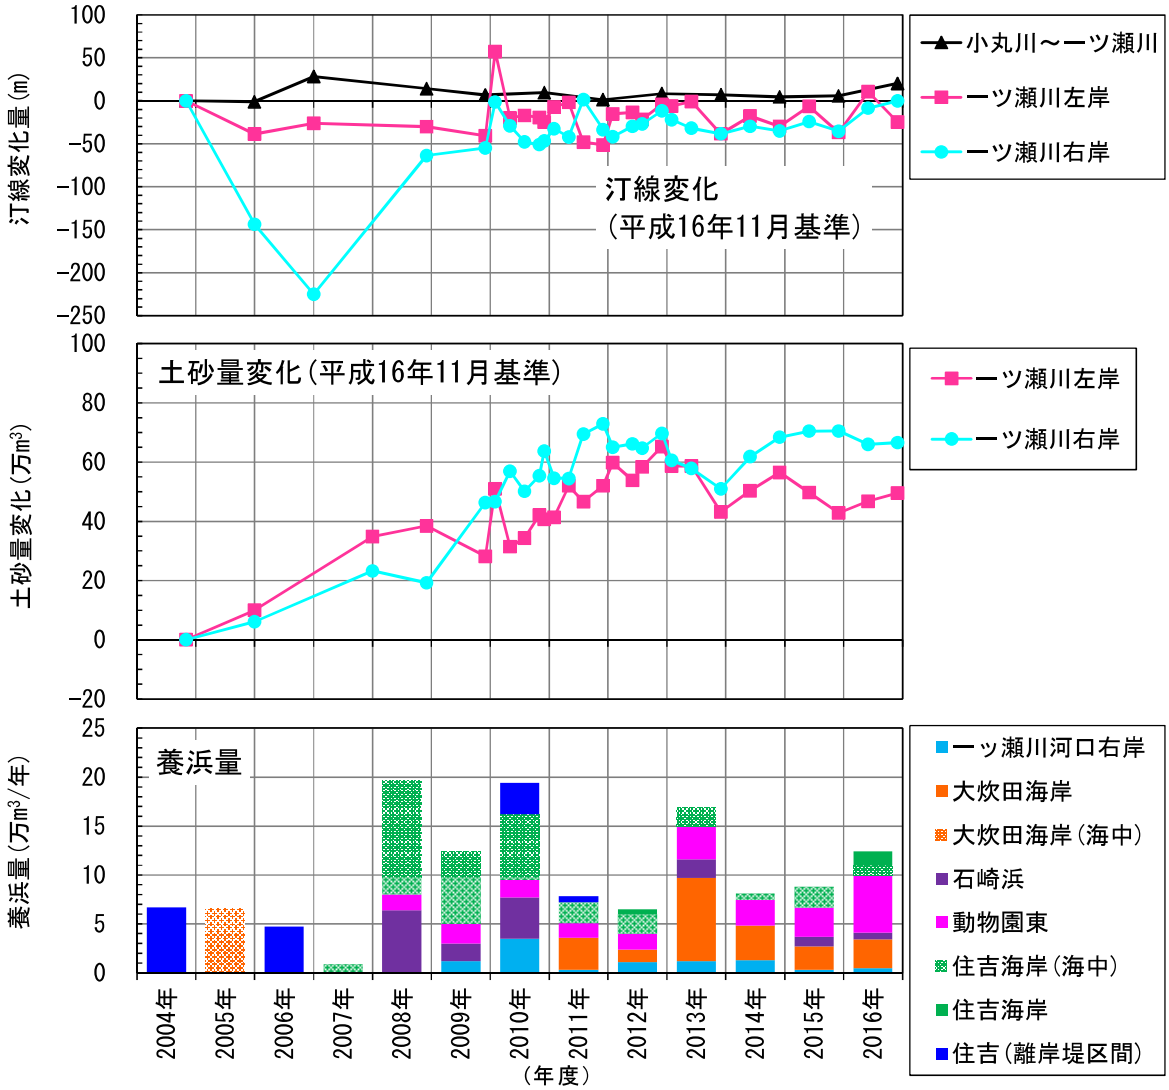

図　一ツ瀬川河口部左右岸、小丸川～一ツ瀬川間の土砂量変化、汀線変化
(一ツ瀬川左岸の土砂変化量は通年で測量成果が存在する No.T4 までを集計)

（参考図）

■二ツ立海岸、大炊田海岸

- 二ツ立海岸は、2004(H16)年以降侵食が続いていたが、2010(H22)年以降、汀線・土砂量ともに回復傾向である。
- 大炊田海岸は、2004(H16)年～2010(H22)年にかけて侵食傾向であったが、2013(H25)年以降、汀線・土砂量ともに安定～ゆるやかな回復傾向である。

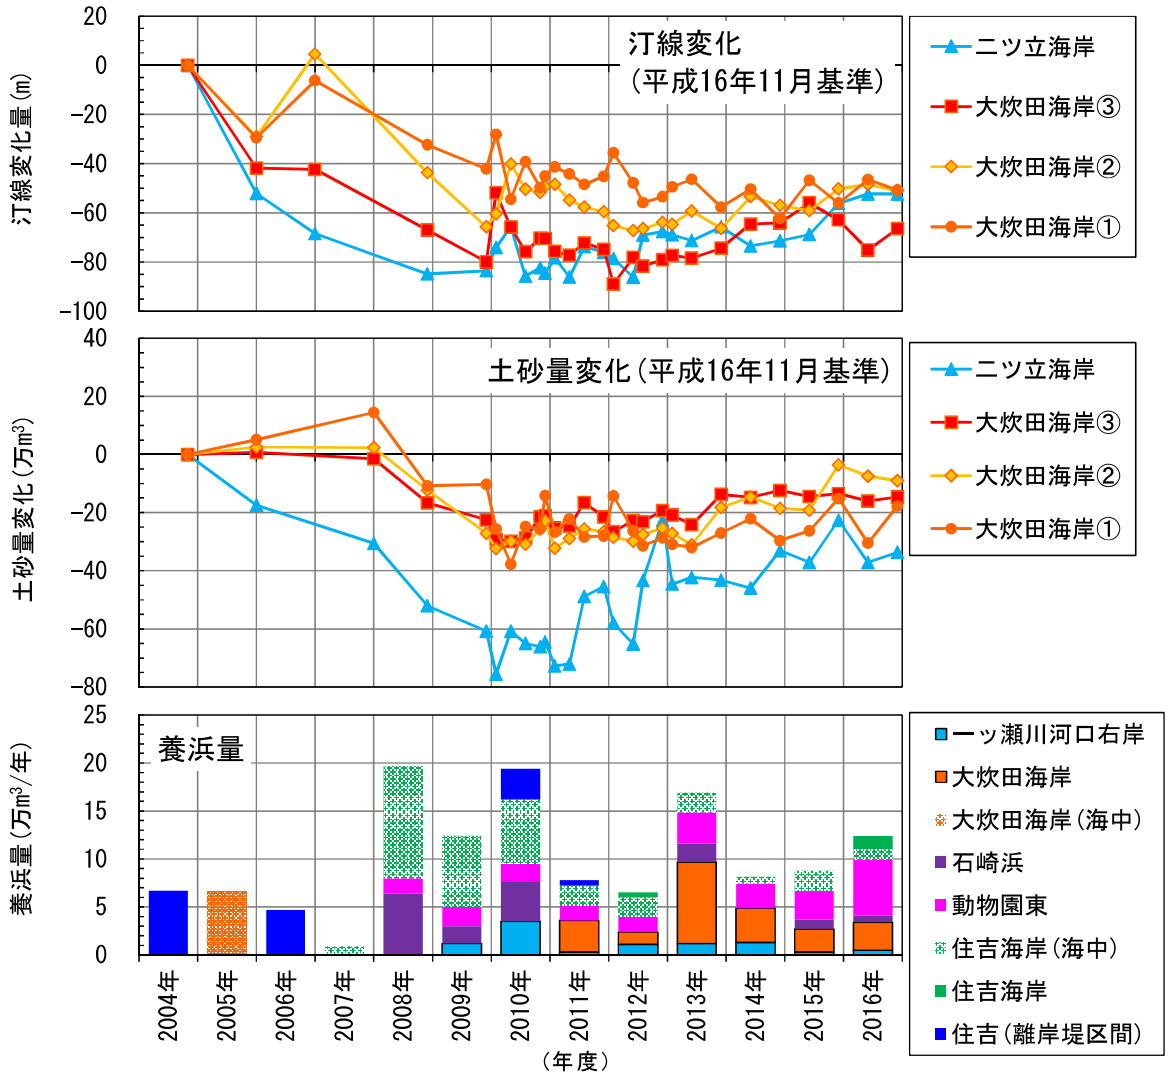

図　大炊田海岸、石崎浜、動物園東の土砂量変化、汀線変化

調　査　項　目	測量	地形測量		
要　分　析　指　標	土砂量変化、等深線変化			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■石崎浜、動物園東

- 石崎浜は、2012 年以降侵食が進んだが、これは、継続して実施していた石崎浜への養浜を 2011(H23)年、2012(H24)年に実施しなかったことが要因のひとつと推察される。なお、最近 3 年間は変動しつつ維持傾向である。
- 動物園東は、南側に位置する動物園東①が 2008(H20)年以降、動物園東②が 2012(H24)年以降に侵食傾向である。

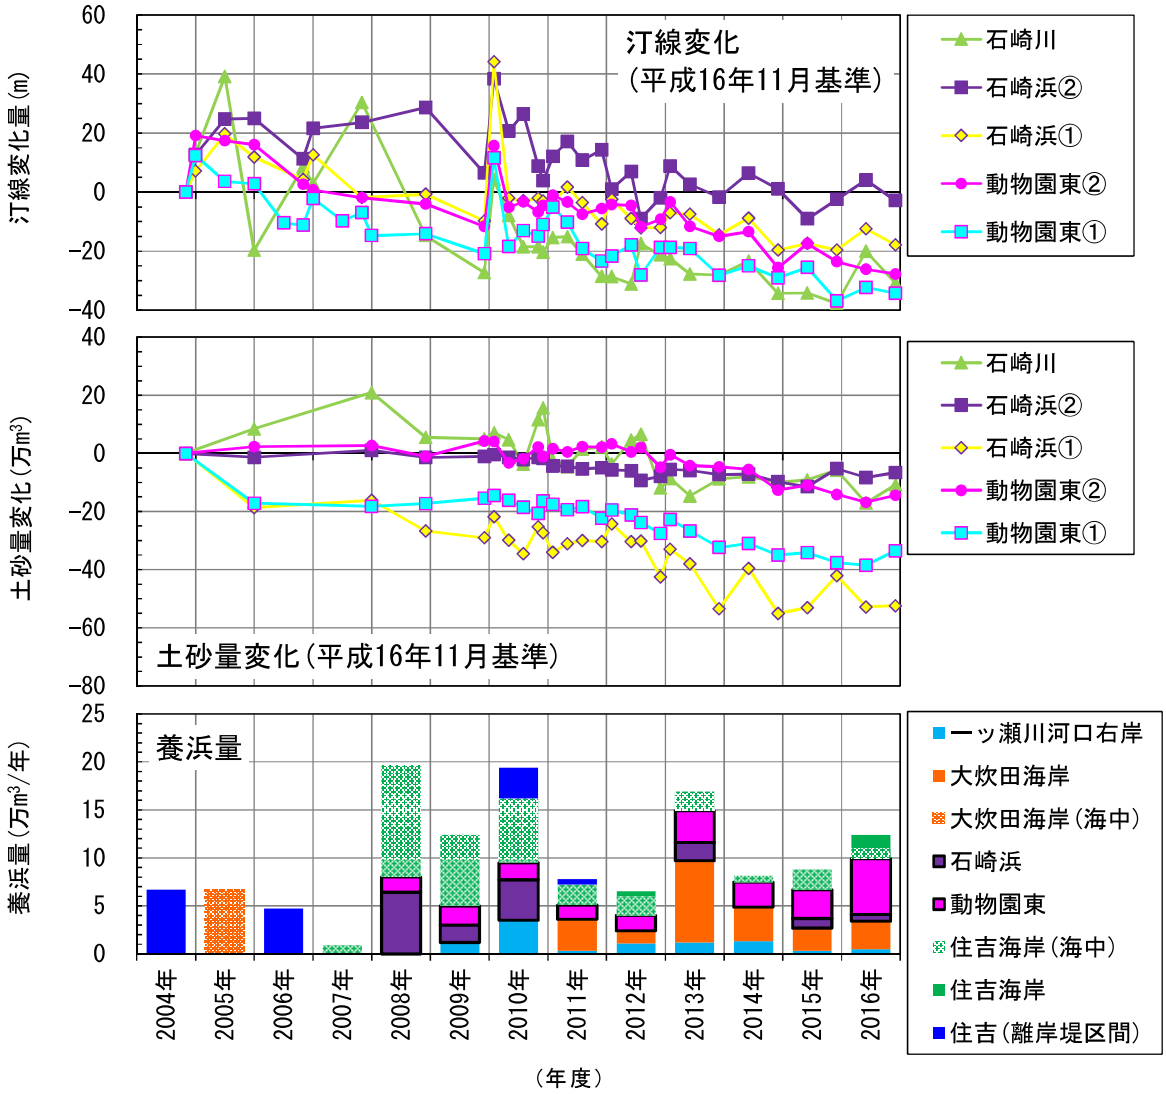

図　石崎浜、動物園東の土砂量変化、汀線変化

（参考図）

■住吉海岸、県管理区間

- 住吉海岸(補助突堤②北、補助突堤①北、突堤北)は、汀線は補助突堤②北の変動が大きく後退傾向である。なお、補助突堤②北および突堤北の汀線は砂浜が消失しているため変化が見られない状況となっている。土砂量は 2005(H17)年～2009(H12)年まで増加傾向であったが、その後は安定～やや侵食傾向である。
- 県管理区間(離岸堤区間)は、汀線は概ね安定している。土砂量は 2005(H17)年～2009(H12)年まで増加傾向であったが、その後は維持～やや侵食傾向である。

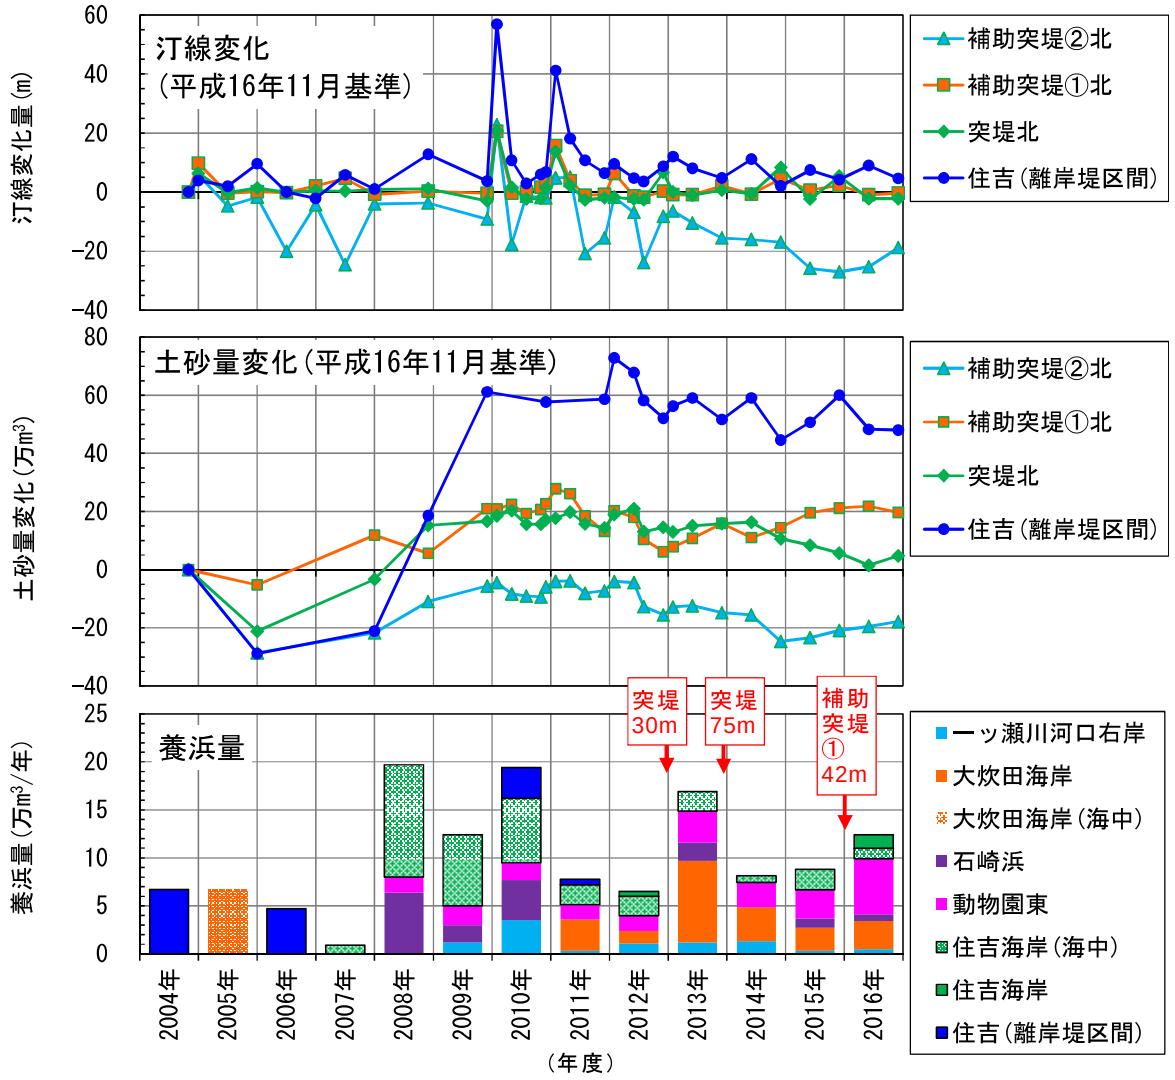

図　住吉海岸、県管理区間の土砂量変化、汀線変化

調　査　項　目	測量	地形測量		
要　分　析　指　標	土砂量変化、等深線変化			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■土砂量の変化と外力の関係

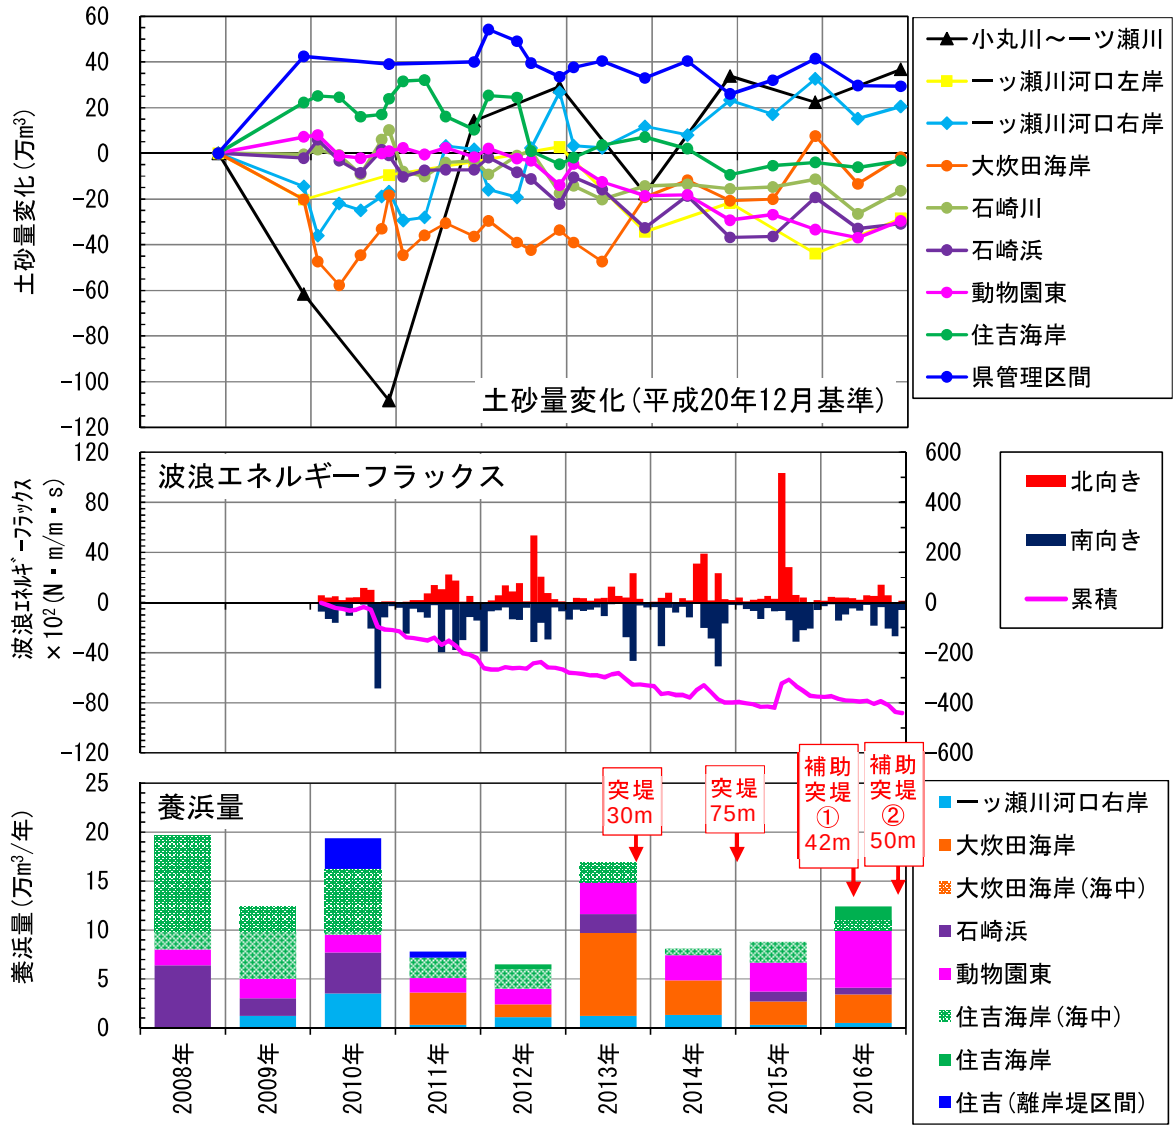

（参考図）

表　宮崎海岸に来襲した高波浪（発生要因別年間上位 5 波）

年	発生要因	ネダノ瀬地点における観測値				土砂移動方向 ↑：北向 ↓：南向
		発生起時	最大有義波高 H1/3(m)	有義波周期 T1/3(s)	平均波向 (°)	
平成22年 (2010年)	台風13号	10/30_08	4.9	11.9	81	↓
	低気圧	04/27_05	3.7	8.4	124	↑
	台風12号	09/25_08	3.7	12.0	88	↓
	低気圧	04/09_22	3.6	9.8	84	↓
	低気圧	06/13_08	3.3	7.6	89	↓
平成23年 (2011年)	台風6号	07/19_03	8.9	12.2	92	↓
	台風12号	09/02_04	5.5	12.1	95	↓
	前線	10/20_21	3.8	9.6	76	↓
	台風2号	05/29_14	3.8	11.1	135	↑
	低気圧	12/03_02	3.7	10.6	79	↓
平成24年 (2012年)	台風10号	08/01_14	7.2	10.6	80	↓
	台風16号	09/16_23	5.8	9.4	135	↑
	台風15号	08/27_21	4.9	11.1	138	↑
	低気圧	04/22_04	4.8	9.4	127	↑
	低気圧	05/22_11	4.8	11.4	96	↓
平成25年 (2013年)	台風26号	10/15_12	7.3	14.9	115	↑
	台風27号	10/23_23	5.1	11.5	97	↓
	台風18号	09/15_06	5.0	11.1	103	↓
	台風24号	10/07_23	3.9	9.4	123	↑
	低気圧	04/06_09	3.5	6.3	108	↑
平成26年 (2014年)	台風18号	10/05_17	8.8	12.6	103	↓
	台風19号	10/13_10	7.4	10.1	123	↑
	台風11号	08/09_12	7.4	9.0	94	↓
	台風8号	07/10_00	4.5	8.3	147	↑
	台風12号	08/01_15	4.4	9.7	139	↑
平成27年 (2015年)	台風15号	08/25_06	7.0	8.8	153	↑
	台風9号	07/09_15	5.3	15.1	129	↑
	低気圧	12/11_00	4.2	8.8	111	↑
	台風11号	07/16_08	4.2	10.9	99	↓
	低気圧	04/13_05	4.0	9.2	75	↓
平成28年 (2016年)	台風16号	09/20_04	7.2	7.7	110	↑
	低気圧	02/20_08	3.4	7.3	121	↑
	低気圧	01/17_22	3.2	7.5	101	↓
	低気圧	05/03_13	3.1	7.0	140	↑
	低気圧	04/17_03	3.1	6.7	141	↑

宮崎海岸と波向の関係

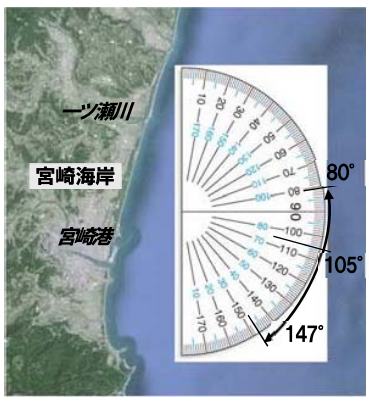

※宮崎海岸の平均的な海岸線の法線は 105°

調　査　項　目	測量	地形測量		
要 分 析 指 標	土砂量変化、等深線変化			
評　価　単　位	計画検討の前提条件	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

■砂丘からの土砂供給量

- 浜崖の後退に伴い砂丘から漂砂帯に供給される土砂量として、T.P.+4m 以上の地形変化量を算出した結果、2011(H23)年は 11.8 万 m^3（大炊田海岸：約 8.5 万 m^3、動物園東：約 3.3 万 m^3）、2014(H26)年は 4.6 万 m^3（大炊田海岸：約 1.3 万 m^3、動物園東：約 3.3 万 m^3）、2015(H27)年は 2.4 万 m^3（大炊田海岸：約 1.4 万 m^3、動物園東：約 1.0 万 m^3）の土砂供給があった。
- 2016(H28)年は 0.2 万 m^3（大炊田海岸：0 万 m^3、動物園東：0.2 万 m^3）であった。なお、動物園東では浜崖後退は生じていないことから、カウントされた土砂量は養浜した土砂の一部である。

※T.P.+4m 以上の地形変化量は、地形変化解析にも考慮されている。

（参考図）

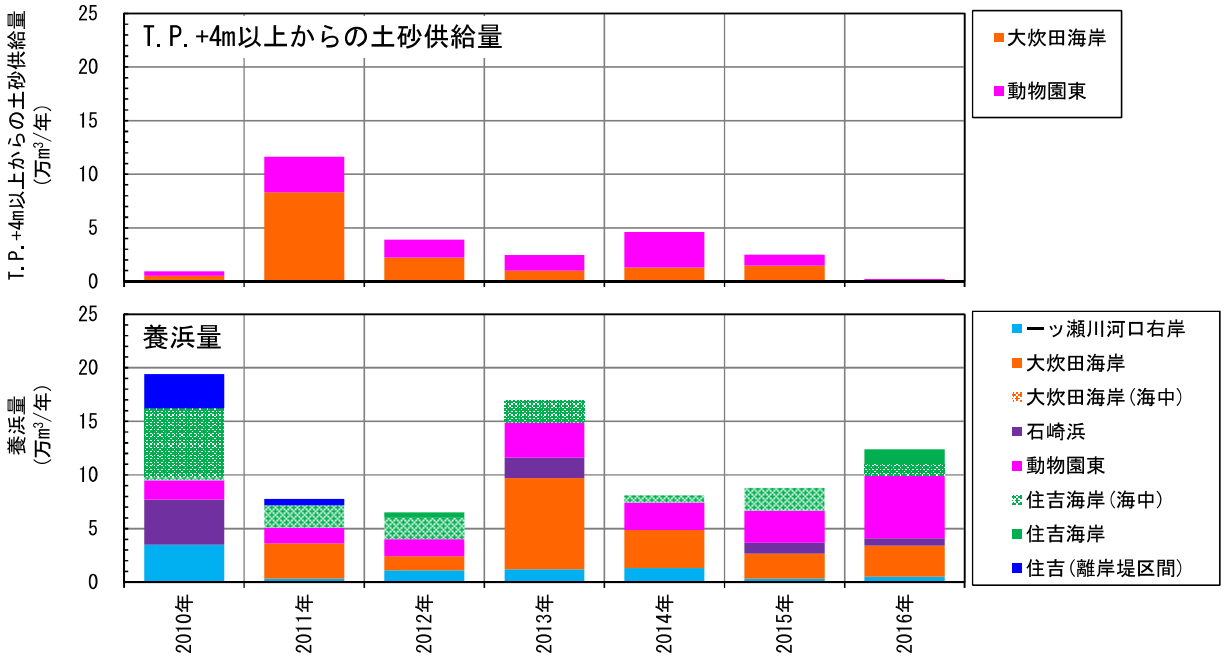

図　T.P.+4m 以上からの土砂量変化

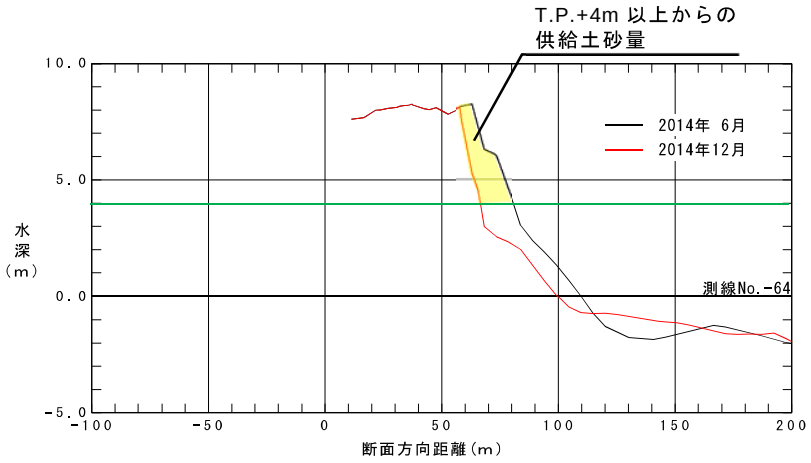

図　砂丘からの土砂供給量の算定例

調　査　項　目	測量	地形測量		
要 分 析 指 標	浜崖形状の変化			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	~~養浜~~	~~突堤~~	埋設護岸

分　析　内　容

- 2016(H28)年は、埋設護岸の設置が概ね完了している大炊田海岸では、浜崖位置の後退及び浜崖頂部高の低下ともにみられず、埋設護岸の効果を発揮している。
- 一方、動物園東では、埋設護岸設置区間の浜崖頂部は守られ効果を発揮している。一方、未設置区間は浜崖頂部の天端高が 2008(H20)年に比べて低下しており、越波対策上必要な防護高（T.P.+7m）よりも低い状況となっている。
- 動物園東は侵食傾向が顕著であり、埋設護岸未設置区間背後の浜崖頂部高が低くなっていることから、埋設護岸整備が必要である。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

分析に用いた図表

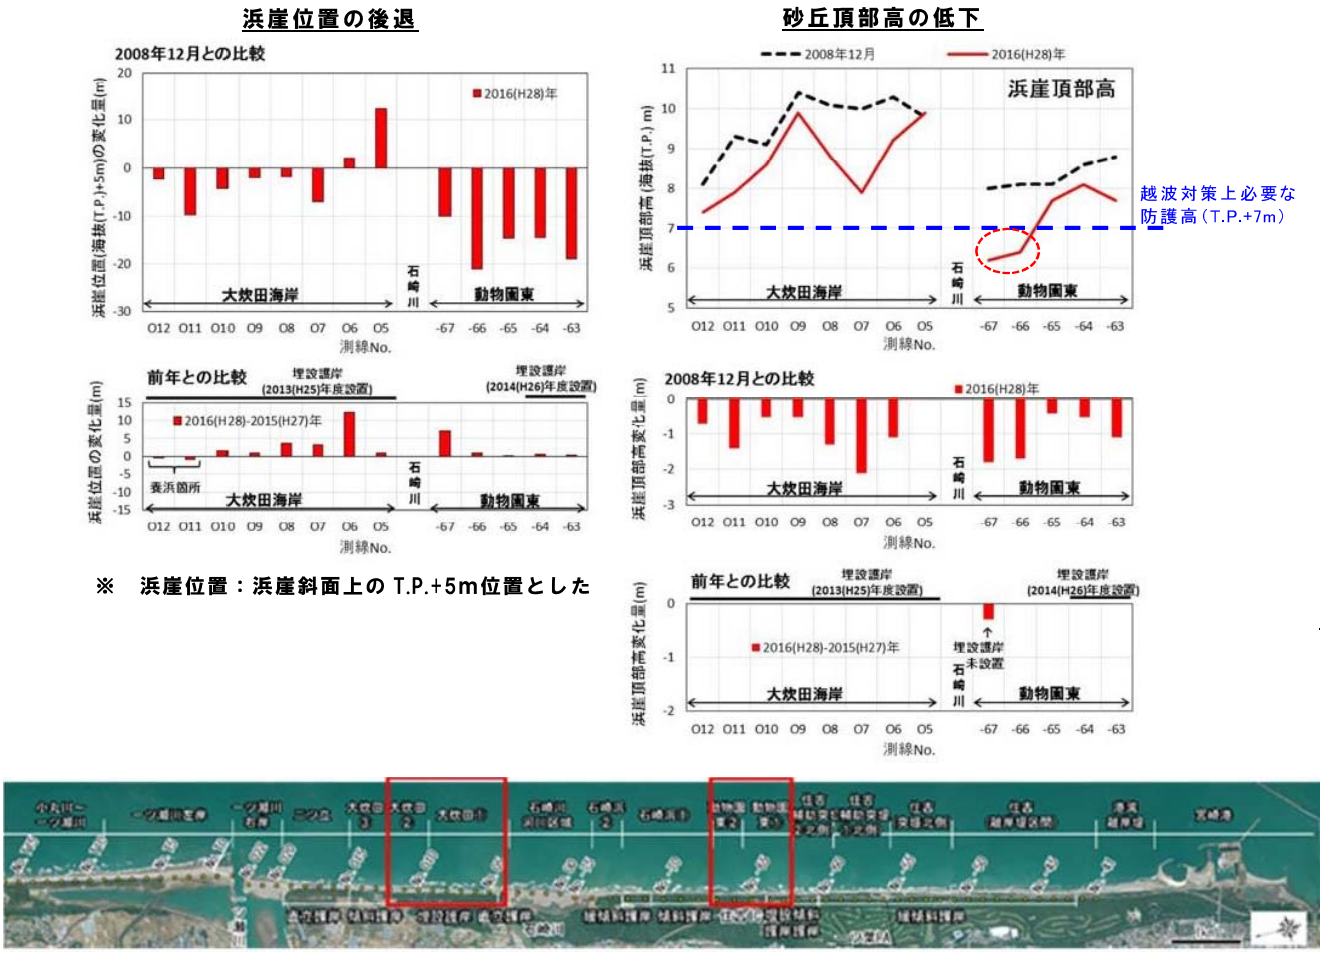

図　大炊田海岸、動物園東の浜崖位置及び砂丘頂部高の変化

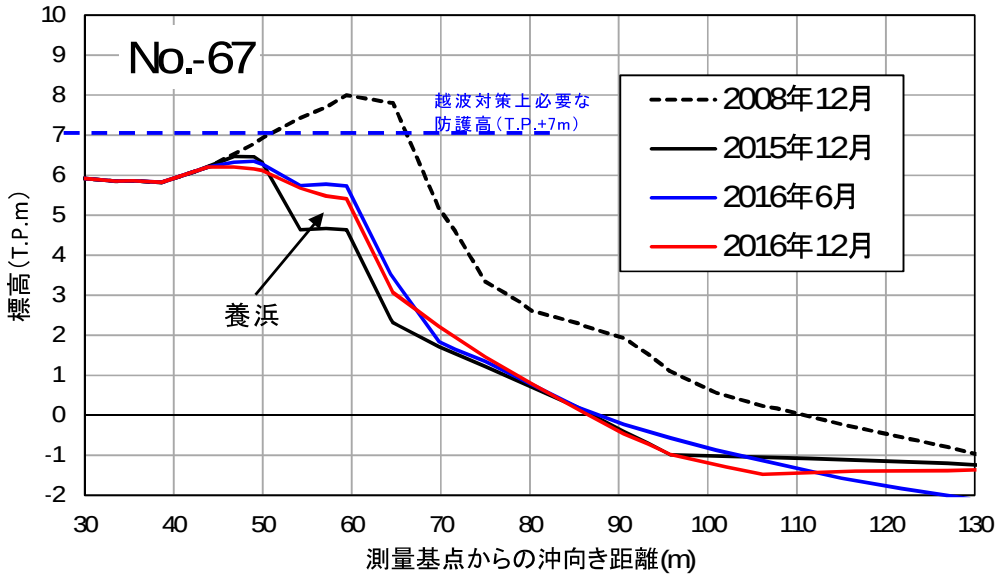

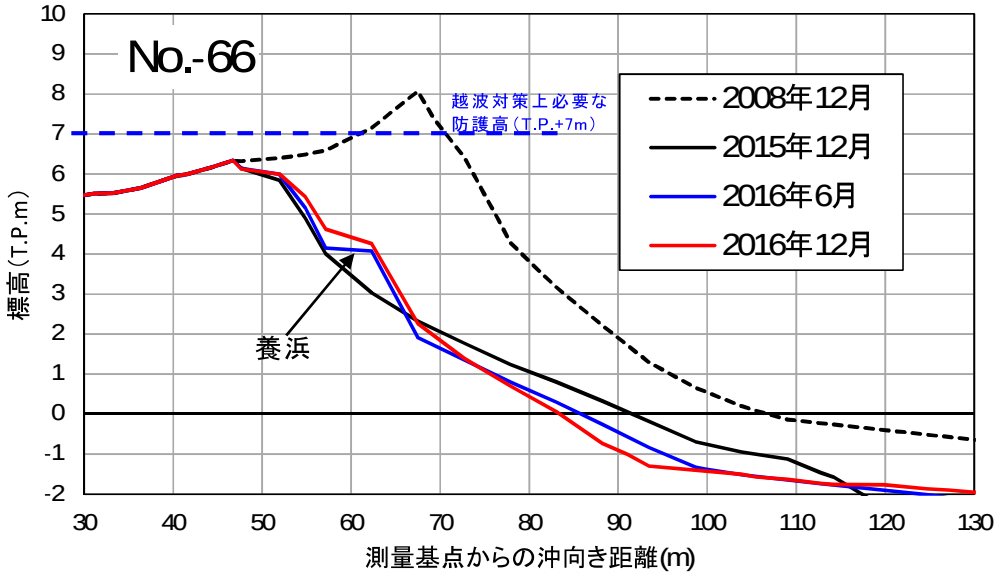

図　動物園東埋設護岸未設置区間の浜崖形状の変化

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
③要処置	対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

調　査　項　目	測量	地形測量		
要 分 析 指 標	前浜勾配			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 一ツ瀬川より北側で前浜の緩勾配化、石崎浜①～突堤北の範囲で前浜の急勾配化が見られた。
- 前浜部分の横断図を見ると、一ツ瀬川左岸導流堤に近い測線（No.T0～6）で勾配が緩くなっている。同範囲周辺の 2015(H27)年 12 月～2016(H28)年 12 月の 1 年間の水深変化を見ると、前浜近傍は導流堤に近いところは侵食、その北側は堆積となっており、全体的にはやや堆積傾向となっている。
- 石崎浜①～突堤北は、指標範囲の急勾配とほぼ同じ勾配であるため、通常の変動範囲から大きく外れるような特異な変化ではないと考えられるが、補助突堤②北～突堤北の範囲はコンクリート護岸箇所であり、前面に砂浜が存在しない状況であるため、養浜、突堤等により砂浜を回復する必要があると考える。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

分析に用いた図表

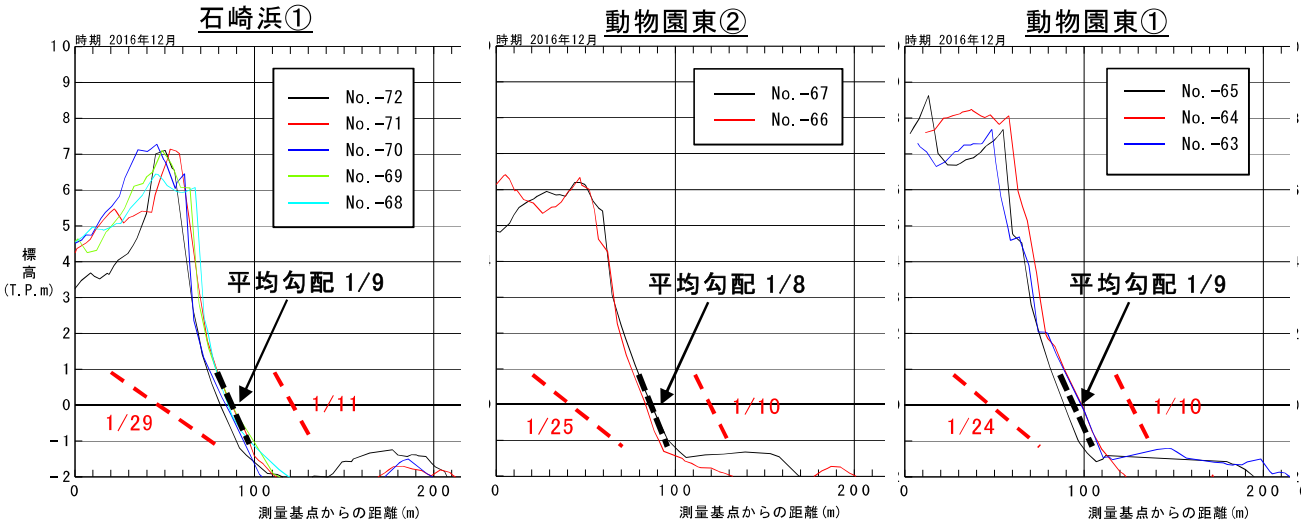

一ツ瀬川左岸

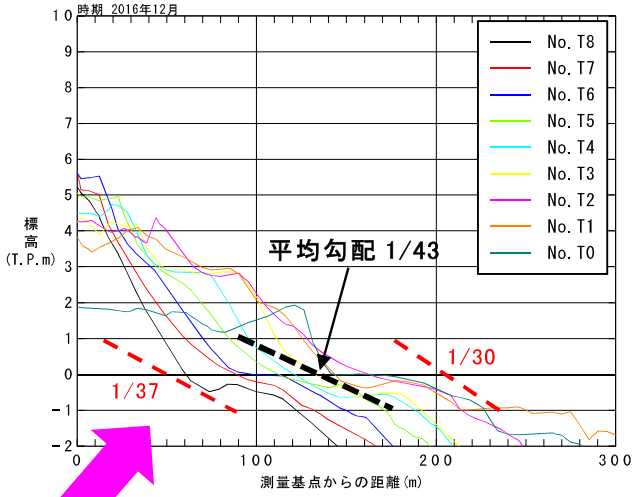

一ツ瀬川左岸周辺の水深変化

（2015 年 12 月～2016 年 12 月）

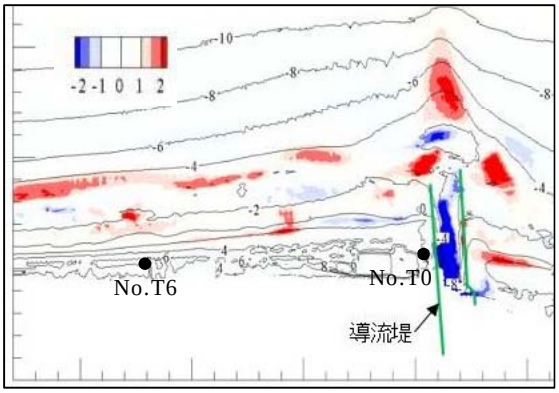

補助突堤②北

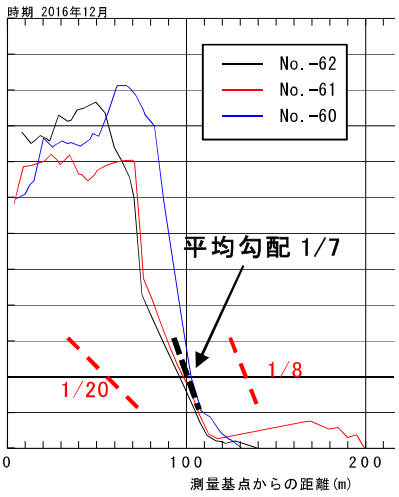

補助突堤①北

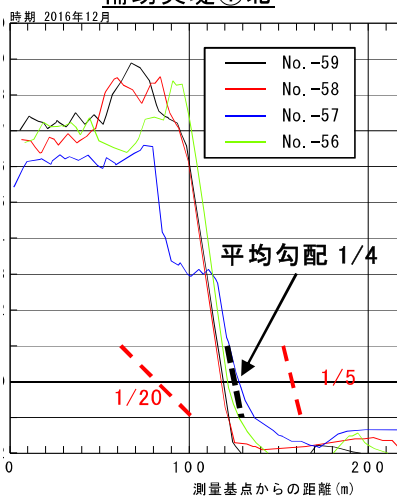

突堤北

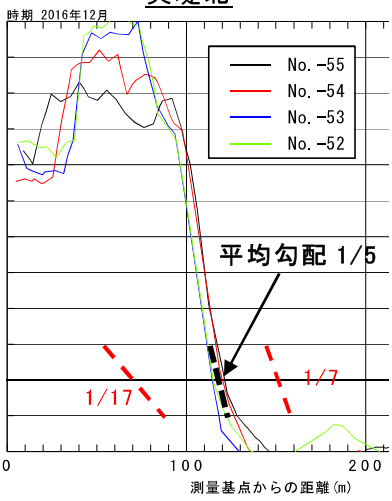

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
③要処置	対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

調　査　項　目	測量	施設点検		
要 分 析 指 標	ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ天端高、背後養浜盛土形状、ｻﾝﾄﾞﾊﾟｯｸの露出状況			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	~~養浜~~	~~突堤~~	埋設護岸

分　析　内　容

- 2016(H28)年の目視点検では、動物園東南側および大炊田海岸において、埋設護岸の変状につながる事象（サンドパック、グラベルマット、アスファルトマットの露出）を確認したが、埋設護岸の変状や背後の浜崖侵食は見られなかったことから、埋設護岸は一定の効果を発揮しているものと考えられる。
- 動物園東北側において養浜土砂の流出を確認した。この範囲は、砂浜が狭く背後の砂丘が海岸線間近に迫っているため、砂浜の回復を目指すとともに、埋設護岸整備が必要である。
- なお、平成 27 年度に洗掘対策工として新規に採用したグラベルマットは、露出後も大きな変状は見られず、サンドパック本体が変状する状況も見られなかった。ただし、高波浪の来襲がほとんどなかったため、改良した洗掘防止対策を含めた埋設護岸が十分な機能を有しているかは現時点では十分に判断できない。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。

分析に用いた図表



巡視回	2016(H28)年度	大炊田海岸③	大炊田海岸②	大炊田海岸①	石崎川	石崎浜②	石崎浜①	動物園東②	動物園東①	補助突堤②北	補助突堤①北	突堤北
1	4月14日			SPの露出					SP露出			
2	4月20日											
3	4月28日											
4	5月6日											
5	5月12日											
6	5月18日								南端復旧工事			
7	5月24日											
8	5月31日											
9	6月8日		SP北端・袋詰め玉石露出									
10	6月14日											
11	6月22日											
12	6月28日								SP露出			
13	7月5日		ガリ侵食，袋詰め玉石露出	養浜箇所ガリ侵食，SPの露出								
14	7月12日					養浜箇所ガリ侵食			SP・GM露出，養浜箇所ガリ侵食			
15	7月19日								SP・GM露出，養浜箇所ガリ侵食			
16	7月26日								SP・GM露出			
17	8月2日			SP露出								
18	8月9日											
19	8月16日											
20	8月24日			養浜箇所侵食，SP露出					SP露出，養浜箇所侵食			
21	8月30日								SP・GM露出，養浜箇所侵食			
22	9月5日							養浜箇所侵食				
23	9月13日											
24	9月21日					養浜箇所侵食						
25	9月27日		ガリ侵食，SP北端露出						SP・GM・AM露出，養浜箇所侵食			
26	10月6日											
27	10月12日											
28	10月18日							養浜箇所侵食	SP露出，養浜箇所侵食			
29	10月25日		ガリ侵食，養浜箇所侵食，SP露出						SP露出			
30	11月1日								SP・GM露出，養浜箇所侵			
31	11月8日							養浜箇所侵食	SP露出			
32	11月15日								SP露出，養浜箇所侵食			
33	11月22日											
34	11月29日								SP・AM露出，養浜箇所侵食			
35	12月8日											
36	12月14日											
37	12月20日											
38	12月27日		SP北端露出									
39	1月5日								SP露出，養浜箇所侵食			
40	1月11日											
41	1月17日											
42	1月24日											
43	1月31日											
44	2月7日											
45	2月14日											
46	2月21日											
47	2月28日			養浜箇所侵食								
48	3月7日					養浜箇所侵食						
49	3月14日											
50	3月21日											
51	3月27日											

：範囲外↑↓

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
②要注視	対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

6.3 環境・利用

環境･利用に関する指標において､指標に設定した範囲の範囲外となった項目は、環境 19 項目中 9 項目（底質、付着生物、幼稚仔、底生生物、魚介類、植生断面、コアジサシ、アカウミガメ、固結度）、利用 4 項目中 0 項目であった。

以下に、設定範囲外となった指標についての分析結果を示す。

対象外

ー：非実施

			小丸川周辺	一ッ瀬川左岸	一ッ瀬川右岸	二ツ立海岸	大炊田海岸③	大炊田海岸②	大炊田海岸①	石崎川
平成27年度侵食対策	養浜（万m³）			ー	ー	0.3(後浜)	ー	2.4(埋設護岸覆土)		ー
	突堤									
	埋設護岸							ー (L=1,580m)		
	関連工事			ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
平成28年度侵食対策	養浜（万m³）			ー	ー	0.5(後浜)	ー	2.9(埋設護岸覆土)		ー
	突堤									
	埋設護岸							機能復旧工L=260m (計L=1,580m)		
	関連工事			ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
環境	水質	水質（汀線・海）	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		水質（カメラ）	ー	ー						
	底質	底質(粒度)	範囲内	ー	ー	ー	ー	範囲内	ー	ー
		底質(有機物)	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		養浜材	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	浮遊生物・付着生物、幼稚仔、底生生物	浮遊生物	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		付着生物	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		幼稚仔	範囲外↑	ー	ー	ー	ー	範囲外↑	ー	ー
		底生生物	範囲外↑↓	ー	ー	ー	ー	範囲外↑	ー	ー
		底生生物（石崎川河口）								ー
	魚介類	魚介類	範囲外↑	ー	ー	ー	ー	範囲外↑↓	ー	ー
		漁獲								
	植物	植生断面	範囲外↑	ー	ー	範囲内	ー	範囲内	ー	範囲外↑
		植物相	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	昆虫		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	鳥類	鳥類	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
		コアジサシ	ー	範囲外↓	ー	ー	範囲外↓			範囲外↓
	ウミガメ	上陸実態	ー	ー	特記事項なし	特記事項なし		特記事項なし		範囲内
		固結	ー	ー	ー	ー	ー	範囲外↓		ー
利用	操船		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	利用		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	景観		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	市民意見									

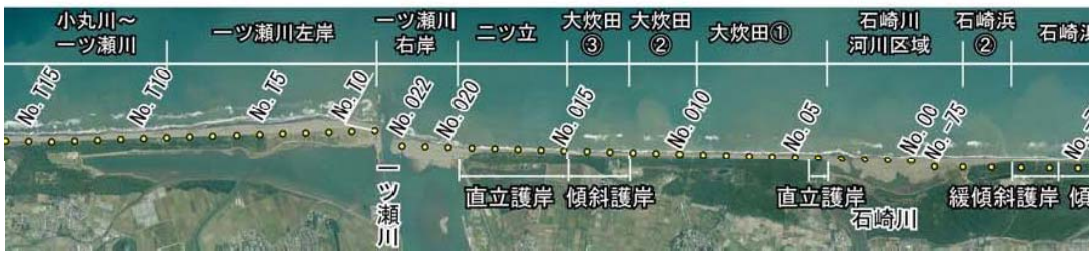

検証ブロック区分										
	石崎浜②	石崎浜①	動物園東②	動物園東①	補助突堤②北	補助突堤①北	突堤北	県管理区間	港湾離岸堤	宮崎港
	1.0(後浜)	ー	3.0 (後浜、埋設護岸覆土)		ー	2.1(海中)	-	-		
					ー	ー	ー (計75m)			
			ー	- (L=280m)						
	ー	ー	ー	ー	護岸工事 (災害復旧)	ー	ー	ー	ー	ー
	0.7(後浜)	ー	5.8 (後浜、埋設護岸覆土)		ー	0.8(汀線付近) 1.1(海中)	0.6(汀線付近)	-		
					L=50m (計50m)	L=42m (計42m)	天端被覆工 (計75m)			
			ー	L=440m (計L=720m)						
	ー	ー	ー	ー	護岸工事 (災害復旧)	ー	ー	ー	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
			ー							
	範囲外↑	ー	ー	ー	ー	ー	範囲外↑↓	範囲外↑↓	ー	ー
	範囲内	ー	ー	ー	ー	ー	範囲内	範囲内	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	範囲内	ー	ー	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	範囲外↑↓	範囲外↑	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	範囲外↑	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	範囲外↑	ー	ー
	ー	ー	特記事項なし (サーフゾーン調査)		ー	ー	範囲外↑↓	範囲外↑	ー	ー
	範囲内									
	ー	ー	ー	範囲内	ー	ー	ー	範囲外↑	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	範囲外↓	範囲外↓	範囲外↓		範囲外↓	範囲内		範囲内	範囲外↓	ー
	ー	ー	範囲外↓		ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	—
	ー	ー	ー	ー	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	ー	ー	ー
	特記事項なし									

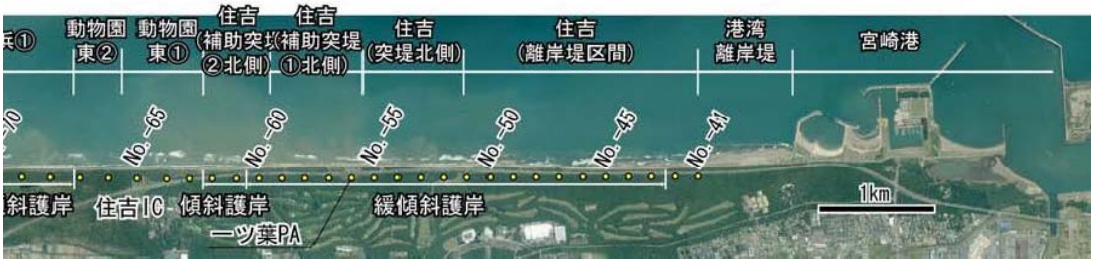

調　査　項　目	環境・利用	底質調査		
要 分 析 指 標	底質（中央粒径、ふるいわけ係数、粒径加積曲線）			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	~~突堤~~	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 指標範囲外となった石崎浜②(砕波帯の中央粒径・ふるい分け係数)、住吉海岸(突堤北側)(汀線・砕波帯のふるい分け係数)および住吉海岸(離岸堤区間)(砕波帯の中央粒径・ふるい分け係数)について、継続して水深毎の底質採取を実施している地点の粒度組成を比較した。底質は粗粒化と細粒化を繰り返しており、一定の傾向は見られない。
- 従来の海岸の底質の粒度組成に大きな影響を与えるような養浜材は投入していない。
- 突堤周辺の地形変化に対応した底質の変化は見られない。
- 対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。

分析に用いた図表

■中礫分　■小礫分　■極粗粒砂分　■粗粒砂分
■中粒砂分　■細粒砂分　■極細粒砂分　■シルト・粘土分

■粒度組成（汀線付近）

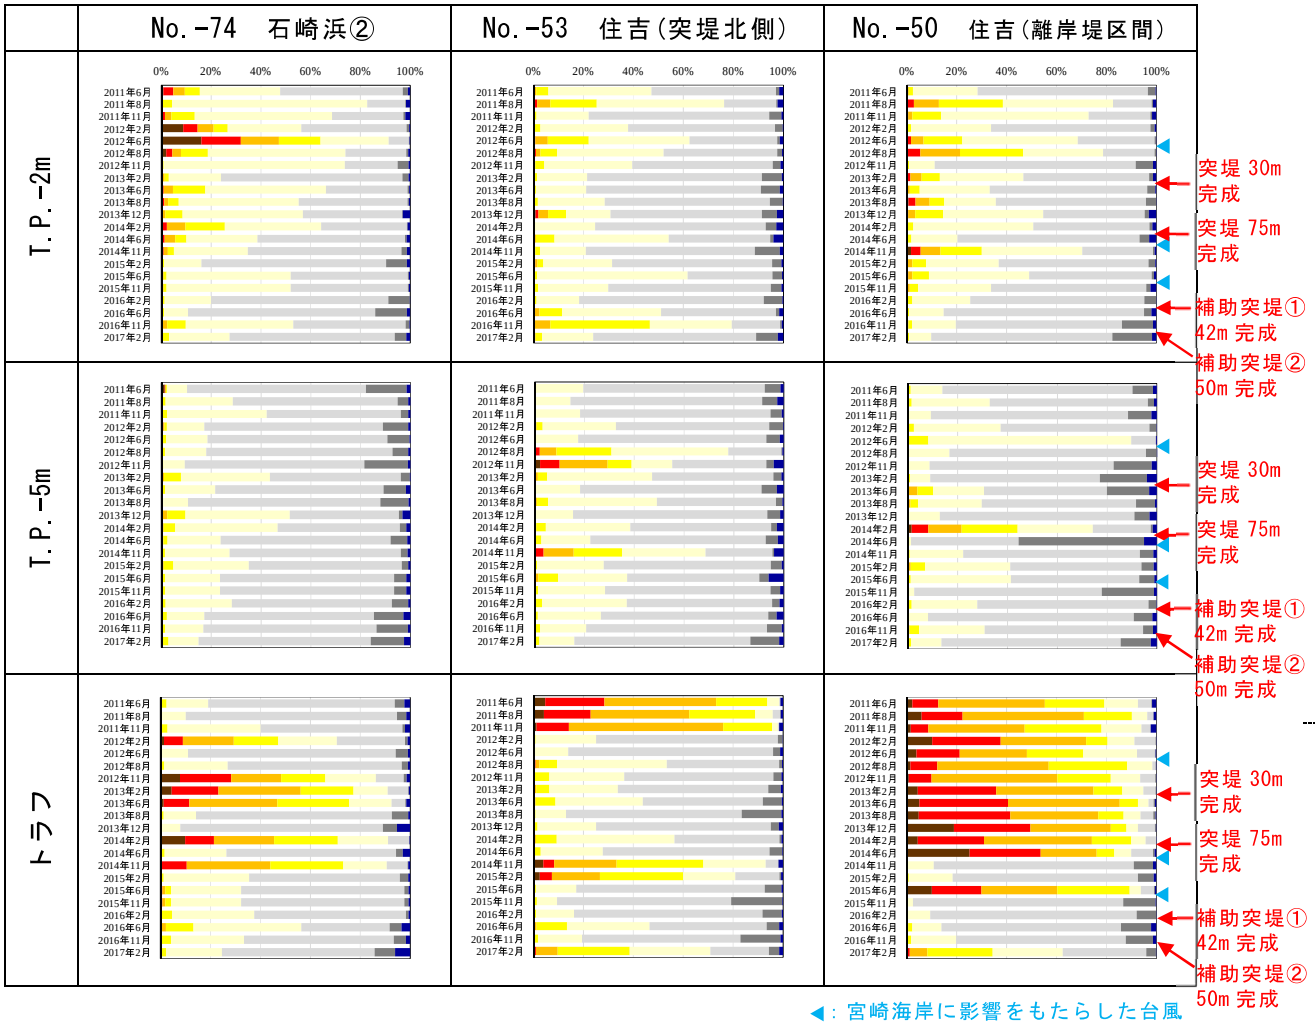

■粒度組成（砕波帯付近）

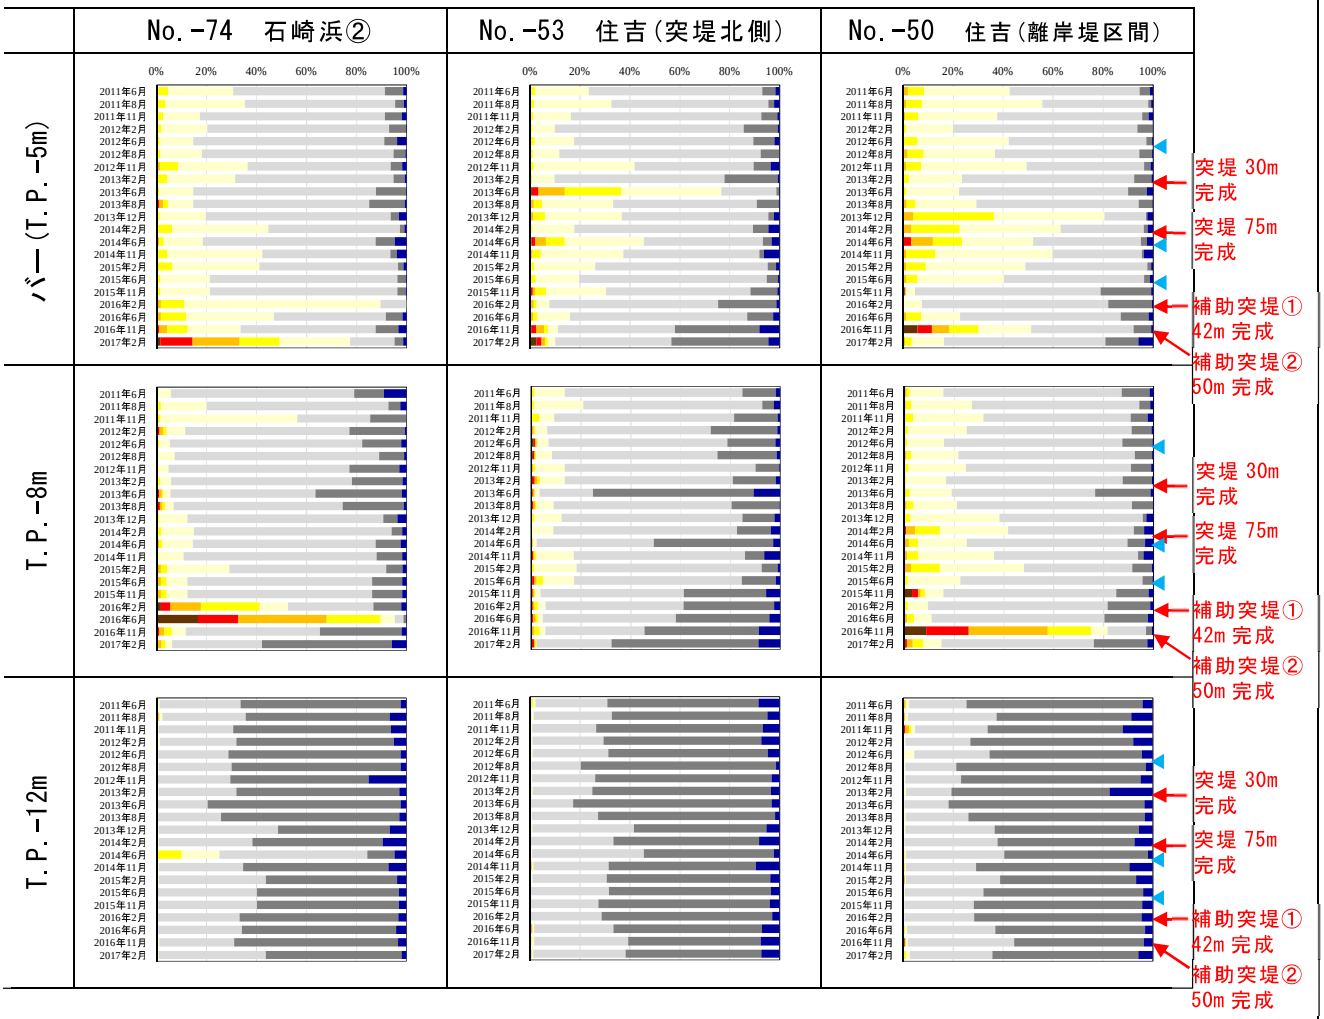





分　析　結　果

①要観察	対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

調　査　項　目	環境・利用	底質調査		
要 分 析 指 標	底質（中央粒径、ふるいわけ係数、粒径加積曲線）			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	~~突堤~~	~~埋設護岸~~

分析に用いた図表

■養浜材の粒度分析結果

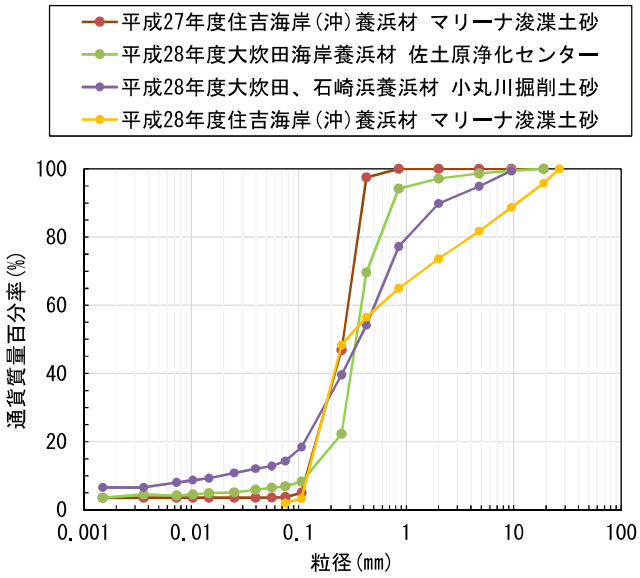

■地形変化と粒度分析結果の関

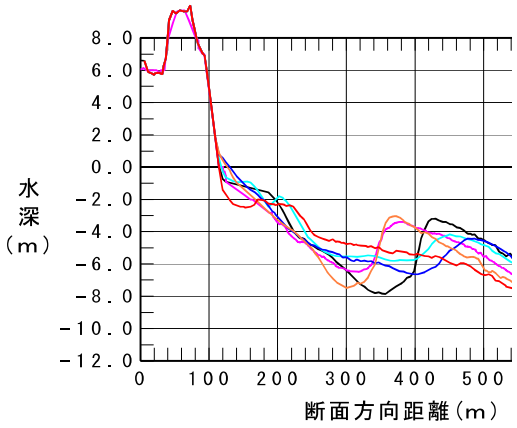

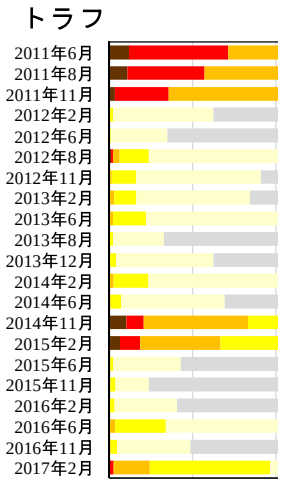

系

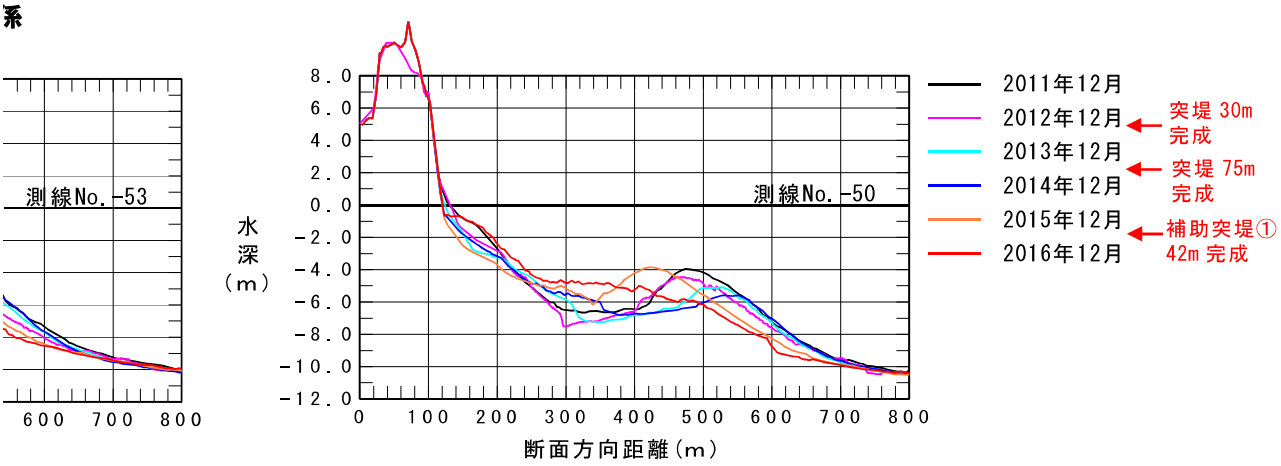

トラフ

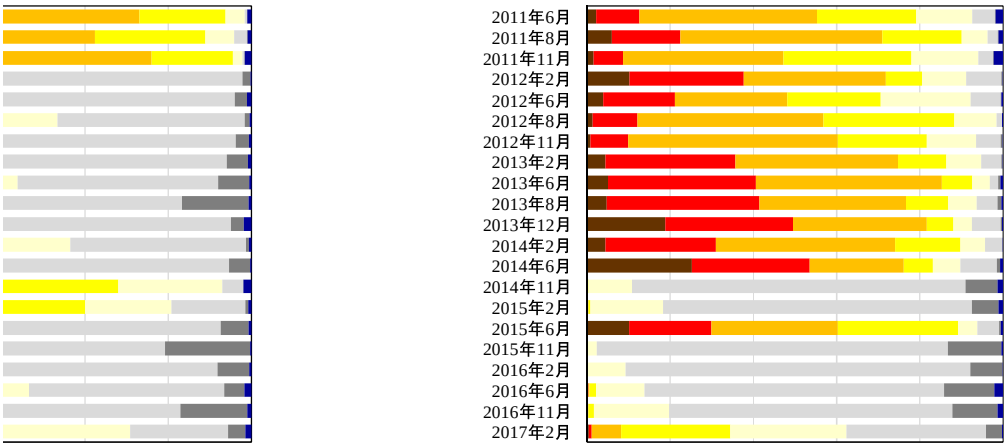

分　析　結　果

①要観察	対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

調　査　項　目	環境・利用	付着生物調査		
要 分 析 指 標	付着生物			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	~~養浜~~	突堤	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 平成 28 年 4 月～6 月にかけて、突堤天端被覆工事の実施に伴い側方のブロックも移動しているため、環境の連続性が断たれている。特に紅藻綱は全地点で大きく減少している。
- これまでの突堤調査の結果突堤の付着植物の湿重量は、既設離岸堤の平均値と比較して同程度からやや多いが、付着動物は個体数、種数ともにブロック側面を除いてやや少ない。
- 既設の離岸堤では、平成 25 年春季以降、付着植物の紅藻綱の出現種数が既往調査結果より大きくなる傾向が続いている。これは突堤建設開始後に相当するが、それ以前の挙動と比較して極端な変化ではいため、関連性は不明である。
- 整備が進む突堤と付着生物の関連性を把握するため、引き続き、経過を観察する。

分析に用いた図表

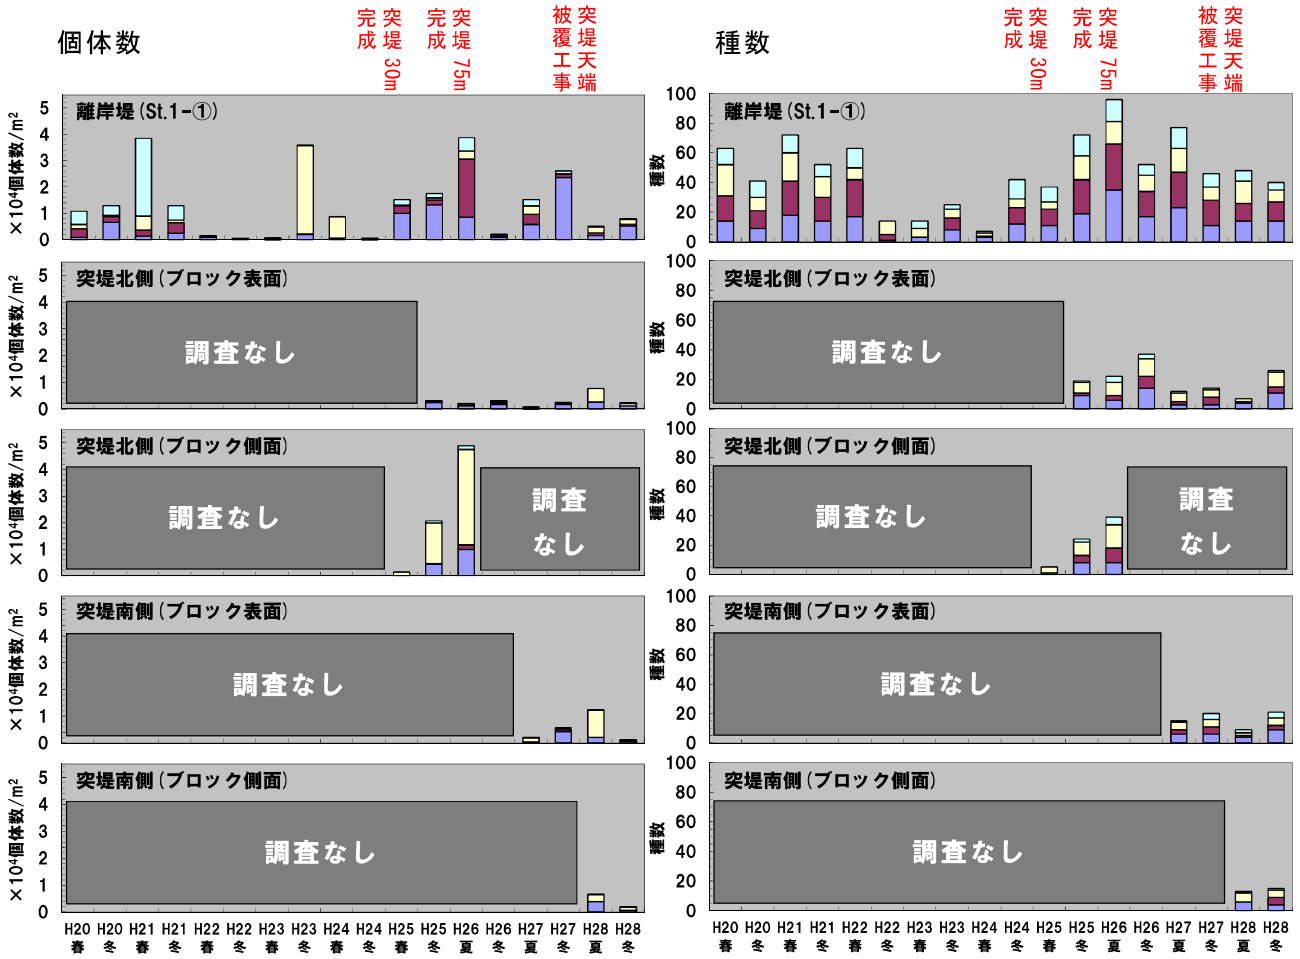

図　付着動物の出現状況

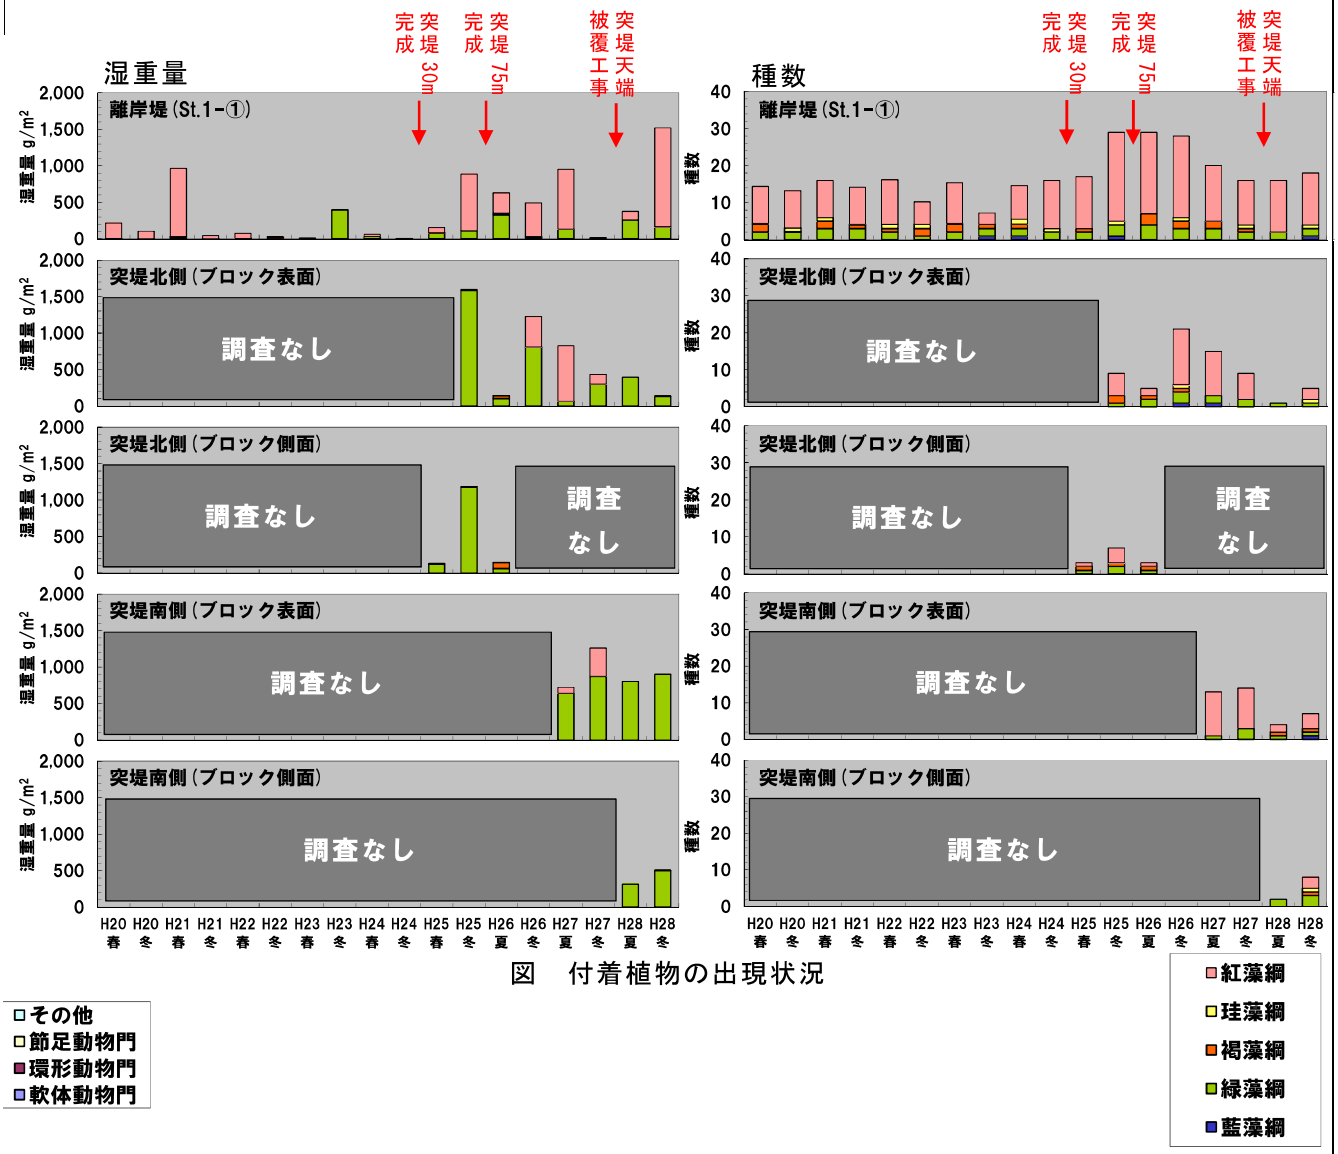

図　付着植物の出現状況

分　析　結　果

①要観察	対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

調　査　項　目	環境・利用	幼稚仔調査		
要 分 析 指 標	幼稚仔			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	~~突堤~~	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 平成 28 年度春季調査で、大炊田海岸の幼稚仔個体数が急増したが、その規模は平成 26 年春季調査を下回る程度であり、また、平成 28 年冬季にはそれまでと同程度まで減少している。
- 大炊田海岸で、春季調査において節足動物門の個体数が既往最大値を上回った。これは、ミツクリハマアミが多く確認されたためである。冬季調査においては、個体数は範囲内となった。
- 対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。

分析に用いた図表

幼稚仔調査地点

ミツクリハマアミ

■海浜土量、養浜量と幼稚仔（個体数）の経年変化

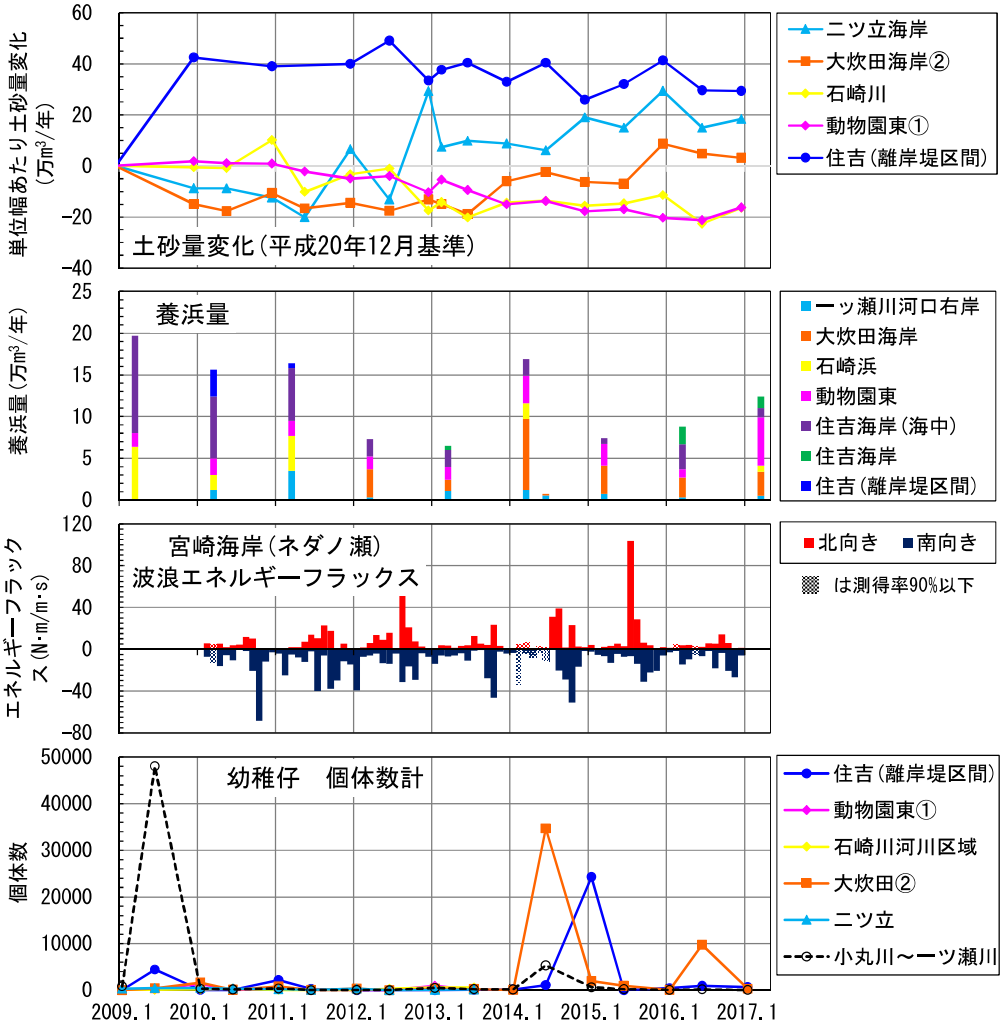

分　析　結　果

①要観察	対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

調　査　項　目	環境・利用	幼稚仔調査		
要 分 析 指 標	幼稚仔			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	~~突堤~~	~~埋設護岸~~

分析に用いた図表

：宮崎海岸に影響を及ぼした低気圧・台風
：養浜
：突堤施工
：埋設護岸施工

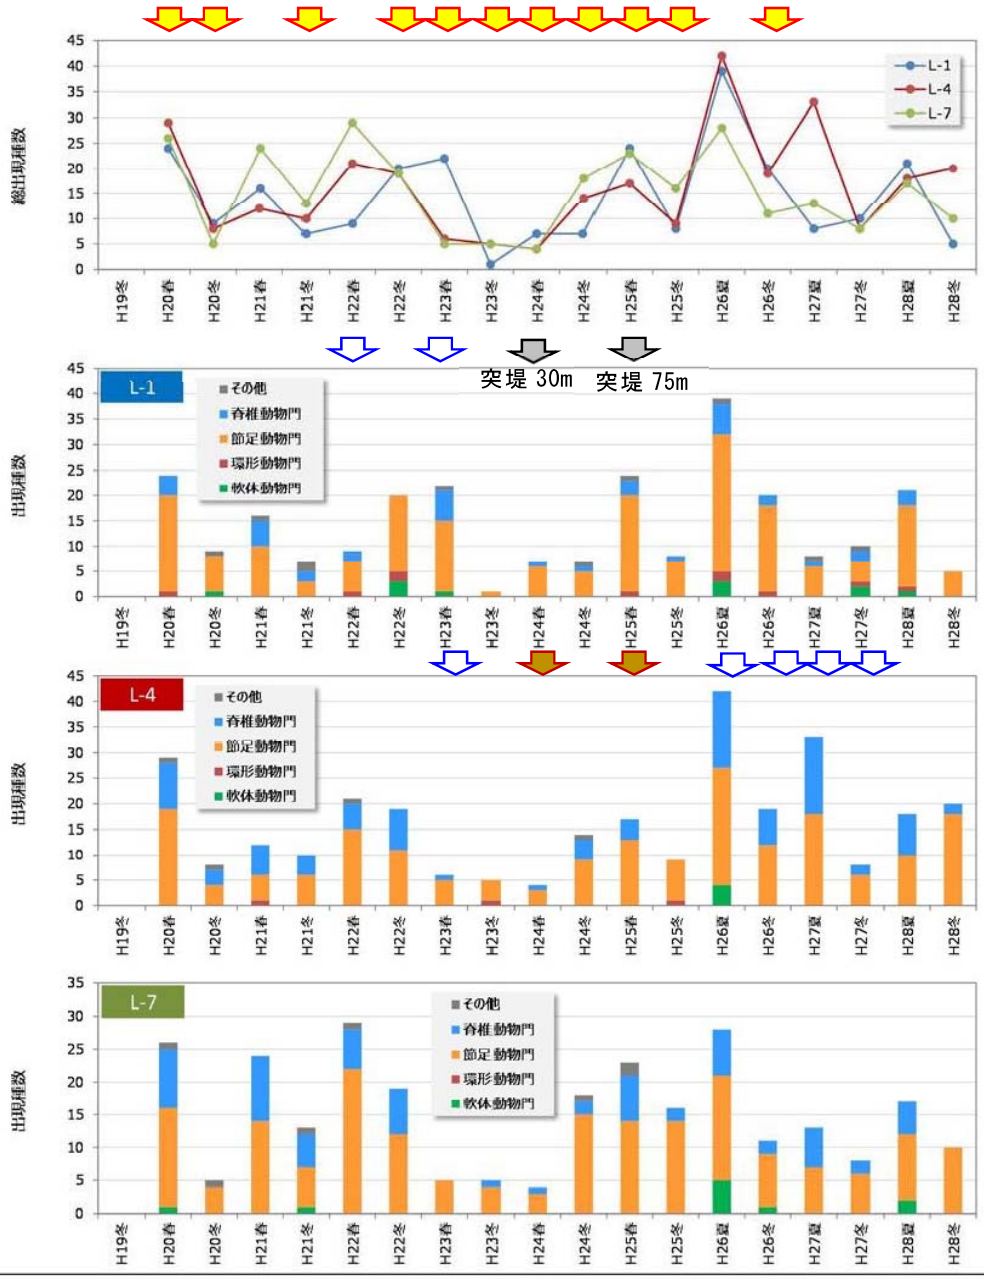

（参考図）

- 幼稚仔調査で確認される種は、汀線付近から砕波帯付近を生活の一部として利用する魚類及びその稚仔魚、アミ類、ヨコエビ類等を含んでおり、魚食性の魚類の餌料環境を支える生物種として重要である。出現種数および個体数については、対策の実施や波浪条件との明確な連動性はみられない。

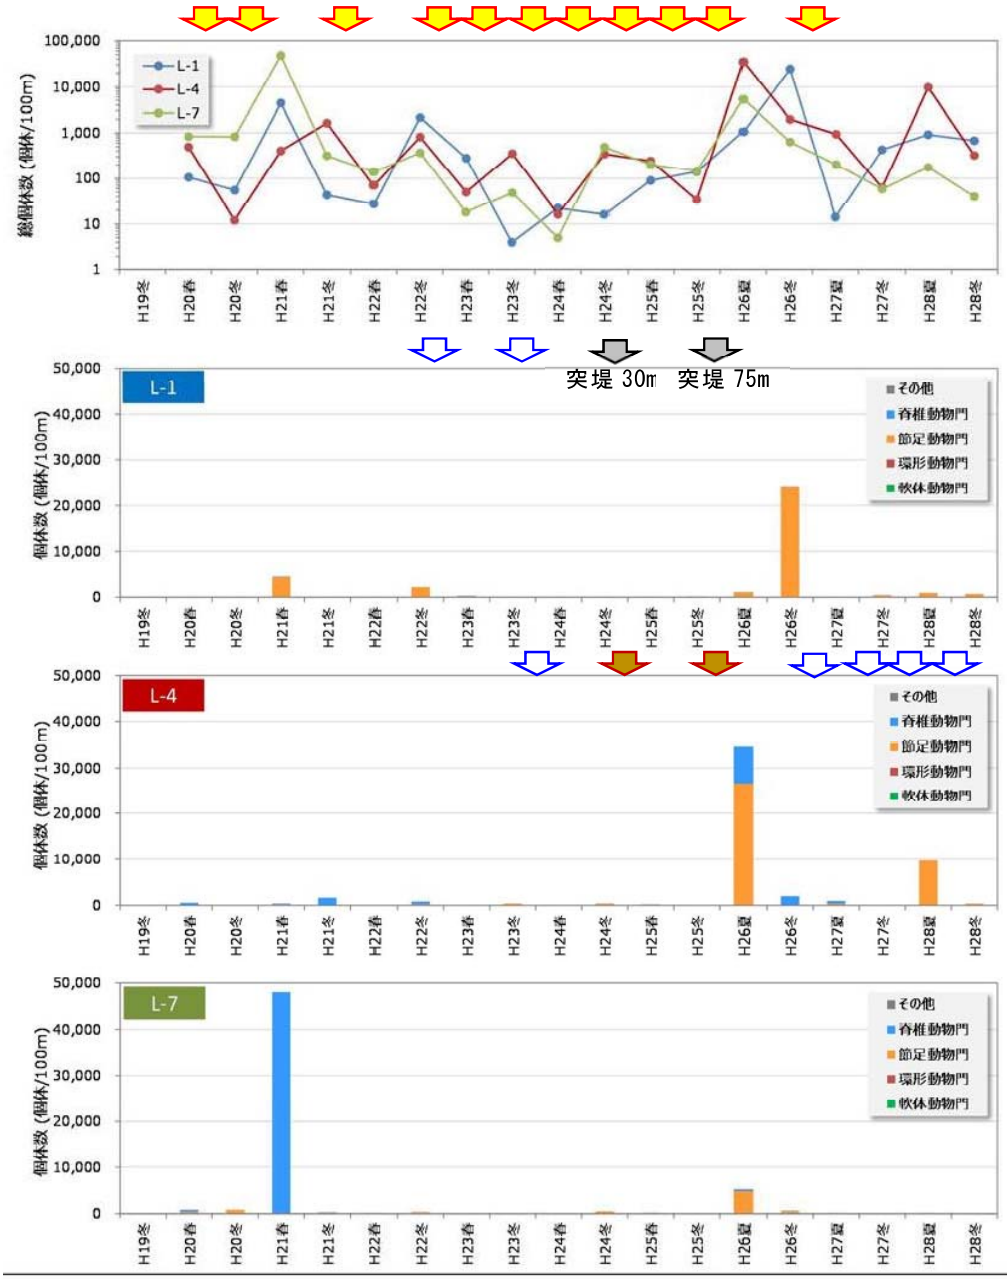

調　査　項　目	環境・利用	底生生物調査		
要 分 析 指 標	底生生物			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 大炊田海岸、住吉(離岸堤区間)ともに、過去と比較して際立った変動は見られない。比較対象地点である小丸川～一ツ瀬川において、平成 28 年春季に汀線、砕波帯付近ともに節足動物門の増加により個体数が増加したが平成 28 年冬季には以前と同程度まで減少している。
- 底生生物の生息状況との関連があると示唆される粒径は、過去と比較して目立った変化は見られない。
- 養浜や突堤設置、埋設護岸設置等の対策箇所と、魚介類個体数の変動箇所の間に明確な関連性は見られない。
- 対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。

分析に用いた図表

底生生物調査地点

■海浜土量、養浜量と底生生物（個体数）の経年変化

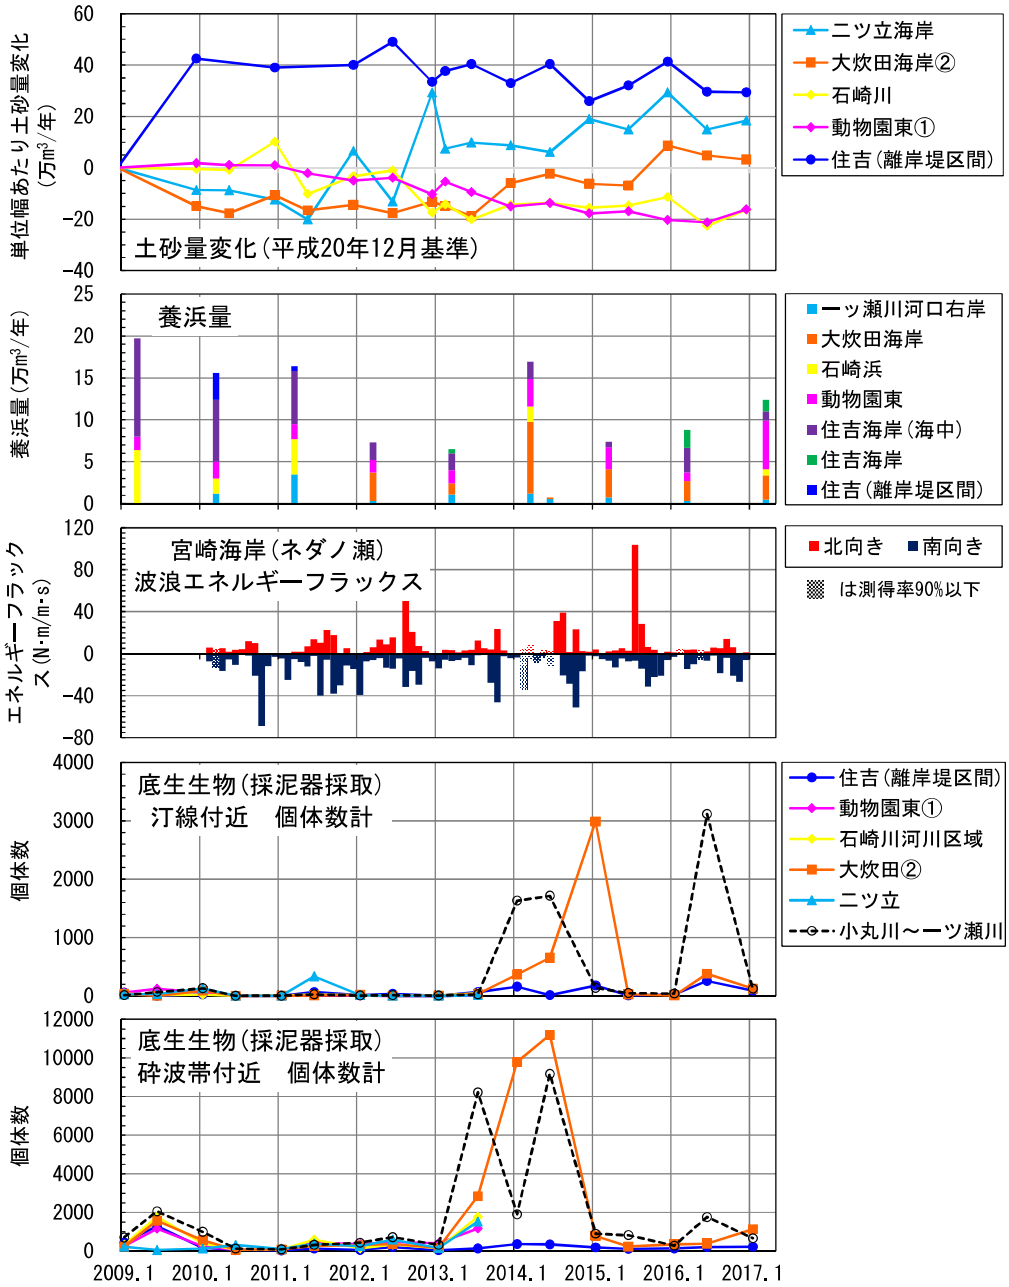

分　析　結　果

①要観察	対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

調　査　項　目	環境・利用	底生生物調査		
要 分 析 指 標	底生生物			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

分析に用いた図表

■底生生物（汀線付近）の出現種数、個体数および底質調査結果経年変化

：宮崎海岸に影響を及ぼした低気圧・台風
：養浜
：突堤施工
：埋設護岸施工

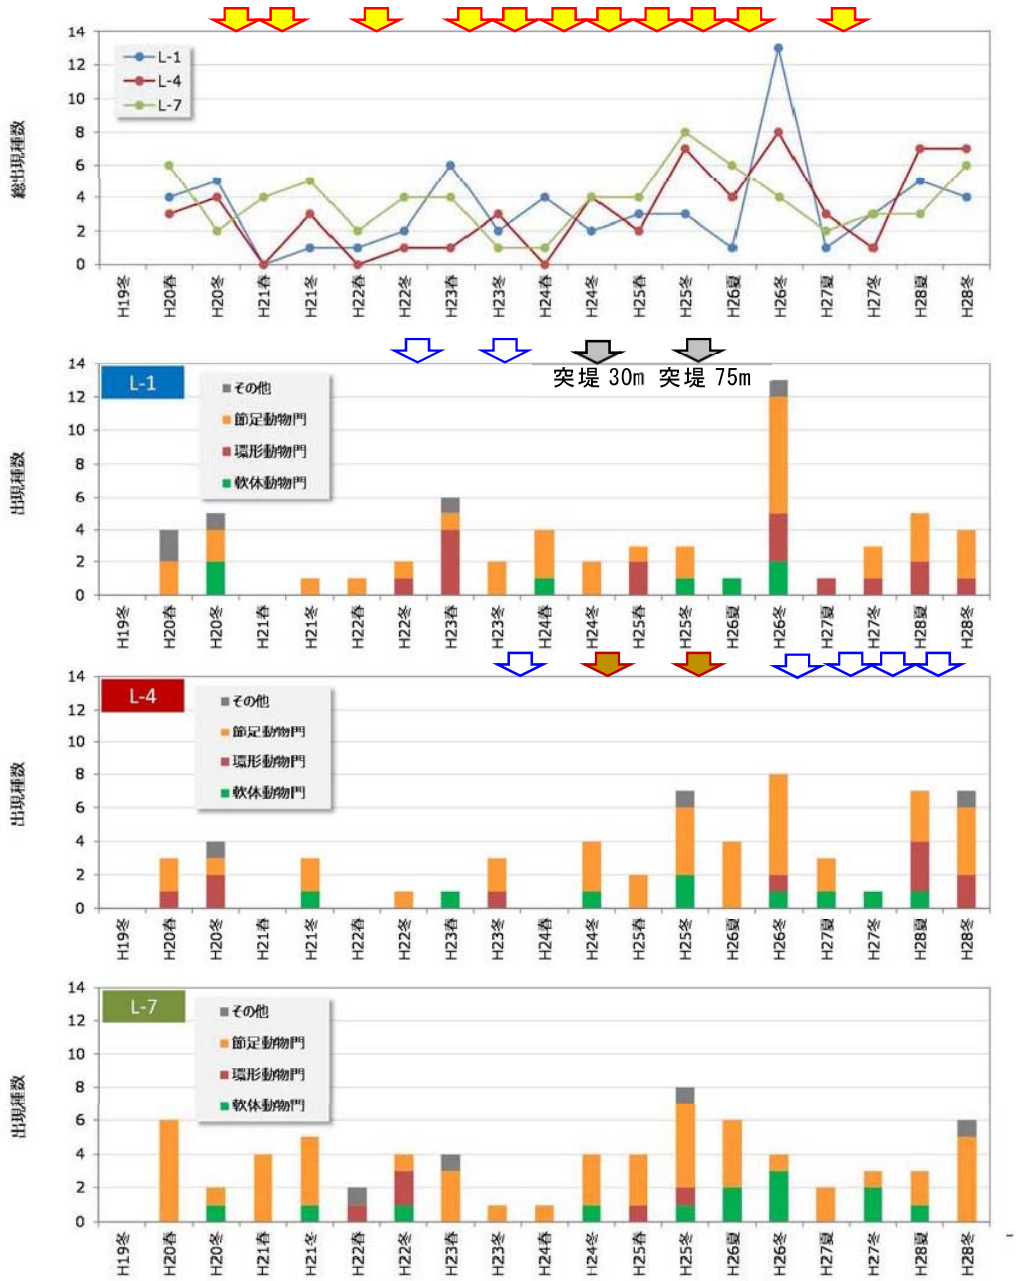

（参考図 1）

- 経年的に見ると、種数、個体数ともに概ね節足動物門が多く、平成 28 年度も同様の傾向が見られた。
- 既往調査結果によると粒径が粗い場合、底生動物の個体数が少ない傾向にあり、出現数および個体数は底質の粒径との連動性が示唆される。平成 28 年度は粒径が極端に粗い地点は見られなかった。

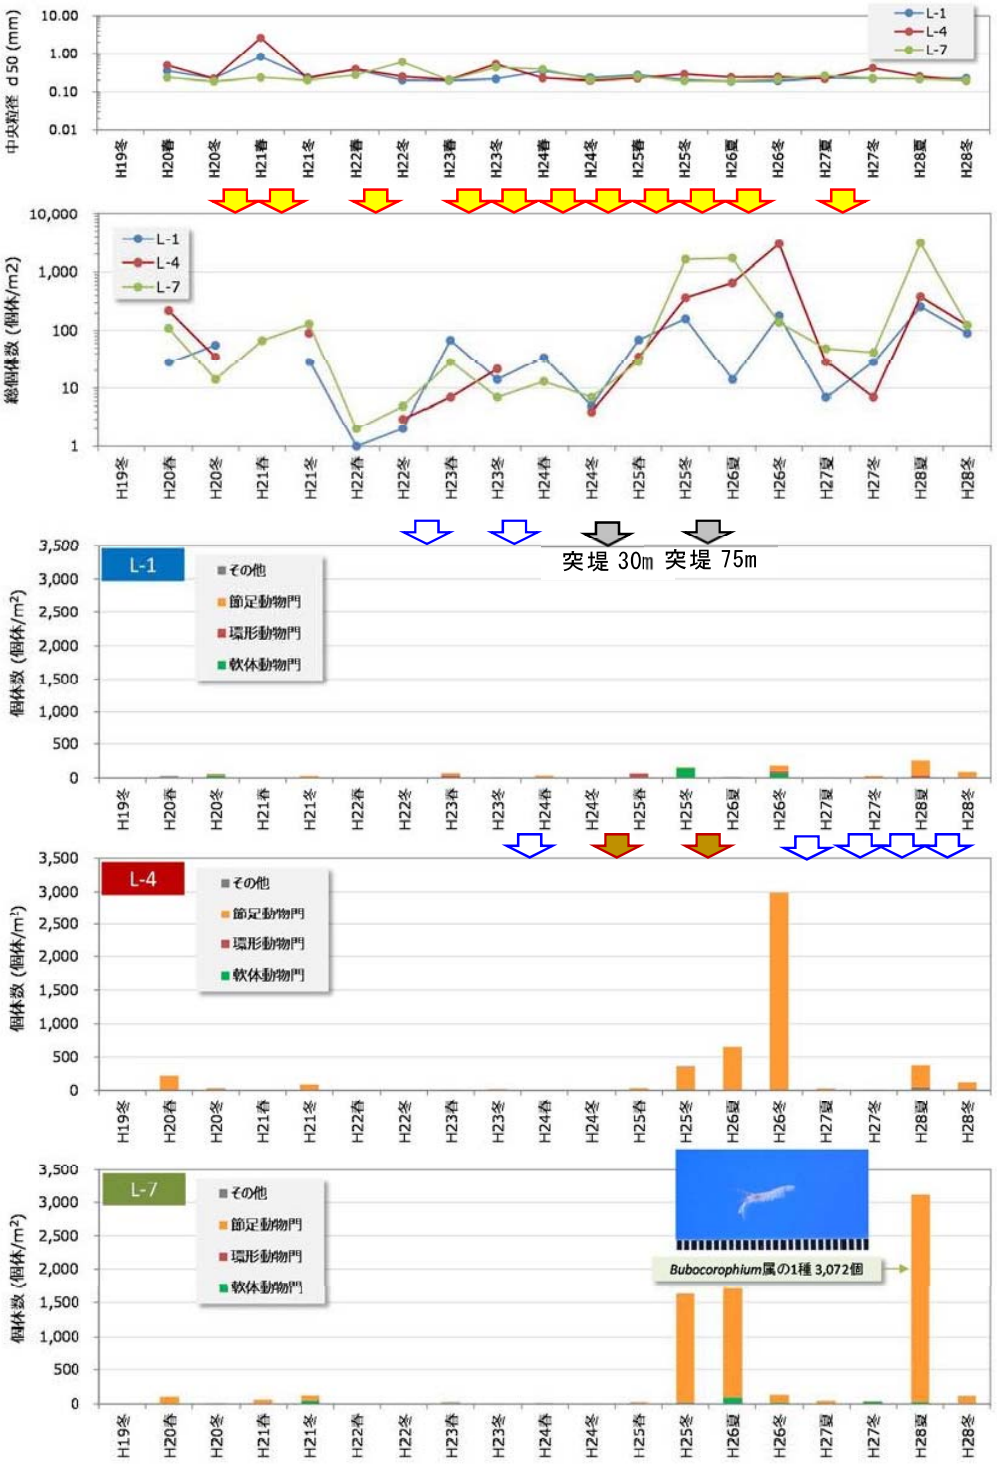

調　査　項　目	環境・利用	底生生物調査		
要 分 析 指 標	底生生物			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

分析に用いた図表

■底生生物（砕波帯付近）の出現種数、個体数および底質調査結果経年変化

：宮崎海岸に影響を及ぼした低気圧・台風
：養浜
：突堤施工
：埋設護岸施工

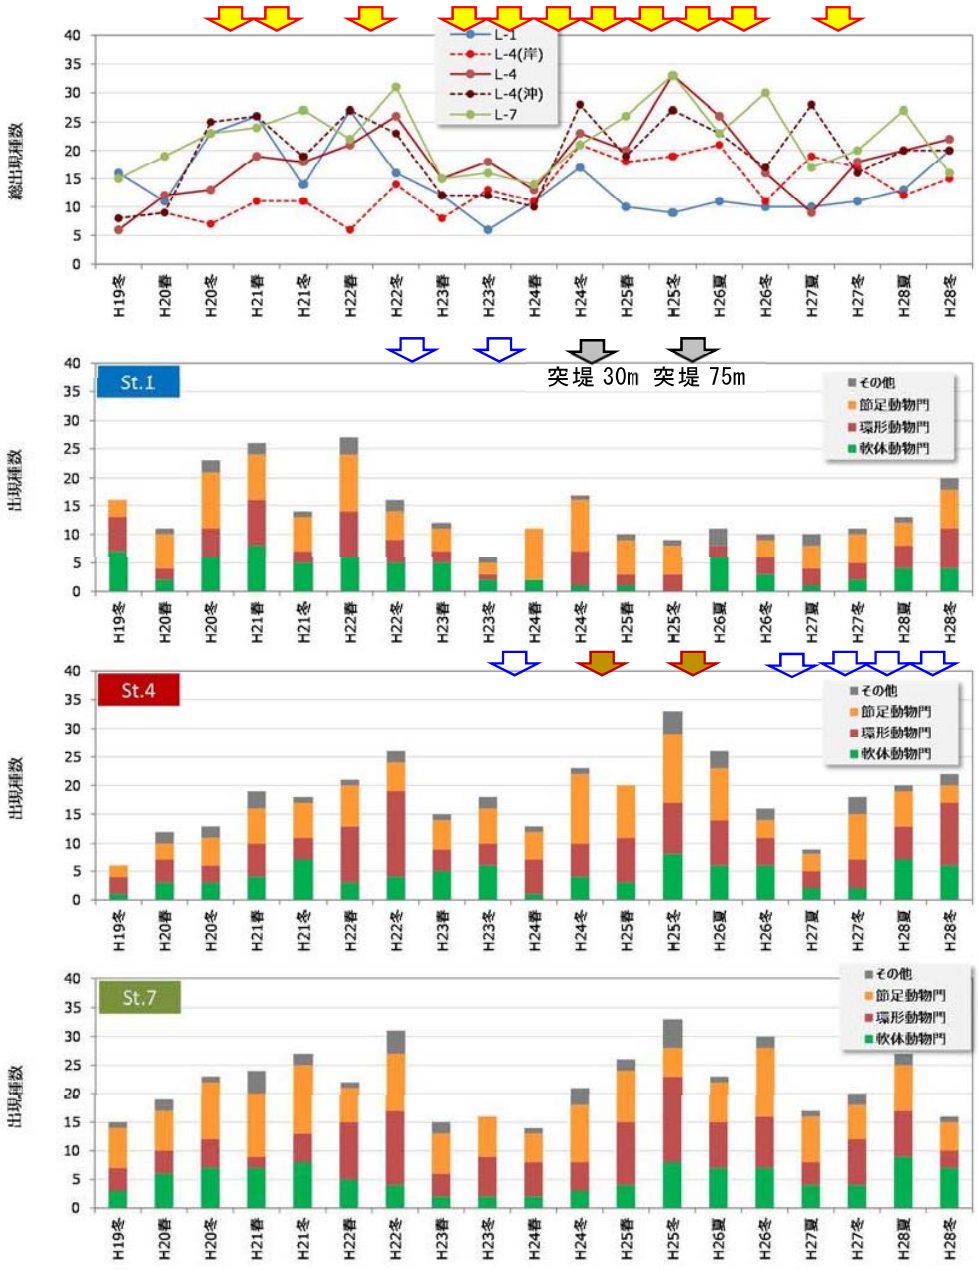

（参考図 2）

- 砕波帯付近は、汀線付近と比較して個体数・種数ともに多い。
- 養浜土砂、突堤設置の影響との関連性は不明瞭であった。

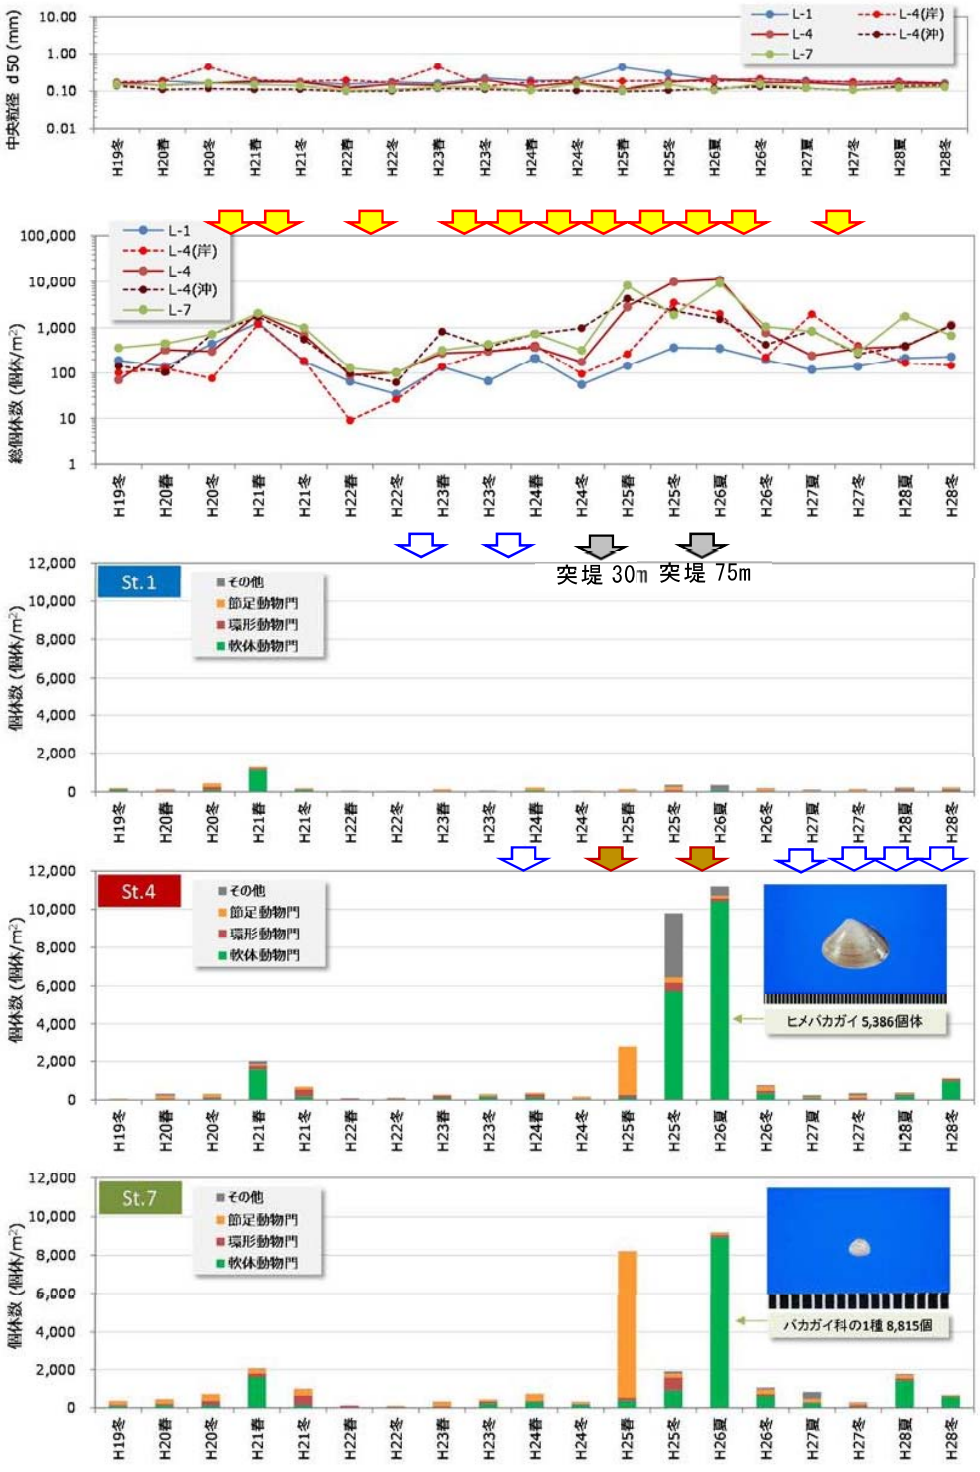

調　査　項　目	環境・利用	底生生物調査		
要 分 析 指 標	底生生物			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

分析に用いた図表

■底生生物（砕波帯付近）の出現種数、個体数および底質調査結果経年変化（St.4 岸沖）

：宮崎海岸に影響を及ぼした低気圧・台風
：養浜
：突堤施工
：埋設護岸施工

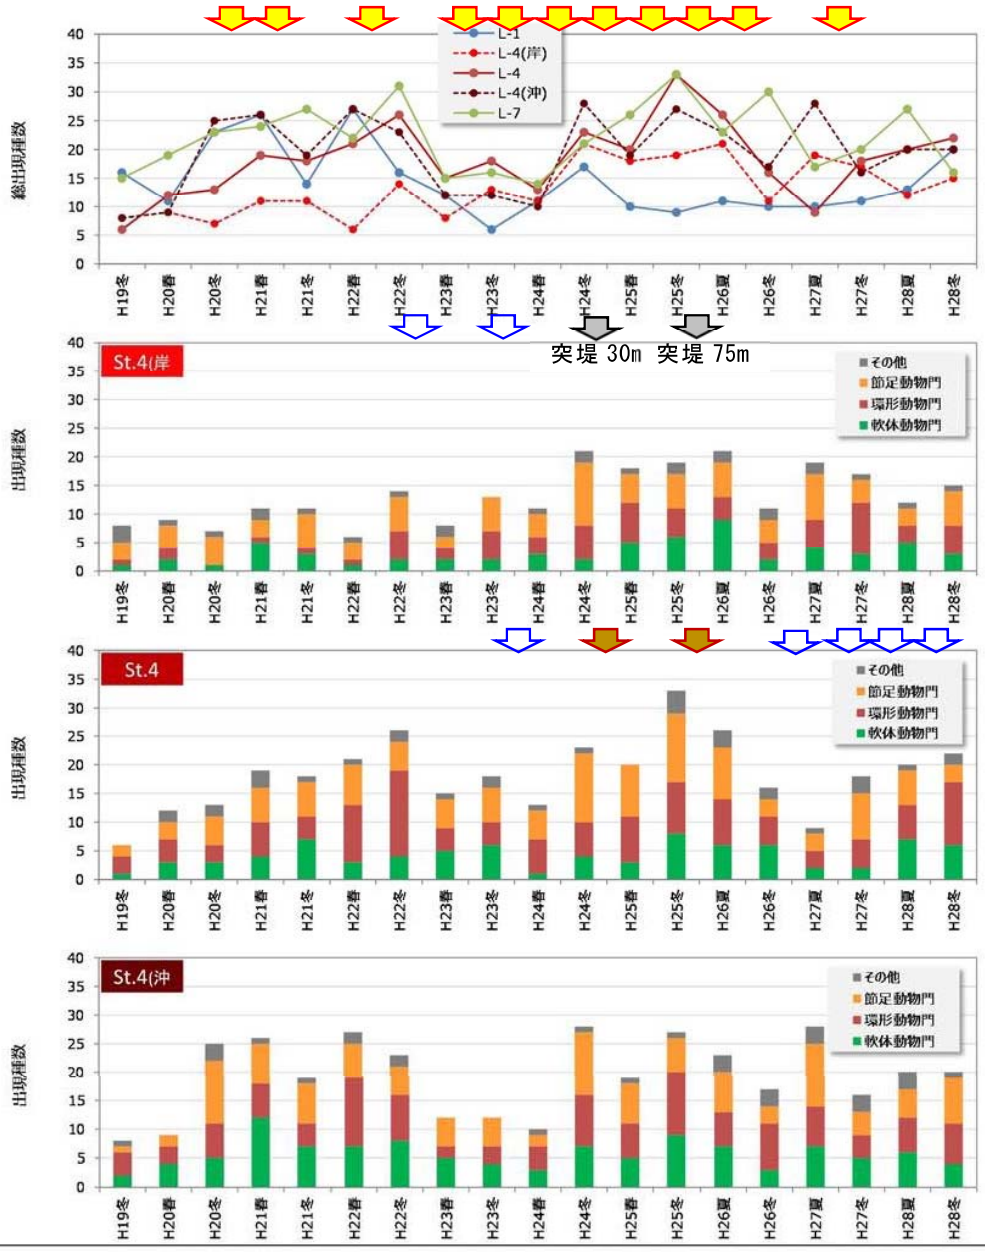

（参考図 3）

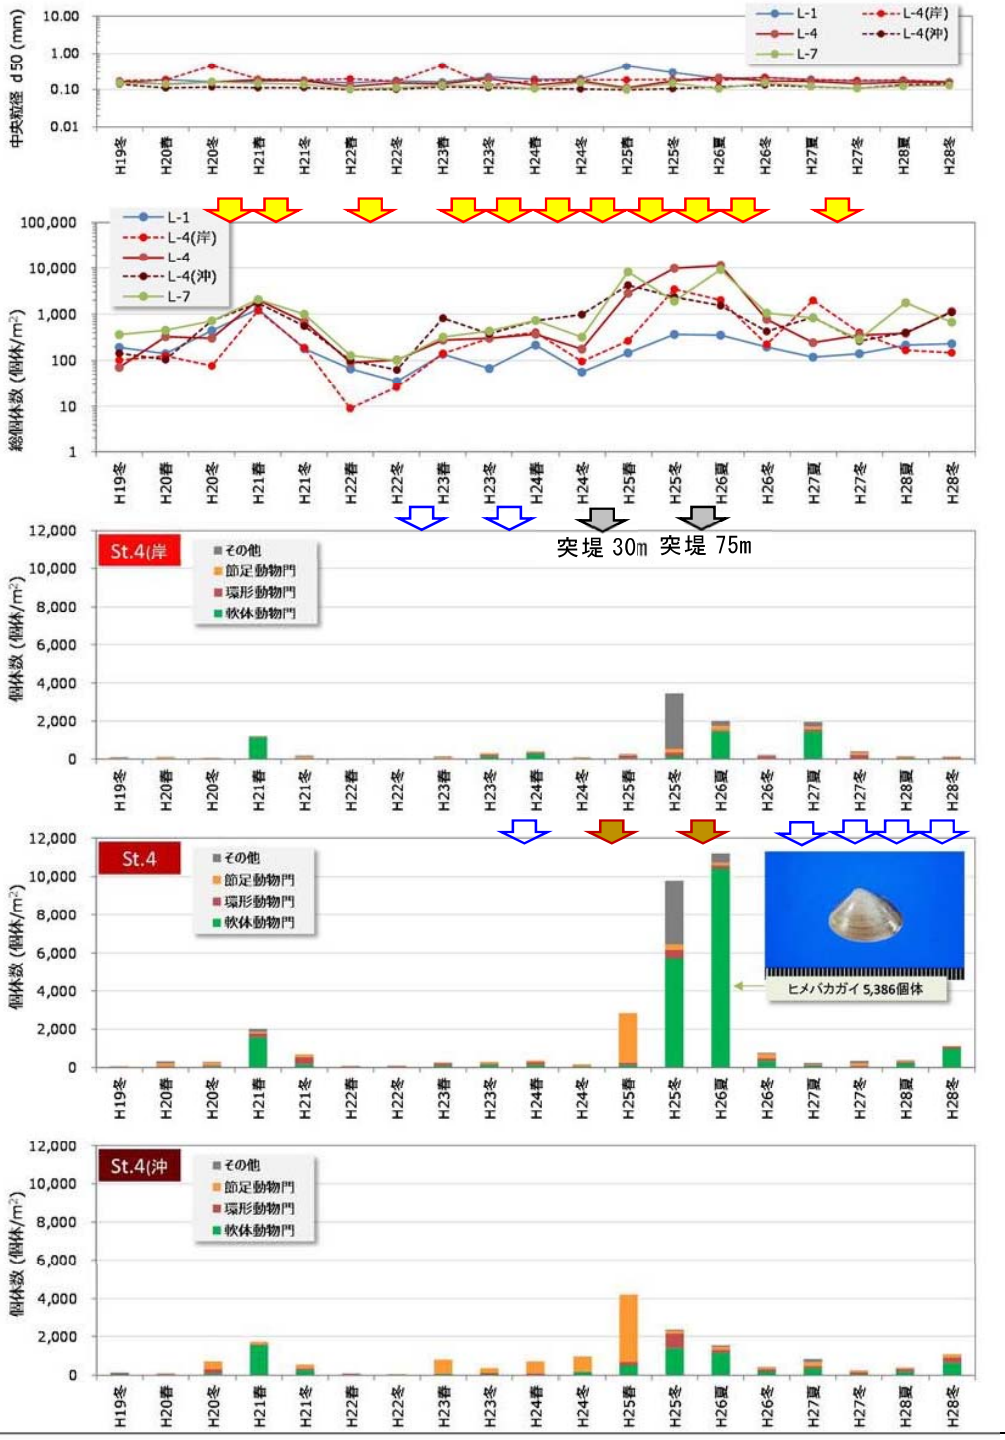
中央粒径 d50 (mm)
L-1
L-4
L-7
L-4(岸)
L-4(沖)
総個体数 (個体/m²)
突堤 30m
突堤 75m
St.4(岸
St.4
St.4(沖
その他
節足動物門
環形動物門
軟体動物門
ヒメバカガイ 5,386個体
個体数 (個体/m²)

調　査　項　目	環境・利用	魚介類調査		
要 分 析 指 標	魚介類			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 平成 27 年度までは魚介類（軟体動物門（腹足綱、二枚貝綱）、節足動物門、棘皮動物門の合計数）は、わずかに季節変動(冬季に減少し夏季に増加)が見られたが、平成 28 年度は同様の傾向は見られなかった。
- 大炊田海岸の軟体動物門【腹足綱】の個体数は連続して大きな値になっている。個体数、湿重量ともにシマミクリガイの占める割合が大きい。
- 養浜や突堤設置、埋設護岸設置等の対策箇所と、魚介類個体数の変動箇所の間に明確な関連性は見られない。
- 対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。

分析に用いた図表

魚介類調査地点

シマミクリガイ
(大炊田海岸で増加)

■海浜土量、養浜量と魚介類（個体数）の経年変化

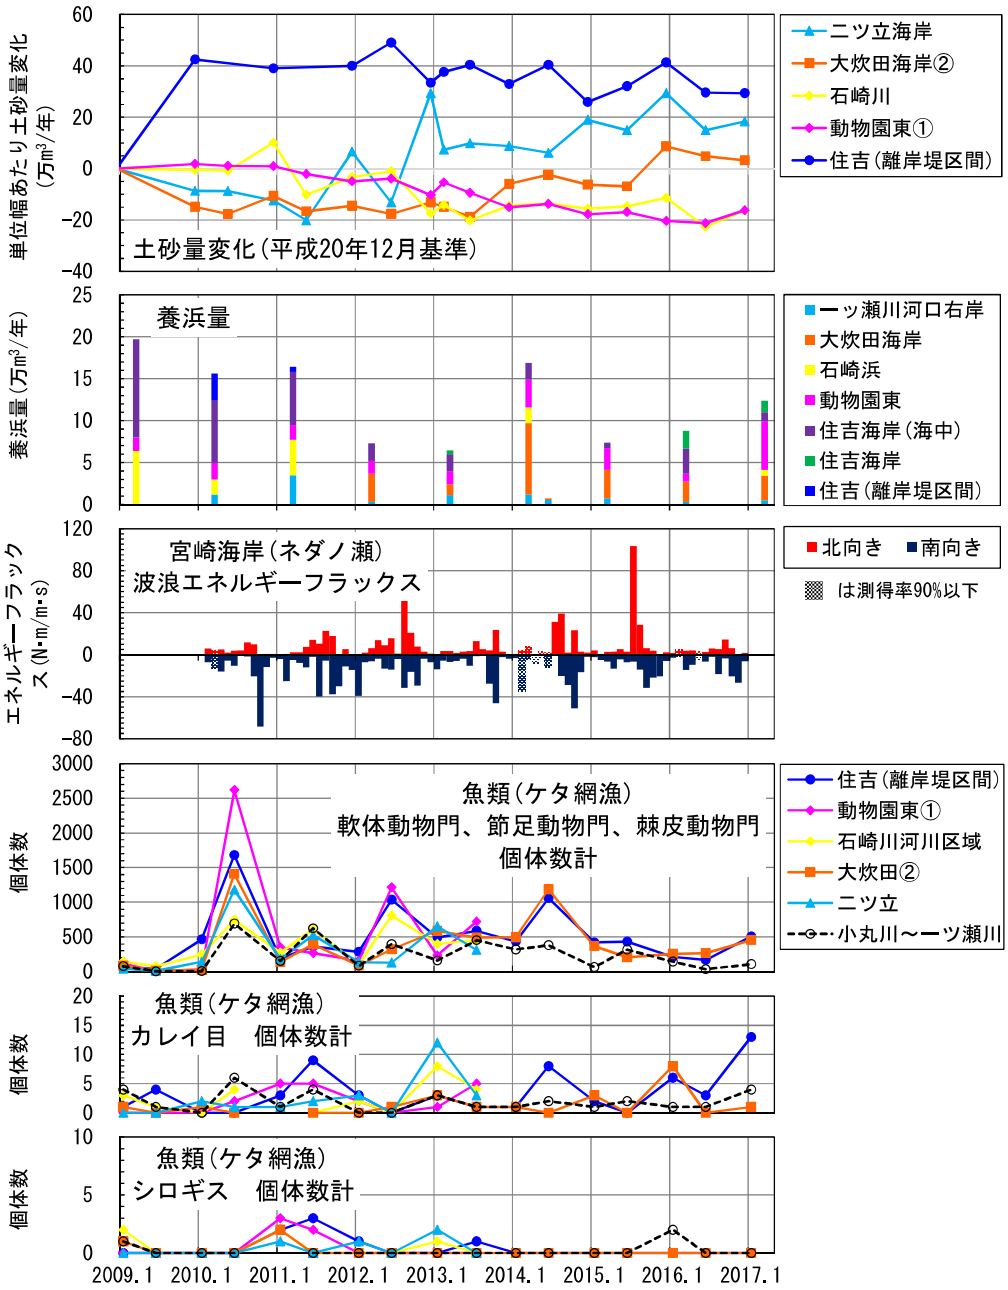

分　析　結　果

①要観察	対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

調　査　項　目	環境・利用	魚介類調査		
要 分 析 指 標	魚介類			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

分析に用いた図表

■魚介類（貝類、節足動物、棘皮動物）の出現種数、個体数および底質調査

：宮崎海岸に影響を及ぼした低気圧・台風
：養浜
：突堤施工
：埋設護岸施工

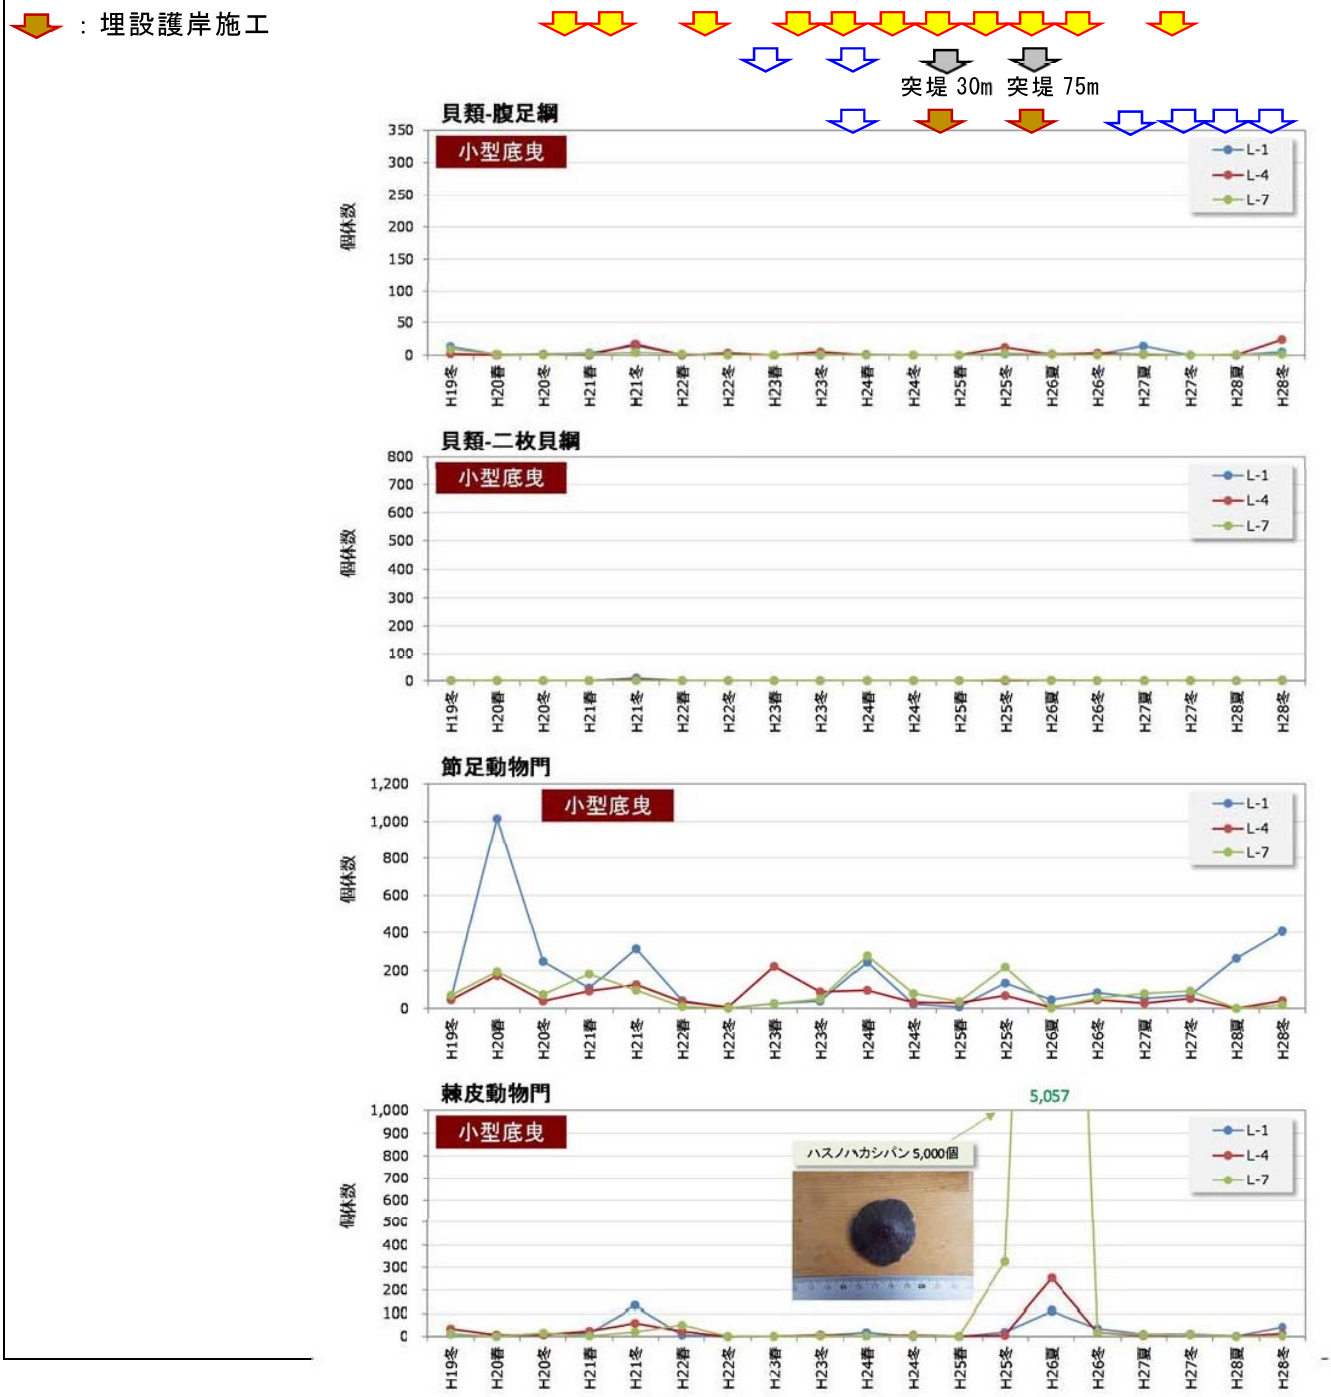

（参考図 1）

（貝類、節足動物、棘皮動物）

- これまでの結果から、地点別個体数と養浜箇所との間にも明確な傾向はみられない。
- 底質の変動との明確な連動性はみられない。

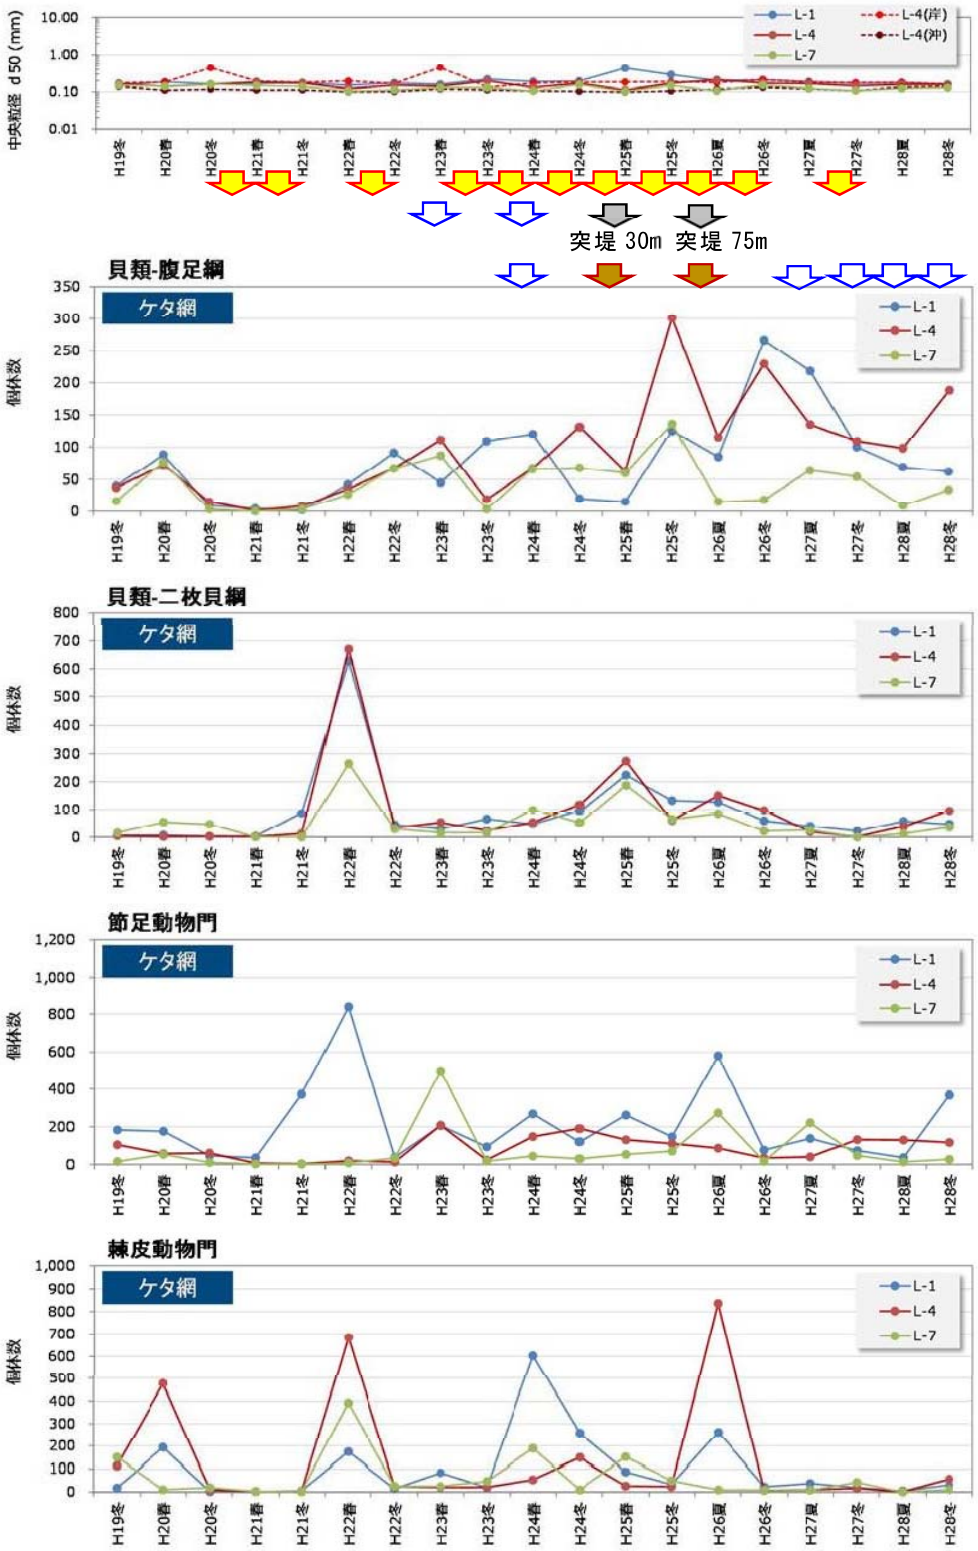

調　査　項　目	環境・利用	魚介類調査		
要 分 析 指 標	魚介類			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	~~埋設護岸~~

分析に用いた図表

■魚介類（魚類（カレイ目、シロギス））の出現種数、個体数および底質調査結果経年変化

：宮崎海岸に影響を及ぼした低気圧・台風
：養浜
：突堤施工
：埋設護岸施工

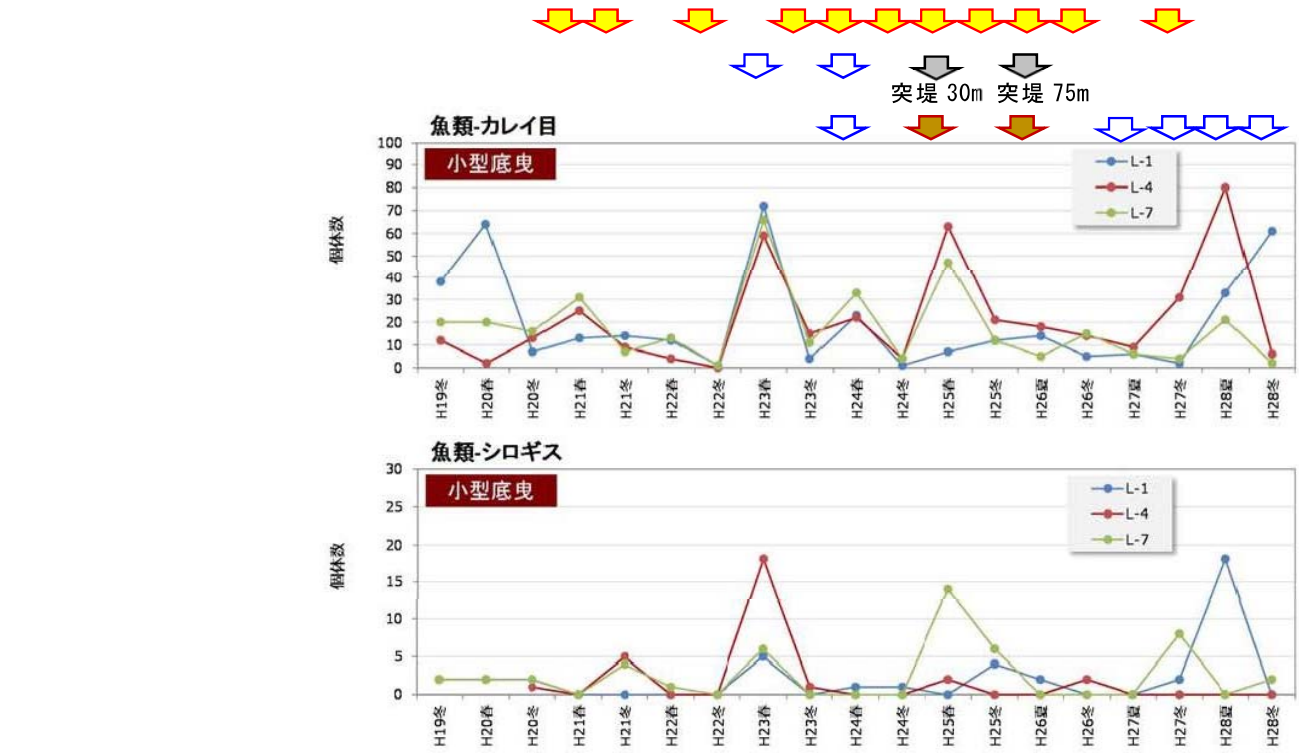

（参考図 2）

（魚類（カレイ目、シロギス）

- 底質の変動との明確な連動性はみられない。

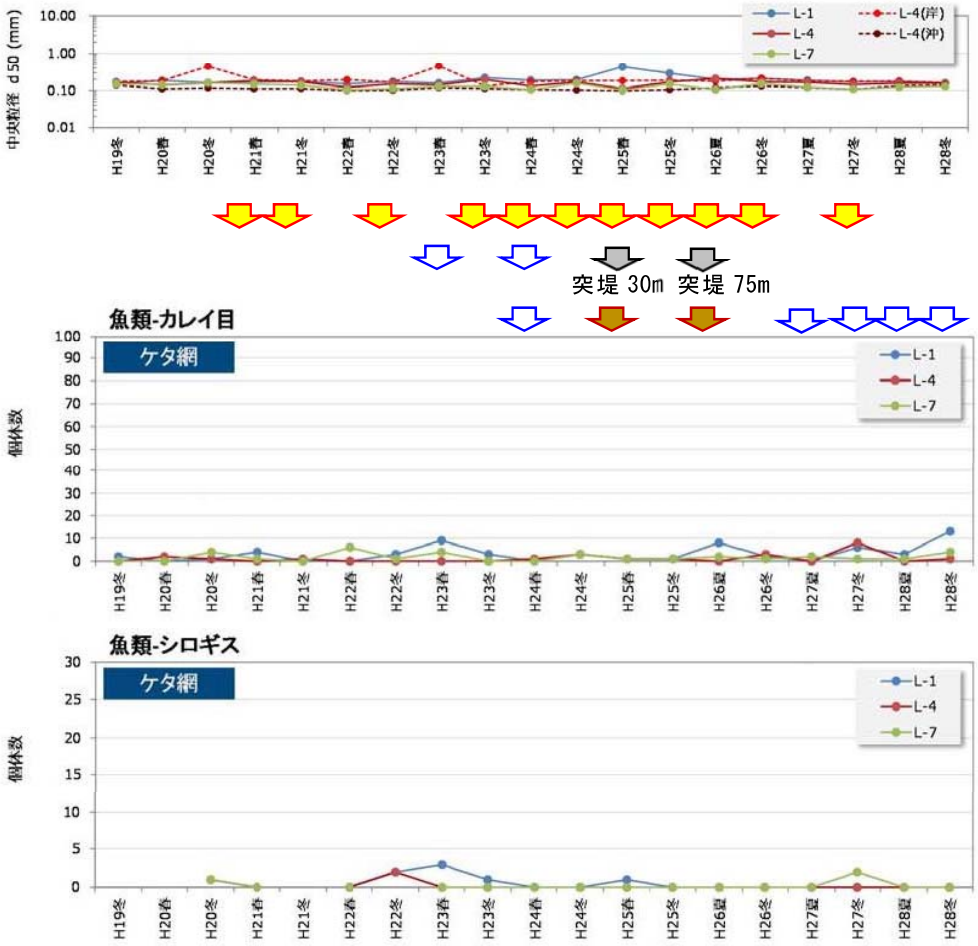

調　査　項　目	環境・利用	植物調査（植生断面調査）		
要 分 析 指 標	出現種・分布			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	~~突堤~~	埋設護岸

分　析　内　容

- 平成 28 年度は全体的に植生帯が前進傾向であった。
- 二ツ立海岸では 2013(H25)年度以降、護岸海側に砂浜が安定的に存在するようになり、2015(H27)年度に初めて植生の回復が見られた。
- 大炊田海岸では 2013(H25)年度に埋設護岸が設置されて以降、背後の浜崖の地形が安定しており、半安定帯(海浜型)の植生であるコウボウムギ等が確認された。
- 住吉海岸(離岸堤区間)では 2015(H27)年度に引き続き植生帯が前進した。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。

分析に用いた図表　：安定帯　：半安定帯(陸生型)　：半安定帯(海浜型)　：不安定帯

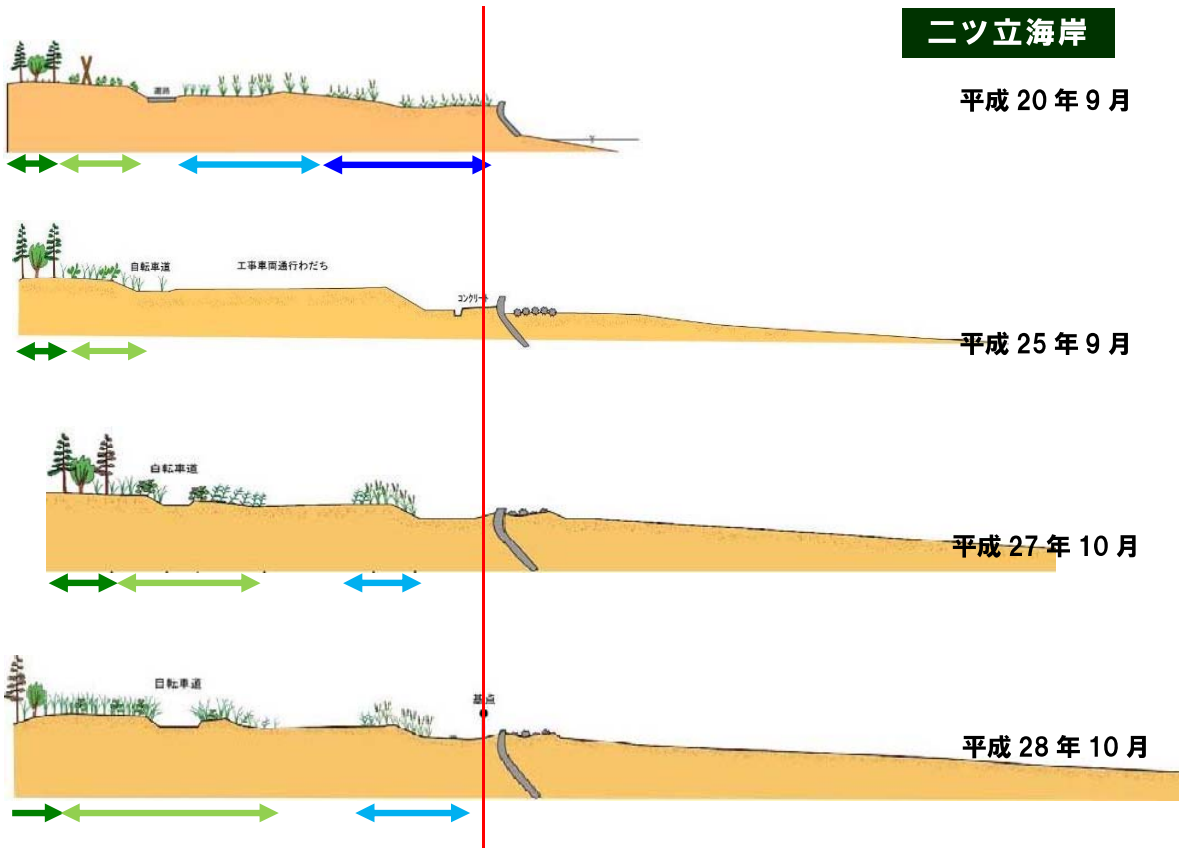

2013(H25)年度以降、護岸海側に砂浜が安定的に存在するようになり、2015(H27)年度に初めて植生の回復が見られた。

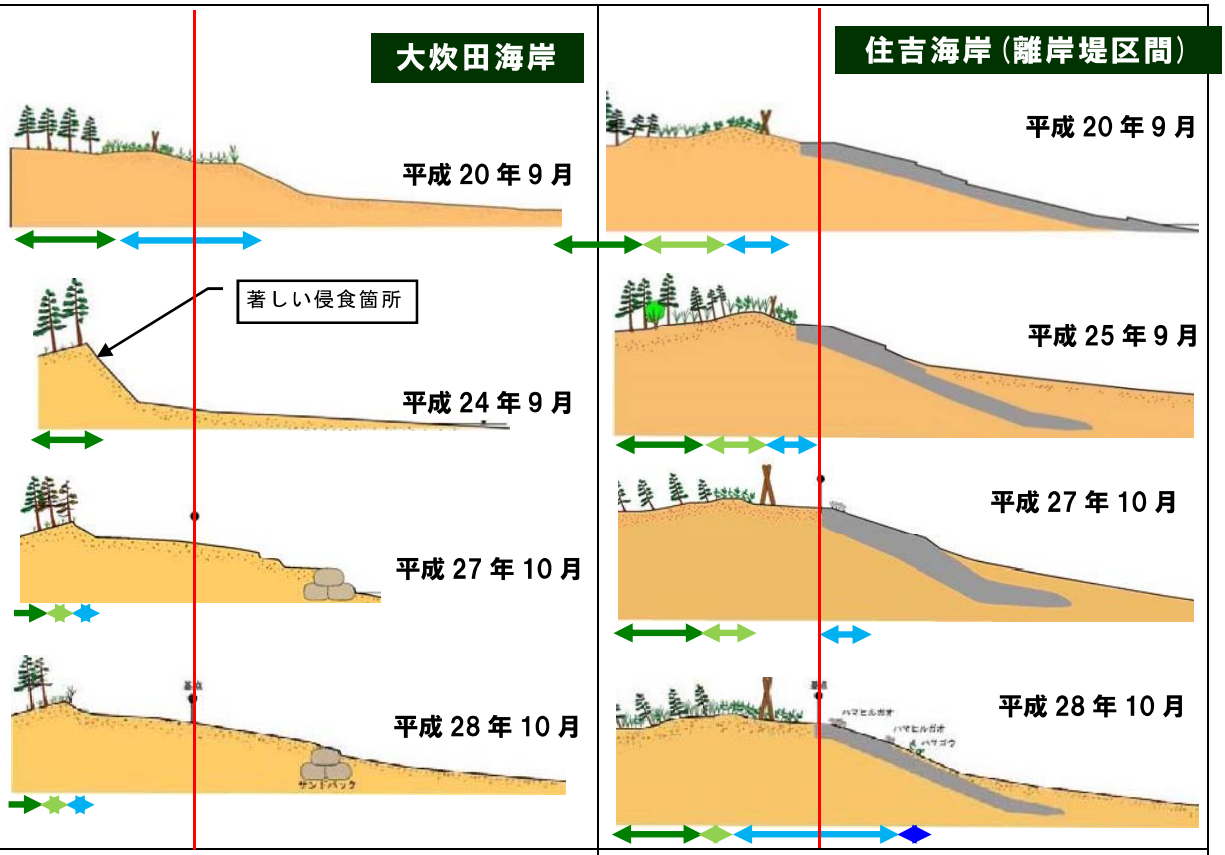

埋設護岸が設置されて以降、背後の浜崖の地形が安定しており、半安定帯(海浜型)の植生であるコウボウムギ等が確認された。	護岸上に植生が確認された。

二ツ立海岸の様子
2016(H28)年 7 月時点で、護岸の前にも植生が見られる。

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
②要注視	対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

調　査　項　目	環境・利用	コアジサシ利用実態調査		
要 分 析 指 標	出現種・分布			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	~~突堤~~	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- コアジサシの営巣・繁殖は、侵食が進む大炊田海岸のみならず、近年比較的砂浜の安定している一ツ瀬川右岸および一ツ瀬川左岸においても見られておらず、地形変化と営巣・繁殖状況の間に明確な関係性は見られない。
- 対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。

分析に用いた図表

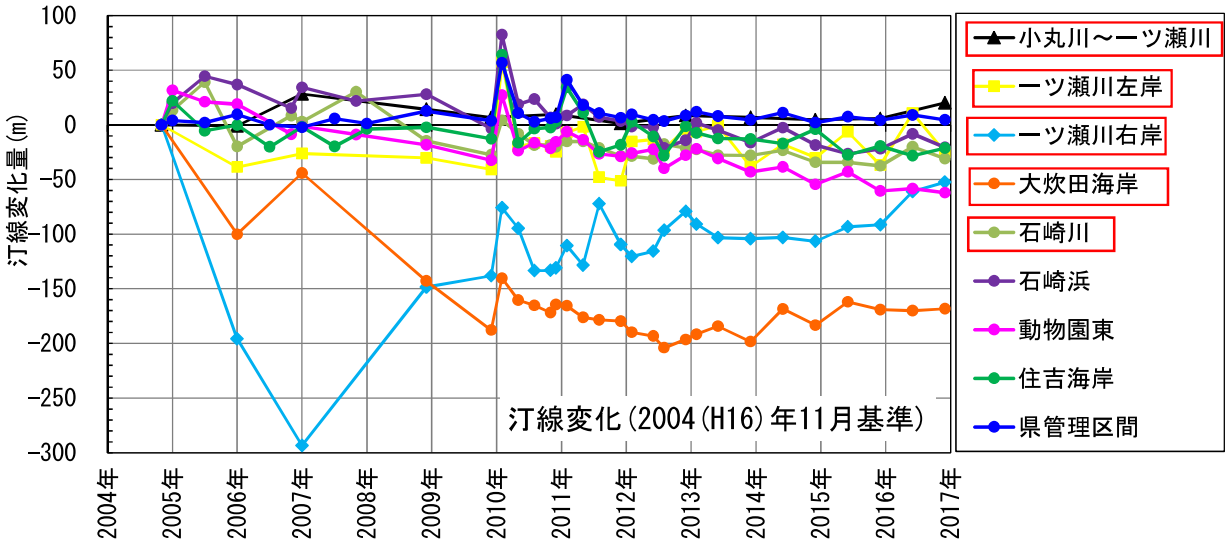

図　汀線変化量図

確認地点			一ツ瀬川河口右岸	一ツ瀬川河口左岸（富田浜）	大炊田海岸	石崎川河口	小丸川河口・河川域	備考
H19	現地調査（全体）	営巣・繁殖	－	－	－	－	－	秋季(9月)から現地調査を実施しており、コアジサシの渡来時期を逸しているため確認できず。
		採餌・休憩	－	－	－	－	－	
H20	現地調査（全体）	営巣・繁殖	○	○	－	△	－	上記３ヶ所で営巣・繁殖を確認。 石崎川河口は、営巣地への海岸利用者（釣り、サーフィン、散歩等）の立ち入りなど、人為的な圧力により営巣地を放棄したと推察される。
		採餌・休憩	○	○	－	○	－	
H21	現地調査（全体）	営巣・繁殖	×	×	－	×	－	上記３ヶ所で求愛行動等は確認されたが、営巣・繁殖は確認できず。 営巣地への海岸利用者（釣り、サーフィン、散歩等）の立ち入り、四輪駆動車の走行など、人為的な圧力により営巣地を放棄したと推察される。
		採餌・休憩	○	○	－	○	－	
H22	現地調査（個別）	営巣・繁殖	○	○	－	×	×	一ツ瀬川河口（左岸・右岸）、小丸川で営巣・繁殖を確認した。 一ツ瀬川河口では、1回目は繁殖に失敗したが、2回目に繁殖成功。
		採餌・休憩	○	○	－	○	○	
H23	現地調査（個別）	営巣・繁殖	△	△	－	×	×	一ツ瀬川河口（左岸・右岸）で求愛行動、営巣を確認した。 7月中旬の台風に伴う高波浪により営巣地が水没したため、繁殖に失敗。
		採餌・休憩	○	○	－	○	○	
H24	ヒアリング	営巣・繁殖	△	△	－	－	－	一ツ瀬川河口（左岸・右岸）で求愛行動、営巣を確認した。 6月中旬の台風に伴う高波浪により営巣地が水没したため、繁殖に失敗。
		採餌・休憩	○	○	－	－	－	
H25	ヒアリング	営巣・繁殖	△	△	○	－	△	5月頃から一ツ葉入江や一ツ瀬川河口、小丸川、大淀川、宮崎港周辺でも確認されていたが、いずれも飛来数は少なく、繁殖まで至ったのは一ツ葉入江や大炊田海岸（既設工事区域内）のわずかな個体のみであった。
		採餌・休憩	○	○	○	－	○	
H26	ヒアリング	営巣・繁殖	－	○	×	－	－	H25年に引き続き飛来数は少なかった。 宮崎県内では、このほか日向市の小倉ヶ浜海岸等でコロニーが見られた。
		採餌・休憩	○	○	×	－	－	
H27	現地調査（個別）ヒアリング	営巣・繁殖	－	×	×	×	－	海上の飛翔、採餌行動を確認したが、飛来数は少なかった。繁殖・営巣は確認されていない。
		採餌・休憩	○	○	×	○	－	
H28	現地調査	営巣・繁殖	×	×	×	×	×	5月に、一ツ瀬川河口左岸沖で約50羽が海上を飛翔し、採餌行動を確認した。繁殖・営巣は確認されていない。
		採餌・休憩	×	○	×	×	×	

○：確認（繁殖成功）
△：確認（繁殖失敗）
×：確認なし
－：調査未実施

分　析　結　果

①要観察	対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
~~③要処置~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。~~

調　査　項　目	環境・利用	アカウミガメ調査		
要 分 析 指 標	上陸・産卵頭数			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	埋設護岸

分　析　内　容

- 石崎浜②、石崎浜①南部、動物園東において上陸・産卵数が範囲外↓であった。石崎浜①北部、住吉(補助突堤②)北側において上陸数が範囲外↓であった。港湾離岸堤区間において産卵数が範囲外↓であった。
- 全国では、2016(H28)年は 3 年ぶりに上陸・産卵回数が増加に転じている。
- 5~8 月のアカウミガメ上陸状況を見ると、2015(H27)年と比較して 7 月の上陸数が回復している。また、復旧工事が完了した大炊田海岸で上陸・産卵が回復している。
- 2014(H26)年、2015(H27)年度に引き続き、埋設護岸上でもアカウミガメの産卵が見られた。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

分析に用いた図表

■上陸頭数、産卵頭数が範囲外であった場所と平成 27 年度工事実施位置の関係

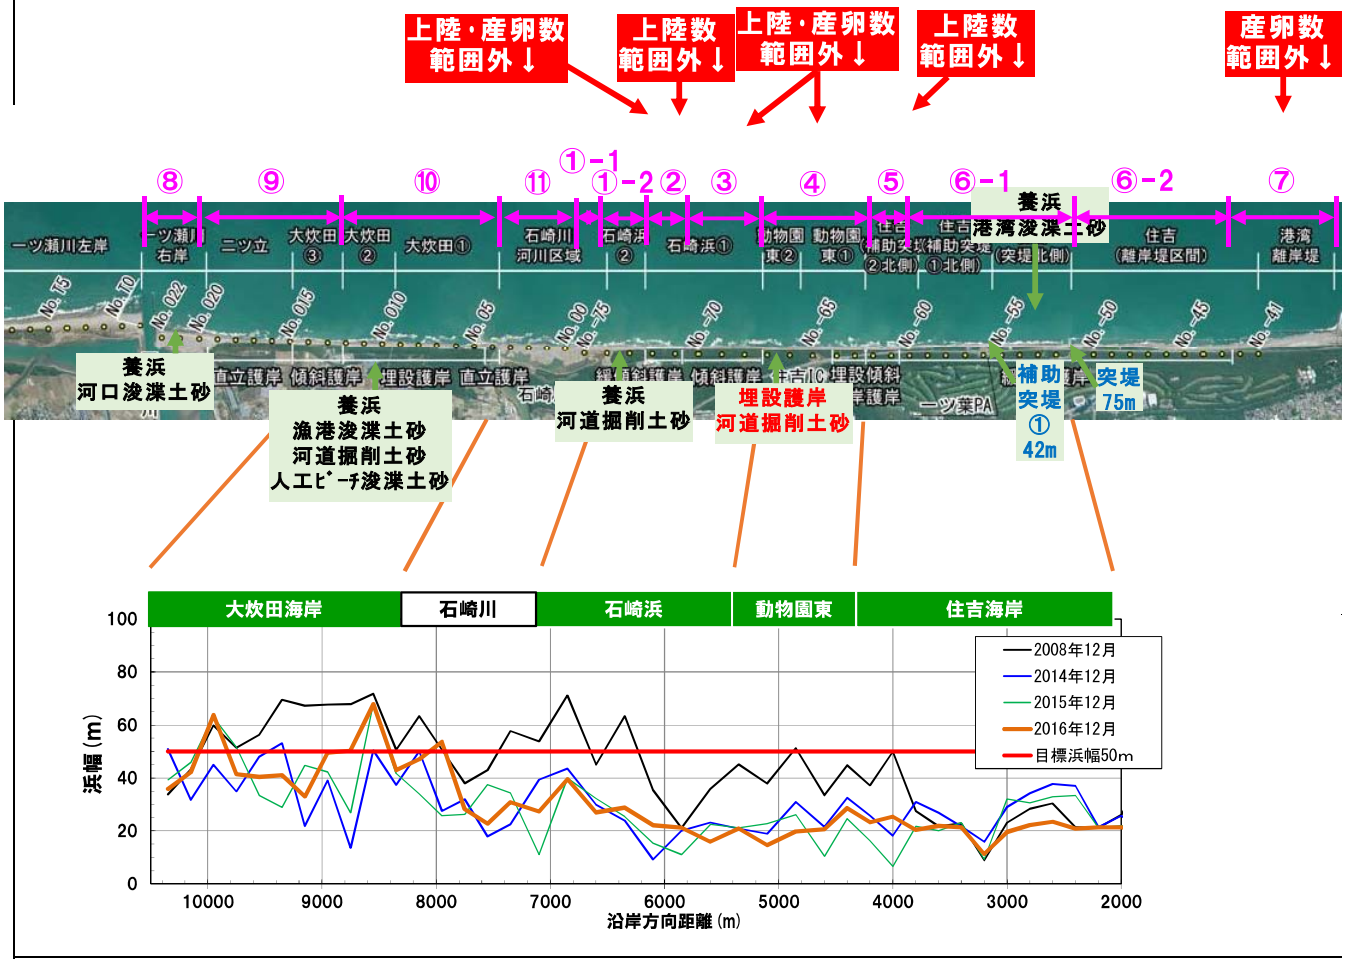

≪参考　日本におけるアカウミガメの上陸・産卵の年変化≫

➢ 2015(H27)年は 2014(H26)年と比較し上陸回数、産卵回数ともに大きく減少していた。

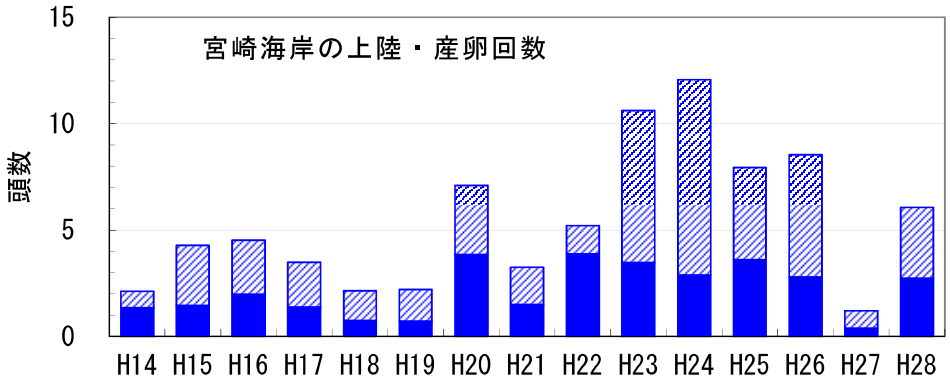

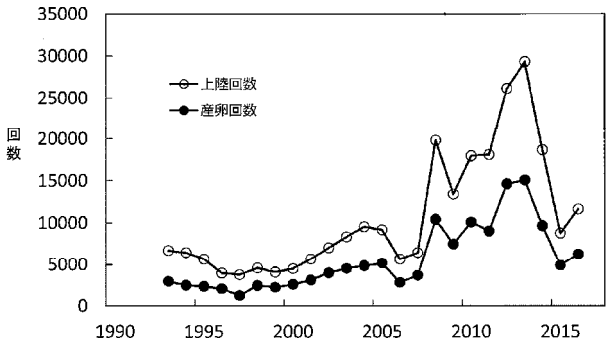

図 3. 日本におけるアカウミガメの上陸・産卵回数の年変化

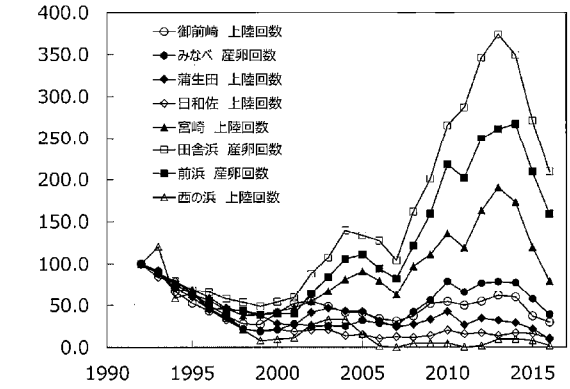

図 4. 日本における主要な産卵地の上陸もしくは産卵回数の 3 年移動平均の相対変化。1990～1992 年の平均を 100 とした。

出典：日本ウミガメ誌 2015（第 26 回日本ウミガメ会議 in 一宮町），
NPO 法人日本ウミガメ協議会、2015 年 11 月 27 日

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
③要処置	対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

調　査　項　目	環境・利用	アカウミガメ調査		
要　分　析　指　標	上陸・産卵頭数			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	埋設護岸

分析に用いた図表

■5 月～8 月の宮崎海岸アカウミガメ上陸状況

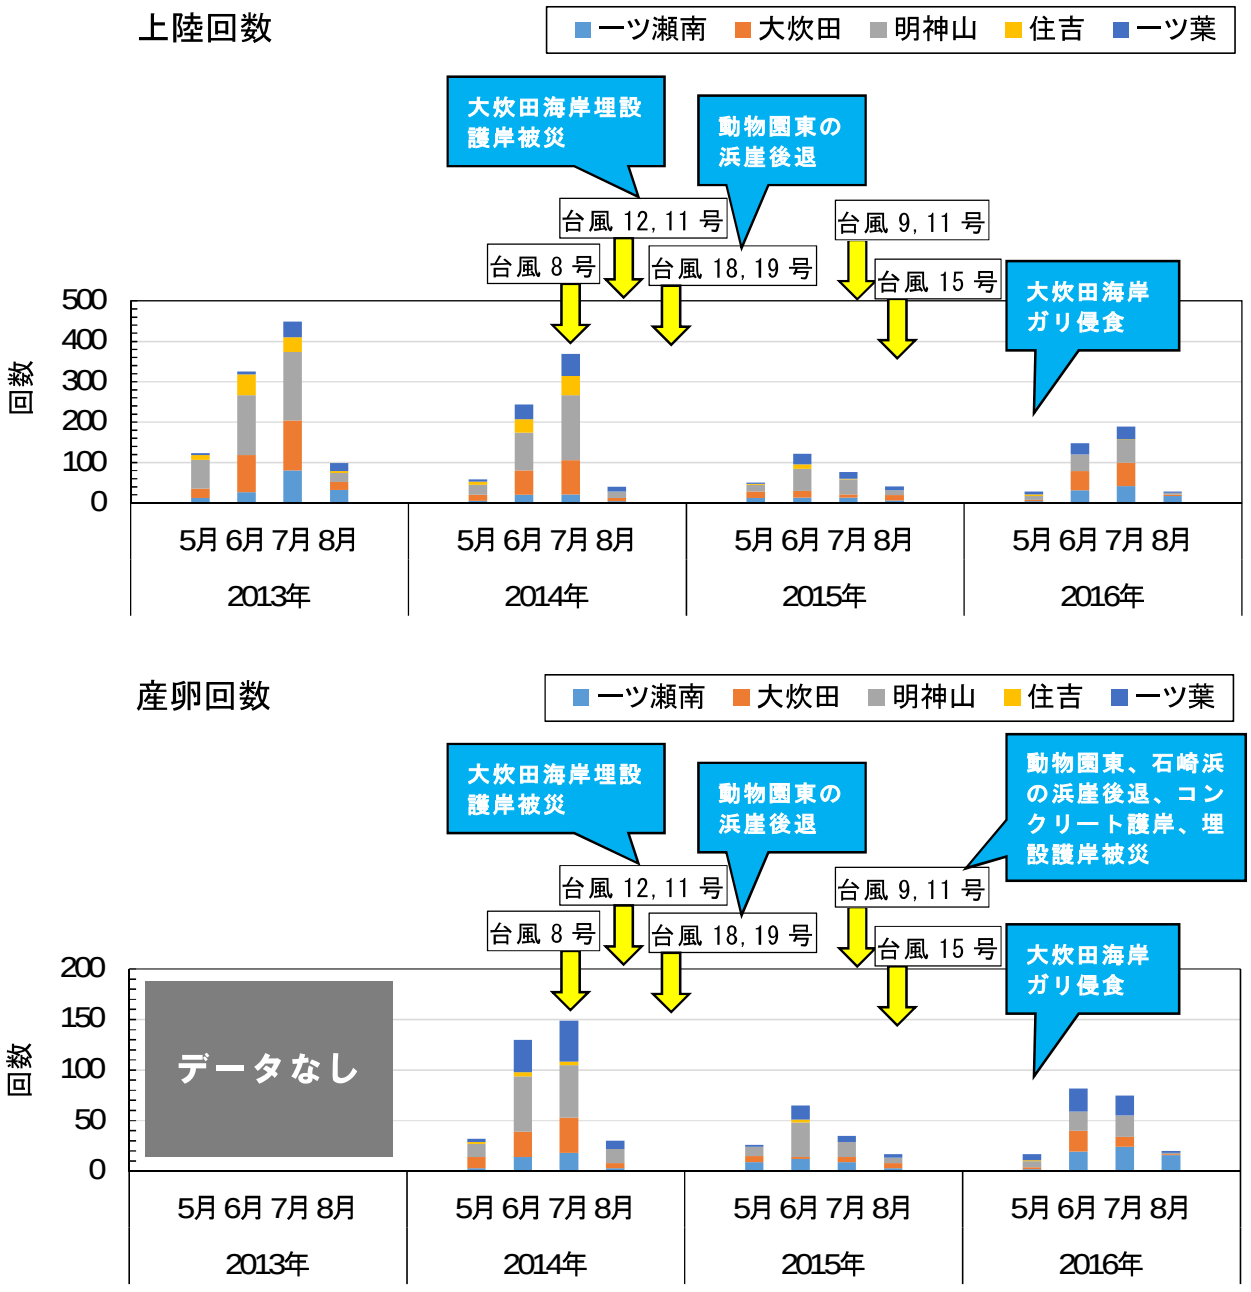

図　調査月別上陸頭数

（参考図）

■埋設護岸上でのアカウミガメの産卵状況（大炊田海岸、2016（H28）年６月 14 日）

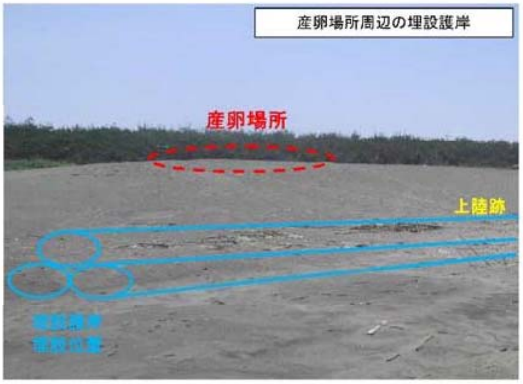

○産卵場所（イメージ図）

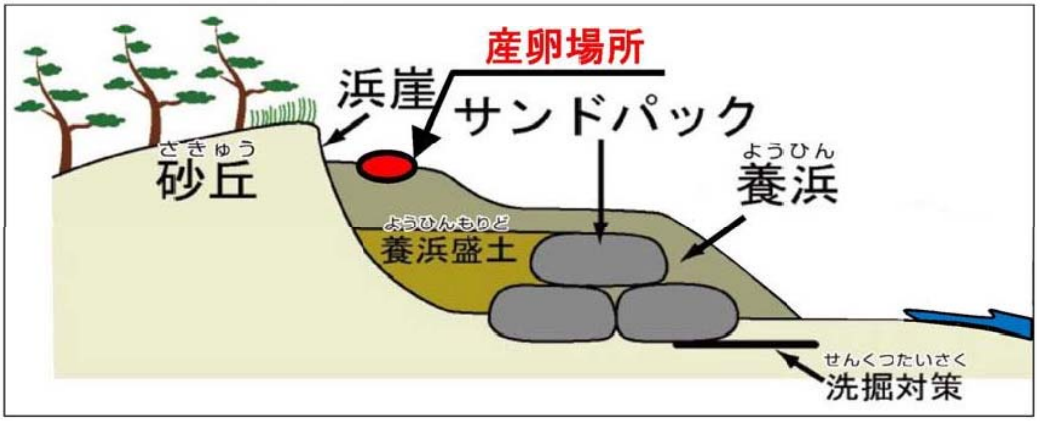

宮崎河川国道事務所　記者発表資料抜粋

調　査　項　目	環境・利用	固結調査		
要 分 析 指 標	砂浜の固結状況			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	~~突堤~~	~~埋設護岸~~

分　析　内　容

- 2016(H28)年度は、養浜実施区間である区間⑩(大炊田海岸)、区間①-2(石崎浜)および埋設護岸実施区間である区間④(動物園東)において、特に砂浜が硬い箇所が見られた。
- 養浜実施地点である大炊田海岸および自然浜地点である二ツ立海岸において、軟度が指標範囲外である箇所においても、アカウミガメの産卵が見られたが、養浜実施地点である石崎浜および埋設護岸設置地点である動物園東では、軟度が指標範囲外で上陸非産卵のケースが見られた。
- 今後も軟度とアカウミガメの産卵の関係に注視する目的で、現時点での指標範囲の見直しは行わない。
- 砂浜が固結しないよう、少なくとも表層については養浜材の質を選別するか、投入した養浜盛土表層をほぐすなどの対応が必要である。

分析に用いた図表

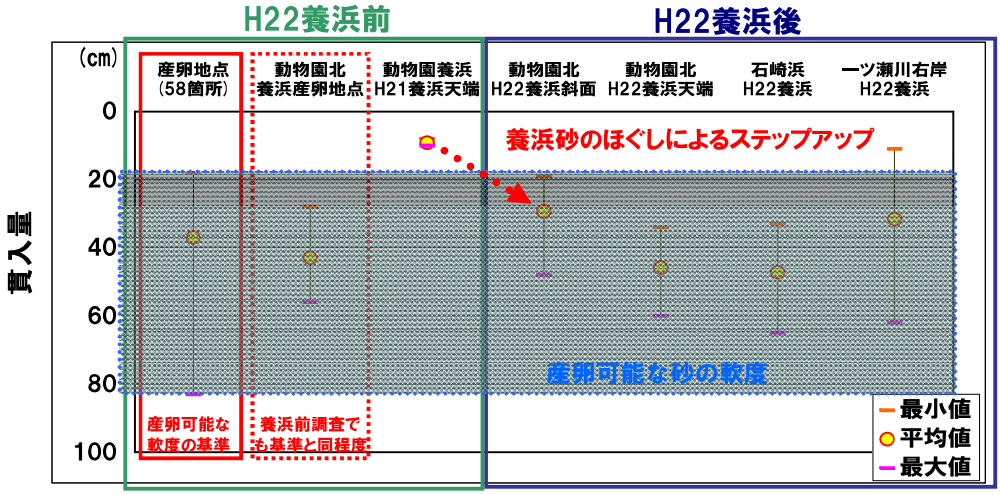

図　固結調査に関する指標範囲

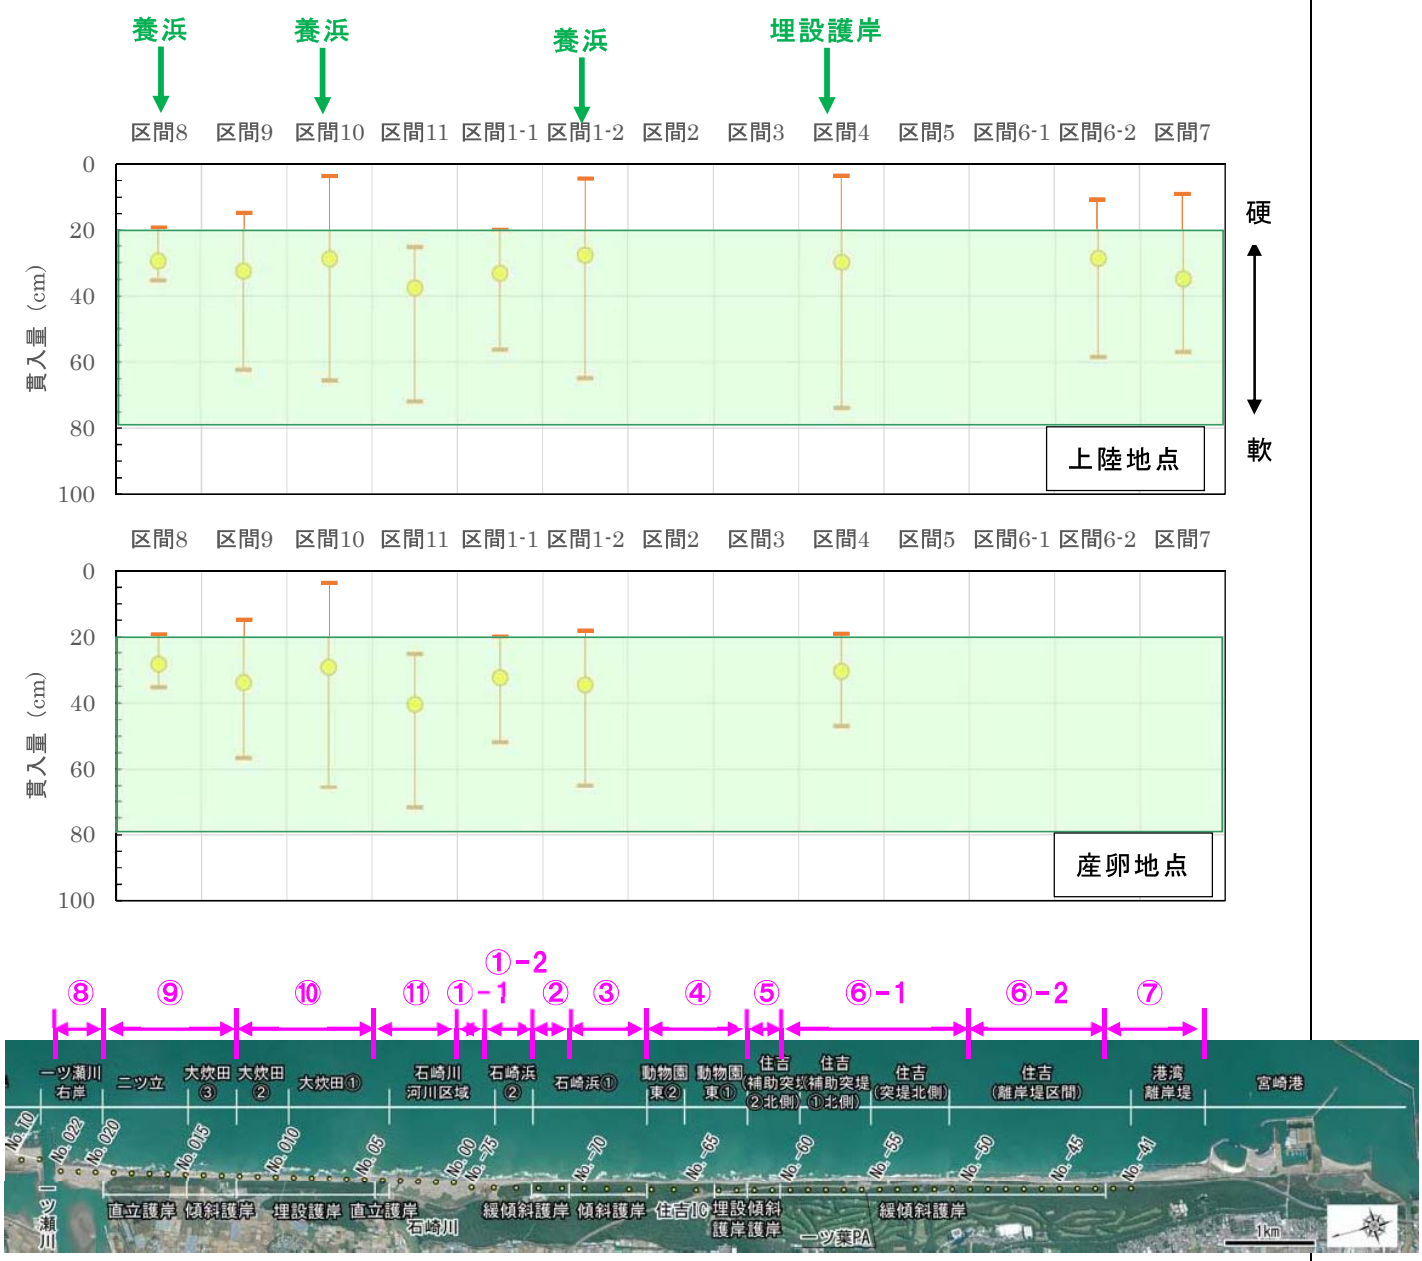

図　軟度測定装置による測定結果（アカウミガメ上陸地点）

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
③要処置	対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

6.4 目視点検

目視点検において、養浜・覆土地形の変化、埋設護岸の変状につながる可能性のある事象（サンドパック、アスファルトマット、グラベルマットの露出）を確認した。

以下に、設定範囲外となった指標についての分析結果を示す。

対象外 ー:非実施		小丸川周辺	一ッ瀬川左岸	一ッ瀬川右岸	二ツ立海岸	大炊田海岸③	大炊田海岸②	大炊田海岸①	石崎川
平成27年度侵食対策	養浜 (万m^3)		ー	ー	0.3(後浜)	ー	2.4(埋設護岸覆土)		ー
	突堤								
	埋設護岸						ー (L=1,580m)		
	関連工事		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
平成28年度侵食対策	養浜 (万m^3)		ー	ー	0.5(後浜)	ー	2.9(埋設護岸覆土)		ー
	突堤								
	埋設護岸						機能復旧工L=260m (計L=1,580m)		
	関連工事		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
目視点検						範囲内	範囲外↑↓	範囲外↑↓	範囲内

検証ブロック区分									
石崎浜②	石崎浜①	動物園東②	動物園東①	補助突堤②北	補助突堤①北	突堤北	県管理区間	港湾離岸堤	宮崎港
1.0(後浜)	ー	3.0 (後浜、埋設護岸覆土)		ー	2.1(海中)	-	-		
				ー	ー	ー (計75m)			
		ー	- (L=280m)						
ー	ー	ー	ー	護岸工事 (災害復旧)	ー	ー	ー	ー	ー
0.7(後浜)	ー	5.8 (後浜、埋設護岸覆土)		ー	0.8(汀線付近) 1.1(海中)	0.6(汀線付近)	-		
				L=50m (計50m)	L=42m (計42m)	天端被覆工 (計75m)			
		ー	L=440m (計L=720m)						
ー	ー	ー	ー	護岸工事 (災害復旧)	ー	ー	ー	ー	ー
範囲外↑↓	範囲内	範囲外↑↓	範囲外↑↓	範囲内	範囲内	範囲内			

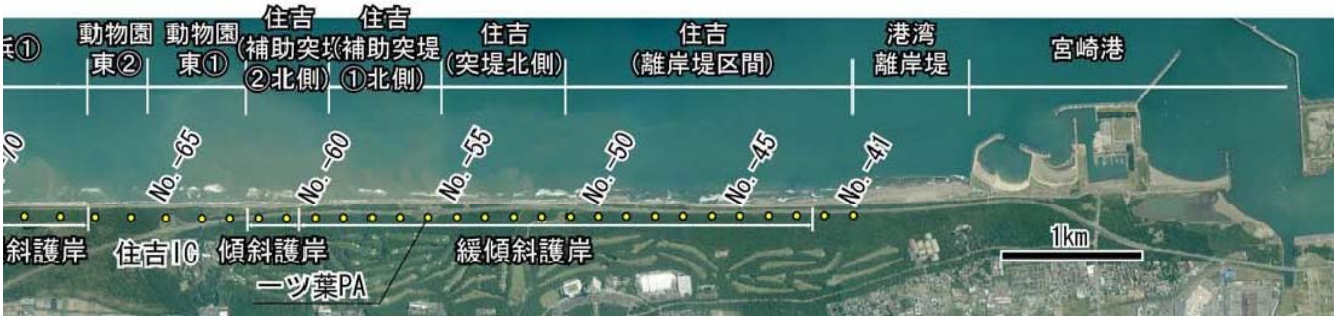

調　査　項　目	目視点検	巡視		
要 分 析 指 標	養浜箇所の侵食			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	養浜	突堤	埋設護岸

分　析　内　容

- 2015(H27)年度に養浜を実施した動物園東北端で、養浜の侵食が見られた。
- 動物園東北側の区間は砂浜が狭く背後の砂丘が海岸線間近に迫っており、また砂丘頂部の高さが低下している。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、砂浜の回復を目指すとともに、埋設護岸整備を進める必要がある。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

分析に用いた図表

写真　5k400(動物園東)付近侵食状況

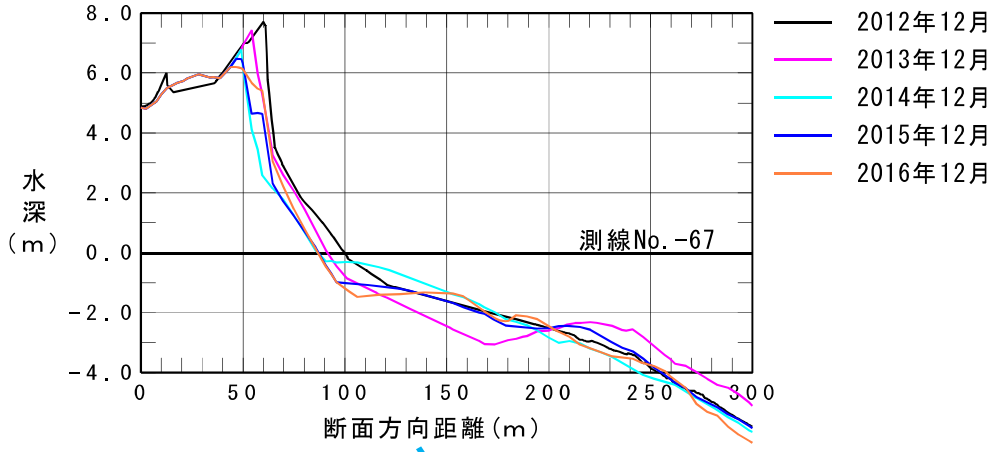

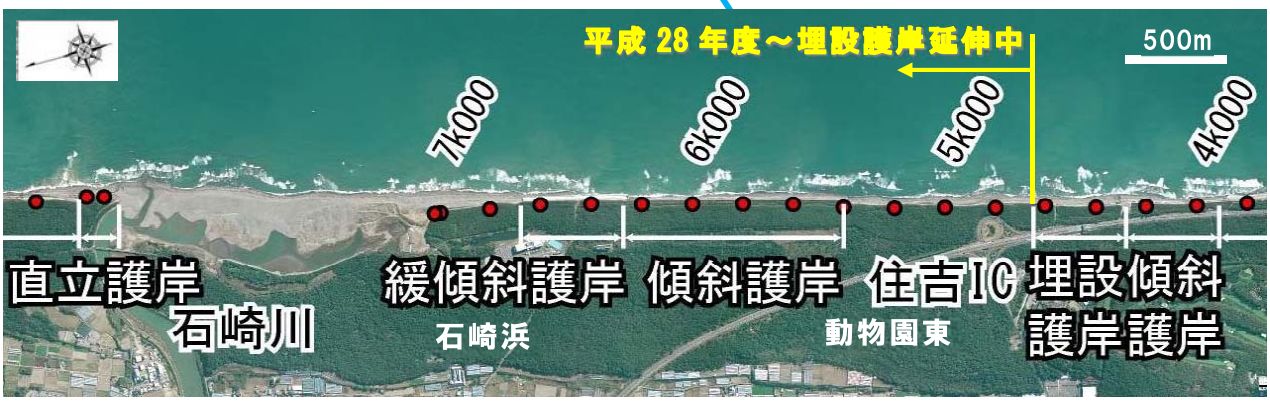

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
~~②要注視~~	~~対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。~~
③要処置	対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。

調　査　項　目	目視点検	巡視		
要 分 析 指 標	埋設護岸　覆土の流出、護岸の破損			
評　価　単　位	~~計画検討の前提条件~~	~~養浜~~	~~突堤~~	埋設護岸

分　析　内　容

- 年間を通してサンドパックが露出する箇所が見られたが、2016(H28)に新たにサンドパックの変状が見られた箇所はなかった。
- サンドパックが露出した箇所では適宜覆土工事が実施されている。
- 対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。

分析に用いた図表

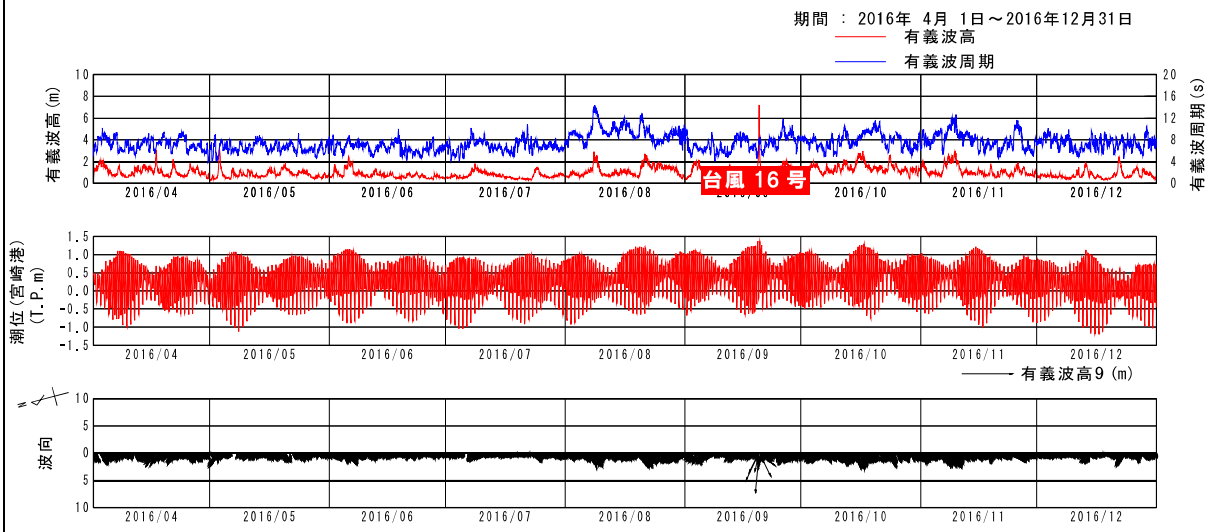

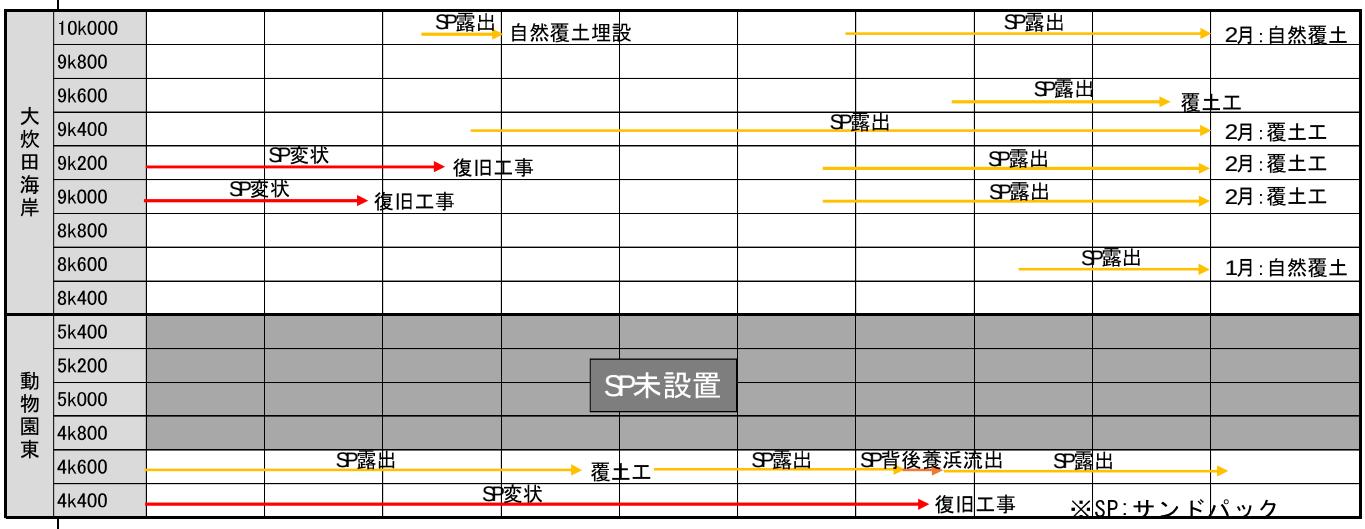

9k000

高波浪後にサンドパックが露出したがサンドパックの変状なし

4k400

高波浪後にサンドパックが露出し背後の養浜が流出したがサンドパックおよび背後の砂丘の変状なし

分　析　結　果

~~①要観察~~	~~対策の効果・影響と関連があるとは判断できないため、引き続き、経過を観察する。~~
②要注視	対策の効果・影響と関連がある可能性が認められるため、今後、動向を注視する。
③要処置	対策の効果・影響と関連がある可能性が高いため、必要に応じて、何らかの処置を行う。
