平成31年度　山国川災害用資機材保有箇所

平成31年度　山国川重要水防箇所

凡例	
━	A 区間
━	B 区間
━	要注意区間
━	重点区間

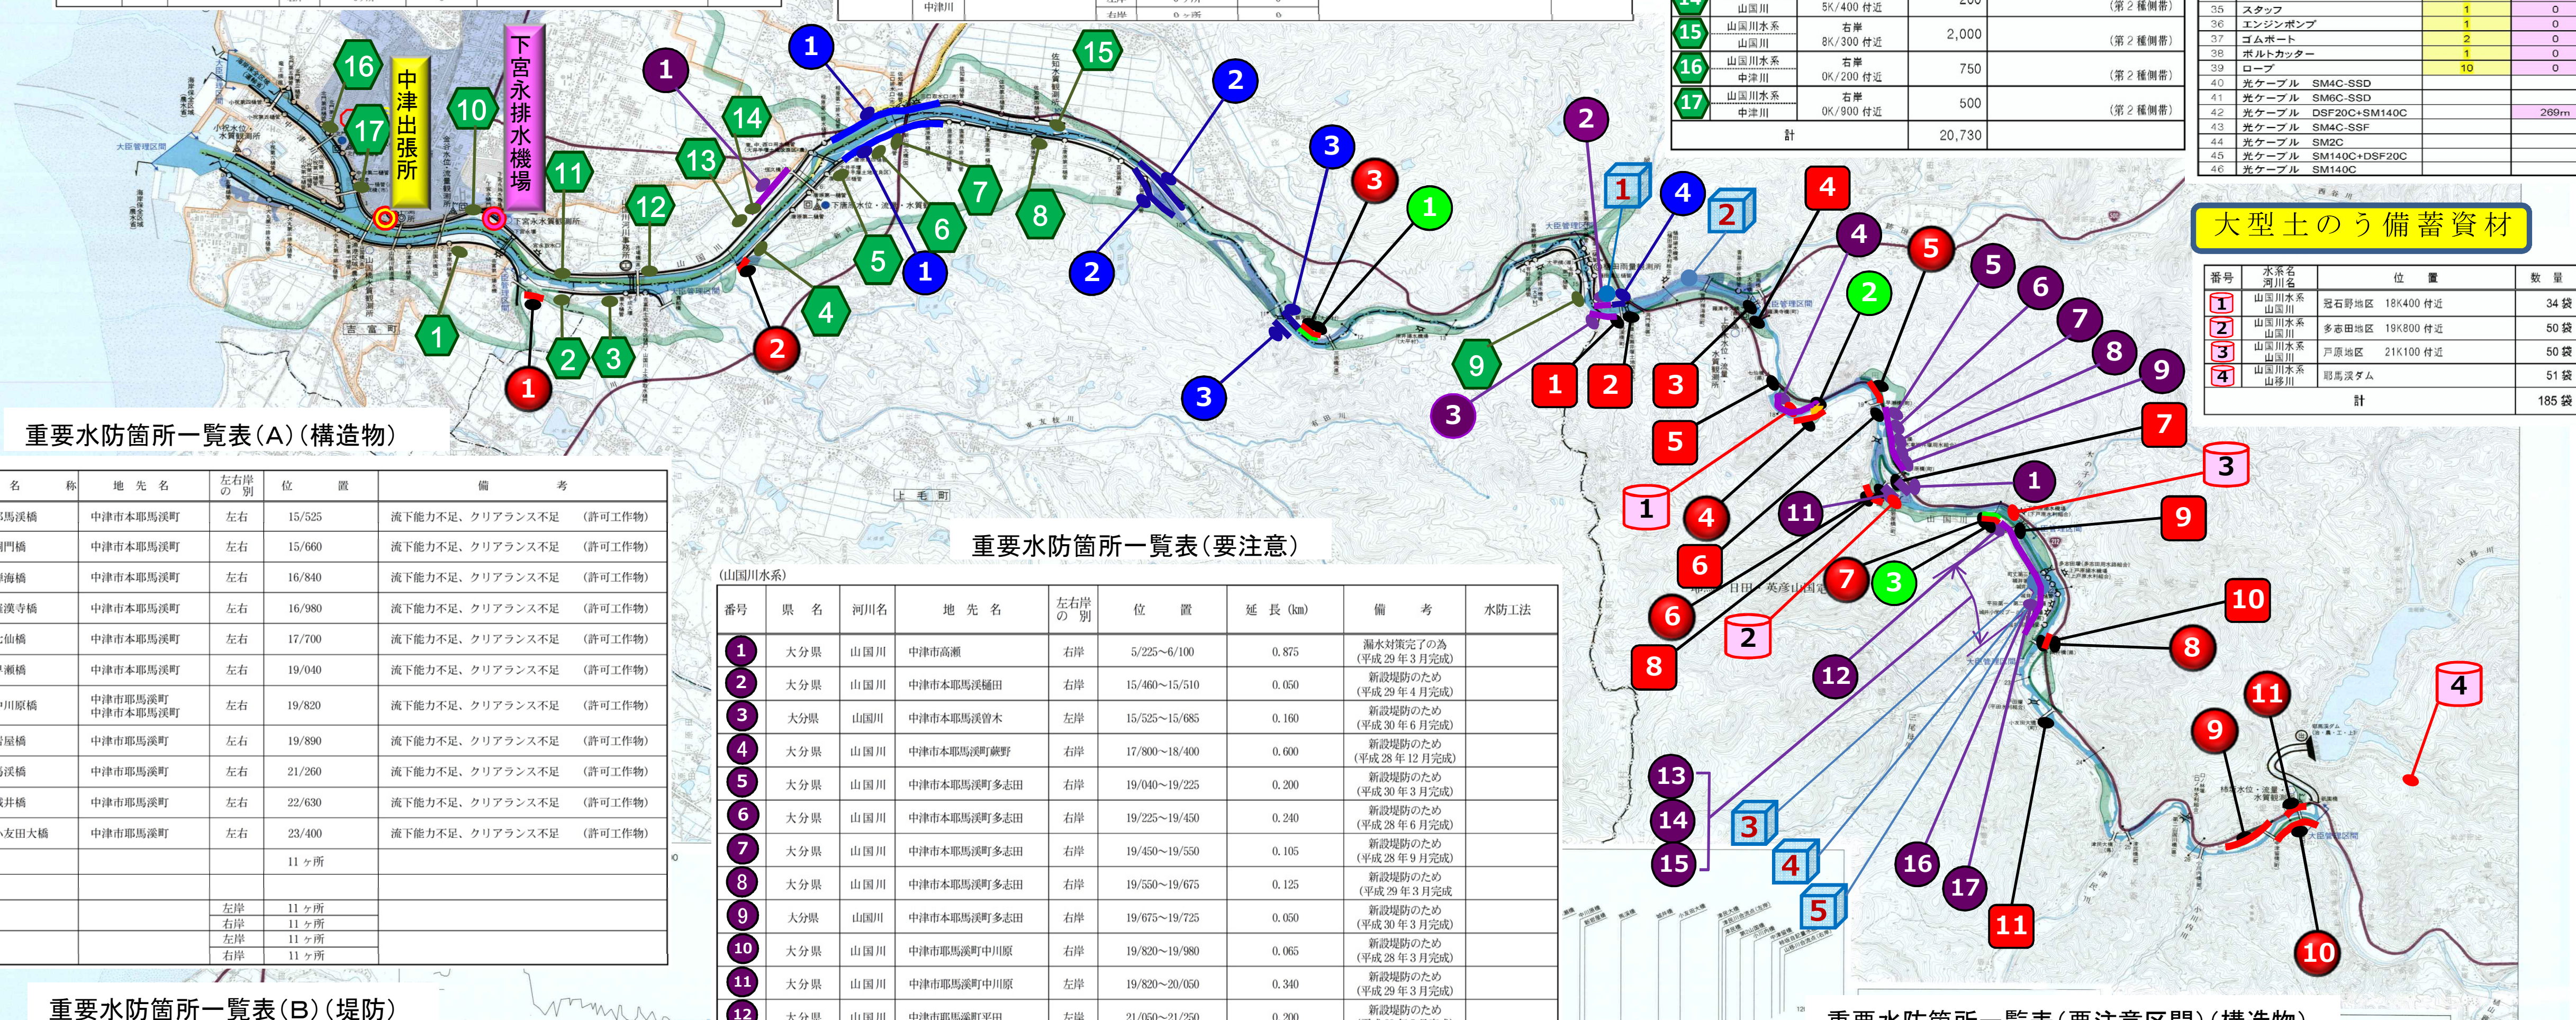

平成十八年五月現在　国土交通省山国川河川事務所

重要水防箇所一覧表（A）（重点区

（山国川水系）

番号	県名	河川名	地　先　名	左右岸の　別	位　　置	延　長（km）	備　　考	水防工法
1	大分県	山国川	中津市三光土田	右岸	11/400～11/600	0.190	河岸が低く溢水あるいは崩壊の恐れ。（堤防高A）	積み土のう
2	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町蕨野	右岸	18/350～18/400	0.050	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の1/2以下。（堤防高A）	積み土のう
3	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	20/850～ 21/050	0.200	堤防が低く溢水する。堤防断面が計画の 1/2 以下。（堤防高A）	積み土のう
計					3ヶ所	0.440		
	福岡県			左岸	0ヶ所	0		
				右岸	0ヶ所	0		
	大分県			左岸	1ヶ所	0.200		
				右岸	2ヶ所	0.240		
河川内訳		山国川		左岸	1ヶ所	0.200		
				右岸	2ヶ所	0.240		
		中津川		左岸	0ヶ所	0		
				右岸	0ヶ所	0		

重要水防箇所一覧表（A）（堤防）

（山国川水系）

番号	県名	河川名	地　先　名	左右岸の　別	位　　置	延長（km）	備　　考	水防工法
1	福岡県	山国川	築上郡吉富町幸子	左岸	3/250～3/290	0.050	無堤で河岸が低く溢水する。（堤体高A）	積み土のう
2	福岡県	山国川	築上郡上毛町下唐原	左岸	5/000～5/040	0.040	無堤で河岸が低く溢水する。（堤体高A）	積み土のう
3	大分県	山国川	中津市三光土田	右岸	11/400～11/600	0.190	無堤で河岸が低く、溢水の恐れ。（堤体高A）	積み土のう
4	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町冠石野	左岸	18/200～18/400	0.250	堤防が低く溢水する。 堤防断面が計画の１／２ 以下（堤防高A）	積み土のう
5	大分県	山国川	中津市本耶馬溪町多志田	右岸	18/800～19/050	0.300	堤防が低く溢水する。 堤防断面が計画の１／２ 以下（堤防高A）	積み土のう
6	大分県	山国川	中津市耶馬溪町岩屋	左岸	19/600～20/050	0.910	堤防が低く溢水する。 堤防断面が計画の１／２ 以下（堤防高A）	積み土のう
7	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	20/850～21/050	0.200	堤防が低く溢水する。 堤防断面が計画の１／２ 以下（堤防高A）	積み土のう
8	大分県	山国川	中津市耶馬溪町戸原	右岸	22/500～22/630	0.130	堤防が低く溢水する。 堤防断面が計画の１／２ 以下（堤防高A）	積み土のう
9	大分県	山国川	中津市耶馬溪町柿坂	右岸	26/400～26/900	0.460	堤防が低く溢水する。 堤防断面が計画の１／２ 以下（堤防高A）	積み土のう
10	大分県	山国川	中津市耶馬溪町中鶴	左岸	26/750～27/400	0.530	堤防が低く溢水する。 堤防断面が計画の１／２ 以下（堤防高A）	積み土のう
11	大分県	山国川	中津市耶馬溪町柿坂	右岸	27/050～27/220	0.460	堤防が低く溢水する。 堤防断面が計画の１／２ 以下（堤防高A）	積み土のう
計					11 ヶ所	3.520		
	福岡県			左岸	2 ヶ所	0.090		
				右岸	0 ヶ所	0		
	大分県			左岸	4 ヶ所	1.890		
				右岸	5 ヶ所	1.540		
河川内訳		山国川		左岸	6 ヶ所	1.980		
				右岸	5 ヶ所	1.540		
		中津川		左岸	0 ヶ所	0		
				右岸	0 ヶ所	0		

土砂及び根固めブロック備蓄箇所

番号	水系名 河川名	位　置	備蓄量（土砂m³）	根固めブロック（個） 備　考
1	山国川水系 山国川	左岸 2K/100 付近	700	うち 50m³（岩砕）　（第２種側帯）
2	山国川水系 山国川	左岸 3K/300 付近	1,400	２ｔ六脚ブロック　723 個
3	山国川水系 山国川	左岸 3K/600 付近	650	（第２種側帯）
4	山国川水系 山国川	左岸 5K/200 付近	1,890	（第２種側帯）
5	山国川水系 山国川	左岸 6K/600 付近	7,960	うち 1,000m³（岩砕）　ヘリポート ①袋詰玉石　128 袋 ②２ｔ六脚ブロック 100 個　（第２種側帯）
6	山国川水系 山国川	左岸 6K/850 付近 （上毛町借地箇所）	／	①2t 六脚ブロック　100 個 ②2t ホロースケヤー　400 個 ③連接ブロック（998×998×350）620 個 ④連接ブロック（998×499×350）114 個 ※連結金具 1029 個は下宮永排水機場に保管
7	山国川水系 山国川	左岸 6K/900 付近	300	（第２種側帯）
8	山国川水系 山国川	左岸 8K/400 付近	730	（第２種側帯）
9	山国川水系 山国川	左岸 15K/100 付近	1,300	（第２種側帯）
10	山国川水系 山国川	右岸 2K/300 付近	550	（第２種側帯）
11	山国川水系 山国川	右岸 3K/000 付近	400	（第２種側帯）
12	山国川水系 山国川	右岸 4K/200 付近	600	（第２種側帯）
13	山国川水系 山国川	右岸 5K/100 付近	800	（第２種側帯）
14	山国川水系 山国川	右岸 5K/400 付近	200	（第２種側帯）
15	山国川水系 山国川	右岸 8K/300 付近	2,000	（第２種側帯）
16	山国川水系 中津川	右岸 0K/200 付近	750	（第２種側帯）
17	山国川水系 中津川	右岸 0K/900 付近	500	（第２種側帯）
計			20,730	

水防備蓄資材

番号	品　目	出張所倉	下宮永機場	耶馬渓ダム
1	土のう袋	5,400	0	
2	大型土のう袋	50	138	
3	耐候性大型土のう袋	150	50	
4	水のう	0	0	
5	袋詰根固め（２ｔ）	559	27	
6	木杭	438	0	
7	金杭（メガネピン）	4	65	
8	丸鋼	0	65	
9	鉄線	1	0	
10	スコップ	10	36	
11	ツルハシ	12	0	
12	掛矢	8	6	
13	大ハンマー	0	5	
14	ハンマー	3	0	
15	ペンチ	1	0	
16	鎌	16	0	
17	鋸	1	0	
18	斧	3	0	
19	鍬	4	0	
20	鉈	5	0	
21	バール	3	0	
22	エンジン刈払機	4	0	
23	火ばさみ	131	0	
24	フォーク	4	0	
25	竹製てみ（えびじょうげ）	2	0	
26	一輪車	9	4	
27	照明器具	0	0	
28	A 型バリケード	20	0	
29	オイルフェンス	1	4	
30	ブルーシート(3.6×5.4m)	90	0	
31	ひしゃく	4	0	
32	救命胴衣	20	12	
33	脚立	1	0	
34	レベル	0	0	
35	スタッフ	1	0	
36	エンジンポンプ	1	0	
37	ゴムボート	2	0	
38	ボルトカッター	1	0	
39	ロープ	10	0	
40	光ケーブル　SM4C-SSD			160m
41	光ケーブル　SM6C-SSD			30m
42	光ケーブル　DSF20C+SM140C		269m	350m
43	光ケーブル　SM4C-SSF			690m
44	光ケーブル　SM2C			180m
45	光ケーブル　SM140C+DSF20C			240m
46	光ケーブル　SM140C			300m

大型土のう備蓄資材

番号	水系名 河川名	位　　置	数　量	
1	山国川水系 山国川	冠石野地区　18K400 付近	34 袋	耐候性　10 袋 普通　24 袋
2	山国川水系 山国川	多志田地区　19K800 付近	50 袋	
3	山国川水系 山国川	戸原地区　21K100 付近	50 袋	
4	山国川水系 山移川	耶馬渓ダム	51 袋	
計			185 袋	

重要水防箇所一覧表（A）（構造物）

（山国川水系）

番号	県　名	河川名	名　　称	地　先　名	左右岸の　別	位　　置	備　　考
1	大分県	山国川	耶馬渓橋	中津市本耶馬渓町	左右	15/525	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
2	大分県	山国川	洞門橋	中津市本耶馬渓町	左右	15/660	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
3	大分県	山国川	禅海橋	中津市本耶馬渓町	左右	16/840	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
4	大分県	山国川	羅漢寺橋	中津市本耶馬渓町	左右	16/980	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
5	大分県	山国川	七仙橋	中津市本耶馬渓町	左右	17/700	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
6	大分県	山国川	早瀬橋	中津市本耶馬渓町	左右	19/040	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
7	大分県	山国川	中川原橋	中津市耶馬溪町 中津市本耶馬渓町	左右	19/820	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
8	大分県	山国川	岩屋橋	中津市耶馬溪町	左右	19/890	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
9	大分県	山国川	馬渓橋	中津市耶馬溪町	左右	21/260	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
10	大分県	山国川	城井橋	中津市耶馬溪町	左右	22/630	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
11	大分県	山国川	小友田大橋	中津市耶馬溪町	左右	23/400	流下能力不足、クリアランス不足　（許可工作物）
計						11 ヶ所	
					左岸	11 ヶ所	
					右岸	11 ヶ所	
	大分県	山国川			左岸	11 ヶ所	
					右岸	11 ヶ所	

重要水防箇所一覧表（B）（堤防）

（山国川水系）

番号	県名	河川名	地　先　名	左右岸の　別	位　　置	延　長（km）	備　　考	水防工法
1	福岡県 大分県	山国川	築上郡上毛町唐原 中津市三口	左右岸	6/400～7/400	1.000	流下断面不足で溢水の恐れ（堤体高B）	積み土のう
2	福岡県 大分県	山国川	築上郡上毛町唐原 中津市三光二本杉	左右岸	9/400～9/800	0.400	流下断面不足で溢水の恐れ（堤体高B）	積み土のう
3	福岡県 大分県	山国川	築上郡上毛町原井 中津市三光牛ノ首	左右岸	11/200～11/400	0.200	流下断面不足で溢水の恐れ（堤体高B）	積み土のう
4	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町樋田	右岸	15/525～15/610	0.090	流下断面不足で溢水の恐れ（堤体高B）	積み土のう
計					4 ヶ所	1.690		
	福岡県 大分県	山国川		左岸	3 ヶ所	1.600		
				右岸	3 ヶ所	1.600		
	大分県	山国川		左岸	0 ヶ所	0		
				右岸	1 ヶ所	0.090		
	福岡県	山国川		左岸	0 ヶ所	0		
				右岸	0 ヶ所	0		
合計				左岸	3 ヶ所	1.600		
				右岸	4 ヶ所	1.690		
					7 ヶ所	3.290		

重要水防箇所一覧表（要注意）

（山国川水系）

番号	県　名	河川名	地　先　名	左右岸の　別	位　　置	延　長（km）	備　　考	水防工法
1	大分県	山国川	中津市高瀬	右岸	5/225～6/100	0.875	漏水対策完了の為 （平成 29 年 3 月完成）	
2	大分県	山国川	中津市本耶馬渓樋田	右岸	15/460～15/510	0.050	新設堤防のため （平成 29 年 4 月完成）	
3	大分県	山国川	中津市本耶馬渓曽木	左岸	15/525～15/685	0.160	新設堤防のため （平成 30 年 6 月完成）	
4	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町蕨野	右岸	17/800～18/400	0.600	新設堤防のため （平成 28 年 12 月完成）	
5	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町多志田	右岸	19/040～19/225	0.200	新設堤防のため （平成 30 年 3 月完成）	
6	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町多志田	右岸	19/225～19/450	0.240	新設堤防のため （平成 28 年 6 月完成）	
7	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町多志田	右岸	19/450～19/550	0.105	新設堤防のため （平成 28 年 9 月完成）	
8	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町多志田	右岸	19/550～19/675	0.125	新設堤防のため （平成 29 年 3 月完成	
9	大分県	山国川	中津市本耶馬渓町多志田	右岸	19/675～19/725	0.050	新設堤防のため （平成 30 年 3 月完成）	
10	大分県	山国川	中津市耶馬溪町中川原	右岸	19/820～19/980	0.065	新設堤防のため （平成 28 年 3 月完成）	
11	大分県	山国川	中津市耶馬溪町中川原	左岸	19/820～20/050	0.340	新設堤防のため （平成 29 年 3 月完成）	
12	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21/050～21/250	0.200	新設堤防のため （平成 29 年 5 月完成）	
13	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21/265～21/450	0.180	新設堤防のため （平成 30 年 6 月完成）	
14	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21/450～21/775	0.325	新設堤防のため （平成 30 年 2 月完成）	
15	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21/775～21/900	0.095	新設堤防のため （平成 30 年 6 月完成）	
16	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	21/900～22/160	0.230	新設堤防のため （平成 29 年 5 月完成）	
17	大分県	山国川	中津市耶馬溪町平田	左岸	22/160～22/465	0.295	新設堤防のため （平成 28 年 12 月完成）	

		計			17 ヶ所	4.135		
計	大分県	山国川		左岸 右岸	8 ヶ所 9 ヶ所	1.825 2.310		
	福岡県	山国川		左岸 右岸	0 ヶ所 0 ヶ所	0 0		
合計				左岸 右岸	8 ヶ所 9 ヶ所	1.825 2.310		

重要水防箇所一覧表（要注意区間）（構造物）

（山国川水系）

番号	県名	河川名	名　　称	地　先　名	左右岸の別	位　　置	備　　考
1	大分県	山国川	樋田陸閘	中津市本耶馬渓町樋田	右岸	15/515	
2	大分県	山国川	青第一陸閘	中津市本耶馬渓町青	右岸	16/300	
3	大分県	山国川	平田第一陸閘	中津市耶馬溪町平田	左岸	21/750	
4	大分県	山国川	平田第二陸閘	中津市耶馬溪町平田	左岸	22/150	
5	大分県	山国川	平田第三陸閘	中津市耶馬溪町平田	左岸	22/340	
計						5 ヶ所	
	福岡県	山国川			左岸	0 ヶ所	
					右岸	0 ヶ所	
	大分県	山国川			左岸	3 ヶ所	
					右岸	2 ヶ所	
