

第5回熊本地震等復旧・復興工事情報連絡会議

日時：平成31年2月15日（金）14時00分～

会場：熊本テルサ「テルサホール」（熊本市中央区水前寺公園 28-51）

次 第

1 開 会

2 挨 拶

3 議 事

（議題1）復旧・復興工事の進捗状況について

- ① 国土交通省九州地方整備局
- ② 農林水産省九州農政局・九州森林管理局
- ③ 熊本県・市町村

（議題2）不調・不落の状況について

- ① 国土交通省九州地方整備局
- ② 農林水産省九州農政局・九州森林管理局
- ③ 熊本県・市町村

（議題3）復旧・復興工事及び通常工事に関する今後の発注計画等について

- ① 国土交通省九州地方整備局
- ② 農林水産省九州農政局・九州森林管理局
- ③ 熊本県・市町村

（議題4）建設資機材や労働力の確保に関する現状と課題について

- ① 国土交通省九州地方整備局

（議題5）円滑な施工確保対策について

- ① 国土交通省九州地方整備局
- ② 農林水産省九州農政局
- ③ 熊本県

4 意見交換

5 その他

6 閉 会

熊本地震等復旧・復興工事情報連絡会議規約

(名称)

第1条 本会議は、「熊本地震等復旧・復興工事情報連絡会議（以下、「情報連絡会議」という。）」と称する。

(目的)

第2条 情報連絡会議は、熊本地震等により被災した公共土木施設等に係る復旧・復興工事を円滑に進めるため、各地域の施工体制の確保等に係る様々な課題に対し、関係者間において情報共有や対応策の検討を行うことを目的とする。

(協議事項)

第3条 情報連絡会議は、下記事項について協議する。

- (1) 復旧・復興工事に関する発注計画の共有
- (2) 建設産業の現状と課題の共有
- (3) 建設資機材や労働力の確保に関する現状と課題の共有
- (4) 適正な発注について
- (5) 発注情報の一元化
- (6) その他、情報連絡会議で必要と認める事項

(組織)

第4条 情報連絡会議は、国土交通省九州地方整備局及び熊本県で主催する。

2 構成員は別表1に掲げるとおりとする。

(役員)

第5条 本会議に、次の役員を置く。

議 長 1名

副議長 1名

(役員の選任)

第6条 議長は、熊本県土木部長をもって充てる。

2 副議長は、国土交通省九州地方整備局企画部長をもって充てる。

(役員の職務)

第7条 議長は、本会議の会務を統括する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議の開催)

第8条 情報連絡会議は、必要に応じて開催する。

(熊本地震等復旧・復興工事情報連絡準備会議)

第9条 情報連絡会議開催に向け、様々な課題の整理、検討等を行うため、熊本地震等復旧・復興工事情報連絡準備会議を置く。

2 構成員は別表2に掲げるとおりとする。

(事務局)

第10条 情報連絡会議の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局は、熊本県土木部監理課に置くものとする。

(その他)

第11条 この規約に定めるもののほか、情報連絡会議の運営に必要な事項は、情報連絡会議において協議のうえ定める。

附 則

この規約は、平成28年11月10日から施行する。

附 則

この規約は、平成29年2月13日から施行する。

附 則

この規約は、平成29年6月2日から施行する。

附 則

この規約は、平成29年11月29日から施行する。

国土交通省	九州地方整備局	企画部長
	九州地方整備局 企画部	技術調整管理官
	九州地方整備局 企画部	技術開発調整官
	九州地方整備局 建政部	建設産業調整官
	九州地方整備局 営繕部	営繕品質管理官
	熊本河川国道事務所	所長
	八代河川国道事務所	所長
	熊本復興事務所	所長
	菊池川河川事務所	所長
	川辺川ダム砂防事務所	所長
	立野ダム工事事務所	所長
	緑川ダム管理所	所長
	熊本営繕事務所	所長
農林水産省	九州農政局	設計課長
	土地改良技術事務所	所長
	九州森林管理局	治山課長
	熊本森林管理署	署長
熊本県	土木部	土木部長 政策審議監 監理課長 土木技術管理課長 営繕課長
	農林水産部	農林水産政策課長 技術管理課長
	県央広域本部	土木部長 農林部長
	宇城地域振興局	土木部長 農林部長
	上益城地域振興局	土木部長 農林部長
	県北広域本部	土木部長 農林水産部長
	玉名地域振興局	土木部長 農林部長
	鹿本地域振興局	土木部長 農林部長
	阿蘇地域振興局	土木部長 農林部長
	県南広域本部	土木部長 農林水産部長
	芦北地域振興局	土木部長 農林部長
	球磨地域振興局	土木部長 農林部長
	天草広域本部	土木部長 農林水産部長
	教育庁	施設課長
熊本県警察本部	刑事部組織犯罪対策課	暴力対策官兼暴力対策室長
県内市町村	熊本市	土木主管課長
	八代市	農林水産主管課長
	人吉市	契約主管課長

荒尾市
水俣市
玉名市
天草市
山鹿市
菊池市
宇土市
上天草市
宇城市
阿蘇市
合志市
美里町
玉東町
和水町
南関町
長洲町
大津町
菊陽町
南小国町
小国町
産山村
高森町
南阿蘇村
西原村
御船町
嘉島町
益城町
甲佐町
山都町
氷川町
芦北町
津奈木町
錦町
あさぎり町
多良木町

	湯前町	
	水上村	
	相良村	
	五木村	
	山江村	
	球磨村	
	苓北町	
建設産業団体	(一社) 熊本県建設業協会 (一社) 熊本県建設業協会 熊本支部 (一社) 熊本県建設業協会 宇城支部 (一社) 熊本県建設業協会 玉名支部 (一社) 熊本県建設業協会 荒尾支部 (一社) 熊本県建設業協会 鹿本支部 (一社) 熊本県建設業協会 菊池支部 (一社) 熊本県建設業協会 阿蘇支部 (一社) 熊本県建設業協会 上益城支部 (一社) 熊本県建設業協会 八代支部 (一社) 熊本県建設業協会 芦北支部 (一社) 熊本県建設業協会 人吉支部 (一社) 熊本県建設業協会 天草支部 (一社) 熊本県建設業協会 建築部会 (一社) 熊本県建設業協会 舗装部会 熊本県管工事業組合連合会 熊本県砕石業協同組合 熊本県鉄筋工事業協同組合 熊本県生コンクリート工業組合 (一社) 熊本県法面保護協会 熊本県アスファルト合材協会 熊本県技能士会連合会建設専門工事業部会 西日本建設業保証(株) 熊本支店 (一社) 熊本県測量設計コンサルタント協会 (一社) 熊本県警備業協会	会長 支部長 支部長 支部長 支部長 支部長 支部長 支部長 支部長 支部長 支部長 支部長 支部長 支部長 部会長 部会長 会長 理事長 理事長 理事長 会長 会長 部会長 支店長 会長 会長

※今後、構成員は必要に応じて追加されることもあり得る

国土交通省	九州地方整備局 企画部 九州地方整備局 建政部 九州地方整備局 営繕部 熊本河川国道事務所 熊本復興事務所	技術管理課長 建設産業課長 計画課長 所長 所長
農林水産省	九州農政局 九州森林管理局	設計課長 治山課長
熊本県	土木部	土木部長 政策審議監 監理課長 土木技術管理課長 営繕課長
	農林水産部	農林水産政策課長 技術管理課長
	県央広域本部	土木部長 農林部長
	宇城地域振興局	土木部長 農林部長
	上益城地域振興局	土木部長 農林部長
	阿蘇地域振興局	土木部長 農林部長
	教育庁	施設課長
県内市町村	熊本市	契約監理部長 土木部長 建築住宅部長
建設産業団体	(一社) 熊本県建設業協会	会長

※構成員は、今後必要に応じて追加することもあり得る


【議題 1】

「復旧・復興工事の進捗状況について」

①国土交通省九州地方整備局

②農林水産省九州農政局・九州森林管理局

③熊本県・市町村

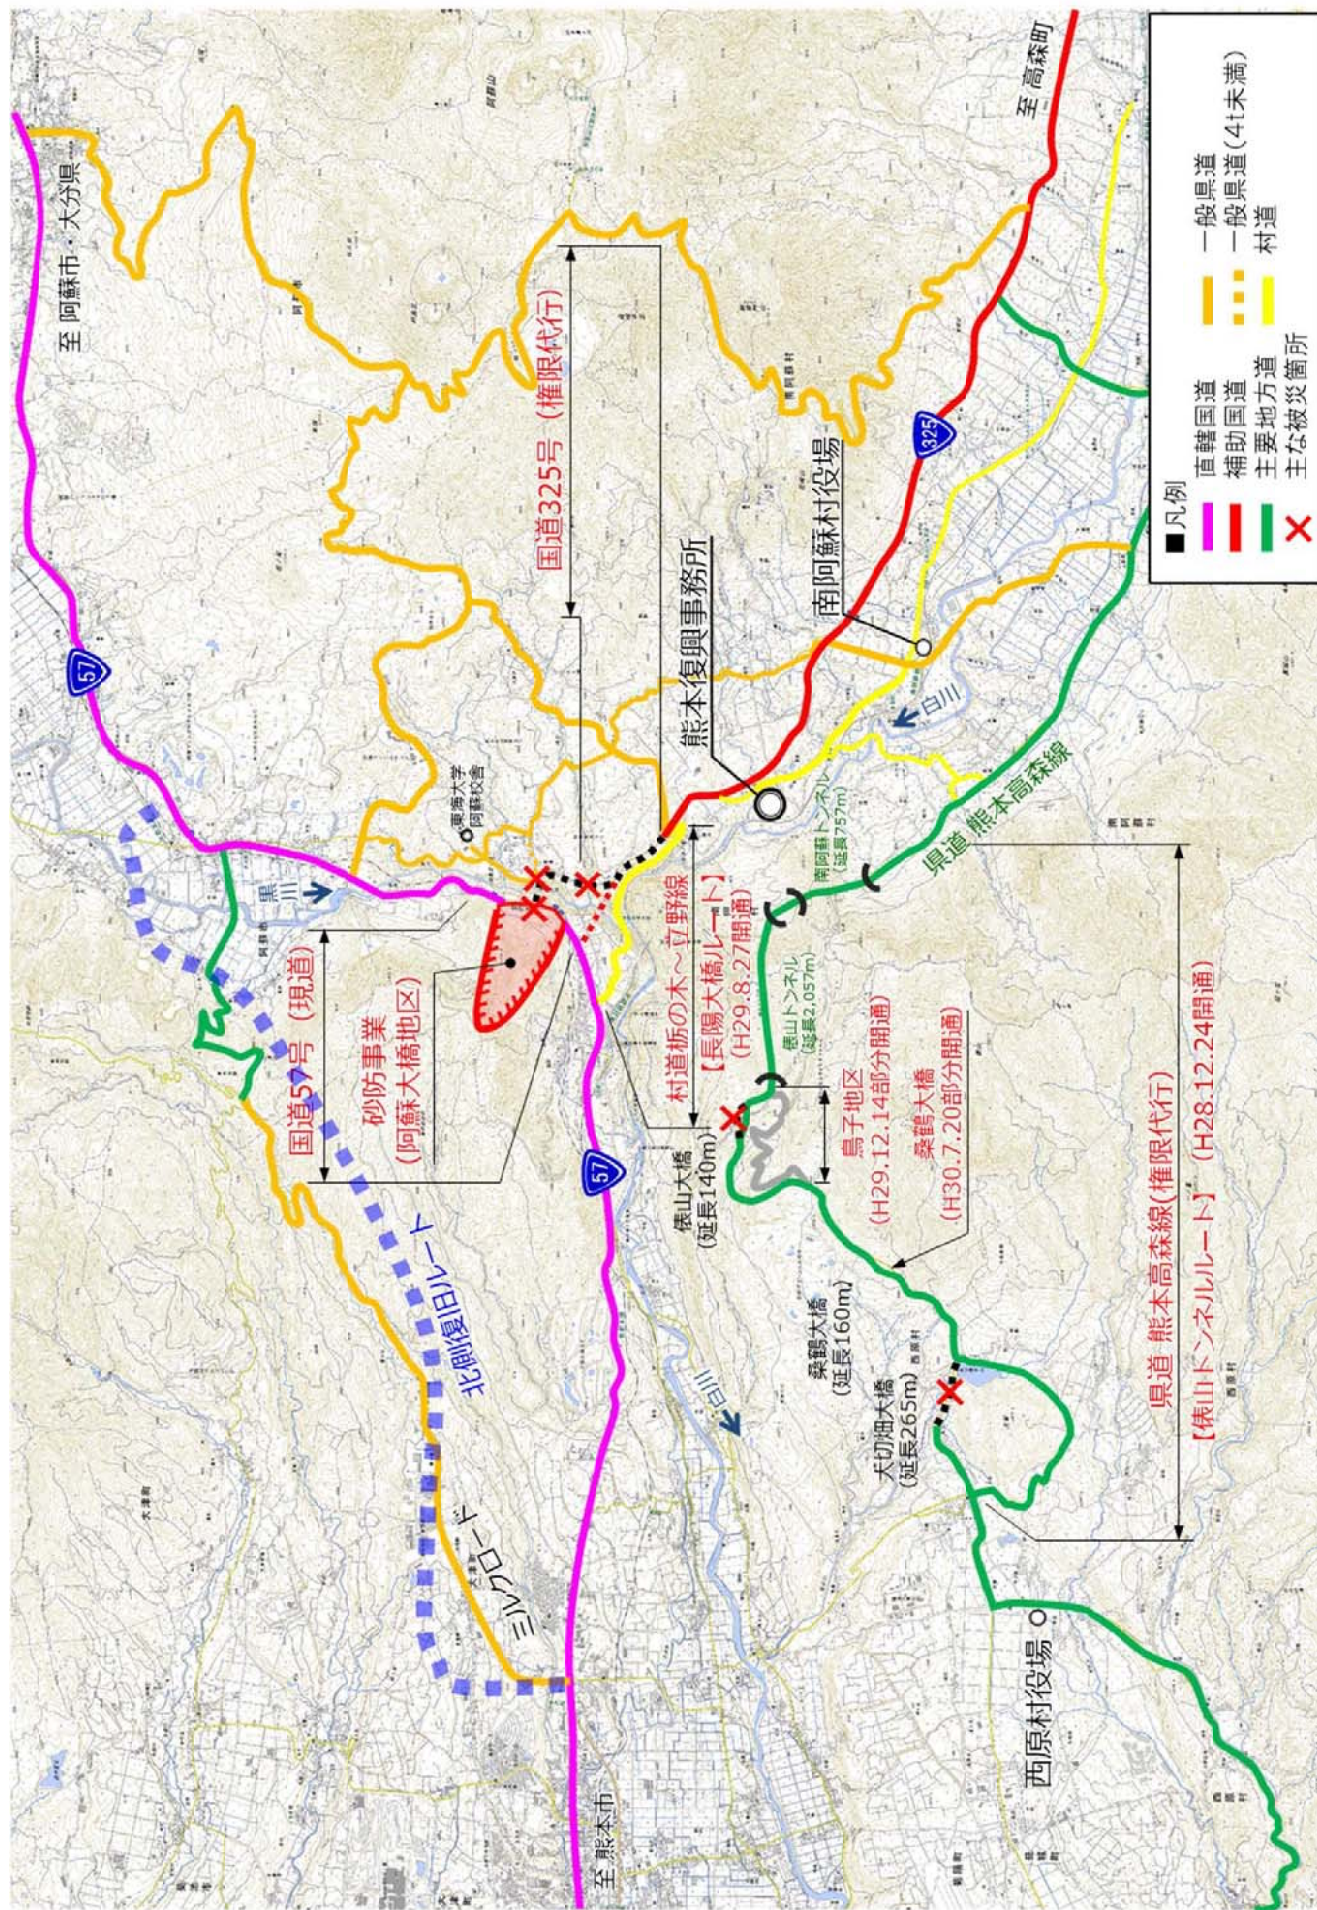


省交通国土

斜面上部の傾斜が特に急な区域(標高620m以上)の対策が完了(平成30年9月5日)し、引き続き、斜面中腹部の対策を行っています。



・植生マット工、ネット工・鉄筋挿入工 施工中

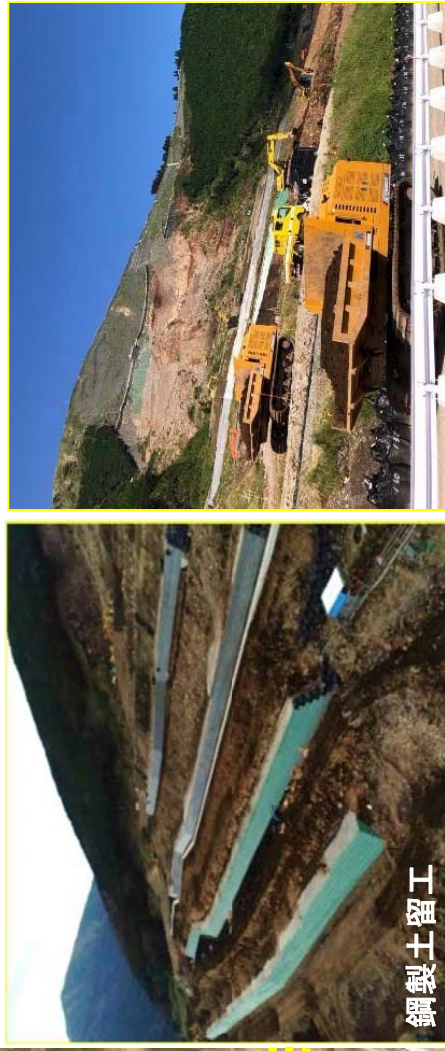


・斜面対策工事、黒川河岸欠壊防止工事で工事ヤードとして使用中

国道325号 阿蘇大橋架替【権限代行】


阿蘇大橋本体工事について、下部工施工のための基礎工に着手しました。
平成32年度の開通を目指します。

阿蘇大橋（イメージ）

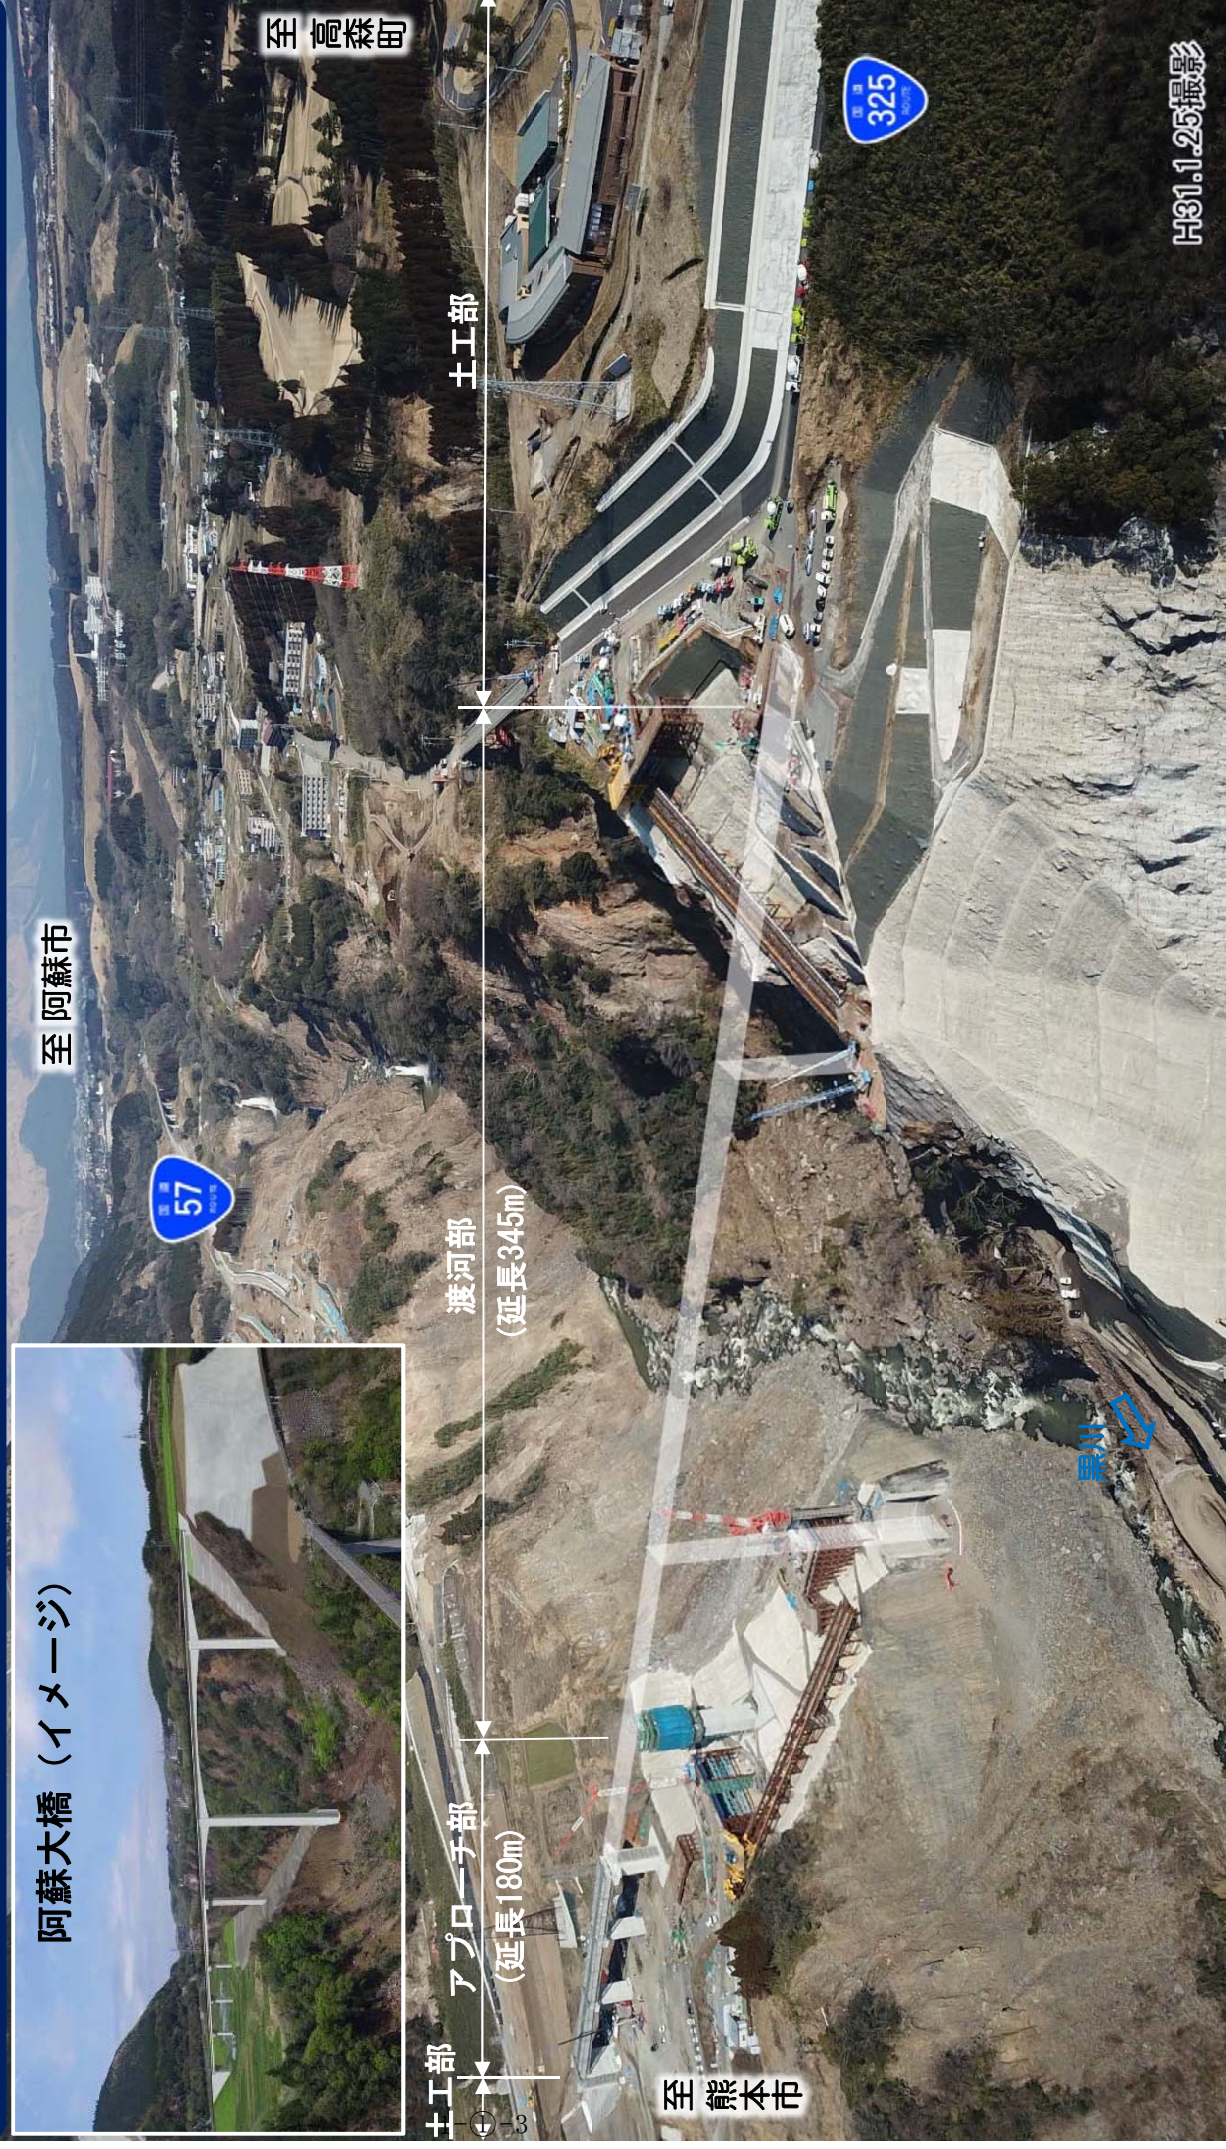

県道熊本高森線（俵山トンネルルート）【権限代行】

平成30年7月20日に桑鶴大橋の交通切替を実施しました。
 橋梁（大切畑大橋、俵山大橋）の補修工事等を推進しています。

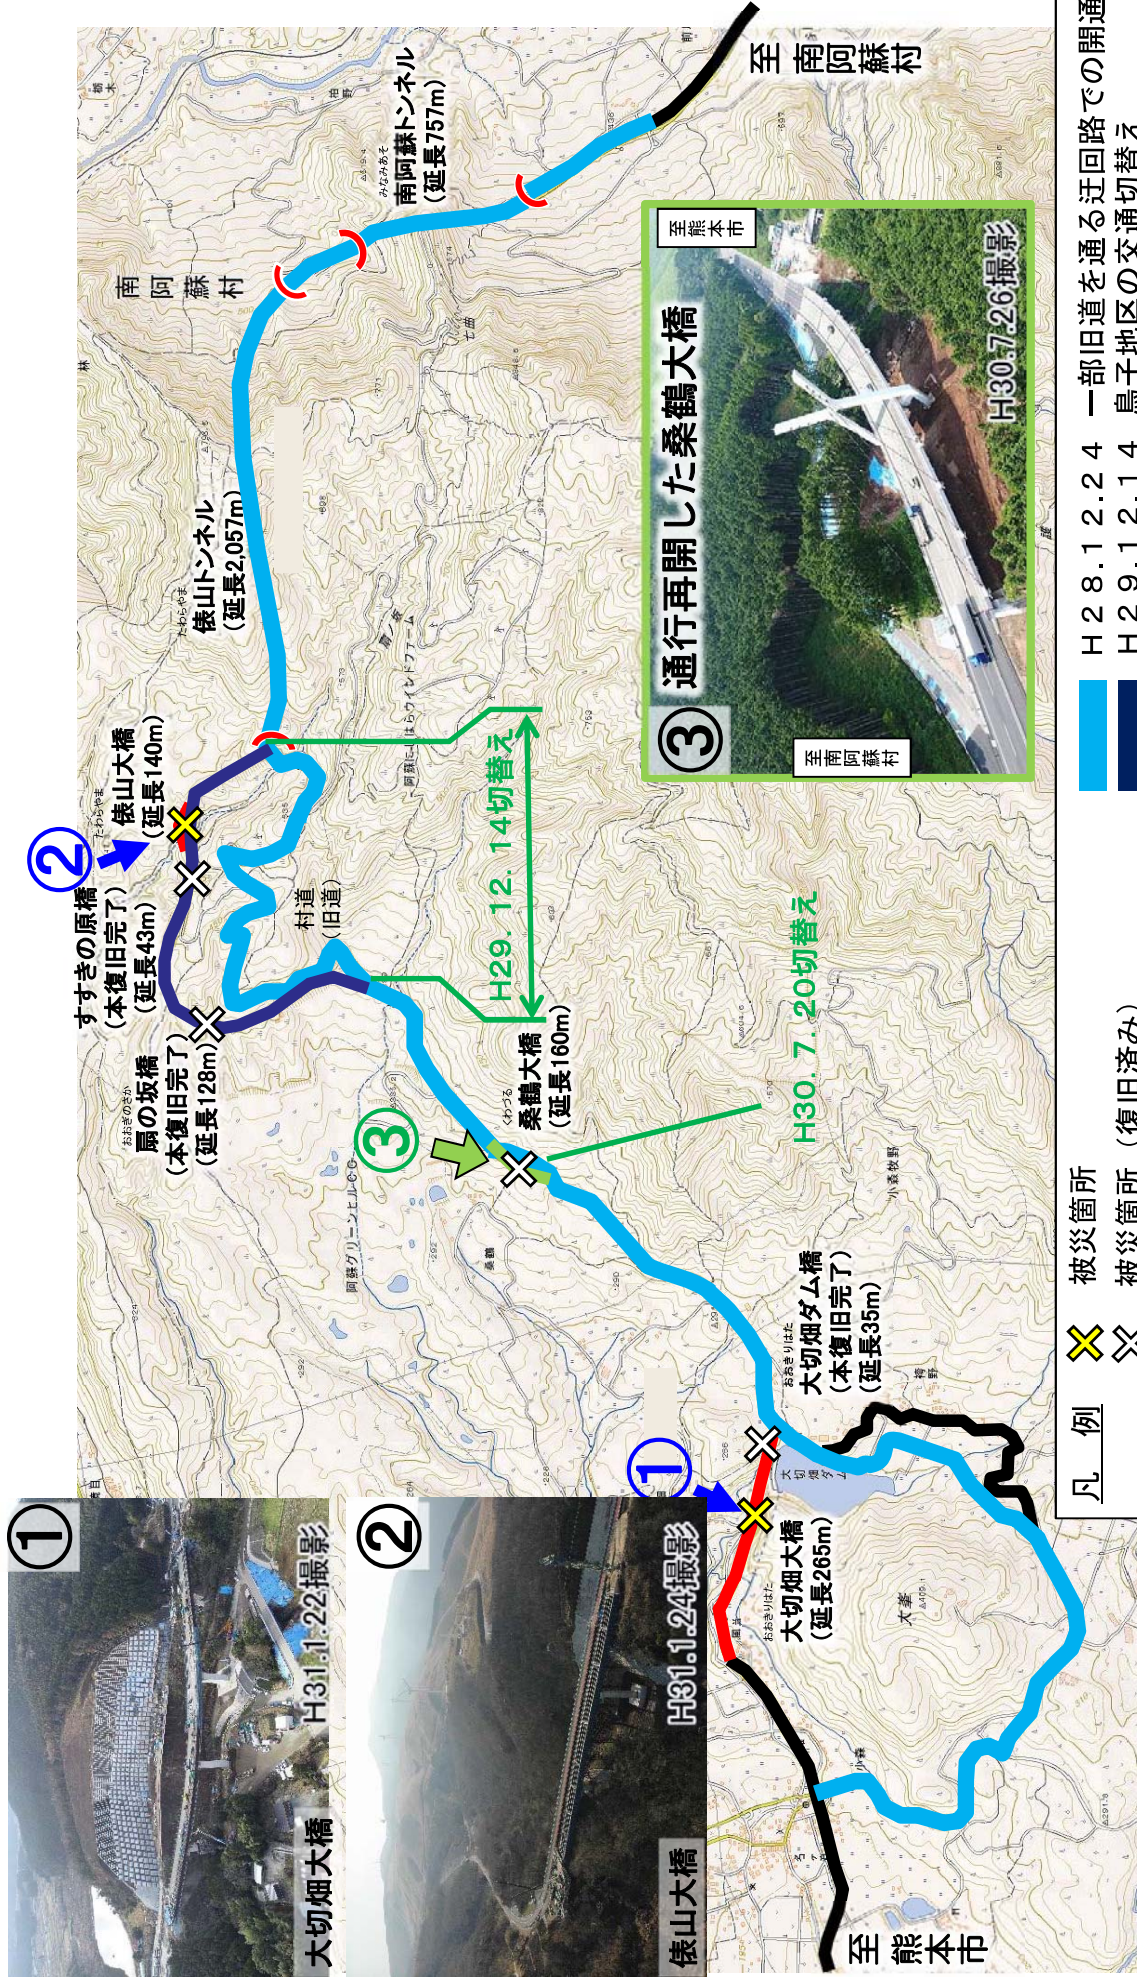

凡 例	被災箇所	被災箇所 (復旧済み)	被災箇所 (通行可能時期未定)
×	被災箇所	被災箇所 (復旧済み)	被災箇所 (通行可能時期未定)
×	被災箇所	被災箇所 (復旧済み)	被災箇所 (通行可能時期未定)
×	被災箇所	被災箇所 (復旧済み)	被災箇所 (通行可能時期未定)

H28.12.24 一部旧道を通る迂回路での開通
 H29.12.14 鳥子地区の交通切替え
 H30.7.20 桑鶴大橋の交通切替え

村道栃の木～立野線（長陽大橋ルート）【権限代行】

平成29年8月27日に応急復旧として開通しました。
引き続き、恒久復旧に向けた道路斜面対策等の工事を行っています。


阿蘇長陽大橋全景




戸下地区下部斜面施工状況



戸下地区下部斜面工事用進入路施工状況

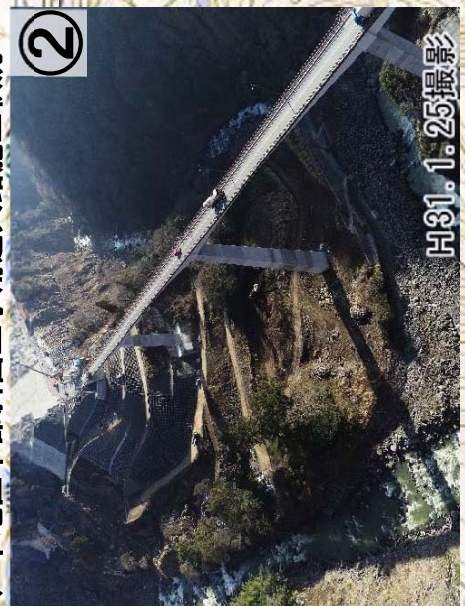



特定災害復旧事業熊本農地海岸地区における工事の進捗状況について九州農政局

九州農政局では、熊本県からの要請に応じ、熊本地震により被災した熊本農地海岸（有明海側3海岸、八代海側4海岸）における、海岸堤防の復旧事業を実施。
平成28年12月に復旧工事に着手し、平成30年10月に予定した全ての農地海岸復旧工事を完了。

- 1. 計画総事業費：1,008百万円
- 2. 事業工期：平成28年度～平成30年度
- 3. 事業実施主体：九州農政局
- 4. 特定災害復旧事業 熊本農地海岸地区 工事計画工程表

区域名(工区名)		数量(m)		主な工種	平成28年度			平成29年度												平成30年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		総延長	被災延長		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
有明海側	鮑託海岸 (熊本市西区沖新町)	3,517.5	411.0	地盤改良、堤防盛土、波返工 (コンクリート)復旧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

※ 環境に配慮する期間、全体工事計画 H28・29年度工事 H29年度工事 H29・30年度工事

復旧・復興工事の進捗状況について

九州森林管理局

○災害復旧・復興工事を全て契約済み。7割で工事が完了。

単位：件、百万円

災害復旧事業の種類	全体		平成30年度 第3四半期末		契約済累計		実施率		工事完了		完了率	
	件数	査定決定工 事費の総額	契約件数	請負額	契約件数	左記請負額	契約件数	請負額	竣工件数	請負額	完了件数	請負額
治山施設災害復旧事業	18	1,718	18	1,502	18	1,502	100.0%	87.4%	11	805	61.1%	46.9%
治山災害関連連緊急事業	4	675	4	597	4	597	100.0%	88.4%	4	597	100.0%	88.4%
林道施設災害復旧事業	11	440	11	440	11	440	100.0%	100.0%	8	145	72.7%	33.0%
合計	33	2,833	33	2,539	33	2,539	100.0%	89.6%	23	1,547	69.7%	54.6%

※平成30年12月末時点

主な施工箇所の復旧状況

左近(さこん)地区（南阿蘇村）



吉岡(よしおか)地区（南阿蘇村）



復旧・復興工事の進捗状況について

県・市町村（政令市含む）災害復旧事業の進捗状況（平成30年12月末時点）

○ 全災害件数10,191件のうち件数ベースで約88%が発注済、約64%が完了。

災害復旧事業の種類		全 体		平成30年度 第3四半期末（12月末） 発注済累計		発注率		工事完了		完了率	
		件数 (A)	工事費 (B)	発注件数 (C)	左記 発注額 (D)	発注件数 (E=C/A)	発注額 (F=D/B)	竣工件数 (G)	竣工額 (H)	竣工件数 (I=G/A)	竣工額 (J=H/B)
①	公共土木施設災害復旧事業	4,907	108,274	4,770	96,318	97.2%	89.0%	3,917	61,008	79.8%	56.3%
	農業用施設災害復旧事業	2,357	20,542	1,899	11,317	80.6%	55.1%	1,236	6,177	52.4%	30.1%
	農地災害復旧事業	2,579	7,766	2,008	6,294	77.9%	81.0%	1,070	3,782	41.5%	48.7%
②	林道施設災害復旧事業	303	1,894	293	1,840	96.7%	97.1%	258	1,461	85.1%	77.1%
	治山施設災害復旧事業	20	871	17	604	85.0%	69.4%	10	267	50.0%	30.7%
	漁港施設災害復旧事業	25	398	25	398	100.0%	100.0%	25	398	100.0%	100.0%
合 計		10,191	139,745	9,012	116,771	88.4%	83.6%	6,516	73,093	63.9%	52.3%

※1 県・市町村（政令市含む）の計、国直轄、代行事業は除く
※2 地震、梅雨前線豪雨等28年発生災害査定後（災害再調査等考慮）
※3 建築・営繕は除く

復旧・復興工事の進捗状況について

県・市町村（政令市含む）公共土木施設災害復旧工事の進捗状況（平成30年12月末時点）

- 全災害件数のうち県央（熊本市、上益城、宇城）地域に約63%が集中、そのうち約97%が発注済。
- 県北地域の全災害件数は約31%で、そのうち約98%が発注済。
- 全体では、約97%が発注済みで、そのうち約80%が完了。

①公共土木施設災害復旧事業分

	県 央		県 北		県 南	天 草	合 計	うち熊本・上益城・阿蘇地域	
	県 央	うち熊本・上益城地域	県 北	うち阿蘇地域					
総箇所数A	3,107	2,355	1,526	1,186	142	132	4,907		3,541
構成比 (A/ΣA)	63.3%	48.0%	31.1%	24.2%	2.9%	2.7%	100.0%		72.2%
発注済数B	2,999	2,260	1,497	1,157	142	132	4,770		3,417
発注率 (B/A)	96.5%	96.0%	98.1%	97.6%	100.0%	100.0%	97.2%		96.5%
竣工数C	2,336	1,696	1,309	970	140	132	3,917		2,666
完了率 (C/A)	75.2%	72.0%	85.8%	81.8%	98.6%	100.0%	79.8%		75.3%

単位：件

※査定件数ベース（災害再調査等での廃工等考慮） ※県工事を含む

※地域ブロックは県の広域本部管轄区分

○県央：熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、益城町、甲佐町、山都町

○県北：荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村

○県南：八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町

○天草：上天草市、天草市、苓北町

復旧・復興工事の進捗状況について

県・市町村(政令市含む)農林水産部施設災害等復旧工事の進捗状況(平成30年12月末時点)

- 全災害件数のうち県央(熊本市、上益城、宇城)地域に約69%が集中、そのうち約72%が発注済。
- 県北地域の全災害件数は約28%で、そのうち約100%が発注済。
- 全体では、約80%が発注済みで、そのうち約49%が完了。

②農林水産部施設災害等復旧事業分

	県 央		県 北		県 南	天 草	合 計	うち熊本・上益城・阿蘇地域	
	県	うち熊本・上益城地域	県	うち阿蘇地域					
総箇所数A	3,629	3,205	1,487	1,117	97	71	5,284	4,322	
構成比 (A/ΣA)	68.7%	60.7%	28.1%	21.1%	1.8%	1.3%	100.0%	81.8%	
発注済数B	2,593	2,180	1,482	1,112	96	71	4,242	3,292	
発注率 (B/A)	71.5%	68.0%	99.7%	99.6%	99.0%	100.0%	80.3%	76.2%	
竣工数C	1,245	981	1,187	833	96	71	2,599	1,814	
完了率 (C/A)	34.3%	30.6%	79.8%	74.6%	99.0%	100.0%	49.2%	42.0%	

※査定件数ベース(災害再調査等での廃工等考慮) ※県工事を含む

※地域ブロックは県の広域本部管轄区分

○県央：熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町

○県北：荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村

○県南：八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町

○天草：上天草市、天草市、苓北町

復旧・復興工事の進捗状況について

県・市町村（政令市含む）災害復旧関係事業※の進捗状況（平成30年12月末時点）

※対象事業：災害関連事業、激甚災害対策特別緊急事業、災害関連緊急事業、復旧治山事業 など（平成28年災害分）

- 砂防・地すべり関係（関連、災関緊、激特）の構成比率が工事費ベースで約34％。
- 発注率（工事費ベース）は全体で約76％。
- 完了率（工事費ベース）は全体で約22％。

災害復旧関係事業の種類	箇所数 全体工事費			平成30年度 第3四半期末（12月末）迄 発注済累計		発注率 (工事費ベース) (F=E/B)	工事完了			完了率	
	事業 箇所数 ^{注1} (A)	全体 工事費 ^{注2} (B)	構成比率 (工事費ベース) (C=B/ΣB)	工事 発注件数 ^{注3} (D)	左記 発注額 (E)		完了 工事件数 ^{注4} (G)	完了 工事額 (H)	完了 事業数 ^{注5} (I)	完了 工事額 (K=H/B)	完了 事業数 (J=I/A)
河川関係（関連）	1	125	0.2%	2	121	96.5%	1	60	0	48.0%	0.0%
橋梁関係（関連）	2	1,066	1.7%	6	846	79.4%	3	172	0	16.1%	0.0%
砂防・地すべり関係 （関連、災関緊、激特）	67	20,867	33.8%	94	17,152	82.2%	38	1,640	8	7.9%	11.9%
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業	196	5,229	8.5%	195	5,018	96.0%	102	2,293	102	43.9%	52.0%
宅地耐震化推進事業 （大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）	328	16,201	26.2%	235	11,826	73.0%	62	2,890	58	17.8%	17.7%
治山関係（復旧治山、災関緊、激特）	142	18,277	29.6%	100	11,846	64.8%	63	6,238	55	34.1%	38.7%
合 計	736	61,765	100.0%	632	46,808	75.8%	269	13,293	223	21.5%	30.3%

単位：件、百万円

注1：件数は事業数とする。

注2：全体工事費のみを対象とする（工事費以外の用地補償費や測量試験費等は除く）。

注3：1事業において発注した複数の工事を累計した件数を記載。

注4：(D)に対する完了件数。

注5：(A)に対する完了事業数。

単位：件、百万円

復旧・復興工事の進捗状況について

県・市町村(政令市含む)災害復旧関係事業※の進捗状況(平成30年12月末時点)

※対象事業：災害関連連事業、激甚災害対策特別緊急事業、災害関連緊急事業、復旧治山事業 など(平成28年災害分)

- 総事業数のうち県央地域が約46%、県北地域が約52%。
- 総工事費のうち県北地域が約68%であり、特に阿蘇地域に集中している。

		単位：件、百万円					
	県 央	うち熊本・上益城地域	県 北	うち阿蘇地域	県 南	天 草	合 計
総事業数A※1	336	292	386	370	12	2	736
事業数構成比 (A/ΣA)	45.7%	39.7%	52.4%	50.3%	1.6%	0.3%	100.0%
総工事費B※2	18,791	17,428	42,119	39,868	736	119	61,765
工事費構成比 (B/ΣB)	30.4%	28.2%	68.2%	64.5%	1.2%	0.2%	100.0%
発注済工事費C	15,191	13,912	30,784	29,142	736	97	46,808
発注率 (C/B) ※工事費ベース	80.8%	79.8%	73.1%	73.1%	100.0%	81.6%	75.8%
完了工事費D	5,052	4,098	7,471	6,753	673	97	13,293
完了率 (D/B) ※工事費ベース	26.9%	23.5%	17.7%	16.9%	91.4%	81.6%	21.5%
							18.9%

注1：件数は事業箇所数とする。

注2：全体工事費のみを対象とする（工事費以外の用地補償費や測量試験費等は除く）。

※地域ブロックは県の広域本部管轄区分

○県央：熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町

○県北：荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村

○県南：八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町

○天草：上天草市、天草市、苓北町

復旧・復興工事の進捗状況について

県有施設における災害復旧工事の進捗状況（平成30年12月末時点）

- 全被災施設数のうち県央（熊本市、上益城、宇城）地域に約80%が集中、工事費ベースで約91%が発注済。
- 全体では、工事費ベースで約92%が発注済みで、そのうち約77%が完了。

単位：施設、百万円

区	分	県央 うち熊本・ 上益城地域	県北 うち阿蘇地域	県南	天草	合計	うち熊本・上益 城・宇城地域
被災した県有施設	施設数 計 (A) 注1	40	8	0	2	50	36
	構成比 (A / Σ A)	80.0%	16.0%	0.0%	4.0%	100.0%	72.0%
	工事費 計 (B) 注2	11,249	918	0	13	12,180	11,480
	構成比 (B / Σ B)	92.4%	7.5%	0.0%	0.1%	100.0%	94.3%
	発注率 (C)	10,265	913	0	13	11,191	10,491
発注率	発注率 (工事費ベース) (D=C/B)	91.3%	99.5%	—	100.0%	91.9%	91.4%
	竣工額 (E)	8,540	800	0	13	9,353	8,653
	完了率 (工事費ベース) (F=E/B)	75.9%	87.1%	—	100.0%	76.8%	75.4%
	完了した施設数 (G)	32	7	0	2	41	27
	完了率 (施設数ベース) (H=G/A)	80.0%	87.5%	—	100.0%	82.0%	75.0%

注1：県有施設の施設数は、土木部管轄課へ復旧事業を依頼された施設数を計上。
 また予算年度は異なるが、重複する8施設については施設数を重複カウントしないよう調整。
 注2：工事費は、県有施設所有管轄課から土木部管轄課に依頼のあった予算額を計上。なお、復旧完了した施設については、精算額を計上。

復旧・復興工事の進捗状況について



市町村・小中学校における災害復旧工事の進捗状況（平成30年12月末時点）

○ 市町村・小中学校においては、被災学校数ベースで約95%が完了。

区 分		県 央		県 北		県 南		天 草		合 計	
		うち熊本・上益城地域	うち阿蘇地域	うち熊本・上益城・阿蘇地域	うち熊本・上益城・阿蘇地域	うち熊本・上益城・阿蘇地域	うち熊本・上益城・阿蘇地域	うち熊本・上益城・阿蘇地域	うち熊本・上益城・阿蘇地域	うち熊本・上益城・阿蘇地域	うち熊本・上益城・阿蘇地域
被災した学校（A）	小学校	107	90	33	11	4	1	145	101		
	中学校	49	40	15	6	3	0	67	46		
	計	156	130	48	17	7	1	212	147		
	構成比（A/ΣA）	73.6%	61.3%	22.6%	8.0%	3.3%	0.5%	100.0%	69.3%		
復旧が完了した学校（B）	小学校	104	87	32	10	4	1	141	97		
	中学校	42	33	15	6	3	0	60	39		
	計	146	120	47	16	7	1	201	136		
	構成比（B/ΣB）	72.6%	59.7%	23.4%	8.0%	3.5%	0.5%	100.0%	67.7%		
完了率（B/A）	小学校	97.2%	96.7%	97.0%	90.9%	100.0%	100.0%	97.2%	96.0%		
	中学校	85.7%	82.5%	100.0%	100.0%	100.0%	（－）	89.6%	84.8%		
	計	93.6%	92.3%	97.9%	94.1%	100.0%	100.0%	94.8%	92.5%		



※地域ブロックは県の広域本部管轄区分
○県央：熊本市、宇城市、美里町、御船町、益城町、甲佐町、山都町
○県北：荒尾市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村
○県南：八代市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町
○天草：上天草市、天草市、苓北町

市町村庁舎の建て替えの進捗状況（平成30年12月末時点）

○ 8市町村※の庁舎建替については、6市町村で工事着手されており、1町は完了している。
※八代市、人吉市、水俣市、宇土市、天草市、大津町、小国町、益城町



代表的な道路関連施設の復旧状況について

平成30年12月末の進捗状況

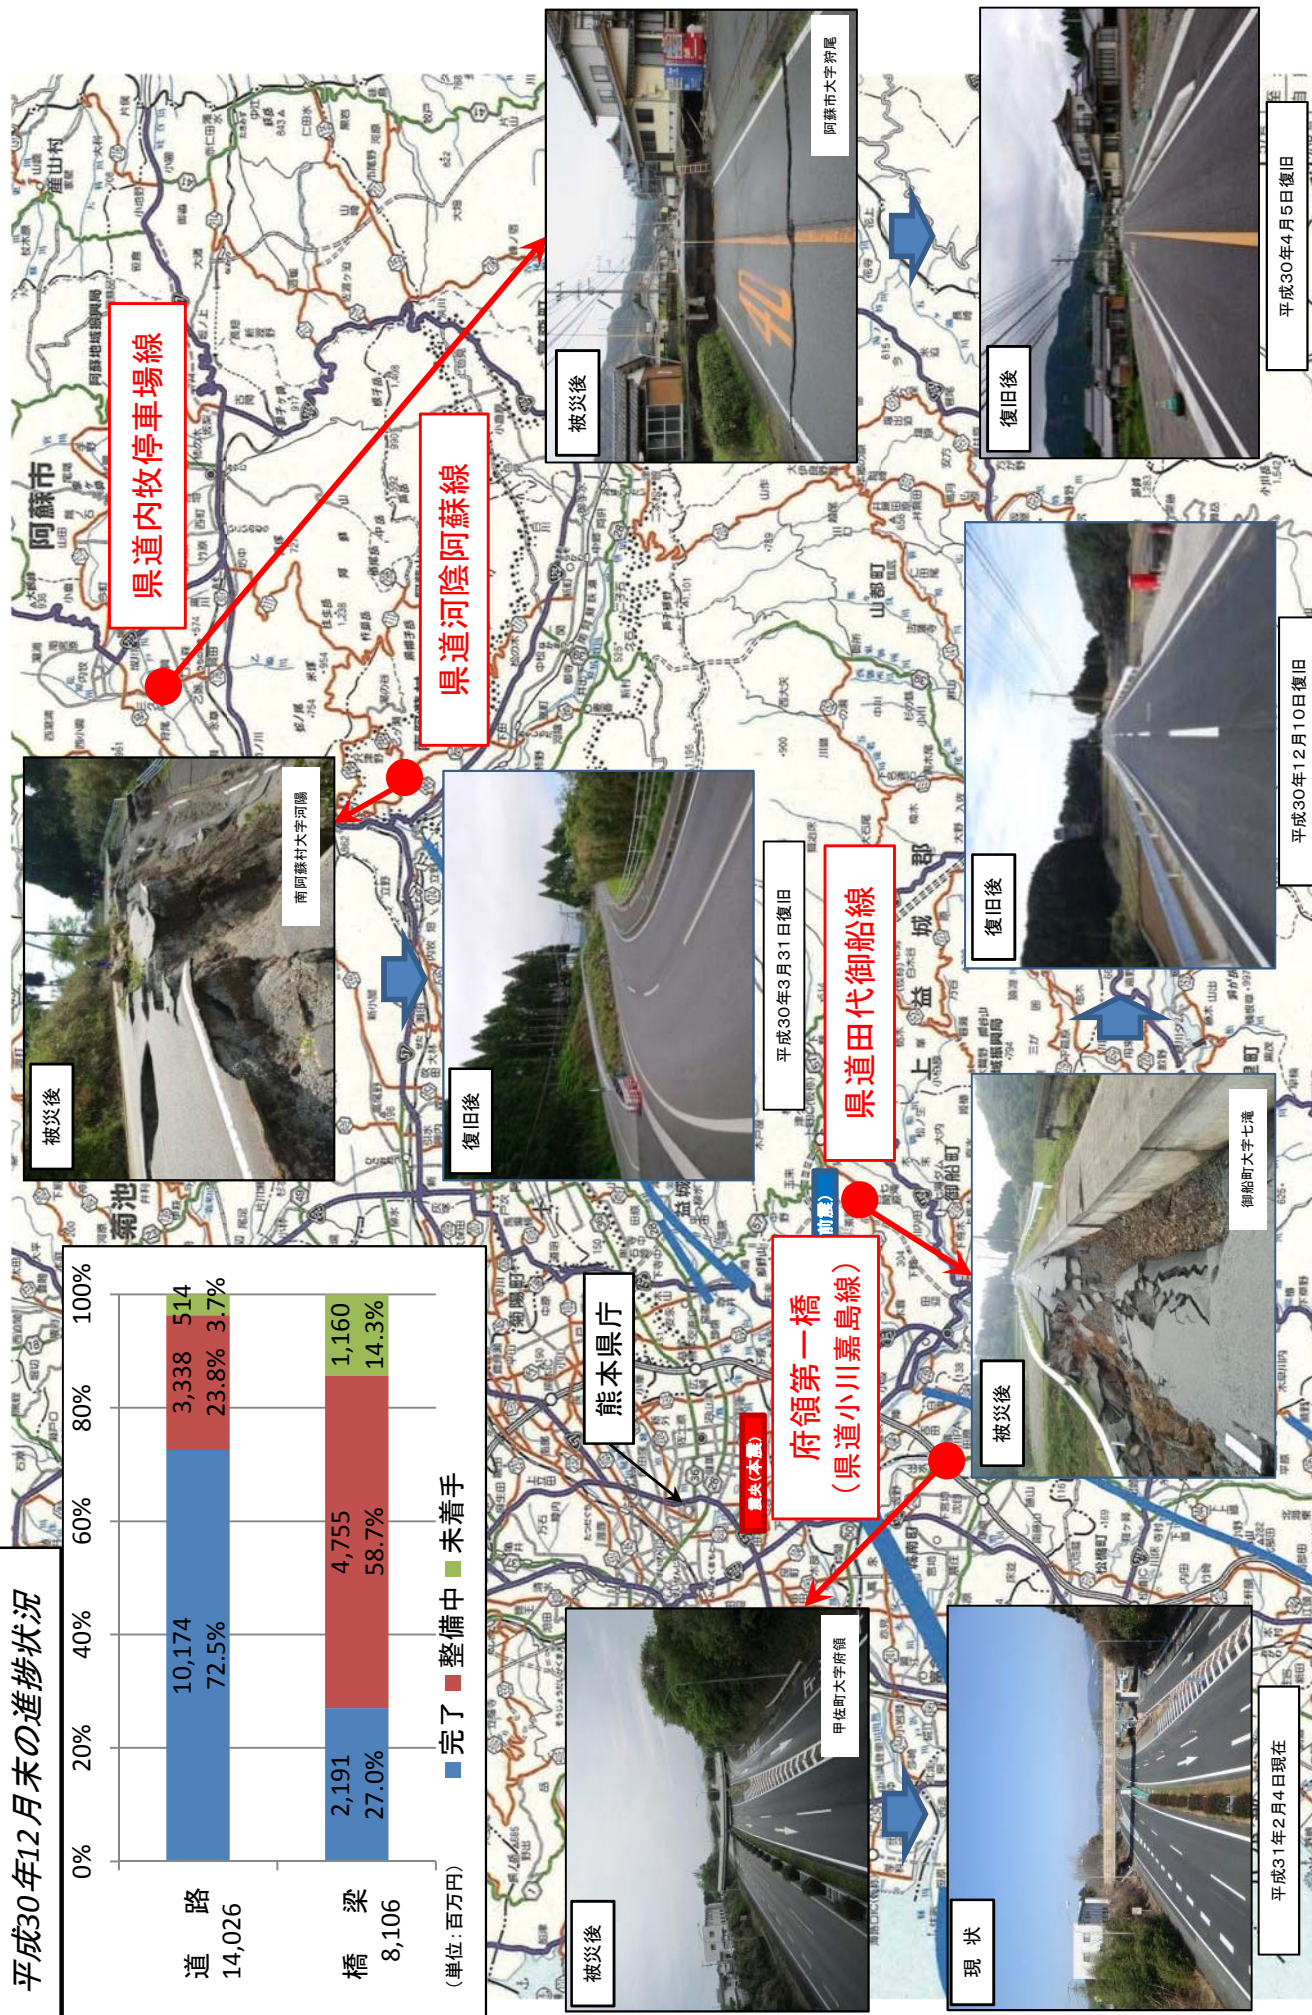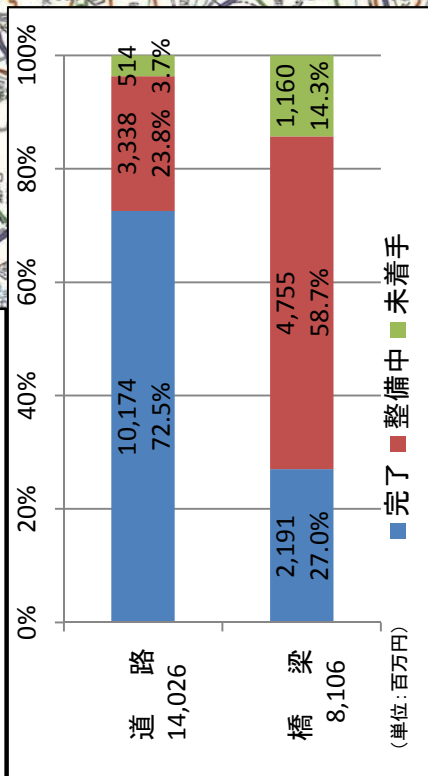


代表的な河川施設と港湾施設の復旧状況について

平成30年12月末の進捗状況

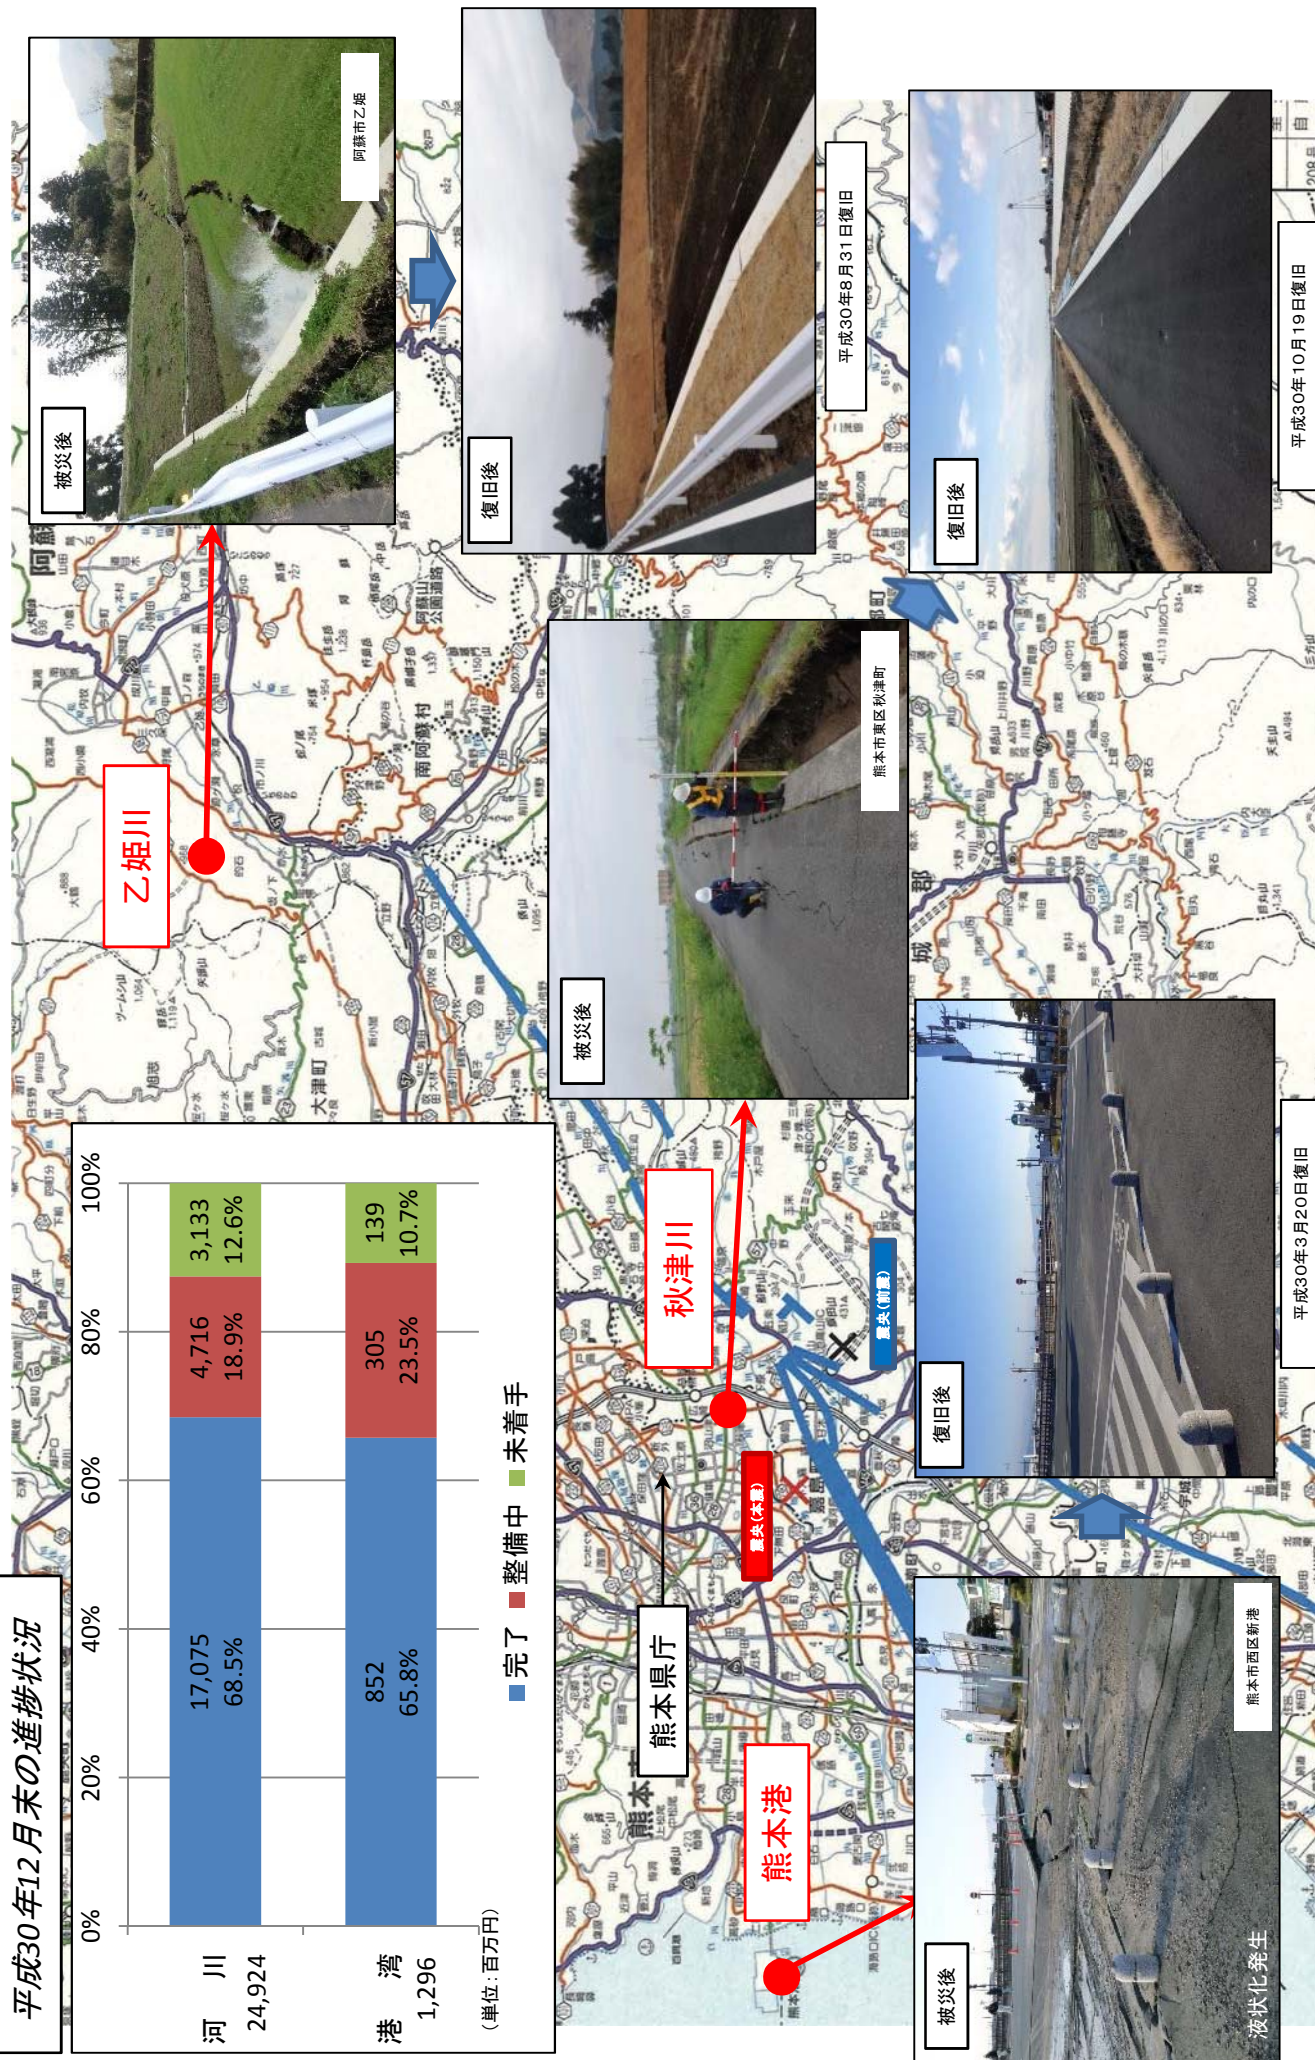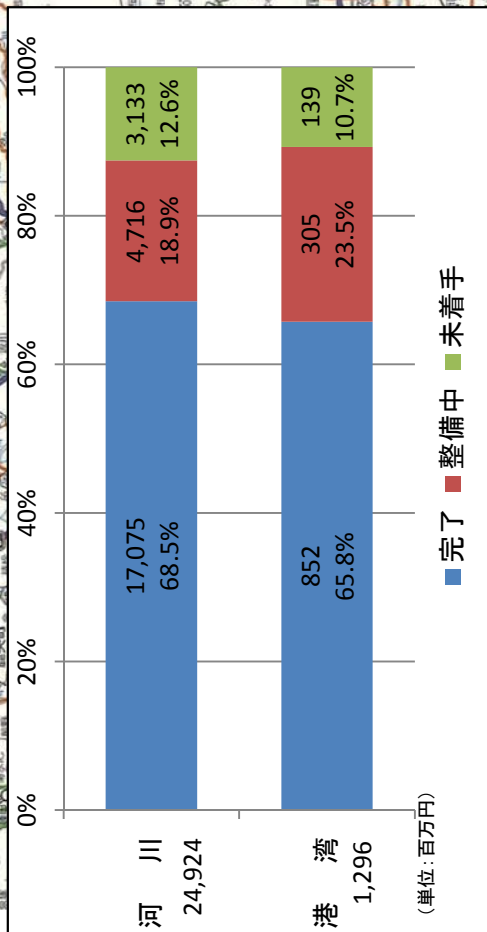

復旧後



5,503

(単位:百万円)

■ 未着手
■ 整備中
■ 完了

火の鳥温泉地区(地すべり)

王谷川(砂防)

大切畑地区(地すべり)

被災後

現狀

平成31年1月末時点

平成31年1月末時点

平成31年1月末時点

現象

從後

南阿蘇村大字長野

復旧後

平成30年3月23日復旧



被災後

南阿蘇村大字河陽

被災後

現狀

代表的な県有施設の復旧状況と災害公営住宅の整備状況について

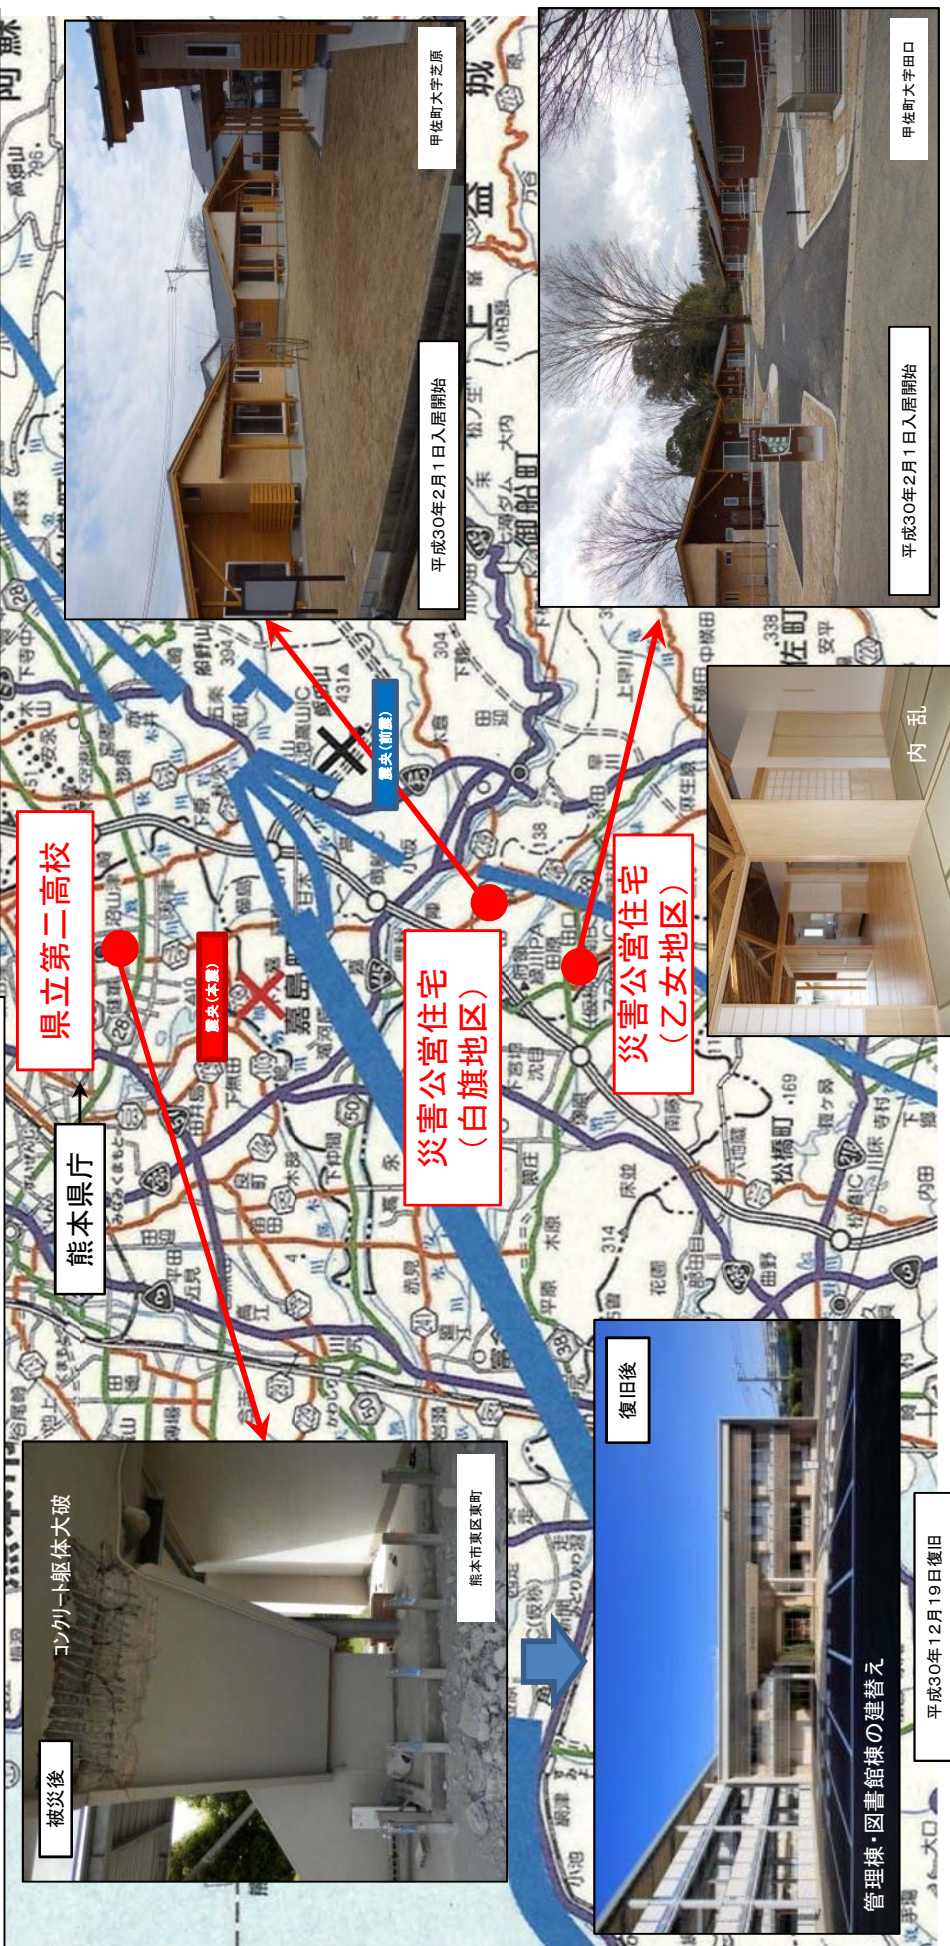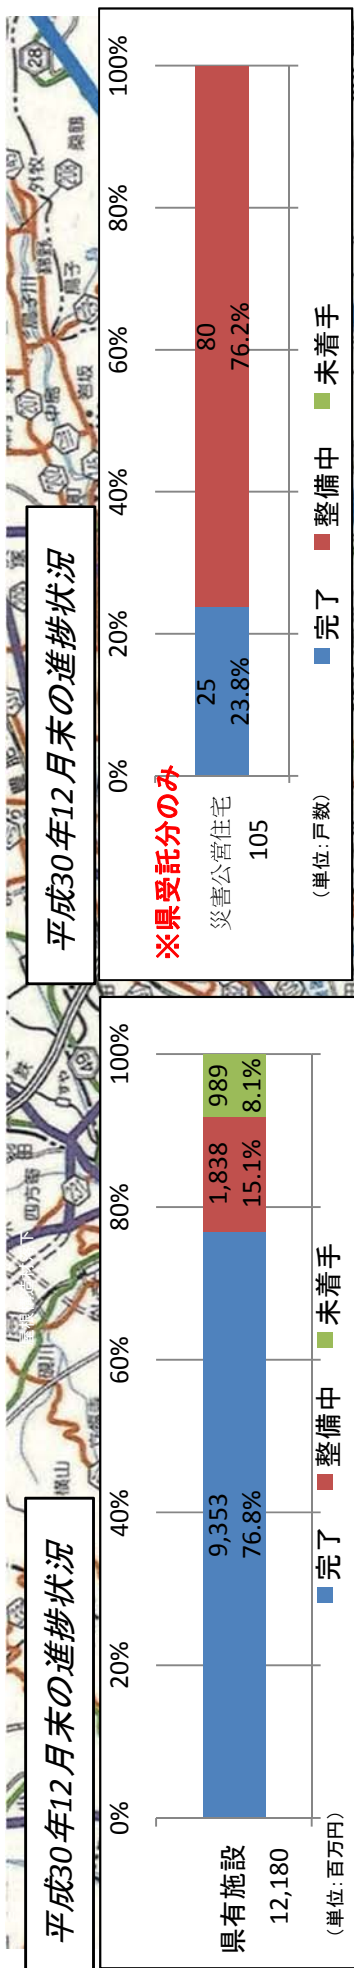

復旧・復興の状況（農林水産業関連①）

■被災農家の営農再開

営農再開を目指す農家：15,503戸

(H30年10月末)

1.7%

進捗率

98.3%

■ 営農再開 ■ 未再開

「被災農家の営農再開」を重点項目として設定。農地及び営農施設の復旧を完了し、平成31年に営農再開が可能となるよう取り組みを推進

■営農用施設・機械

(被災農業者向け経営体育成支援事業)

事業申請：10,299件

うち事業完了：9,299件(H30年10月末時点)

進捗率

90.3%

9.7%

■ 完了 ■ 整備中

農舎・トラクターの復旧(阿蘇市)



■地域ぐるみの畜産復興

(H30年10月末時点)

畜産クラスター事業（施設整備）

33箇所

93.9%

6.1%

■ 完了

■ 整備中

搾乳ロボット



新設牛舎



■カントリーエレベーター・選果場等の共同利用施設

(H30年5月完了)

カントリー・

選果場等

(96箇所)

100.0%

卸売市場

(7箇所)

100.0%

■ 完了



カントリーエレベーター建設（嘉島町）



復旧・復興の状況（農林水産業関連②）


■農地・農業用施設

大切畑ダム除く（H30年10月末時点）

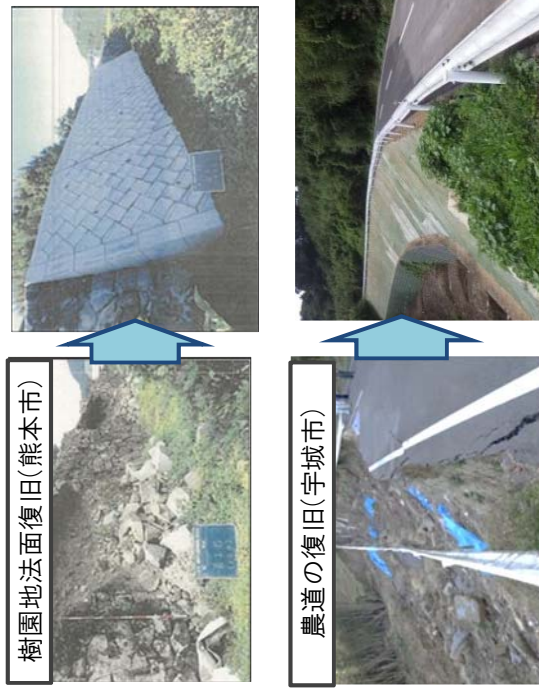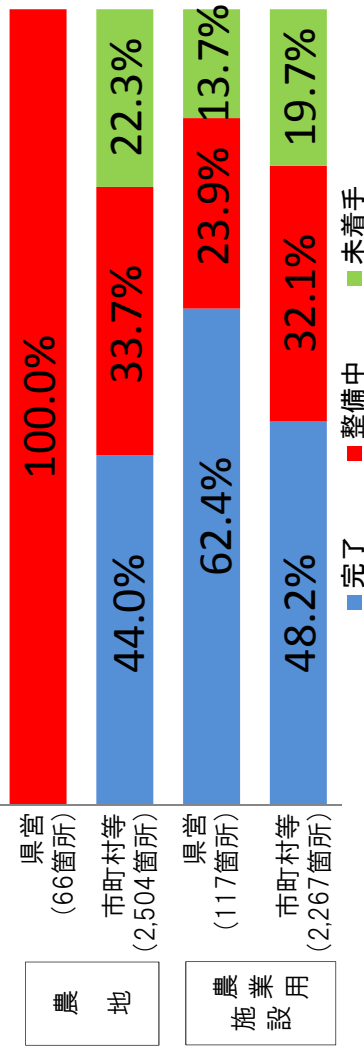

■農地の創造的復興

地震を契機に被災した地域が一体となって将来を見据え、持続可能で安定した農業が展開できるよう、災害復旧と併せて大区画化や担い手への農地集積、汎用化等の取組みを推進

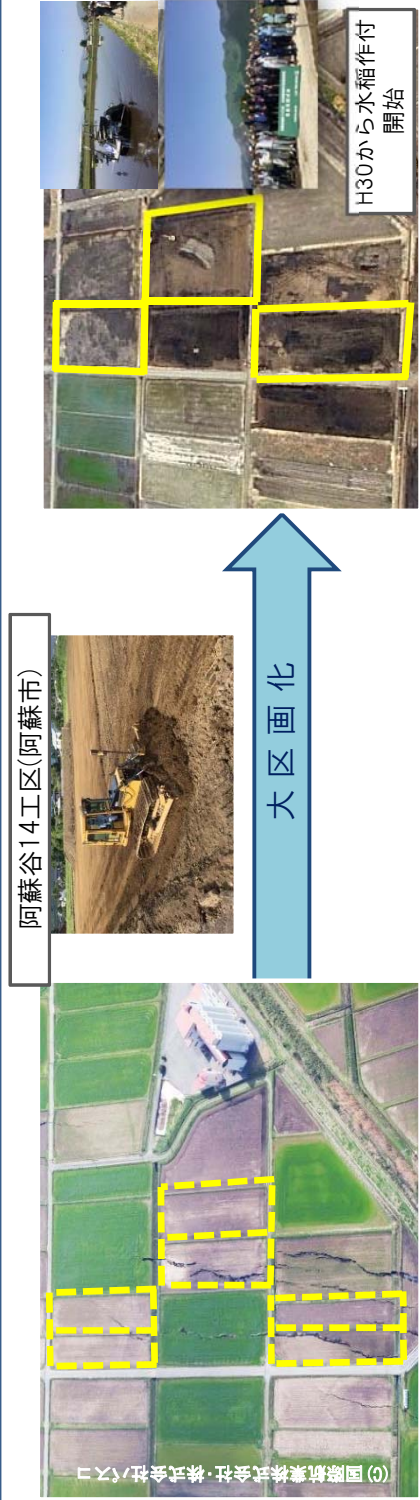


阿蘇谷14工区(阿蘇市)

H30から水稻作付開始

復旧・復興の状況(農林水産業関連③)

■山地崩壊

(H30年10月末時点)




丸太柵工
機生ネット
を展張


谷止工
の設置

■林業関係

(H30年10月末時点)




木材加工流通施設の復旧 (西原村)

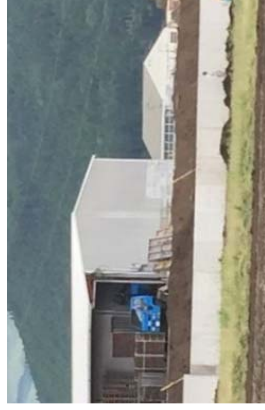

■水産関係

(水産庁事業関連)

(H30年3月完了)

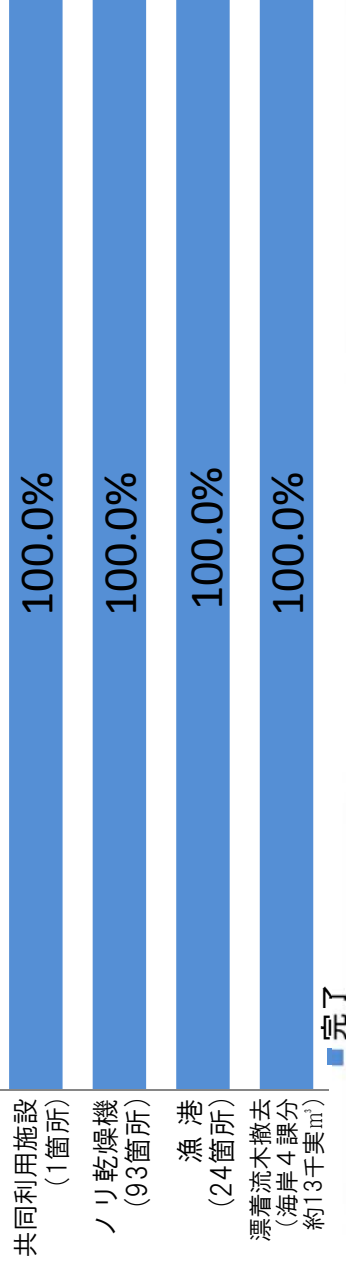

県漁連ノリ荷捌き所建設(熊本市)



ノリ乾燥設備復旧(熊本市)



漂着流木撤去作業

■国の直轄代行による復旧状況 (H30年10月末時点)

○農地海岸施設

- ・海岸施設7箇所の復旧事業を実施。
H29年度中に4箇所が完了
(残り3箇所はH30年度に完了予定)

○治山施設

- ・阿蘇市、南阿蘇村の治山施設(17箇所)の復旧事業を実施。15箇所が着手済み、うち8か所が完成(残り9箇所はH31年度までに完了予定)

【議題 2】

「不調・不落の状況について」

①国土交通省九州地方整備局


②農林水産省九州農政局・九州森林管理局

③熊本県・市町村

平成28年度発注工事(全工種)の契約状況

熊本県内国土交通省直轄工事における契約状況


○平成28年度発注工事は、一旦不調・不落となった後、再発注等により契約できている。

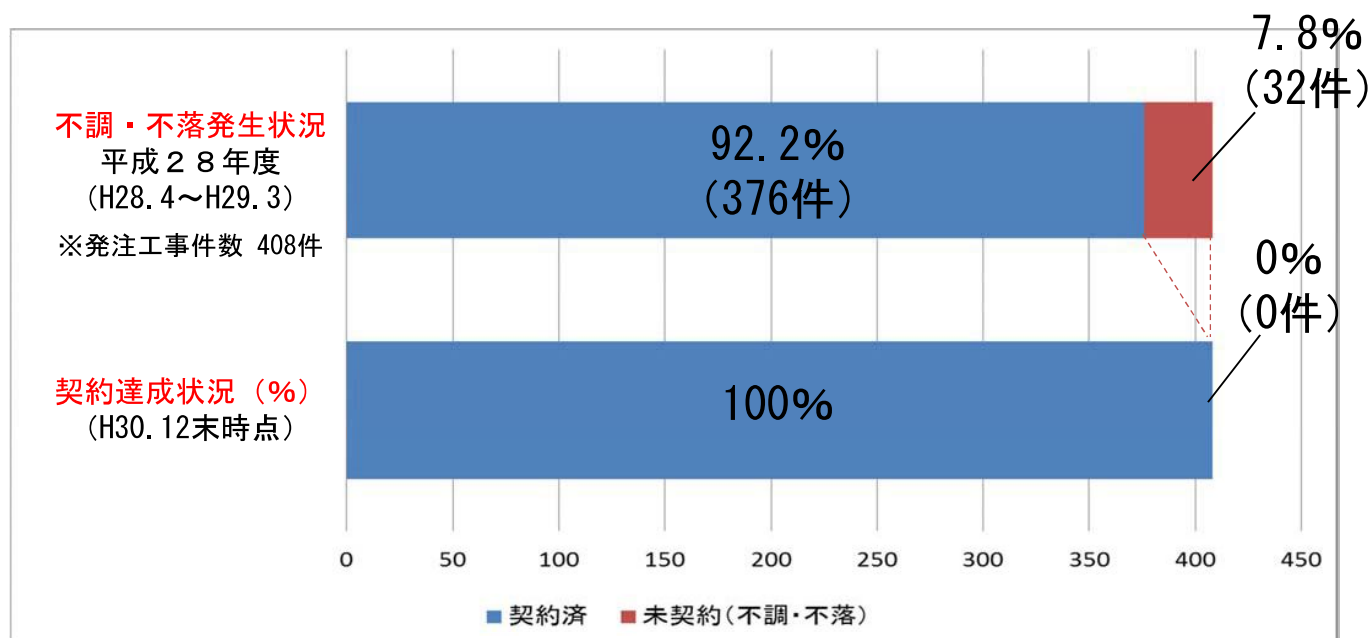

平成29年度発注工事(全工種)の契約状況

熊本県内国土交通省直轄工事における契約状況


○平成29年度発注工事は、一旦不調・不落となった後、再発注等により現段階で概ね契約できている。

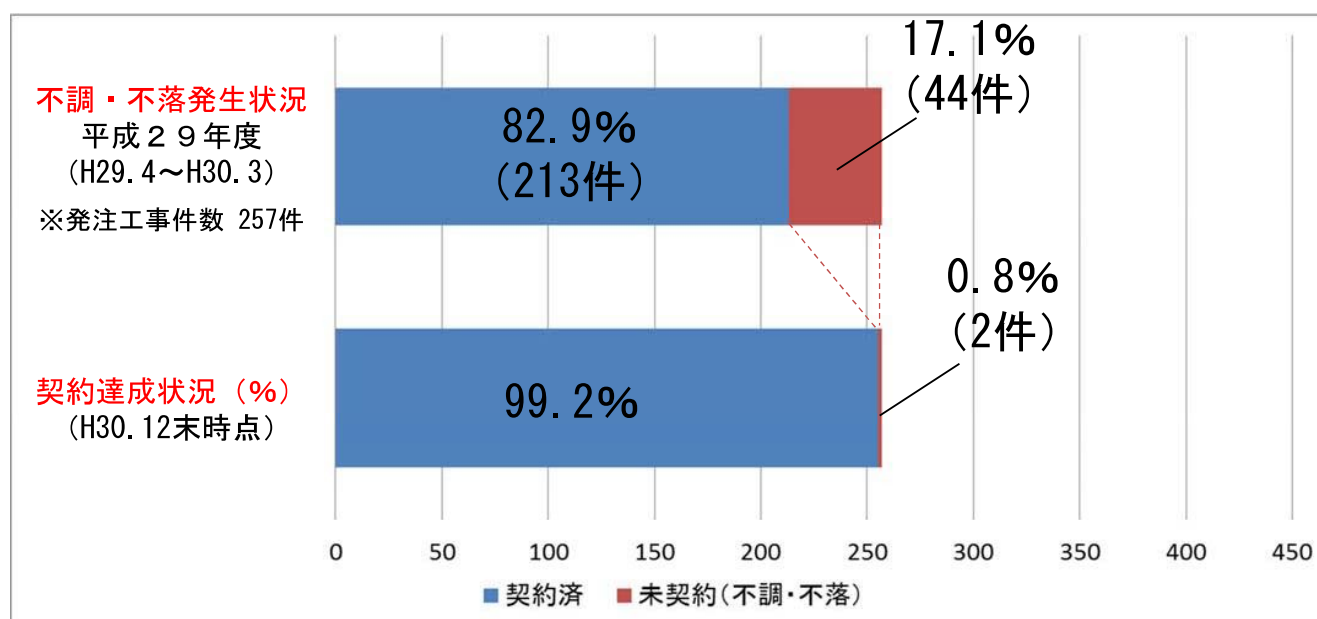

平成30年度発注工事(全工種)の契約状況


熊本県内国土交通省直轄工事における契約状況

○平成30年度発注工事は、一旦不調・不落となった後、再発注等による手続きを進めている。

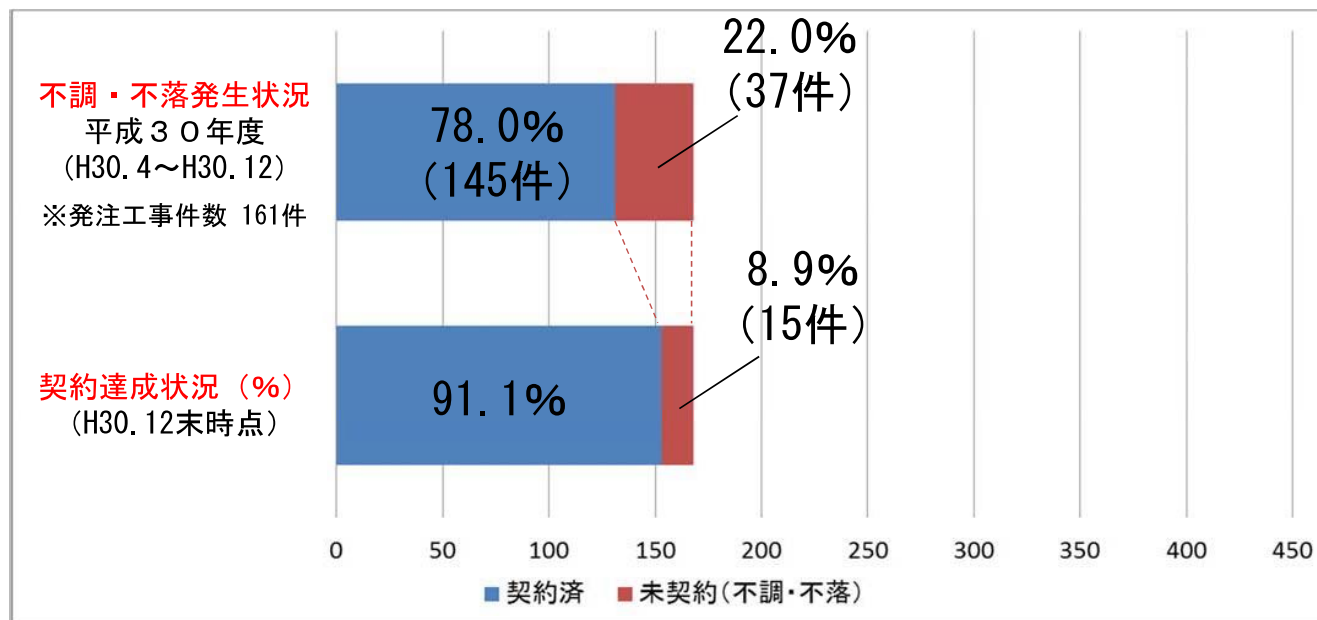


不調・不落の状況(熊本県内国土交通省直轄工事・全工種)

発注件数(直轄・熊本県内) 不調不落件数(直轄・熊本県内)

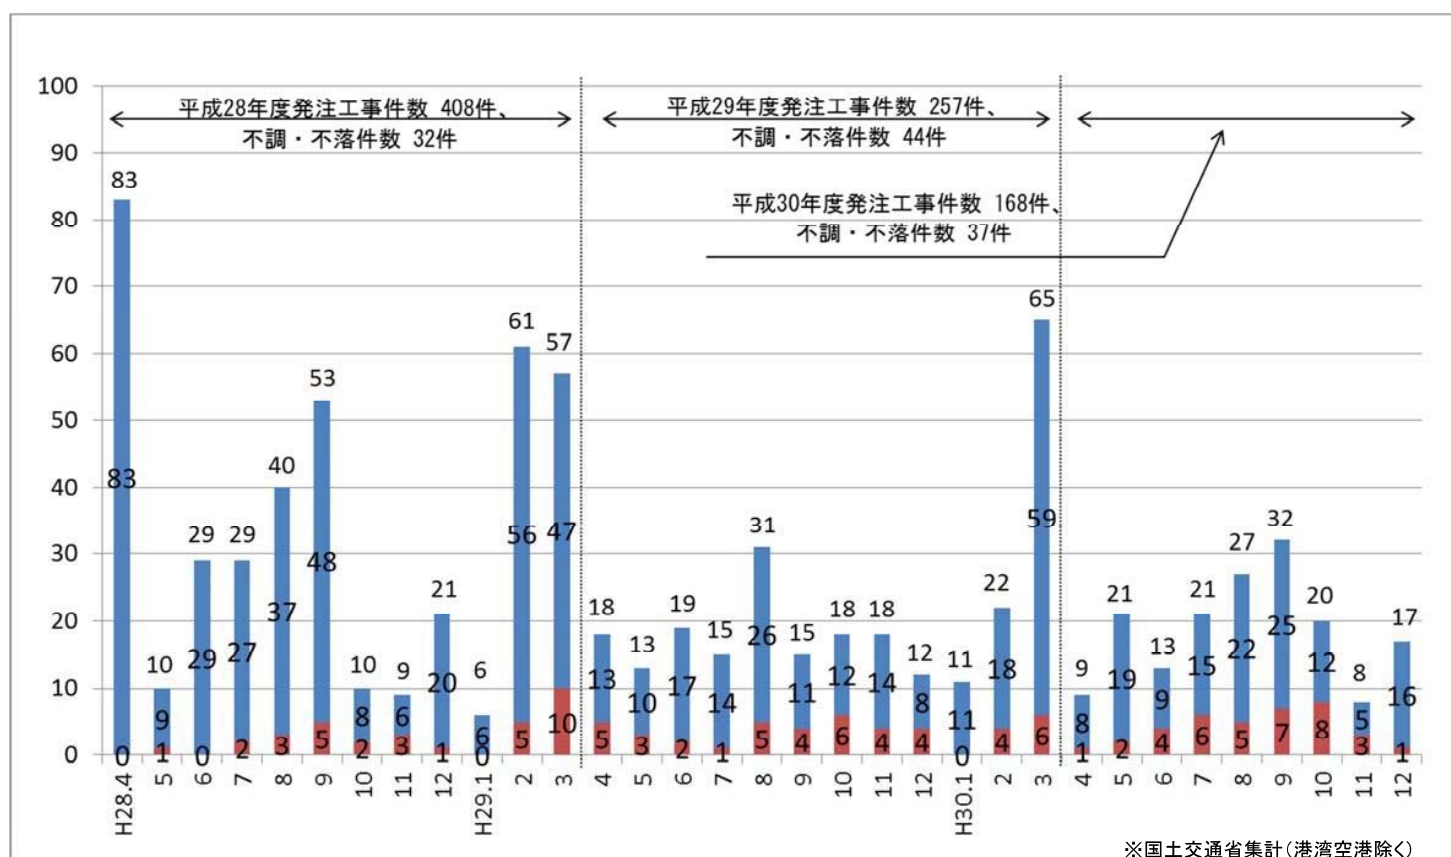


不調・不落の状況(熊本県発注工事・全工種)

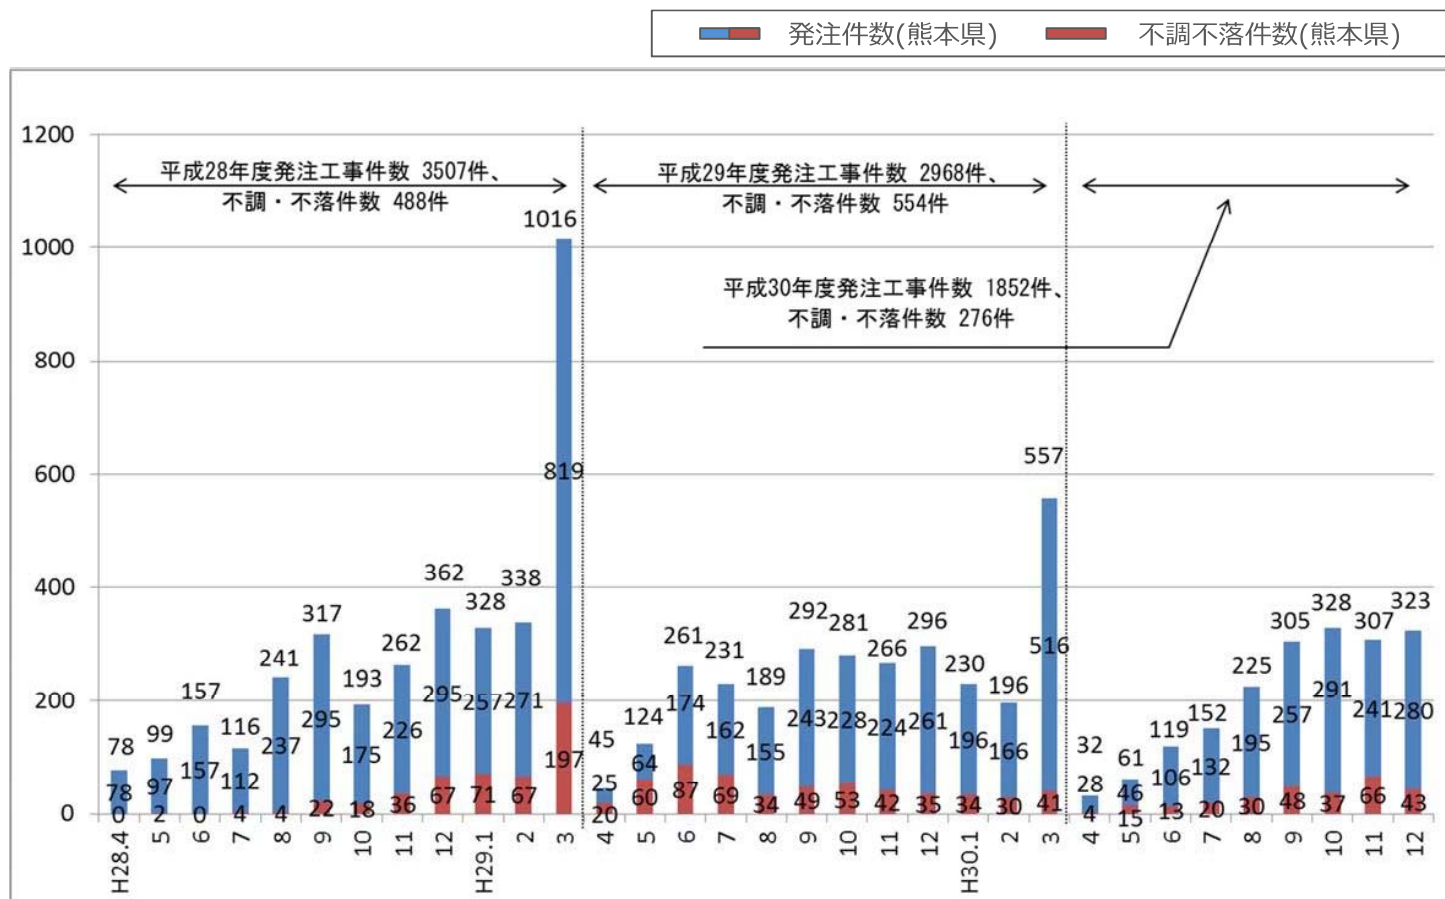

※熊本県が集計したものを国土交通省で整理


熊本県内における平成28、29、30年度の発注工事件数

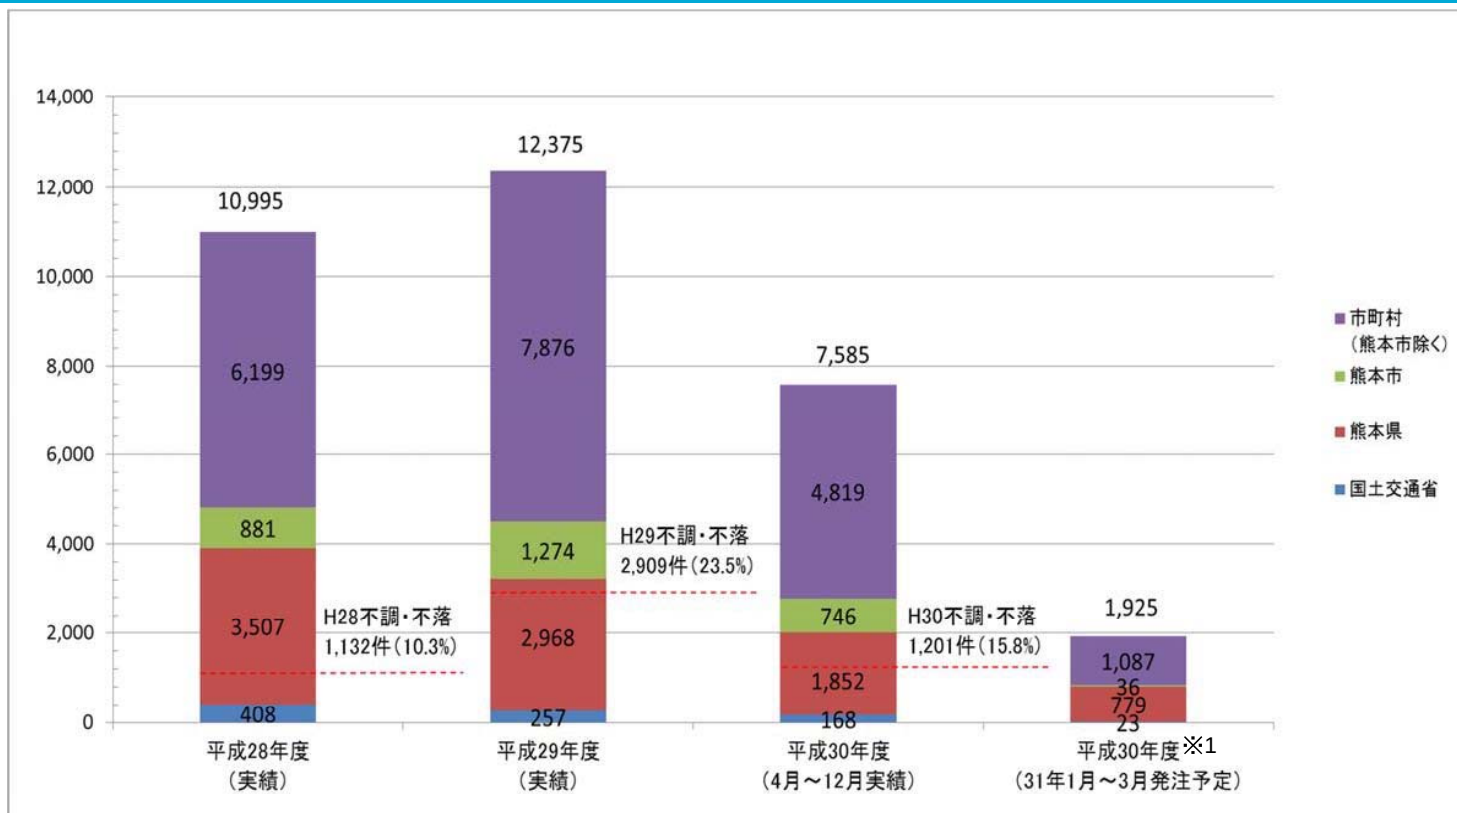

※1 平成30年度の31年1月～3月発注予定の件数については、1月時点で公表している発注見通しの件数であるため、実際の件数は変更となる場合があります。

その他に、農林水産省九州農政局、農林水産省林野庁九州森林管理局、防衛省九州防衛局、西日本高速道路(株)、(独)都市再生機構九州支社において、平成30年度の31年1月～3月に18件の発注が予定されています。

熊本県内における平成28、29、30年度発注工事の不調・不落件数

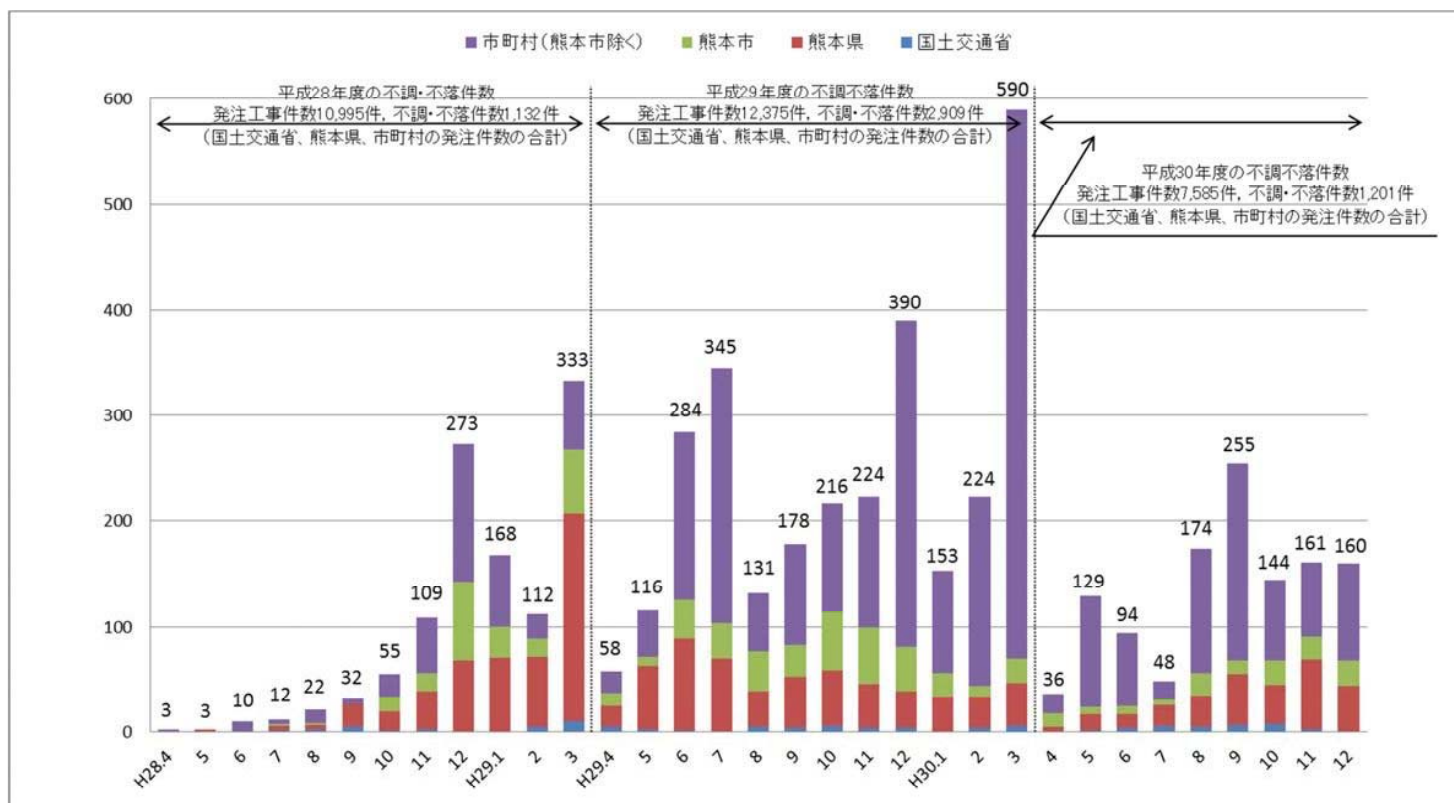

熊本県内国土交通省直轄工事における現場稼働状況

○熊本県内の国土交通省直轄工事における現場の稼働状況については、平成28年度末から引き続きピークを継続し続けるものの、年度末にかけて少なくなっていく傾向にある。



※発注予定工事(平成31年1月時点発注予定)は、「発注情報の一元化」資料の入札予定時期(第4四半期)を2月に契約したとして稼働状況を算出。

不調・不落の状況について

九州農政局

九州農政局では、平成30年度、熊本県下における継続事業(4地区)で、12月末までに14件の工事の入札を行い、不調・不落が4件発生している。

不調・不落が発生した工事については、工事内容や入札参加条件等を見直し再入札、別途工事による施工等により対応。

熊本県下における入札不調・不落の発生件数等

(単位:件)

施工地域	平成29年度	平成30年度(平成30年12月末時点)			計
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	
玉名	0	0	0	0	0
阿蘇	0	0	0	0	0
熊本	1	0	0	0	0
八代	1	0	0	1	1
球磨	1	1	2	0	3
計	3	1	2	1	4

不調・不落の状況について

九州森林管理局


○今年度、治山・林道工事において6件の不調・不落工事が発生(平成31年1月末現在)。

局 署	工 種	件 数	区 分				契約済	今後発注予定	繰越発注
			入札者なし	1者入札	失格	予定価格超過			
局 (熊本県内)	土木(治山)	1	0	-	0	1	8	0	0
	土木(林道)	0	0	-	0	0	0	0	0
熊本	土木(治山)	1	1	-	0	0	5	0	0
	土木(林道)	3	3	-	0	0	4	0	1
熊本南部署	土木(治山)	1	1	-	0	0	4	0	0
	土木(林道)	0	0	-	0	0	5	0	6
計	土木(治山)	3	2	-	0	1	17	0	0
	土木(林道)	3	3	-	0	0	9	0	7
計		6	5	-	0	1	26	0	7

平成28年度以降の県工事における不調不落の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
入札件数	78	99	157	116	241	317	193	262	362	328	338	1,016	45	124	261	231	189	292	281	266	296	230	196	557	32	61	119	152	225	305	328	307	323
発生率	0.0%	2.0%	0.0%	3.4%	1.7%	6.9%	9.3%	13.7%	18.5%	21.6%	19.8%	19.4%	44.4%	48.4%	33.3%	29.9%	18.0%	16.8%	18.9%	15.8%	11.8%	14.8%	15.3%	7.4%	12.5%	24.6%	10.9%	13.2%	13.3%	15.7%	11.3%	21.5%	13.3%
不調件数	0	2	0	4	4	4	22	18	36	67	71	67	20	60	87	69	34	49	53	42	35	34	30	41	4	15	13	20	30	48	37	66	43

震災発生後の発注と不調発生状況

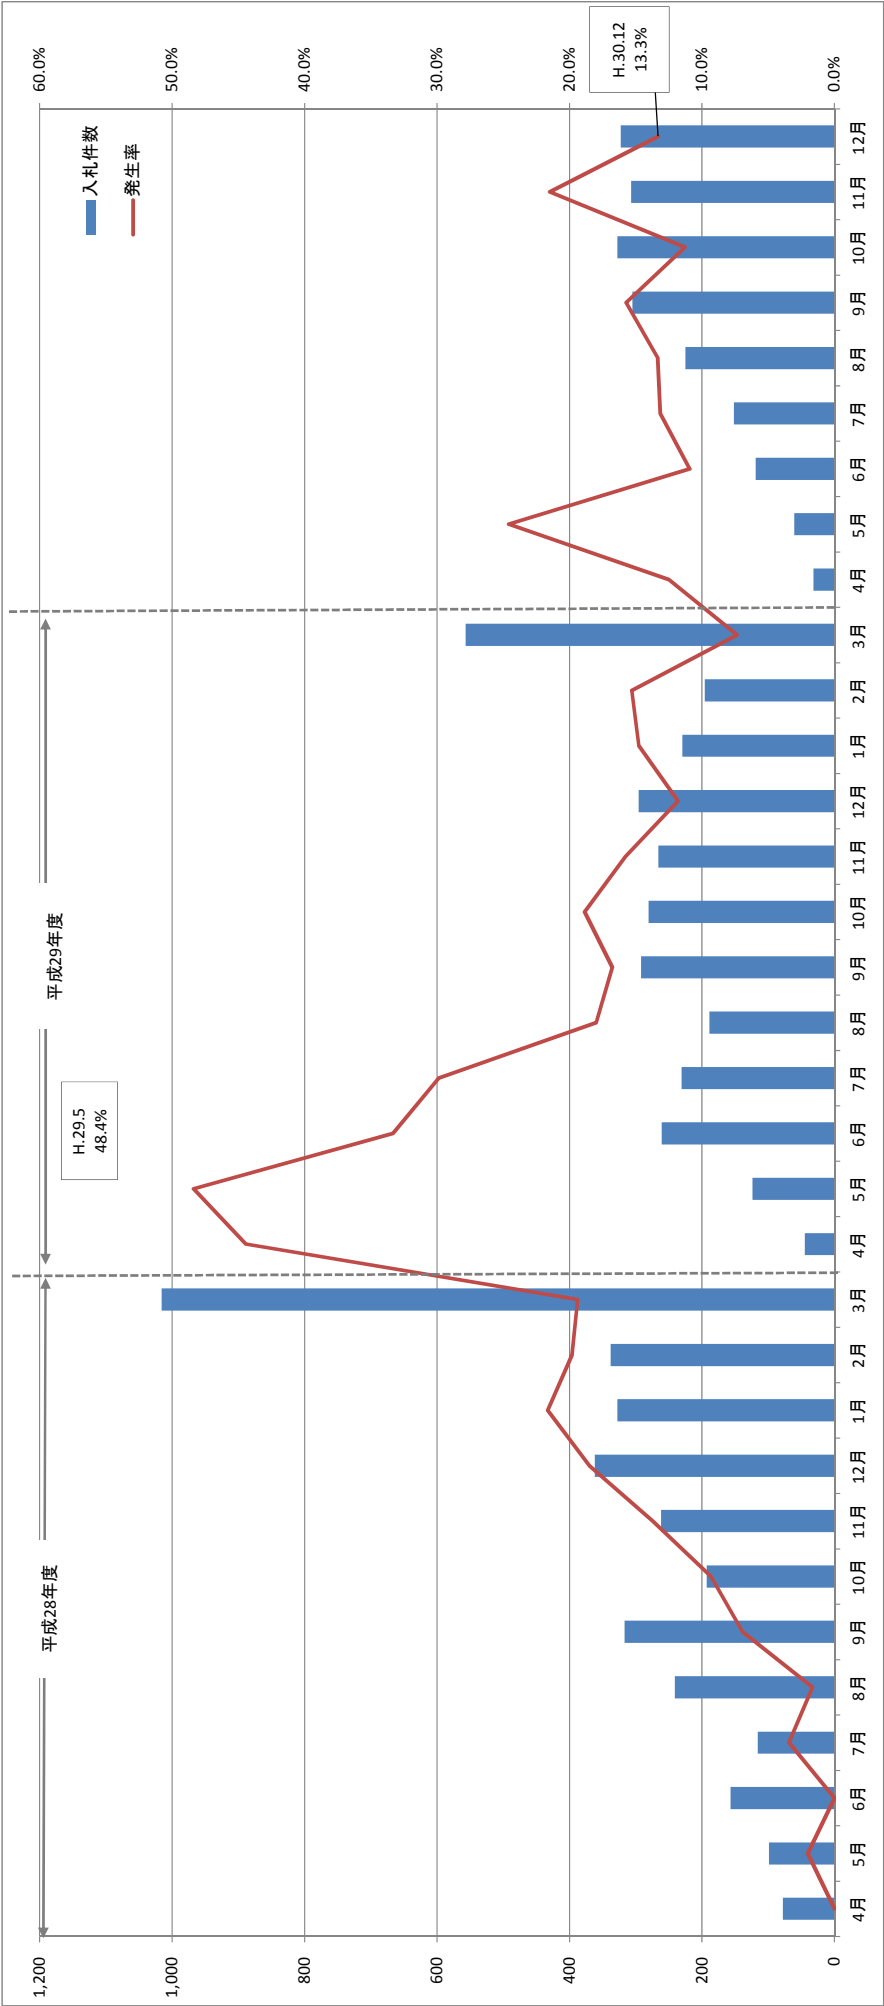

平成30年度県工事における不調不落状況一覧(農林水産部、土木部)

平成30年12月末現在

(1)年度別件数

年度	入札件数	不調件数		不落件数		合計	(発生率)
		入札者なし	1者入札	失格	内訳書不備等		
平成28年度	3,507	372	106	6	4	488	13.92%
平成29年度	2,968	437	98	8	11	554	18.67%
平成30年度	1,852	208	64	4	0	276	14.90%

(2)発注機関別件数

年度・月	本庁	熊農	熊土・駅周	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合計
H28	75	14	131	19	125	8	6	3	76	14	2	12	3	488
H29	81	16	119	48	64	5	16	2	146	21	2	8	26	554
H30	46	28	29	43	45	3	6	8	34	18	1	3	12	276
H.30年度入札件数	226	47	143	141	146	134	97	88	247	143	103	159	178	1852
(%)	20.4	59.6	20.3	30.5	30.8	2.2	6.2	9.1	13.8	12.6	1.0	1.9	6.7	14.90

(3)月別件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入札件数(A)	32	61	119	152	225	305	328	307	323				1,852
(うち震災関係)	13	22	41	30	45	51	42	70	41				(355)
不調不落件数(B)	4	15	13	20	30	48	37	66	43				276
(うち 1者入札)	3	2	3	2	7	11	13	13	10				(64)
(うち震災関係)	0	3	5	8	12	12	7	20	6				(73)
発生率(%)	12.5	24.6	10.9	13.2	13.3	15.7	11.3	21.5	13.3	0.0	0.0	0.0	14.90

(4)発注業種別件数

業種	件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	(発生率)
土木	不調・不落	2	14	10	13	22	46	23	50	30				210	22.9%
	入札件数	20	44	64	67	106	169	133	156	157				916	
建築	不調・不落	0	0	2	3	3	0	5	6	1				20	29.9%
	入札件数	0	2	7	9	10	9	17	9	4				67	
舗装	不調・不落	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0.0%
	入札件数	0	1	15	20	44	57	82	46	37				302	
電気	不調・不落	0	1	0	0	0	0	1	1	3				6	11.1%
	入札件数	1	4	0	7	5	8	10	10	9				54	
管	不調・不落	1	0	1	2	1	0	4	2	1				12	27.3%
	入札件数	1	3	4	7	3	8	4	12	2				44	
その他	不調・不落	1	0	0	2	4	2	4	7	8				28	6.0%
	入札件数	10	7	29	42	57	54	82	74	114				469	

平成30年度県内市町村工事における不調不落状況一覧

平成30年12月末現在

(1) 年度別件数

年度	入札件数	不調件数 (入札者なし・一者入札等)	不落件数 (失格・内訳書不備等)	合計	(発生率)
平成28年度	7,080	612		612	8.6%
平成29年度	9,150	2,281	30	2,311	25.3%
平成30年度	5,565	859	29	888	16.0%

(2) 広域本部(地域振興局)管内別件数

年度	県央	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合計
H28	218	79	64	9	15	41	55	23	0	28	80	612
H29	364	153	1,398	3	26	42	206	24	0	18	77	2,311
H30	136	79	488	4	13	39	41	17	0	13	58	888
H30入札件数	746	441	1,146	336	442	221	487	352	266	432	696	5,565
H30入札不調不落発生率(%)	18.2	17.9	42.6	1.2	2.9	17.6	8.4	4.8	0.0	3.0	8.3	16.0

(3) 平成30年度月別不調・不落件数の推移

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入札件数	261	675	563	530	637	628	785	657	829				5,565
不調不落件数合計	31	112	77	22	139	200	99	92	116				888
不調不落等発生率	11.9	16.6	13.7	4.2	21.8	31.8	12.6	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	16.0%

(4) 平成30年度発注業種別不調不落の件数

業種	件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	(発生率)
土木	不調・不落件数	19	102	67	9	111	181	77	63	88				717	23.2%
	入札件数	156	431	282	240	335	399	437	329	484				3,093	
建築	不調・不落件数	3	4	5	6	8	8	9	14	7				64	13.0%
	入札件数	29	53	53	65	70	33	65	69	56				493	
舗装	不調・不落件数	0	1	0	1	0	1	1	0	4				8	1.7%
	入札件数	13	53	60	50	59	46	71	57	57				466	
電気	不調・不落件数	1	0	1	0	0	0	1	2	3				8	3.3%
	入札件数	4	22	41	31	18	22	40	31	32				241	
管	不調・不落件数	7	4	2	0	10	3	3	8	4				41	11.3%
	入札件数	24	41	36	37	53	28	31	61	51				362	
その他	不調・不落件数	1	1	2	6	10	7	8	5	10				50	5.5%
	入札件数	35	75	91	107	102	100	141	110	149				910	

平成30年度県内市町村工事における月別不調・不落の状況

H30. 12月末現在

No.	地域	機関名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	総入札件数	不調率等
1	県央	熊本市	13	7	8	5	21	13	23	22	24				136	746	18.2
2	宇城	宇土市	2	1	0	3	9	2	13	5	7				42	139	30.2
3		宇城市	0	3	1	0	3	1	4	2	2				16	126	12.7
4		美里町	0	13	0	0	0	0	6	2	0				21	176	11.9
		管内計	2	17	1	3	12	3	23	9	9	0	0	0	79	441	17.9
5		荒尾市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1	61
6	玉名	玉名市	0	0	0	0	1	2	1	4	4				12	149	8.1
7		玉東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	41	0.0
8		和水町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	114	0.0
9		南関町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	48	0.0
10		長洲町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	29	0.0
	管内計	0	0	0	0	1	2	1	4	5	0	0	0	13	442	2.9	
11	鹿本	山鹿市	1	0	0	1	0	1	2	5	29				39	221	17.6
12	菊池	菊池市	0	1	0	0	0	0	0	0	2				3	133	2.3
13		合志市	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	73	0.0
14		大津町	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1	48	2.1
15		菊陽町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	82	0.0
		管内計	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	336	1.2
16	阿蘇	阿蘇市	5	1	0	0	1	1	1	0	3				12	121	9.9
17		南小国町	0	0	0	5	0	0	0	7	6				18	88	20.5
18		小国町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	27	0.0
19		産山村	0	0	0	0	3	0	0	0	0				3	54	5.6
20		高森町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	11	0.0
21		南阿蘇村	0	1	0	2	0	1	1	3	0				8	130	6.2
22		西原村	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	56	0.0
		管内計	5	2	0	7	4	2	2	10	9	0	0	0	41	487	8.4
23	上益城	御船町	0	0	6	0	0	0	0	0	1				7	197	3.6
24		嘉島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	31	0.0
25		益城町	0	0	1	3	1	5	0	5	2				17	108	15.7
26		甲佐町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	65	0.0
27		山都町	2	81	56	0	97	168	36	20	4				464	745	62.3
		管内計	2	81	63	3	98	173	36	25	7	0	0	0	488	1,146	42.6
28	八代	八代市	0	1	1	1	1	2	4	6	1				17	300	5.7
29		氷川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	52	0.0
		管内計	0	1	1	1	1	2	4	6	1	0	0	0	17	352	4.8
30	芦北	水俣市	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	93	0.0
31		芦北町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	126	0.0
32		津奈木町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	47	0.0
		管内計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0.0
33	球磨	人吉市	0	0	0	0	0	0	1	3	2				6	104	5.8
34		錦町	0	0	0	0	0	0	0	1	0				1	29	3.4
35		あさぎり町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	93	0.0
36		多良木町	0	0	0	0	0	0	2	1	2				5	40	12.5
37		湯前町	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	20	0.0
38		水上村	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	43	0.0
39		相良村	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	14	0.0
40		五木村	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	26	0.0
41		山江村	1	0	0	0	0	0	0	0	0				1	16	6.3
42		球磨村	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	47	0.0
	管内計	1	0	0	0	0	0	0	3	5	4	0	0	0	13	432	3.0
43	天草	天草市	1	2	4	0	0	1	4	3	22				37	575	6.4
44		上天草市	6	1	0	2	2	3	1	2	3				20	98	20.4
45		苓北町	0	0	0	0	0	0	0	1	0				1	23	4.3
		管内計	7	3	4	2	2	4	5	6	25	0	0	0	58	696	8.3
計			31	112	77	22	139	200	99	92	116	0	0	0	888	5,565	16.0

【議題 3】

「復旧・復興工事及び通常工事に関する今後の発注計画等について」

①国土交通省九州地方整備局

②農林水産省九州農政局・九州森林管理局

③熊本県・市町村

九州地方整備局の発注見通し(平成31年1月時点)

■発注事務所別

発注事務所 工事種別 工事規模	平成30年度／ 平成31年度 (早期発注分)
熊本河川国道事務所	13
一般土木工事	2
6,000万円以上 1億円未満	1
2億円以上 3億円未満	1
造園工事	6
3,000万円以上 6,000万円未満	6
維持修繕工事	5
3,000万円以上 6,000万円未満	2
1億円以上 2億円未満	1
2億円以上 3億円未満	2
八代河川国道事務所	2
維持修繕工事	2
6,000万円以上 1億円未満	2
川辺川ダム砂防事務所	1
維持修繕工事	1
1億円以上 2億円未満	1
菊池川河川事務所	1
維持修繕工事	1
6,000万円以上 1億円未満	1
立野ダム工事事務所	3
一般土木工事	3
2億円以上 3億円未満	3
緑川ダム管理所	1
維持修繕工事	1
6,000万円以上 1億円未満	1
筑後川ダム統合管理事務所	1
維持修繕工事	1
6,000万円以上 1億円未満	1
営繕部・熊本営繕事務所	1
建築工事	1
3,000万円以上 6,000万円未満	1
総計	23

※九州地方整備局における 平成30年度及び平成31年度(早期発注分)の発注見通しについて、下記公表資料を基にとりまとめたものである。

- ・平成30年度 発注見通し公表(1月時点)(H31.1.7発表)
- ・平成31年度(早期発注分) 発注見通し公表(1月時点)(H31.1.7発表)

※発注予定であるため、実際に発注する工事が、上表の内容と異なる場合、または、記載の無い工事が発注される場合がある。

※工事規模は、別表の区分によるものとし、発注予定が無い区分については表示していない。

(別表)

一般土木工事及び建築工事等 (右側に掲げる工事を除く工事)	アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、 電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事
3,000万円未満	3,000万円未満
3,000万円以上 6,000万円未満	3,000万円以上 5,000万円未満
6,000万円以上 1億円未満	5,000万円以上 8,000万円未満
1億円以上 2億円未満	8,000万円以上 1億2,000万円未満
2億円以上 3億円未満	1億2,000万円以上 2億円未満
3億円以上 7億4,000万円未満	2億円以上 3億円未満
7億4,000万円以上 15億円未満	3億円以上 7億4,000万円未満
15億円以上 30億円未満	7億4,000万円以上 10億円未満
30億円以上 50億円未満	10億円以上 20億円未満
50億円以上	20億円以上

■施工地域別

施工地域 工事種別 工事規模	平成30年度／ 平成31年度 (早期発注分)
熊本	5
造園工事	3
3,000万円以上 6,000万円未満	3
維持修繕工事	2
3,000万円以上 6,000万円未満	1
1億円以上 2億円未満	1
宇城	2
一般土木工事	1
2億円以上 3億円未満	1
維持修繕工事	1
6,000万円以上 1億円未満	1
上益城	1
一般土木工事	1
6,000万円以上 1億円未満	1
菊池	4
一般土木工事	1
2億円以上 3億円未満	1
造園工事	1
3,000万円以上 6,000万円未満	1
維持修繕工事	2
6,000万円以上 1億円未満	1
2億円以上 3億円未満	1
阿蘇	5
一般土木工事	2
2億円以上 3億円未満	2
造園工事	1
3,000万円以上 6,000万円未満	1
建築工事	1
3,000万円以上 6,000万円未満	1
維持修繕工事	1
6,000万円以上 1億円未満	1
八代	4
造園工事	1
3,000万円以上 6,000万円未満	1
維持修繕工事	3
3,000万円以上 6,000万円未満	1
6,000万円以上 1億円未満	1
2億円以上 3億円未満	1
球磨	2
維持修繕工事	2
6,000万円以上 1億円未満	1
1億円以上 2億円未満	1
総計	23

平成30年度第4 四半期 発注見通し【対象工事は、平成30年度に発注する工事及び発注手続きを開始する工事です。】

A欄	B欄	C欄	D欄	E欄	F欄	G欄	H欄	I欄	J欄	K欄	L欄
発注機関	担当部署	施工区	施工地域	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び発注の方法	入札予定時期	工費 備考
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	施工地域 上益城	九州横断道（嘉島～山郷）西原地区改良9期工事	上益城郡山郷町	約8ヶ月	一般土木工事	掘削13.860m3 盛土14,700m3	一般競争	第4四半期	6,000万円以上 1億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	阿蘇	平成31年度 阿蘇管内道路植栽維持工事	阿蘇市 ～ 菊池郡菊陽町	約12ヶ月	造園工事	道路維持（植栽維持工外） 1式、道路修繕（伐採工外） 1式	一般競争	第4四半期	3,000万円以上 6,000万円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本	平成31年度 熊本管内道路植栽維持工事	熊本市北区 ～ 宇城市	約12ヶ月	造園工事	道路維持（植栽維持工外） 1式、道路修繕（伐採工外） 1式	一般競争	第4四半期	3,000万円以上 6,000万円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本	平成31年度 熊本東B P 龍田地区道路植栽維持工事	熊本市北区 ～ 熊本市東区	約12ヶ月	造園工事	道路維持（植栽維持工外） 1式、道路修繕（伐採工外） 1式	一般競争	第4四半期	3,000万円以上 6,000万円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本	平成31年度 熊本東B P 保田地区道路植栽維持工事	熊本市東区 ～ 熊本市南区	約12ヶ月	造園工事	道路維持（植栽維持工外） 1式、道路修繕（伐採工外） 1式	一般競争	第4四半期	3,000万円以上 6,000万円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	八代	平成31年度 八代管内道路植栽維持工事	八代郡永川町 ～ 水俣市	約12ヶ月	造園工事	道路維持（植栽維持工外） 1式、道路修繕（伐採工外） 1式	一般競争	第4四半期	3,000万円以上 6,000万円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	菊池	平成31年度 山鹿管内及び熊本北B P 道路植栽維持工事	鹿尾市 ～ 熊本市北区	約12ヶ月	造園工事	道路維持（植栽維持工外） 1式、道路修繕（伐採工外） 1式	一般競争	第4四半期	3,000万円以上 6,000万円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	八代	平成31・32年度 八代管内道路植栽維持修繕工事	八代郡永川町 ～ 水俣市	約24ヶ月	維持修繕工事	道路維持工 1式、道路修繕工 1式	一般競争	第4四半期	2億円以上 3億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	菊池	平成31・32年度 山鹿管内道路植栽維持修繕工事	鹿尾市 ～ 熊本市北区	約24ヶ月	維持修繕工事	道路維持工 1式、道路修繕工 1式	一般競争	第4四半期	2億円以上 3億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本	平成31・32年度 熊本管内道路植栽維持修繕工事	阿蘇市 ～ 水俣市	約24ヶ月	維持修繕工事	道路維持（道路清掃工外） 1式	一般競争	第4四半期	1億円以上 2億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	宇城	平成31年度 宇城地区1工区改良工事	宇土市 ～ 宇土市	約9ヶ月	一般土木工事	応力灌漑工（仮設）1式、灌漑施設取壊1式	一般競争	第4四半期	2億円以上 3億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	八代	平成31年度熊本南部地区道路照明灯維持補修工事	八代郡永川町 ～ 水俣市	約12ヶ月	維持修繕工事	道路照明灯維持補修工 1式 （対急設備数）道路照明灯約6000灯、トンネル照明灯約3,900灯	一般競争	第4四半期	3,000万円以上 6,000万円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本河川国道事務所	熊本県	熊本	平成31年度熊本北地区道路照明灯設置取替工事	山鹿市 ～ 阿蘇市	約12ヶ月	維持修繕工事	道路照明灯維持補修工 1式 （対急設備数）道路照明灯約2,8000灯、トンネル照明灯約140灯	一般競争	第4四半期	3,000万円以上 6,000万円未満
11国土交通省 九州地方整備局	八代河川国道事務所	熊本県	八代	H31八代地区河川維持管理工事	八代市 ～ 熊本北郡芦北町	約12ヶ月	維持修繕工事	堤防除雪工1式、清掃工1式、法覆護岸工1式、付属物設置工1式、応急処理工1式	一般競争	第4四半期	6,000万円以上 1億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	八代河川国道事務所	熊本県	球磨	H31人吉球磨地区河川維持管理工事	球磨郡球磨村 ～ 球磨郡水上村	約12ヶ月	維持修繕工事	堤防除雪工1式、清掃工1式、法覆護岸工1式、付属物設置工1式、応急処理工1式	一般競争	第4四半期	6,000万円以上 1億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	川辺川ダム砂防事務所	熊本県	球磨	平成31年度 川辺川管内維持（その1）工事	球磨郡五木村 ～ 球磨郡五木村	約9ヶ月	維持修繕工事	落石防止補工 約80m、応急処理工 1式	一般競争	第4四半期	1億円以上 2億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	菊池川河川事務所	熊本県	菊池	平成31年度電門ダム管内維持管理工事	菊池市 ～ 菊池市	約12ヶ月	維持修繕工事	除雪工1式、清掃工1式、植栽維持工1式、施設管理工1式、塵芥処理工1式	一般競争	第4四半期	6,000万円以上 1億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	立野ダム工事事務所	熊本県	阿蘇	沢津野土場整備その他工事	阿蘇郡南阿蘇村 ～ 菊池郡大津町	約9ヶ月	一般土木工事	盛土工1式、法面工1式、排水溝修理工1式、鋪設工1式、道路付属施設工1式、応急処理工1式、道路清掃工1式、除草工1式、仮設工1式	一般競争	第4四半期	2億円以上 3億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	立野ダム工事事務所	熊本県	阿蘇	立野ダム左岸沢部その他工事	阿蘇郡南阿蘇村 ～ 菊池郡大津町	約8ヶ月	一般土木工事	河川土工1式、法覆護岸工1式、法面工1式、応急処理工1式、仮設工1式	一般競争	第4四半期	2億円以上 3億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	立野ダム工事事務所	熊本県	菊池	立野ダム左岸上流部対策（下設部）工事	菊池郡大津町 ～ 菊池郡大津町	約10ヶ月	一般土木工事	掘削 V=57,000m3、植生基付吹付 A=3,300m2	一般競争	第4四半期	2億円以上 3億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	緑川ダム管理所	熊本県	宇城	平成31年度 緑川ダム塵芥処理及び周辺維持工事	下益城郡美里町 ～ 上益城郡山郷町	約12ヶ月	維持修繕工事	塵芥処理 V=2,000～3,000m3、除草 A=65,000m2、植生基付期間設定工事（平成31年4月着手予定）	一般競争	第4四半期	6,000万円以上 1億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	筑後川ダム統合管理事務所	大分県	日田	平成31年度 松原・下釜ダム管内維持修繕工事	日田市 ～ 阿蘇郡小国町	約12ヶ月	維持修繕工事	樹林帯維持工1式、塵芥処理工1式、河川維持工1式	一般競争	第4四半期	6,000万円以上 1億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本宮崎事務所	熊本県	阿蘇	阿蘇労働組合庁舎（平成30）建築改修その他工事	阿蘇市	約5ヶ月	建築工事	・外壁、屋外防水改修等工事。	随意契約	第4四半期	3,000万円以上 6,000万円未満

＜留意事項＞

- 平成30年度（平成31年1月4日時点）における工事の発注見通しを公表します。
- 各機関の公表要領等に引続き公表の回数及び時期の定めがあり、公表時点（H31.1.4時点）における発注情報をお示しできない場合は、公表時点における直近のものを発注情報として掲載しております。
- 発注見通しは発注時点における今後の予定であり、実際に発注される工事内容等がこの見通しと異なる場合があります。
- また、工事概要に関する事項は公表時点の予定であり、公表後変更されることがあります。
- 工事に関する問い合わせは、各発注機関の担当部署へお願いします。

平成31年1月29日

九州ブロック発注者協議会

九州ブロックにおける240機関、約10,000件の発注情報を一元化

～ 平成31年1月時点の発注見通しを一元化し、公表します ～

- ◆各発注機関の発注見通しを一元化することで発注情報の閲覧・検索をスムーズに行えるようになりました。
- ◆この取り組みにより、建設業者による技術者や技能者の計画的な配置や資機材の円滑な調達に役立つことが期待されます。

<概要>

- 九州ブロック（7県）を各振興局若しくは土木事務所単位（福岡県、大分県除く）で66地域に区分（福岡県：4地域、佐賀県：5地域、長崎県：10地域、熊本県：11地域、大分県：18地域、宮崎県：11地域、鹿児島県：7地域）しており、地域毎の発注情報を把握することができます。
- 今回、とりまとめた機関は、国19機関（発注無し7機関含む）、独立行政法人等6機関（発注無し2機関含む）及び地方公共団体215機関（発注無し11機関含む）の合計240機関（参画率91%）であり、発注情報の件数は全体で9,668件となっております（平成30年度発注分）。
- 一元化された情報は一覧表としてとりまとめており、フィルタ機能を活用することで、必要な工事情報を検索することができます。
- 原則として毎年度4回の公表を行います。

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 企画部 技術管理課長 徳田 浩一郎 内線 3311
課長補佐 次郎丸 敬太 内線 3313
代表：092-471-6331
直通：092-476-3546

発注情報の一元化について

○公表は九州地方整備局のホームページに記載
九州地方整備局HPアドレス：<http://www.qsr.mlit.go.jp/>

○公表は九州地方整備局のホームページに記載
九州地方整備局HPアドレス：<http://www.qsr.mlit.go.jp/>

[illegible]

平成30年度の工事発注計画について

九州農政局

九州農政局では、平成30年度に熊本県下における継続事業(4地区)で、14件の工事を実施する計画であり、平成30年12月までに、10件の工事については契約を完了、今後4件の工事を発注する予定。

(H30.12月末時点)

No	担当事業所	施工地域	工事の名称	契約予定時期	工事種別	入札方法	備考
1	大野川上流農業水利事業所	阿蘇	大蘇ダム地下水位観測機器交換工事	第1四半期	電気通信設備	一般競争	3千万円未満 契約済み
2	川辺川農業水利事業所	球磨	東幹線水路(岩川内工区)処理工事	第2四半期	土木工事	一般競争	6千万円～9千万円未満 契約済み
3	川辺川農業水利事業所	球磨	造成団地整備工事	第2四半期	土木工事	一般競争	3千万円未満 契約済み
4	玉名横島海岸保全事業所	玉名	堤防裏法面被覆工(菊池工区1-2)その他工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円～1.2億円未満 契約済み
5	玉名横島海岸保全事業所	玉名	堤防裏法面被覆工(菊池工区1-3)その他工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円～1.2億円未満 契約済み
6	玉名横島海岸保全事業所	玉名	堤防裏法面被覆工(菊池工区2-1)その他工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円～1.2億円未満 契約済み
7	玉名横島海岸保全事業所	玉名	資材置場整備他工事	第1四半期	土木工事	一般競争	3千万円未満 契約済み
8	玉名横島海岸保全事業所	玉名	堤防補強盛土(菊池工区2-2)その他工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円～1.2億円未満 契約済み
9	玉名横島海岸保全事業所	玉名	堤防補強1次盛土(横島漁港工区)その他工事	第1四半期	土木工事	一般競争	6千万円～9千万円未満 契約済み
10	玉名横島海岸保全事業所	玉名	堤防補強1次盛土(第二工区1)その他工事	第2四半期	土木工事	一般競争	6千万円～9千万円未満 契約済み
11	玉名横島海岸保全事業所	玉名	堤防裏法面被覆工(第二工区1-3)工事	第4四半期	土木工事	一般競争	1.2億円～2.3億円未満
12	玉名横島海岸保全事業所	玉名	大開排水樋門改修その他工事	第4四半期	土木工事	一般競争	1.2億円～2.3億円未満
13	玉名横島海岸保全事業所	玉名	堤防補強(その1)工事	第4四半期	土木工事	一般競争	9千万円～1.2億円未満
14	玉名横島海岸保全事業所	玉名	堤防補強(その2)工事	第4四半期	土木工事	一般競争	6千万円～9千万円未満

※上記の工事には、不調・不落となった4件の工事は含まない。

復旧・復興工事及び通常工事に関する今後の発注計画

九州森林管理局

○平成30年度第4四半期には、2件の工事を発注予定。



発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の期間	工事種別	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
九州森林管理局	熊本森林管理署	熊本県	天草	福連木321-1林道新設工事	約7ヶ月	林道工事	一般競争入札（総合評価落札方式）	第4四半期	
九州森林管理局	熊本南部森林管理署	熊本県	芦北	上山1421林道新設工事	約6ヶ月	林道工事	一般競争入札（総合評価落札方式）	第4四半期	契約済み

復旧・復興工事及び通常工事に関する今後の発注計画等

県工事(土木部・農林水産部)のブロック別発注予定

ブロック	平成30年度									
	平成29年度契約済		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
県央	772	40,441	42	3,988	138	8,482	195	8,152	212	9,057
県北	833	48,554	64	4,093	219	7,940	222	6,245	234	12,468
県南	572	17,487	37	1,554	165	5,646	153	5,669	232	6,438
天草	279	7,255	23	519	85	2,195	81	1,746	101	3,068
合計	2,456	113,737	166	10,154	607	24,263	651	21,812	779	31,031
比率			7.5%	11.6%	27.6%	27.8%	29.6%	25.0%	35.4%	35.6%

単位：件、百万円

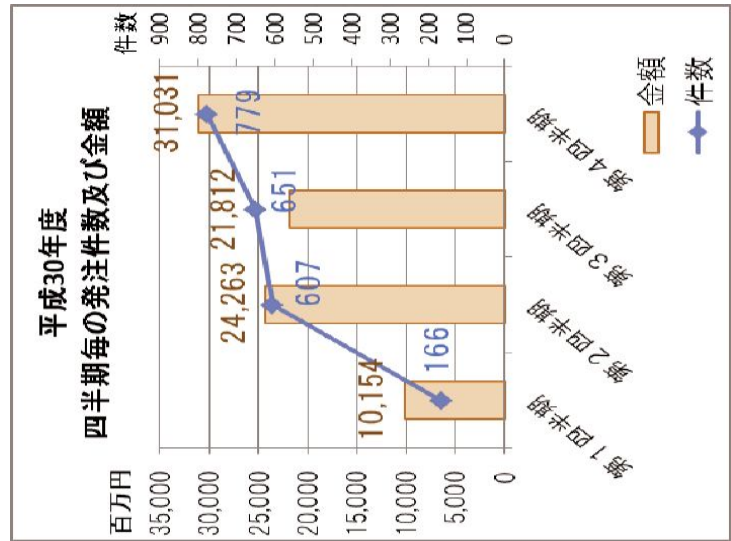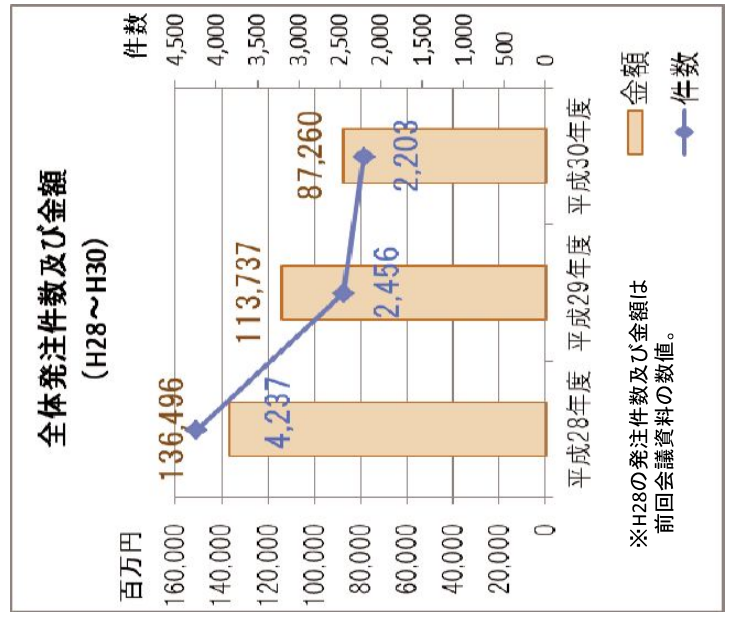

※地域ブロックは県の広域本部管轄区分

- 県央：熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町
- 県北：荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、芦北町、高森町、西原村、南阿蘇村
- 県南：八代市、人吉市、水俣市、氷川町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町
- 天草：上天草市、天草市、苓北町

※件数、金額及び時期については現段階の予定であり、今後変更の可能性有り。
※平成29年度は平成28年度未契約繰越を含む。
※平成30年度は平成29年度未契約繰越を含む。
※H30の件数・金額はH31に繰り越す可能性がある。
※発注見通しが不確定な案件については含まれていない。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】 県全体
(土木部・農林水産部)

(表一 1)

発注価格帯別			平成30年度													
			平成29年度契約済			第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計		
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A 1	3億円以上	(32)	14, 979		(0)	0	(4)	1, 313	(0)	0	(4)	2, 554	(8)	3, 867	
	A 1	7, 000万円以上3億円未満	(160)	23, 444		(18)	2, 099	(47)	5, 790	(15)	1, 667	(63)	7, 730	(143)	17, 286	
	A 2	1, 500万円以上7, 000万円未満	(634)	25, 851		(56)	2, 197	(176)	5, 826	(177)	5, 982	(222)	8, 535	(631)	22, 540	
	B、C	1, 500万円未満	(409)	3, 886		(31)	187	(64)	486	(104)	774	(136)	995	(335)	2, 442	
	小計		(1, 235)	68, 159		(105)	4, 483	(291)	13, 415	(296)	8, 423	(425)	19, 814	(1, 117)	46, 135	
建築一式	A 1	1億3, 200万円以上	(18)	6, 727		(2)	2, 454	(2)	1, 620	(4)	1, 142	(2)	729	(10)	5, 945	
	A 2	5, 500万円以上1億3, 200万円未満	(25)	2, 227		(1)	68	(9)	848	(8)	807	(3)	300	(21)	2, 023	
	B	2, 750万円以上5, 500万円未満	(0)	0		(5)	233	(5)	231	(3)	132	(7)	273	(20)	869	
	C	1, 100万円以上2, 750万円未満	(10)	166		(1)	12	(2)	34	(3)	54	(4)	88	(10)	188	
	D	1, 100万円未満	(4)	31		(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	
舗装	小計		(57)	9, 151		(9)	2, 767	(18)	2, 733	(18)	2, 135	(16)	1, 390	(61)	9, 025	
	A	1, 100万円以上	(331)	8, 226		(14)	276	(113)	2, 570	(92)	1, 975	(104)	2, 372	(323)	7, 193	
	B	330万円以上1, 100万円未満	(107)	932		(2)	14	(34)	271	(24)	203	(18)	133	(78)	621	
	C	330万円未満	(6)	12		(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	3	(1)	3	
法面	小計		(444)	9, 170		(16)	290	(147)	2, 841	(116)	2, 178	(123)	2, 508	(402)	7, 817	
			(187)	11, 972		(14)	1, 300	(45)	2, 073	(41)	1, 634	(52)	3, 057	(152)	8, 064	
	橋梁補修		(82)	1, 413		(1)	15	(14)	329	(12)	207	(20)	271	(47)	822	
	安全施設		(64)	683		(2)	13	(4)	28	(17)	155	(12)	181	(35)	377	
鋼構造物			(38)	1, 646		(2)	19	(12)	538	(19)	1, 848	(7)	160	(40)	2, 565	
	電気		(60)	2, 892		(6)	461	(16)	777	(21)	631	(21)	841	(64)	2, 710	
	管		(31)	1, 881		(5)	579	(11)	725	(11)	543	(12)	280	(39)	2, 127	
	その他		(258)	6, 768		(6)	227	(49)	804	(100)	4, 058	(91)	2, 529	(246)	7, 618	
合計			(2, 456)	113, 737		(166)	10, 154	(607)	24, 263	(651)	21, 812	(779)	31, 031	(2, 203)	87, 260	

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に関わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】 熊本
(土木部・農林水産部)

(表一 1)

発注価格帯別		平成29年度契約済		平成30年度											
				第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
				件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	ランク等	左記ランク発注価格帯区分													
	A 1	3億円以上	(2)	688		(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	1,237	(1)	1,237
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(31)	4,427		(1)	108	(4)	311	(3)	290	(8)	807	(16)	1,516
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(45)	2,053		(0)	0	(10)	422	(12)	595	(20)	867	(42)	1,884
	B、C	1,500万円未満	(39)	522		(12)	43	(5)	35	(3)	33	(10)	94	(30)	205
建築一式	小計		(117)	7,690		(13)	151	(19)	768	(18)	918	(39)	3,005	(89)	4,842
	A 1	1億3,200万円以上	(8)	3,811		(1)	2,001	(1)	1,300	(1)	329	(1)	329	(4)	3,959
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(12)	1,133		(0)	0	(3)	274	(1)	75	(1)	60	(5)	409
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0		(2)	103	(3)	143	(0)	0	(4)	142	(9)	388
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(1)	27		(0)	0	(0)	0	(0)	0	(2)	39	(2)	39
舗装	D	1,100万円未満	(0)	0		(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	小計		(21)	4,971		(3)	2,104	(7)	1,717	(2)	404	(8)	570	(20)	4,795
	A	1,100万円以上	(9)	298		(0)	0	(1)	28	(2)	53	(6)	115	(9)	196
	B	330万円以上1,100万円未満	(3)	27		(1)	10	(0)	0	(1)	10	(0)	0	(2)	20
	C	330万円未満	(0)	0		(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
法面	小計		(12)	324		(1)	10	(1)	28	(3)	63	(6)	115	(11)	216
			(4)	122		(0)	0	(1)	15	(2)	30	(2)	33	(5)	78
	橋梁補修		(0)	0		(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	安全施設		(1)	9		(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	鋼構造物		(3)	11		(0)	0	(1)	19	(1)	30	(2)	9	(4)	58
電気管	電気		(16)	1,494		(3)	399	(5)	430	(1)	100	(2)	57	(11)	986
	管		(8)	687		(2)	463	(3)	217	(5)	437	(2)	40	(12)	1,157
	その他		(52)	2,127		(1)	97	(11)	221	(22)	921	(10)	631	(44)	1,870
	合計		(234)	17,435		(23)	3,224	(48)	3,415	(54)	2,903	(71)	4,460	(196)	14,002

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に関わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】
宇城
(土木部・農林水産部)

(表一1)

発注価格帯別			平成29年度契約済				平成30年度							
			第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計			
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A 1	3億円以上	(1)	376	(0)	0	(1)	300	(0)	0	(0)	0	(1)	300
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(3)	335	(0)	0	(2)	141	(1)	160	(4)	453	(7)	754
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(64)	2,595	(4)	165	(8)	251	(12)	375	(19)	855	(43)	1,646
	B、C	1,500万円未満	(44)	388	(3)	24	(7)	38	(4)	27	(9)	85	(23)	174
	小計		(112)	3,694	(7)	189	(18)	730	(17)	562	(32)	1,393	(74)	2,874
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(2)	596	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(1)	73	(0)	0	(1)	70	(1)	128	(0)	0	(2)	198
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	53	(0)	0	(1)	53
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(2)	32	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	D	1,100万円未満	(1)	4	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
舗装	小計		(6)	705	(0)	0	(1)	70	(2)	181	(0)	0	(3)	251
	A	1,100万円以上	(32)	747	(0)	0	(4)	99	(8)	201	(5)	103	(17)	403
	B	330万円以上1,100万円未満	(7)	65	(0)	0	(1)	9	(0)	0	(0)	0	(1)	9
	C	330万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
法面	小計		(39)	812	(0)	0	(5)	108	(8)	201	(5)	103	(18)	412
			(22)	750	(2)	17	(1)	47	(2)	62	(3)	80	(8)	206
	橋梁補修		(3)	46	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(2)	59	(2)	59
	安全施設		(12)	135	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
鋼構造物			(4)	59	(0)	0	(1)	19	(1)	15	(1)	15	(3)	49
	電気		(6)	301	(2)	13	(0)	0	(4)	331	(2)	2	(8)	346
	管		(1)	161	(1)	40	(0)	0	(1)	32	(0)	0	(2)	72
	その他		(16)	545	(0)	0	(1)	15	(11)	978	(1)	10	(13)	1,003
合計			(221)	7,207	(12)	259	(27)	989	(46)	2,362	(46)	1,662	(131)	5,272

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に關わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】 上益城
(土木部・農林水産部)

(表一1)

発注価格帯別												
発注価格帯別			平成29年度契約済				平成30年度					
			第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A 1	3億円以上	(3)	1,044	(0)	0	(1)	312	(0)	0	(0)	312
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(22)	3,112	(2)	296	(12)	1,601	(2)	280	(5)	2,628
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(87)	3,927	(3)	108	(11)	389	(31)	1,173	(27)	2,660
	B、C	1,500万円未満	(39)	391	(0)	0	(1)	4	(16)	136	(8)	211
	小計		(151)	8,475	(5)	404	(25)	2,306	(49)	1,589	(40)	5,811
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(4)	1,073	(0)	0	(1)	320	(0)	0	(0)	320
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(2)	164	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(2)	101	(0)	0	(0)	0	(0)	101
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(1)	14	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	D	1,100万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
舗装	小計		(7)	1,250	(2)	101	(1)	320	(0)	0	(0)	421
	A	1,100万円以上	(52)	1,347	(0)	0	(15)	412	(12)	246	(25)	1,344
	B	330万円以上1,100万円未満	(12)	106	(0)	0	(5)	45	(6)	57	(5)	137
	C	330万円未満	(2)	5	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
法面	小計		(66)	1,457	(0)	0	(20)	457	(18)	303	(30)	1,481
			(33)	2,377	(0)	0	(10)	742	(9)	500	(10)	1,626
	橋梁補修		(13)	569	(0)	0	(2)	19	(3)	72	(2)	138
	安全施設		(10)	99	(0)	0	(0)	0	(2)	14	(2)	74
鋼構造物			(6)	983	(0)	0	(2)	61	(1)	101	(0)	162
	電気		(4)	142	(0)	0	(1)	60	(3)	69	(3)	164
	管		(3)	192	(0)	0	(1)	90	(0)	0	(0)	90
	その他		(24)	255	(0)	0	(1)	23	(10)	239	(8)	438
合計			(317)	15,799	(7)	505	(63)	4,078	(95)	2,887	(95)	10,405

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に関わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】
菊池
(土木部・農林水産部)

(表一1)

発注価格帯別			平成29年度契約済						平成30年度					
			第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計		金額	金額
			件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	金額	金額
土木一式	A 1	3億円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(15)	2,199	(6)	658	(0)	0	(3)	326	(10)	1,063	(10)	1,063
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(58)	1,812	(25)	758	(11)	275	(17)	694	(59)	1,908	(59)	1,908
	B、C	1,500万円未満	(24)	179	(9)	100	(7)	54	(5)	38	(21)	192	(21)	192
	小計		(97)	4,190	(40)	1,516	(18)	329	(25)	1,058	(90)	3,163	(90)	3,163
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(1)	500	(0)	0	(3)	813	(1)	400	(4)	1,213	(4)	1,213
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(1)	88	(2)	196	(2)	174	(1)	120	(5)	490	(5)	490
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(2)	88	(1)	34	(2)	80	(5)	202	(5)	202
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(1)	14	(1)	20	(1)	22	(0)	0	(2)	42	(2)	42
	D	1,100万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
舗装	小計		(3)	601	(5)	304	(7)	1,043	(4)	600	(16)	1,947	(16)	1,947
	A	1,100万円以上	(25)	444	(13)	301	(11)	211	(12)	243	(36)	755	(36)	755
	B	330万円以上1,100万円未満	(11)	134	(4)	24	(3)	23	(3)	18	(10)	65	(10)	65
	C	330万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	小計		(36)	578	(17)	325	(14)	234	(15)	261	(46)	820	(46)	820
法面			(9)	590	(4)	127	(4)	72	(2)	36	(10)	235	(10)	235
	橋梁補修		(3)	16	(1)	4	(0)	0	(1)	20	(2)	24	(2)	24
	安全施設		(4)	15	(2)	8	(1)	6	(0)	0	(3)	14	(3)	14
	鋼構造物		(0)	0	(1)	4	(0)	0	(0)	0	(1)	4	(1)	4
	電気		(1)	21	(4)	70	(1)	10	(1)	70	(6)	150	(6)	150
その他	管		(2)	150	(3)	284	(0)	0	(1)	90	(4)	374	(4)	374
			(19)	229	(2)	35	(11)	152	(4)	88	(18)	315	(18)	315
合計			(174)	6,392	(79)	2,677	(56)	1,846	(53)	2,223	(196)	7,046	(196)	7,046

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に関わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】 五名
(土木部・農林水産部)

(表一1)

発注価格帯別		平成29年度契約済				平成30年度							
		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計			
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	ランク等	左記ランク発注価格帯区分											
	A 1	3億円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(7)	769	(1)	134	(2)	202	(0)	0	(5)	560	(8)
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(36)	1,252	(5)	199	(14)	370	(19)	472	(15)	471	(53)
	B、C	1,500万円未満	(26)	163	(1)	1	(7)	45	(9)	64	(8)	66	(25)
建築一式	小計		(69)	2,184	(7)	334	(23)	617	(28)	536	(28)	1,097	(86)
	A 1	1億3,200万円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(1)	70	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
舗装	D	1,100万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	小計		(1)	70	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	A	1,100万円以上	(23)	593	(0)	0	(3)	103	(5)	154	(9)	231	(17)
	B	330万円以上1,100万円未満	(6)	63	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	C	330万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
法面	小計		(29)	655	(0)	0	(3)	103	(5)	154	(9)	231	(17)
			(5)	69	(0)	0	(2)	45	(3)	39	(2)	55	(7)
			(12)	217	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(2)	33	(2)
			(4)	28	(0)	0	(0)	0	(1)	5	(3)	50	(4)
			(6)	98	(0)	0	(1)	24	(1)	26	(3)	33	(5)
鋼構造物			(3)	32	(0)	0	(0)	0	(4)	67	(0)	0	(4)
			(0)	0	(0)	0	(0)	0	(2)	42	(0)	0	(2)
			(11)	501	(1)	20	(3)	68	(2)	59	(3)	500	(9)
	その他												
	合計		(140)	3,856	(8)	354	(32)	857	(46)	928	(50)	1,999	(136)

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に關わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】 鹿本
(土木部・農林水産部)

(表一 1)

発注価格帯別		平成29年度契約済				平成30年度							
		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計			
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	ランク等	左記ランク発注価格帯区分											
	A 1	3億円以上	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(33)	928	(9)	220	434	(16)	150	(6)	1,030	(39)	1,030
	B、C	1,500万円未満	(19)	139	(3)	22	34	(4)	0	(0)	0	(7)	56
建築一式	小計		(52)	1,066	(12)	242	488	(20)	150	(6)	1,086	(46)	1,086
	A 1	1億3,200万円以上	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(2)	162	(0)	0	97	(1)	0	(0)	0	(1)	97
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(1)	51	(1)	51
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(0)	0	(0)	0	20	(1)	0	(0)	0	(1)	20
舗装	D	1,100万円未満	(1)	9	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	小計		(3)	172	(0)	0	117	(2)	51	(1)	168	(3)	168
	A	1,100万円以上	(15)	261	(6)	96	29	(2)	0	(0)	0	(8)	125
	B	330万円以上1,100万円未満	(7)	65	(1)	7	0	(0)	7	(1)	14	(2)	14
	C	330万円未満	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
法面	小計		(22)	326	(7)	103	29	(2)	7	(1)	139	(10)	139
			(3)	28	(0)	0	0	(0)	31	(2)	31	(2)	31
			(4)	32	(2)	54	10	(2)	0	(0)	64	(4)	64
			(1)	6	(0)	0	16	(2)	5	(1)	21	(3)	21
			(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0
鋼構造物	電気		(3)	43	(0)	0	0	(0)	4	(1)	4	(1)	4
	管		(3)	95	(0)	0	5	(1)	34	(3)	39	(4)	39
	その他		(7)	125	(1)	12	9	(2)	5	(1)	26	(4)	26
	合計		(98)	1,893	(22)	411	654	(31)	287	(16)	1,578	(77)	1,578

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に関わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】 阿蘇
(土木部・農林水産部)

(表一1)

発注価格帯別		平成29年度契約済		平成30年度											
				第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
				件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
許可業種 土木一式	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	小計
	A 1	3億円以上	(21)	10,232	(0)	0	(1)	300	(0)	0	(1)	637	(2)	937	
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(49)	9,218	(5)	791	(11)	1,896	(0)	0	(23)	3,588	(39)	6,275	
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(138)	7,255	(11)	536	(21)	632	(30)	1,158	(28)	1,299	(90)	3,625	
	B、C	1,500万円未満	(75)	838	(0)	0	(10)	64	(12)	75	(18)	117	(40)	256	
建築一式	小計		(283)	27,543	(16)	1,327	(43)	2,892	(42)	1,233	(70)	5,641	(171)	11,093	
	A 1	1億3,200万円以上	(1)	288	(1)	453	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	453	
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(2)	216	(0)	0	(1)	107	(1)	119	(0)	0	(2)	226	
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	45	(0)	0	(1)	45	
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(4)	63	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	
舗装	D	1,100万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	
	小計		(7)	566	(1)	453	(1)	107	(2)	164	(0)	0	(4)	724	
	A	1,100万円以上	(48)	1,432	(13)	261	(20)	450	(19)	425	(15)	361	(67)	1,497	
	B	330万円以上1,100万円未満	(4)	36	(0)	0	(2)	20	(2)	20	(0)	0	(4)	40	
	C	330万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	
法面	小計		(52)	1,468	(13)	261	(22)	470	(21)	445	(15)	361	(71)	1,537	
			(37)	5,752	(6)	988	(3)	118	(6)	581	(14)	1,644	(29)	3,331	
	橋梁補修		(5)	42	(1)	15	(1)	130	(0)	0	(0)	0	(2)	145	
	安全施設		(9)	69	(0)	0	(0)	0	(4)	56	(0)	0	(4)	56	
	鋼構造物		(3)	165	(0)	0	(3)	41	(4)	159	(1)	103	(8)	303	
電気			(2)	130	(1)	49	(1)	6	(0)	0	(0)	0	(2)	55	
	管		(1)	10	(1)	72	(1)	6	(0)	0	(1)	16	(3)	94	
	その他		(22)	669	(1)	48	(11)	225	(10)	179	(14)	194	(36)	646	
	合計		(421)	36,414	(40)	3,213	(86)	3,995	(39)	2,817	(115)	7,959	(330)	17,984	

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に關わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】 八代
(土木部・農林水産部)

(表一1)

発注価格帯別		平成29年度契約済		平成30年度							
				第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
				件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	小計
土木一式	A 1	3億円以上	(2)	1,298	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(7)	743	(2)	149	(3)	(1)	79	(3)	252
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(44)	1,474	(6)	172	(23)	(8)	277	(17)	434
	B、C	1,500万円未満	(23)	285	(4)	31	(6)	(4)	39	(9)	59
	小計		(76)	3,799	(12)	352	(32)	(13)	395	(29)	745
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	0
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(1)	115	(1)	68	(1)	(1)	98	(1)	120
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(1)	27
	D	1,100万円未満	(1)	8	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0
舗装	小計		(2)	122	(1)	68	(1)	(1)	98	(2)	147
	A	1,100万円以上	(35)	1,123	(0)	0	(6)	(14)	297	(1)	20
	B	330万円以上1,100万円未満	(14)	132	(0)	0	(2)	(2)	20	(1)	7
	C	330万円未満	(1)	3	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0
法面	小計		(50)	1,258	(0)	0	(8)	(16)	317	(2)	27
			(18)	719	(0)	0	(3)	(5)	133	(7)	431
			(5)	79	(0)	0	(0)	(1)	25	(2)	34
			(3)	16	(0)	0	(0)	(1)	9	(1)	9
橋梁補修			(7)	117	(1)	4	(3)	(3)	62	(0)	0
			(5)	98	(0)	0	(2)	(0)	0	(4)	570
安全施設			(2)	169	(0)	0	(1)	(1)	10	(2)	27
			(20)	757	(0)	0	(5)	(7)	1,189	(9)	229
合計			(188)	7,134	(14)	424	(55)	(48)	2,238	(58)	2,219
小計			(86)	2,725	(14)	424	(55)	(48)	2,238	(58)	2,219
小計			(175)	7,180	(14)	424	(55)	(48)	2,238	(58)	2,219

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に關わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】 芦北
(土木部・農林水産部)

(表一1)

発注価格帯別		平成29年度契約済		平成30年度							
				第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
				件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	小計
土木一式	A 1	3億円以上	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(4)	284	(2)	191	(0)	0	(3)	263	(6)
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(35)	1,338	(11)	266	(8)	210	(19)	712	(40)
	B、C	1,500万円未満	(25)	171	(6)	42	(8)	51	(13)	95	(29)
	小計		(64)	1,793	(19)	499	(16)	261	(35)	1,070	(75)
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(1)	66	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	22	(1)
	D	1,100万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
舗装	小計		(1)	66	(0)	0	(0)	0	(1)	22	(1)
	A	1,100万円以上	(11)	203	(13)	268	(0)	0	(6)	120	(19)
	B	330万円以上1,100万円未満	(13)	86	(11)	100	(0)	0	(4)	31	(15)
	C	330万円未満	(1)	3	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
	小計		(25)	292	(24)	368	(0)	0	(10)	151	(34)
法面			(13)	433	(4)	134	(4)	57	(5)	206	(15)
	橋梁補修		(3)	37	(1)	9	(0)	0	(0)	0	(1)
	安全施設		(1)	4	(0)	0	(0)	0	(1)	3	(1)
	鋼構造物		(1)	25	(0)	0	(2)	23	(0)	0	(2)
	電気		(2)	40	(0)	0	(2)	36	(3)	41	(5)
その他	管		(2)	101	(0)	0	(0)	0	(2)	70	(2)
			(21)	463	(5)	41	(6)	81	(9)	107	(20)
			(133)	3,254	(53)	1,051	(30)	458	(66)	1,670	(156)
	合計				264						3,443

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に關わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】 球磨
(土木部・農林水産部)

(表一1)

発注価格帯別		平成30年度									
		平成29年度契約済		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	ランク等										
	A 1	3億円以上	(1)	478	(0)	0	(1)	401	(0)	0	(1)
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(13)	1,279	(4)	351	(4)	425	(4)	448	(5)
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(41)	1,401	(6)	322	(20)	694	(14)	390	(29)
	B、C	1,500万円未満	(38)	348	(1)	5	(1)	12	(17)	127	(37)
建築一式	小計		(93)	3,506	(11)	678	(26)	1,532	(35)	965	(71)
	A 1	1億3,200万円以上	(1)	290	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(2)	141	(0)	0	(1)	120	(0)	0	(0)
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(0)	0	(0)	0	(1)	14	(1)	12	(0)
舗装	D	1,100万円未満	(1)	10	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	小計		(4)	440	(0)	0	(2)	134	(1)	12	(0)
	A	1,100万円以上	(36)	618	(1)	15	(7)	107	(15)	268	(11)
	B	330万円以上1,100万円未満	(23)	175	(1)	4	(7)	49	(4)	35	(3)
	C	330万円未満	(1)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
法面	小計		(60)	793	(2)	19	(14)	156	(19)	303	(14)
			(20)	758	(2)	148	(3)	245	(3)	129	(3)
			(18)	216	(0)	0	(5)	101	(3)	42	(0)
			(2)	9	(0)	0	(0)	0	(1)	5	(0)
			(2)	42	(0)	0	(0)	0	(2)	1,402	(0)
橋梁補修			(8)	414	(0)	0	(3)	46	(2)	13	(2)
			(2)	88	(0)	0	(1)	18	(1)	17	(0)
			(42)	833	(1)	21	(3)	64	(8)	85	(18)
			(251)	7,099	(16)	866	(57)	2,296	(75)	2,973	(108)
			(256)	8,684	(143)	5,019	(143)	2,549	(256)	8,684	(256)
鋼構造物	電気										
	管										
	その他										
	合計										

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に關わるものは含まれない。

※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 7

【発注地域】 天草
(土木部・農林水産部)

(表一1)

発注価格帯別		平成30年度									
		平成29年度契約済					第1四半期				
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数
土木一式	A 1	3億円以上	(2)	864	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(2)
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(9)	1,078	(1)	120	(1)	136	(4)	410	(4)
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(53)	1,815	(5)	200	(24)	872	(16)	623	(25)
	B、C	1,500万円未満	(57)	461	(8)	67	(9)	72	(20)	134	(19)
	小計		(121)	4,218	(14)	387	(34)	1,080	(40)	1,167	(50)
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(1)	171	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	116	(0)
	B	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(1)	29	(0)	0	(0)	0	(0)
	C	1,100万円以上2,750万円未満	(1)	16	(1)	12	(0)	0	(0)	0	(0)
	D	1,100万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
舗装	小計		(2)	186	(2)	41	(0)	0	(1)	116	(0)
	A	1,100万円以上	(45)	1,161	(0)	0	(25)	544	(4)	91	(14)
	B	330万円以上1,100万円未満	(7)	44	(0)	0	(1)	6	(6)	38	(1)
	C	330万円未満	(1)	1	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)
法面	小計		(53)	1,206	(0)	0	(26)	550	(10)	129	(16)
			(23)	375	(2)	58	(14)	357	(3)	31	(2)
			(16)	160	(0)	0	(2)	12	(3)	58	(11)
			(17)	293	(2)	13	(2)	20	(5)	44	(4)
橋梁補修			(6)	146	(1)	15	(0)	0	(4)	30	(0)
			(10)	178	(0)	0	(0)	0	(4)	5	(3)
			(7)	228	(1)	4	(1)	100	(0)	0	(1)
			(24)	264	(1)	1	(6)	76	(11)	166	(14)
安全施設	小計		(279)	7,255	(23)	519	(85)	2,195	(81)	1,746	(101)
鋼構造物											
電気											
管											
その他											
合計			(279)	7,255	(23)	519	(85)	2,195	(81)	1,746	(101)
小計			(290)	7,528	(32)	549	(96)	2,463	(87)	1,963	(112)

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性とすることがある。

※平成31年度以降の通常予算に關わるものは含まれない。



※平成30年度の件数・金額は平成31年度に繰り越す可能性がある。

復旧・復興工事及び通常工事に関する今後の発注計画等

県内市町村(政令市含む)工事のブロック別発注予定

	平成30年度							
	平成29年度契約済		第1四半期		第2四半期		第3四半期	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
県央	3,423	80,117	637	20,714	700	26,427	613	15,290
県北	2,656	36,693	500	9,272	606	8,675	721	10,932
県南	1,387	16,078	301	3,722	385	4,382	560	6,224
天草	709	10,858	178	2,819	181	5,461	259	2,322
合計	8,175	143,746	1,616	36,527	1,872	44,945	2,153	34,768
比率			23.9%	24.9%	27.7%	30.6%	31.8%	23.7%
			第4四半期		第4四半期		小計	
			件数	金額	件数	金額	件数	金額
			637	20,714	700	26,427	385	14,334
			500	9,272	606	8,675	428	11,792
			301	3,722	385	4,382	159	2,444
			178	2,819	181	5,461	151	1,926
			1,616	36,527	1,872	44,945	1,123	30,496
			23.9%	24.9%	27.7%	30.6%	16.6%	20.8%

単位：件、百万円

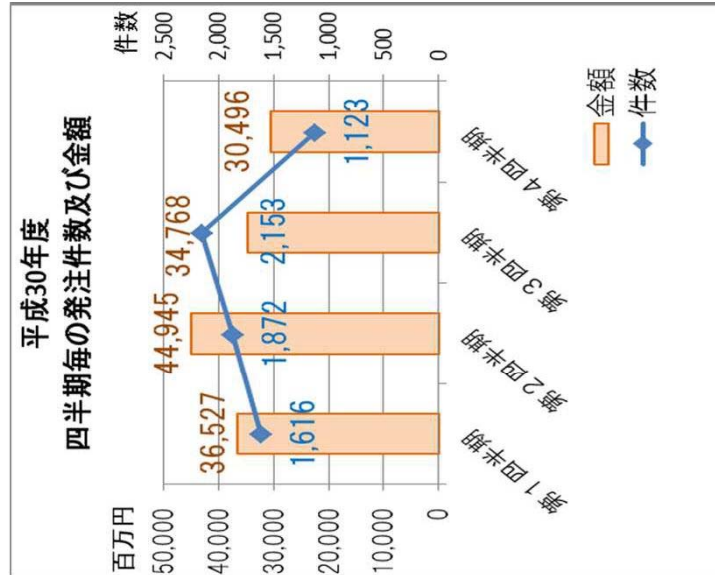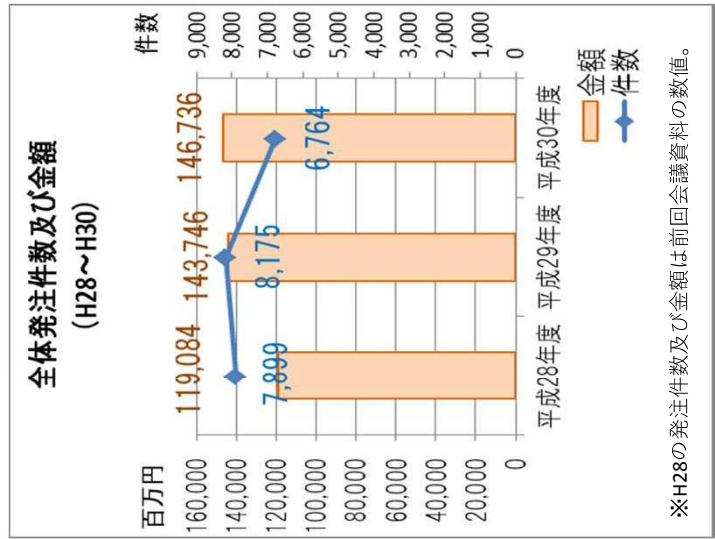

※各市町村により集計した件数及び金額を集計したもので、集計対象事業は各市町村の判断に依る。
※基本は入札件数ベースである。
※今後の入札件数・金額や発注時期は変動する。
※県工事は含まない。
※地域ブロックは県の広域本部管轄区分
○県央：熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町
○県北：荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村
○県南：八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町
○天草：上天草市、天草市、苓北町

※件数、金額及び時期については、現段階の予定であり、今後変更の可能性有り。
※H30の件数・金額はH31に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】熊本市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	33	6023	36	6433	23	3772	13	1780	105	18008
	A	5,000万円以上	123	15070	13	379	15	474	15	436	1	20	44	1309
	B	2,000万円以上5,000万円未満	71	2048	10	128	13	189	27	383	1	15	51	715
	C	1,000万円以上2,000万円未満	51	608	9	53	3	18	18	112	0	0	30	183
	D	1,000万円未満	36	209	65	6583	67	7114	83	4703	15	1815	230	20215
建築一式	小計		281	17935	7	4372	5	1885	2	1854	3	368	17	8479
	A	8,000万円以上	34	12246	10	431	9	410	6	92	2	102	27	1035
	B	1,000万円以上8,000万円未満	56	1701	7	40	2	10	5	31	0	0	14	81
	C	1,000万円未満	28	171	24	4843	16	2305	13	1977	5	470	58	9595
	小計		118	14118	2	41	5	266	5	223	2	130	14	660
舗装	A	2,000万円以上	31	1199	1	14	6	75	2	28	1	15	10	132
	B	1,000万円以上2,000万円未満	9	131	3	16	1	7	8	37	1	5	13	65
	C	1,000万円未満	6	30	6	71	12	348	15	288	4	150	37	857
	小計		46	1360	9	414	5	292	3	146	5	100	22	952
			4	150	0	0	3	116	6	142	0	0	9	258
法面	橋梁補修		4	150	0	0	3	46	2	38	1	15	6	99
	安全施設		9	175	0	0	3	0	3	122	0	0	3	122
	鋼構造物		6	82	0	0	0	0	3	122	0	0	3	122
	電気		60	2898	14	429	22	866	16	362	0	0	52	1657
	管		138	4360	20	547	13	621	12	286	3	18	48	1472
その他			242	9618	45	2516	70	3775	65	1217	3	32	183	7540
	合計		910	50881	183	15403	211	15483	218	9281	36	2600	648	42767

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

八代市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	7	572	5	304	6	1548	2	71	20	2495
	A	2,500万円以上	9	583	3	43	12	169	19	301	3	43	37	556
	B	1,100万円以上2,500万円未満	46	753	10	63	38	220	19	82	5	31	72	396
	C	1,100万円未満	96	497	20	678	55	693	44	1931	10	145	129	3447
建築一式	小計		151	1833										
	A	5,000万円以上	1	60	0	0	1	51	0	0	0	0	1	51
	B	1,000万円以上5,000万円未満	7	137	5	111	4	137	3	64	0	0	12	312
	C	1,000万円未満	10	36	9	28	2	8	6	27	2	9	19	72
舗装	小計		18	233	14	139	7	196	9	91	2	9	32	435
			59	577	5	32	12	86	20	297	2	8	39	423
	法面		10	86	0	0	8	109	6	40	2	13	16	162
	橋梁補修		3	37	0	0	4	33	0	0	0	0	4	33
安全施設			4	66	0	0	0	0	2	48	1	3	3	51
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気	A	8	130	0	0	1	115	2	23	6	209	9	347
	B	1,000万円未満												
管	小計		25	230	3	13	7	140	9	59	10	235	29	447
	A	1,000万円以上	2	98	1	10	0	0	1	31	8	591	10	632
	B	1,000万円未満												
	小計		19	176	3	21	1	8	9	64	8	591	21	684
その他			50	1003	13	621	20	294	24	349	1	42	58	1306
	合計		339	4241	58	1504	114	1559	123	2879	36	1046	331	6988

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

人吉市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別				平成29年度契約済		平成30年度											
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	平成29年度契約済		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計				
			件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額			
土木一式	A 1	2,200万円以上	7	609	2	151	1	140	1	67	0	0	4	358			
	A	2,200万円未満	5	91	0	0	1	19	4	65	0	0	5	84			
	B	1,100万円未満	8	57	2	12	1	6	8	67	0	0	11	85			
	C	550万円未満	16	33	8	20	5	12	10	16	0	0	23	48			
	小計		36	790	12	183	8	177	23	215	0	0	43	575			
建築一式	A 1	4,400万円以上	2	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	A	4,400万円未満	2	56	0	0	0	0	2	72	0	0	2	72			
	B	2,200万円未満	5	49	0	0	0	0	1	19	0	0	1	19			
	C	880万円未満	4	16	2	7	3	12	2	13	0	0	7	32			
	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
舗装	小計		13	224	2	7	3	12	5	104	0	0	10	123			
	A	1,100万円以上	3	44	1	13	1	13	0	0	0	0	2	26			
	B	1,100万円未満	7	36	1	7	0	0	2	14	0	0	3	21			
	C	330万円未満	6	8	1	2	0	0	3	7	0	0	4	9			
	小計		16	88	3	22	1	13	5	21	0	0	9	56			
法面			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
橋梁補修			2	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
安全施設			3	6	1	2	5	5	5	6	0	0	11	13			
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
電気			4	12	6	40	3	10	3	28	0	0	12	78			
管			4	68	2	19	4	13	5	28	0	0	11	60			
その他			33	641	9	51	3	36	7	45	0	0	19	132			
合計			111	2154	35	324	27	266	53	447	0	0	115	1037			

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】 荒尾市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	4	181	4	288	4	440	5	258	17	1167
	A	2,000万円以上	11	485	0	0	0	0	3	32	0	0	3	32
	A・B	1,000万円以上2,000万円未満	4	58	0	0	0	0	3	32	0	0	3	32
	B・C	500万円以上1,000万円未満	6	58	0	0	0	0	3	32	0	0	3	32
	C	300万円以上500万円未満	5	15	0	0	2	6	4	13	2	7	8	26
	D	300万円未満	0	0	0	0	0	0	1	1	1	28	2	29
建築一式	小計		26	605	4	181	8	307	18	526	9	298	39	1312
	A	2,000万円以上	3	119	0	0	1	25	3	115	0	0	4	140
	A・B	1,000万円以上2,000万円未満	2	24	0	0	0	0	3	45	0	0	3	45
	B	500万円以上1,000万円未満	4	25	1	9	1	5	1	5	2	13	5	32
	C	300万円以上500万円未満	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C・D	300万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
舗装	小計		10	171	1	9	2	30	7	165	3	14	13	218
			3	70	0	0	3	24	1	9	0	0	4	33
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法面	小計		3	70	0	0	3	24	1	9	0	0	4	33
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	橋梁補修		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	解体		4	92	0	0	0	0	2	83	1	12	3	95
	機械		6	38	0	0	0	0	1	4	3	15	4	19
	電気		1	3	4	28	1	2	2	40	5	108	12	178
その他	管		7	327	0	0	0	0	0	0	5	538	5	538
			3	19	0	0	0	0	3	15	1	26	4	41
	合計		60	1325	9	218	14	363	34	842	27	1011	84	2434

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続上の件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

水俣市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度												小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期							
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額				
土木一式	A 1	7,000万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	1	73	1	73				
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	0	0	0	0	0	0	2	33	2	65	4	98				
	B	500万円以上1,500万円未満	8	76	1	8	1	8	7	55	0	0	9	71				
	C	500万円未満	43	53	3	5	5	11	22	40	4	9	34	65				
	小計			51	129	4	13	6	19	31	128	7	147	48	307			
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	1	139	1	139				
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	1	57	1	131	0	0	0	0	0	0	1	131				
	B	2,750万円以上5,500万円未満	1	40	1	34	0	0	0	0	0	0	1	34				
	C	1,100万円以上2,750万円未満	2	33	3	49	0	0	0	0	1	20	4	69				
	D	1,100万円未満	6	24	2	4	1	5	2	8	0	0	5	17				
舗装	小計		10	154	7	218	1	5	2	8	2	159	12	390				
	A	1,100万円以上	1	14	0	0	1	12	0	0	0	0	1	12				
	B	330万円以上1,100万円未満	7	50	1	5	5	48	1	10	0	0	7	63				
	C	330万円未満	8	13	2	3	3	6	1	2	0	0	6	11				
	小計		16	77	3	8	9	66	2	12	0	0	14	86				
法面			2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
橋梁補修			2	8	0	0	1	52	3	66	0	0	4	118				
安全施設			5	13	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3				
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
電気			4	8	7	95	0	0	1	6	1	13	9	114				
管			3	13	3	166	1	2	1	1	1	15	6	184				
その他			25	141	2	8	4	15	19	327	0	0	25	350				
合計			118	551	26	508	22	159	60	551	11	334	119	1552				

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。
※「独自の価格帯区分なし」

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

玉名市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度													
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期				小計			
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額				
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額														
	A	1,500万円以上	41	1922	2	31	12	600	13	358	2	193	29	1182				
	B	600万円以上1,500万円未満	33	317	1	9	9	102	16	159	4	31	30	301				
	C	600万円未満	120	180	40	32	32	38	46	54	19	15	137	139				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
建築一式	小計		194	2419	43	72	53	740	75	571	25	239	196	1622				
	A	3,000万円以上	4	956	1	3686	0	0	0	0	0	0	1	3686				
	B	3,000万円未満	7	29	1	27	2	48	0	0	1	1	4	76				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
舗装			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	小計		11	985	2	3713	2	48	0	0	1	1	5	3762				
	A	600万円以上	16	230	1	9	5	42	4	34	2	16	12	101				
	B	130万円以上600万円未満	18	69	4	13	4	15	6	23	1	6	15	57				
	C	130万円未満	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1				
法面	小計		35	300	5	22	9	57	11	58	3	22	28	159				
			0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	6				
	橋梁補修		2	38	0	0	2	20	0	0	0	0	2	20				
	安全施設		2	8	0	0	1	3	1	3	0	0	2	6				
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
電気 管 その他			10	152	4	20	0	0	0	0	0	0	4	20				
			36	782	8	68	3	161	2	1	0	0	13	230				
			51	1715	14	241	10	190	16	140	3	41	43	612				
	合計		341	6399	76	4136	80	1219	106	779	32	303	294	6437				

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】 山鹿市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	0	0	5	94	36	318	0	0	41	412
	A	1,000万円以上	13	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	2,000万円未満	21	126	5	32	27	88	6	45	0	0	38	165
	C	1,000万円未満	37	105	8	23	16	42	13	27	0	0	37	92
	小計		71	350	13	55	48	224	55	390	0	0	116	669
建築一式	A	1,000万円以上	3	1708	1	69	0	0	2	63	0	0	3	132
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	2,000万円未満	4	27	2	22	2	13	3	37	0	0	7	72
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装	小計		7	1735	3	91	2	13	5	100	0	0	10	204
	A	500万円以上	0	0	2	42	0	0	1	59	0	0	3	101
	B	1,000万円未満	2	10	4	26	1	4	2	14	0	0	7	44
	C	500万円未満	6	12	2	2	4	6	3	8	0	0	9	16
	小計		8	22	8	70	5	10	6	81	0	0	19	161
法面			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	橋梁補修		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	安全施設		0	0	1	37	1	11	0	0	0	0	2	48
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	3	14	0	0	3	14
	電気		3	30	2	18	2	19	1	21	0	0	5	58
管	A	1,500万円以上	3	30	2	18	2	19	1	21	0	0	5	58
	B	1,500万円未満	6	21	5	26	3	5	3	21	0	0	11	52
	その他		20	271	3	66	1	3	12	739	0	0	16	808
合計			119	2580	37	430	62	285	86	1369	0	0	185	2084

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
 ※件数は入札手続上の件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

菊池市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額										
	A	2,500万円以上（災害500万円以上）	10	668	5	255	2	73	10	731	2	80	19	1139
	B	1,000万円以上2,500万円未満 （災害200万円以上500万円未満）	10	161	1	1	1	18	6	90	0	0	8	109
	C	1,000万円未満（災害200万円未満）	38	106	5	21	4	16	20	97	4	17	33	151
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築一式	小計		58	935	11	277	7	107	36	918	6	97	60	1399
	A	5,000万円以上	8	1179	1	168	1	94	1	50	1	127	4	439
	B	1,000万円以上5,000万円未満	2	59	0	0	2	60	2	82	0	0	4	142
	C	1,000万円以上2,500万円未満	10	176	0	0	2	39	0	0	0	0	2	39
	D	1,000万円未満	44	90	0	0	4	3	5	11	2	4	11	18
舗装			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		64	1504	1	168	9	196	8	143	3	131	21	638
			26	203	10	39	6	62	10	122	0	0	26	223
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法面	小計		26	203	10	39	6	62	10	122	0	0	26	223
			2	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	橋梁補修		2	22	0	0	0	0	3	62	0	0	3	62
	安全施設		4	11	0	0	0	0	0	0	2	6	2	6
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気 管 その他			17	296	2	37	6	28	9	23	3	20	20	108
			16	235	4	47	3	31	3	8	1	35	11	121
			69	1405	4	44	14	126	18	201	6	81	42	452
	合計		258	4662	32	611	45	550	87	1478	21	370	185	3009

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】宇土市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	A	800万円以上	23	971	8	243	6	124	1	26	3	145	18	537
	B	400万円以上800万円未満	7	38	4	23	2	10	4	19	4	21	14	73
	C	130万円以上400万円未満	12	31	2	5	4	9	4	12	3	10	13	37
	-	130万円未満	12	6	2	1	6	6	2	1	2	2	12	10
	小計		54	1047	16	272	18	149	11	59	12	178	57	658
建築一式	A	800万円以上	9	553	1	14	1	22	2	67	2	198	6	302
	B	130万円以上800万円未満	5	21	1	6	1	4	3	11	2	5	7	25
	-	130万円未満	20	8	2	2	3	2	0	0	0	0	5	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装	小計		34	582	4	22	5	28	5	78	4	203	18	331
	A	800万円以上	3	29	4	61	2	21	3	31	0	0	9	113
	B	300万円以上800万円未満	3	29	4	61	2	21	3	31	0	0	9	113
	C	130万円以上300万円未満	7	17	1	2	2	5	2	9	0	0	5	16
	-	130万円未満	0	0	2	1	3	4	0	0	0	0	5	5
法面	小計		13	60	8	67	9	41	8	47	0	0	25	155
			1	15	1	144	1	28	3	21	1	0	6	194
	橋梁補修		1	19	0	0	1	10	2	117	1	85	4	213
	安全施設		15	7	2	1	7	3	5	4	7	3	21	11
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気 管 その他			10	324	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
			11	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			19	84	2	7	5	37	11	153	1	1	19	197
合計			158	2255	33	514	46	295	46	479	26	470	151	1758

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続上の件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】 上天草市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済				平成30年度							
			第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期					
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A 1	1,500万円以上	2	273	0	0	0	0	0	0	3	300	3	300
	A 2	1,500万円以上5,000万円未満	8	262	1	17	1	17	3	67	0	0	5	101
	B	300万円以上1,500万円未満	17	118	1	9	1	5	8	50	3	17	13	81
	C	300万円未満	11	18	1	3	0	0	4	9	0	0	5	12
	小計		38	671	3	29	2	22	15	126	6	317	26	494
建築一式	A 1	2,000万円以上	1	84	1	254	1	399	0	0	0	0	2	653
	A 2	2,000万円以上7,000万円未満	5	146	0	0	0	0	2	72	0	0	2	72
	B	500万円以上2,000万円未満	8	62	0	0	1	8	1	12	0	0	2	20
	C	500万円未満	3	9	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3
	小計		17	301	1	254	2	407	4	87	0	0	7	748
舗装	A	300万円以上	14	62	4	22	10	94	3	22	0	0	17	138
	B	300万円未満	6	17	3	7	2	6	0	0	0	0	5	13
	小計		20	79	7	29	12	100	3	22	0	0	22	151
電気	A	300万円以上	3	113	2	87	2	131	1	42	0	0	5	260
	B	300万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		3	113	2	87	2	131	1	42	0	0	5	260
管	A	300万円以上	5	303	1	62	0	0	0	0	0	0	1	62
	B	300万円未満	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2
	小計		5	303	1	62	0	0	1	2	0	0	2	64
水道施設	A	300万円以上	4	104	1	8	5	90	2	28	0	0	8	126
	B	300万円未満	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2
	小計		4	104	1	8	5	90	3	30	0	0	9	128
その他			13	381	3	806	2	8	5	31	1	2	11	847
	合計		100	1952	18	1275	25	758	32	340	7	319	82	2692

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続上の件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】宇城市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額										
	A	2,600万円以上	15	1,115	3	212	10	747	2	117	1	20	16	1,096
	B	800万円以上2,600万円未満	17	238	3	39	6	69	7	92	2	32	18	232
	C	800万円未満	37	147	10	53	4	16	9	42	2	9	25	120
	D	200万円未満	75	73	14	11	14	15	33	31	3	3	64	60
	小計		144	1,573	30	315	34	847	51	282	8	64	123	1,508
建築一式	A	2,000万円以上	7	546	2	610	1	42	6	204	3	3,494	12	4,350
	B	2,000万円未満	2	21	0	0	0	0	2	29	3	1,521	5	1,550
	C	130万円未満	7	6	2	1	1	1	3	2	0	0	6	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		16	573	4	611	2	43	11	235	6	5,015	23	5,904
舗装	A	400万円以上	9	89	4	55	2	31	3	25	0	0	9	111
	B	400万円未満	4	12	1	2	1	2	1	2	0	0	3	6
	C	130万円未満	12	11	1	1	0	0	3	3	0	0	4	4
	小計		25	112	6	58	3	33	7	30	0	0	16	121
法面			2	16	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2
橋梁補修			2	147	0	0	1	6	1	26	0	0	2	32
安全施設			7	3	1	1	1	1	4	1	3	4	9	7
鋼構造物			1	1	0	0	0	0	3	12	0	0	3	12
電気			19	81	7	8	3	4	8	24	2	13	20	49
管			34	460	7	87	10	108	7	22	1	1	25	218
その他			18	83	4	139	3	19	19	106	5	271	31	535
合計			268	3,049	59	1,219	58	1,062	112	739	25	5,368	254	8,388

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

阿蘇市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別				平成29年度契約済		平成30年度									
						第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
土木一式	A 1	5,000万円以上	6	360			1	60	0	0	1	60	1	80	200
	A 2	3,000万円以上	8	297			0	0	1	46	1	36	0	0	82
	B	500万円以上5,000万円未満	47	683			8	134	0	0	1	23	2	40	197
	C	1,500万円未満	32	69			27	49	25	22	21	37	18	56	164
	小計		93	1409			36	243	26	68	24	156	21	176	643
建築一式	A	500万円以上	5	887			0	0	0	0	1	25	0	0	25
	B	1,500万円未満	10	16			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装	小計		15	903			0	0	0	0	1	25	0	0	25
	A	1,000万円以上	10	478			3	68	4	101	2	43	0	0	212
	B	500万円以上1,500万円未満	31	157			1	6	1	9	4	21	0	0	36
	C	1,000万円未満	10	8			26	74	21	18	9	11	3	7	110
	小計		51	643			30	148	26	128	15	75	3	7	358
法面			0	0			1	1	0	0	0	0	0	1	1
橋梁補修			7	164			8	357	2	27	2	10	1	20	414
安全施設			1	22			0	0	2	17	0	0	0	0	17
鋼構造物			1	4			0	0	1	4	0	0	0	0	4
電気			0	0			0	0	0	0	2	17	0	0	17
管			6	27			3	10	4	3	12	70	2	11	94
その他			20	122			2	7	2	5	2	4	1	306	322
合計			194	3294	80	766	63	252	58	357	28	520	229	1895	

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】 天草市

金額単位：百万円																
発注価格帯別				平成29年度契約済				平成30年度								
				第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計				
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A	1,100万円以上	31	872	4	115	10	283	16	613	6	251	36	1262		
	B	500万円以上1,100万円未満	59	435	15	103	14	100	27	195	10	68	66	466		
	C	280万円以上500万円未満	63	248	18	64	15	57	22	89	13	46	68	256		
	D	280万円未満	134	213	54	83	16	25	58	87	55	86	183	281		
	小計		287	1768	91	365	55	465	123	984	84	451	353	2265		
建築一式	A	3,000万円以上	5	3202	1	477	3	2015	1	33	0	0	5	2525		
	B	1,500万円以上3,000万円未満	2	35	3	63	2	42	6	118	0	0	11	223		
	C	800万円以上1,500万円未満	13	151	8	82	6	57	9	105	0	0	23	244		
	D	800万円未満	20	64	4	20	4	10	7	39	4	6	19	75		
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
舗装	A	330万円以上	40	3452	16	642	15	2124	23	295	4	6	58	3067		
	B	200万円以上330万円未満	44	532	10	67	8	83	12	99	5	46	35	295		
	C	200万円未満	15	40	2	5	1	3	0	0	0	0	3	8		
	小計		73	591	14	75	13	91	16	104	7	48	50	318		
	A	800万円以上	6	103	0	0	0	0	1	13	0	0	1	13		
橋梁補修	B	330万円以上800万円未満	2	11	1	4	1	7	2	15	0	0	4	26		
	C	330万円未満	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計		13	123	1	4	1	7	3	28	0	0	5	39		
	安全施設		2	49	0	0	0	0	0	0	2	101	2	101		
	鋼構造物		3	6	1	3	2	8	4	12	0	0	7	23		
電気	銅構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A	800万円以上	6	609	0	0	4	465	1	14	1	62	6	541		
	B	330万円以上800万円未満	7	37	0	0	0	0	3	13	1	6	4	19		
	C	330万円未満	10	18	0	0	2	6	2	5	9	10	13	21		
	小計		23	664	0	0	6	471	6	32	11	78	23	581		
管	A	800万円以上	7	1014	2	33	19	965	3	80	17	571	41	1649		
	B	330万円以上800万円未満	7	31	1	4	2	12	4	22	0	0	7	38		
	C	330万円未満	17	30	4	8	5	9	4	11	1	2	14	30		
	小計		31	1075	7	45	26	986	11	113	18	573	62	1717		
	その他		93	782	27	387	26	318	33	286	12	285	98	1276		
合計			565	8510	157	1521	144	4470	219	1854	138	1542	658	9387		

(表-1)

金額単位：百万円

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

合志市

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	1	27	4	258	3	99	0	0	8	384
	A 1	2,500万円以上	3	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A 2		0	0										
	B	700万円以上2,500万円未満	9	110	3	56	3	31	2	27	0	0	8	114
	C	700万円未満	12	50	0	0	3	11	2	10	0	0	5	21
建築一式	小計		24	267	4	83	10	300	7	136	0	0	21	519
		1億3,200万円以上	2	567	0	0	0	0	0	0	1	389	1	389
		5,500万円以上1億3,200万円未満	3	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,750万円以上5,500万円未満	2	69	0	0	0	0	1	49	0	0	1	49
		1,100万円以上2,750万円未満	3	71	0	0	1	20	1	19	0	0	2	39
		1,100万円未満	4	23	1	10	1	3	0	0	0	0	2	13
	小計		14	975	1	10	2	23	2	68	1	389	6	490
舗装	A	1,200万円以上	10	154	0	0	0	0	1	14	1	14	2	28
	B	520万円以上1,200万円未満	8	62	0	0	5	40	2	14	0	0	7	54
	C	520万円未満	19	72	1	4	5	18	8	24	0	0	14	46
	小計		37	288	1	4	10	58	11	52	1	14	23	128
法面			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
橋梁補修			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気			5	84	1	3	3	18	0	0	0	0	4	21
管			2	9	0	0	2	18	2	114	1	60	5	192
その他			18	273	1	2	9	67	6	53	0	0	16	122
合計			100	1896	8	102	36	484	28	423	3	463	75	1472

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入れを行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
 ※集計時点で合冊入れや分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。
 ※建築一式の『独自の価格帯区分なし』

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

美里町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	3	135	3	81	3	81	7	267	16	564
	A	2,000万円以上	22	935	2	27	2	21	2	28	5	67	11	143
	B	1,000万円以上2,000万円未満	25	354	13	69	8	59	16	90	6	22	43	240
	C	300万円以上1,000万円未満	124	656	6	12	19	24	12	19	8	11	45	66
	D	300万円未満	131	233	24	243	32	185	33	218	26	367	115	1013
建築一式	小計		302	2178	24	243	32	185	33	218	26	367	115	1013
	町内建築		11	224	2	15	4	24	2	44	0	0	8	83
	町外建築		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	町内外建築		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		11	224	2	15	4	24	2	44	0	0	8	83
	A	2,000万円以上	2	54	0	0	2	67	0	0	0	0	2	67
	B	1,000万円以上2,000万円未満	2	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	1,000万円未満	4	15	2	6	0	0	0	0	0	0	2	6
法面	小計		8	106	2	6	2	67	0	0	0	0	4	73
			0	0	0	0	0	0	1	46	0	0	1	46
	橋梁補修		1	29	0	0	0	0	0	0	1	24	1	24
	安全施設		1	2	0	0	1	1	1	4	0	0	2	5
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気 管 その他			5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			53	113	14	19	19	33	24	179	2	184	59	415
			205	635	2	11	4	29	0	0	0	0	6	40
	主に解体工事													
	合計		586	3290	44	294	62	339	61	491	29	575	196	1699

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

玉東町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度												小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期							
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
土木一式	A 1	7,000万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	1	16	0	0	0	0	2	44	0	0	0	2	44	2		
	B	500万円以上1,500万円未満	14	142	0	0	0	0	1	8	1	9	2	17	2	17		
	C	500万円未満	18	48	3	7	2	4	2	3	6	7	13	21	13	21		
	小計		33	206	3	7	2	4	5	55	7	16	17	82	17	82		
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	2,750万円以上5,500万円未満	6	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C	1,100万円以上2,750万円未満	4	80	0	0	0	0	1	16	0	0	1	16	1	16		
	D	1,100万円未満	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
舗装	小計		13	334	0	0	0	0	1	16	0	0	1	16	1	16		
	A	1,100万円以上	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	1	12	1	12		
	B	330万円以上1,100万円未満	4	23	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	1	4		
	C	330万円未満	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計		5	25	1	12	0	0	0	0	1	4	2	16	2	16		
法面			0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1			
橋梁補修			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
安全施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
電気			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
管			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他			33	62	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2		
合計			84	627	6	22	2	4	6	71	8	20	22	117	22	117		

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

南関町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	2	54	0	0	3	57	6	210	11	321
	A	1,000万円以上	8	216	2	12	3	16	0	0	23	150	28	178
	B	300万円以上1,000万円未満	15	84	5	7	3	5	3	5	82	124	93	141
	C	300万円未満	33	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0										
建築一式	小計		56	343	9	73	6	21	6	62	111	484	132	640
	A	5,000万円以上	1	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	2,500万円以上5,000万円未満	2	65	0	0	1	26	0	0	1	41	2	67
	C	2,500万円未満	4	22	1	1	1	1	1	19	0	0	3	21
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		7	180	1	1	2	27	1	19	1	41	5	88
		等級なし	3	13	0	0	0	0	3	34	0	0	3	34
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法面	小計		3	13	0	0	0	0	3	34	0	0	3	34
			1	1	0	0	0	0	3	75	0	0	3	75
	橋梁補修		2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全施設		1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気 管			5	32	2	9	0	0	0	0	0	0	2	9
			2	12	0	0	0	0	1	8	0	0	1	8
	その他		28	59	4	13	6	113	5	16	0	0	15	142
合計			105	654	16	96	14	161	20	215	112	525	162	997

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。

※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。

※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

長洲町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	0	0	1	14	2	20	0	0	3	34
	A	500万円以上	8	99	4	5	3	6	8	13	0	0	15	24
	B	500万円未満	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築一式	小計		18	119	4	5	4	20	10	33	0	0	18	58
	A 1	1億3,200万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	2,750万円以上5,500万円未満	2	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	1,100万円以上2,750万円未満	0	13	0	0	0	0	1	24	0	0	1	24
舗装	D	1,100万円未満	4	5	2	4	1	1	2	16	0	0	5	21
	小計		6	111	2	4	1	1	3	40	0	0	6	45
	A	1,100万円以上	0	0	0	0	0	0	1	24	0	0	1	24
	B	330万円以上1,100万円未満	4	16	0	0	0	0	0	0	2	14	2	14
	C	330万円未満	3	4	3	5	0	0	2	3	4	5	9	13
法面	小計		7	20	3	5	0	0	3	27	6	19	12	51
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	橋梁補修		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全施設		2	5	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3
電気 管 その他			3	31	0	0	1	9	1	10	0	0	2	19
			0	0	0	0	1	2	1	4	0	0	2	6
			12	56	2	2	1	41	2	6	0	0	5	49
	合計		48	342	11	16	9	75	21	123	6	19	47	233

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。
※土木一式以外の業種には独自の価格帯区分なし

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】 和水町

(表－1)
金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度												小計	
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		件数	金額	件数	金額		
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額						
土木一式	A	1,000万円以上	17	355	3	57	1	64	9	282	1	47	14	450				
	B	1,000万円未満	77	222	21	50	12	28	28	79	14	54	75	211				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	小計		94	577	24	107	13	92	37	361	15	101	89	661				
建築一式	A	5,000万円以上	0	0	0	0	5	1361	0	0	0	0	5	1361				
	B	2,500万円以上～5,000万円未満	3	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	C	2,500万円未満	8	50	0	0	0	0	1	3	1	5	2	8				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
舗装	小計		11	191	0	0	5	1361	1	3	1	5	7	1369				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
法面	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
橋梁補修	小計		6	7	1	5	2	1	1	1	0	0	4	7				
			49	97	11	14	7	9	18	33	1	1	37	57				
			13	65	0	0	4	26	4	12	0	0	8	38				
			173	937	36	126	31	1489	61	410	17	107	145	2132				
	合計		173	937	36	126	31	1489	61	410	17	107	145	2132				

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

大津町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度												小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期							
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額				
土木一式	A	2,000万円以上（400万円以上）	13	784	6	688	1	7	4	72	4	98	15	865				
	A・B	2,000万円以上～3,000万円未満（400万円以上～600万円未満）	8	120	0	0	1	5	2	27	0	0	3	32				
	B	500万円以上～2,000万円未満（100万円以上～400万円未満）	10	38	1	4	0	0	1	11	1	3	3	18				
	B・C	500万円以上～1,000万円未満（100万円以上～200万円未満）	20	75	0	0	1	1	0	0	4	9	5	10				
	C	300万円以上～500万円未満（40万円以上～100万円未満）	12	15	2	2	0	0	1	3	0	0	3	5				
	C・D	300万円未満（40万円未満）	17	17	2	1	5	4	6	7	7	7	20	19				
建築一式	小計		80	1,049	11	695	8	17	14	120	16	117	49	949				
	A・B	1,000万円以上	1	12	2	360	3	534	0	0	4	5,203	9	6,097				
	C・D	1,000万円未満	20	41	1	1	7	12	6	8	5	9	19	30				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
舗装	小計		21	53	3	361	10	546	6	8	9	5,212	28	6,127				
	A・B	500万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	C・D	500万円未満	3	8	0	0	4	14	0	0	1	1	5	15				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
法面	小計		3	8	0	0	4	14	0	0	1	1	5	15				
			0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1				
	橋梁補修		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	安全施設		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	鋼構造物		2	6	0	0	0	0	1	6	0	0	1	6				
	電気		11	57	2	2	3	9	5	9	2	3	12	23				
管		2	2	0	0	2	3	2	2	1	1	5	6					
		11	28	7	25	2	1	6	26	2	29	17	81					
その他																		
合計			131	1,204	23	1,083	30	591	34	171	31	5,363	118	7,208				

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定価格の件数及び金額を計上する。
※発注等級価格帯区分については、通常工事、災害復旧工事の別により異なる。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

菊陽町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度											
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計			
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
土木一式	A	3,000万円以上	11	488	3	279	2	92	1	40	1	30	7	441		
	B	1,000万円以上3,000万円未満	19	346	0	0	6	73	5	67	2	34	13	174		
	C	500万円以上1,000万円未満	11	78	1	5	2	13	1	6	0	0	4	24		
	D	500万円未満	12	43	1	4	1	3	4	13	0	0	6	20		
	小計		53	955	5	288	11	181	11	126	3	64	30	659		
建築一式	町の等級なし	1億3,200万円以上	1	177	1	175	0	0	0	0	0	0	1	175		
	町の等級なし	5,500万円以上1億3,200万円未満	3	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	町の等級なし	2,750万円以上5,500万円未満	15	526	6	206	0	0	2	90	0	0	8	296		
	町の等級なし	1,100万円以上2,750万円未満	15	295	1	16	1	25	0	0	0	0	2	41		
	町の等級なし	1,100万円未満	20	106	3	12	0	0	0	0	0	0	3	12		
	小計		54	1412	11	409	1	25	2	90	0	0	14	524		
舗装	A	1,000万円以上	5	79	0	0	0	0	3	43	0	0	3	43		
	B	500万円以上1,000万円未満	7	50	0	0	0	0	1	6	0	0	1	6		
	C	500万円未満	12	29	0	0	2	8	0	0	0	0	2	8		
法面	小計		24	158	0	0	2	8	4	49	0	0	6	57		
	町の等級なし		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	町の等級なし		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	町の等級なし		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	町の等級なし		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	町の等級なし		1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	町の等級なし		7	67	3	41	0	0	1	11	0	0	4	52		
鋼構造物	町の等級なし		17	314	6	62	0	0	1	12	0	0	7	74		
	その他		13	120	3	31	1	9	1	29	1	2	6	71		
	合計		169	3038	28	831	15	223	20	317	4	66	67	1437		

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】 南小国町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	7	124	2	202	2	76	0	0	11	402
	A	700万円以上	4	142										
	A・B	700万円未満～330万円以上 29年災害分特例700万円未満～150万円以上	8	24	22	66	20	66	6	23	9	25	57	180
	B	350万円未満 29災害分特例150万円未満	19	26	15	12	13	14	4	2	6	5	38	33
建築一式			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		31	192	44	202	35	282	12	101	15	30	106	615
	A		1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装	小計		1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		5	10	0	0	2	2	0	0	1	5	3	7
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法面	小計		5	10	0	0	2	2	0	0	1	5	3	7
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	橋梁補修		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全施設	A・B	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	2	2
鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気	A	1	15	1	8	0	0	0	0	0	0	1	8	
管	A	4	9	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			43	245	46	212	38	285	13	101	16	35	113	633

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

小国町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度												
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計				
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額			
土木一式		独自の価格帯区分なし	19	341	0	0	0	0	6	58	35	210	41	268			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	小計		19	341	0	0	0	0	6	58	35	210	41	268			
建築一式		独自の価格帯区分なし	3	510	0	0	2	95	0	0	4	268	6	363			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	小計		3	510	0	0	2	95	0	0	4	268	6	363			
舗装		独自の価格帯区分なし	1	9	0	0	0	0	1	9	0	0	1	9			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		小計		1	9	0	0	0	0	1	9	0	0	1	9		
法面			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	橋梁補修			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		安全施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				電気		1	65	0	0	0	0	0	0	2	10	2	10
管						7	160	1	15	4	51	1	19	3	12	9	97
	その他					1	2	0	0	0	0	2	9	0	0	2	9
		合計			32	1087	1	15	6	146	10	95	44	500	61	756	

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

産山村

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済				平成30年度								小計			
							第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期					
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額				
土木一式	A 1	7,000万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	0	0	0	0	2	69	0	0	0	0	2	69				
	B	500万円以上1,500万円未満	9	77	0	0	2	15	6	94	0	0	8	109				
	C	500万円未満	26	60	0	0	29	43	17	34	9	14	55	91				
	小計		35	137	0	0	33	127	23	128	9	14	65	269				
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	1	215	0	0	1	186	0	0	0	0	1	186				
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	B	2,750万円以上5,500万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	C	1,100万円以上2,750万円未満	2	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	D	1,100万円未満	3	4	0	0	1	2	0	0	2	18	3	20				
舗装	小計		6	265	0	0	2	188	0	0	2	18	4	206				
	A	1,100万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	B	330万円以上1,100万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	C	330万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
法面	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
橋梁補修			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
安全施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
電気			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計			41	402	0	0	35	315	26	152	11	32	72	499				

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

高森町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A 1	7,000万円以上	3	405	0	0	0	0	0	0	1	83	1	83
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	4	208	0	0	0	0	1	24	8	367	9	391
	B	500万円以上1,500万円未満	1	5	1	7	2	19	0	0	5	48	8	74
	C	500万円未満	17	36	1	4	1	4	0	0	9	28	11	36
	小計			25	654	2	11	3	23	1	24	23	526	29
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	2,750万円以上5,500万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	1,100万円以上2,750万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	1,100万円未満	0	0	0	0	0	0	2	12	1	6	3	18
舗装	小計		0	0	0	0	0	0	2	12	1	6	3	18
	A	1,100万円以上	1	11	0	0	0	0	0	0	2	108	2	108
	B	330万円以上1,100万円未満	1	6	0	0	0	0	0	0	1	7	1	7
	C	330万円未満	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法面	小計		3	18	0	0	0	0	0	0	3	115	3	115
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	橋梁補修		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			28	672	2	11	3	23	3	36	27	647	35	717

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

西原村

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	2	156	5	488	6	2281	2	814	15	3739
	A	3,000万円以上	12	1234	2	32	3	62	9	174	0	0	14	268
	B	1,500万円以上3,000万円未満	5	85	0	0	4	32	7	65	2	17	13	114
	C	500万円以上1,500万円未満	34	291	0	0	11	24	1	5	2	9	14	38
	D・E	200万円以上500万円未満、200万円未満	68	158										
建築一式	小計		119	1768	4	188	23	606	23	2525	6	840	56	4159
	A	3,000万円以上	1	96	0	0	2	68	0	0	0	0	2	68
	B	1,500万円以上3,000万円未満	2	37	0	0	0	0	1	18	0	0	1	18
	C	500万円以上1,500万円未満	4	42	1	6	0	0	0	0	0	0	1	6
	D	200万円以上500万円未満	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E	200万円未満	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装	小計		13	191	1	6	2	68	1	18	0	0	4	92
	A	3,000万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	1,500万円以上3,000万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C・D・E	1,500万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法面 橋梁補修 安全施設 鋼構造物 電気 管 その他	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11	196	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計		145	2173	5	194	25	674	25	2545	9	945	64	4358

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

南阿蘇村

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A	2,500万円以上	34	1757	1	69	11	739	12	476	10	648	34	1932
	A・B	700万円以上2,500万円未満	53	737	5	104	13	212	10	154	8	113	36	583
	B・C	300万円以上700万円未満	91	419	5	22	10	47	8	40	5	22	28	131
	C・D	300万円未満	277	338	54	59	43	48	24	25	3	6	124	138
	小計		455	3251	65	254	77	1046	54	695	26	789	222	2784
建築一式	A	3,000万円以上	2	90	0	0	0	0	4	393	0	0	4	393
	A・B	1,000万円以上3,000万円未満	5	87	0	0	4	96	3	70	2	32	9	198
	B・C	1,000万円未満	23	82	3	4	6	32	3	10	1	7	13	53
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装	小計		30	259	3	4	10	128	10	473	3	39	26	644
	A	700万円以上	8	209	0	0	1	20	2	32	0	0	3	52
	A・B	200万円以上700万円未満	2	7	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
	B・C	200万円未満	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		15	219	0	0	1	20	2	32	1	2	4	54
水道施設			49	449	6	83	7	129	9	104	0	0	22	316
法面・とび			12	935	1	6	1	201	0	0	0	0	2	207
橋梁補修			0	0	0	0	0	0	2	112	0	0	2	112
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気			6	4	1	31	0	0	1	4	0	0	2	35
管			3	5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
その他			15	34	7	24	2	12	5	28	2	36	16	100
合計			585	5156	84	403	98	1536	83	1448	32	866	297	4253

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

御船町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度											
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計			
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額				
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	災害により 独自の価格 帯区分なし	7,000万円以上	3	270	11	806	12	324	1	19	7	145	31	1294		
		1,500万円以上7,000万円未満	81	2667	5	39	42	360	3	18	7	56	57	473		
		500万円以上1,500万円未満	114	949	34	45	98	296	28	88	46	101	206	530		
		500万円未満	143	351	50	890	152	980	32	125	60	302	294	2297		
建築一式	小計		341	4237	50	890	152	980	32	125	60	302	294	2297		
	独自の価格 帯区分なし	1億3,200万円以上	2	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5,500万円以上1億3,200万円未満	1	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2,750万円以上5,500万円未満	7	232	1	33	0	0	1	29	0	0	2	62		
		1,100万円以上2,750万円未満	8	131	1	11	1	18	0	0	1	18	3	47		
舗装		1,100万円未満	4	21	3	19	2	16	6	10	2	10	13	55		
	小計		22	1147	5	63	3	34	7	39	3	28	18	164		
	A	300万円以上	32	268	8	57	6	45	1	25	0	0	15	127		
	B	300万円未満	33	58	65	75	15	27	1	3	0	0	81	105		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法面	小計		65	326	73	132	21	72	2	28	0	0	96	232		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	橋梁補修		11	489	0	0	1	93	0	0	0	0	1	93		
	安全施設		0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	1	9		
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
電気 管			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	電気		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	管		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他		8	12	0	0	4	3	0	0	2	19	6	22		
合計			447	6211	128	1085	182	1191	42	210	65	349	417	2835		

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

嘉島町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計			
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期					
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額				
許可業種 土木一式 ()は下水道	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額												
	A	1,000万円以上(3,000万円以上)	14	556			0	0	4	168	2	93	0	25	6	286
	B	500万円以上1,000万円未満 (2,000万円以上3,000万円未満)	11	93			1	9	1	8	3	29	3	20	8	66
	(B')	(500万円以上2,000万円未満)	0	0			0	0	1	9	4	40	0	0	5	49
	C	500万円未満(500万円未満)	16	44			2	5	2	2	3	9	3	9	10	25
建築一式	小計		41	693			3	14	8	187	12	171	6	54	29	426
	A 1	1億3,200万円以上	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	2,750万円以上5,500万円未満	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	1,100万円以上2,750万円未満	2	35			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	1,100万円未満	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装	小計		2	35			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	1,000万円以上2,500万円未満	15	254			0	0	0	0	5	96	3	45	8	141
	B	330万円以上1,100万円未満	13	48			0	0	0	0	0	0	1	7	1	7
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法面 橋梁補修 安全施設 鋼構造物 電気 管 その他	小計		28	302			0	0	0	0	5	96	4	52	9	148
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0	2	18	0	0	2	18
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			71	1030	3	14	8	187	19	285	10	106	40	592		

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

益城町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度								小計	
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		件数	金額
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
土木一式	A 1	7,000万円以上	64	3322	8	619	7	1419	16	2409	19	2585	50	7032
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	31	453	5	69	11	199	3	40	3	46	22	354
	B	500万円以上1,500万円未満	31	170	5	25	1	9	3	17	3	24	12	75
	C	500万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		126	3945	18	713	19	1627	22	2466	25	2655	84	7461
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	1	475	1	236	1	3849	0	0	1	598	3	4683
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	4	163	0	0	0	0	0	0	2	129	2	129
	B	2,750万円以上5,500万円未満	1	40	0	0	0	0	1	44	0	0	1	44
	C	1,100万円以上2,750万円未満	2	38	0	0	0	0	0	0	2	40	2	40
	D	1,100万円未満	2	13	0	0	1	4	1	1	2	12	4	17
舗装	小計		10	729	1	236	2	3853	2	45	7	779	12	4913
	A	1,100万円以上	12	214	1	16	3	87	3	64	13	238	20	405
	B	330万円以上1,100万円未満	9	57	0	0	2	7	1	11	1	10	4	28
	C	330万円未満	2	7	1	3	1	2	0	0	1	1	3	6
法面	小計		23	278	2	19	6	96	4	75	15	249	27	439
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	橋梁補修		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気		0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	1	50
	管		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		43	1290	3	4	2	28	5	33	1	19	11	84
合計			202	6242	24	972	29	5604	33	2619	49	3752	135	12947

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

甲佐町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度										
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計		
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額			
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額											
	A	700万円以上	7	597	1	49	0	0	6	500	0	0	7	549	
	B	300万円以上4,000万円未満	23	658	1	32	5	137	1	33	0	0	7	202	
	C	2,000万円未満	43	590	3	26	0	0	2	29	2	31	7	86	
	D	700万円未満	68	261	8	36	8	31	9	38	3	10	28	115	
	小計		141	2106	13	143	13	168	18	600	5	41	49	952	
建築一式		等級設定なし	10	186	2	10	5	767	2	11	1	79	10	867	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
舗装	小計		10	186	2	10	5	767	2	11	1	79	10	867	
	A、B	700万円以上	6	78	0	0	0	0	1	24	0	0	1	24	
	C、D	700万円未満	8	19	1	6	1	2	0	0	0	0	2	8	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		14	97	1	6	1	2	1	24	0	0	3	32	
法面			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
橋梁補修			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全施設			2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気			1	2	1	10	0	0	5	63	0	0	6	73	
管			4	82	1	28	0	0	4	55	0	0	5	83	
その他		土木一式(発注形態不明のため金額のみ)	2	13	0	0	1	25	0	0	0	0	1	25	
合計			174	2494	18	197	20	962	30	753	6	120	74	2032	

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

山都町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度												小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期							
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額				
土木一式	A 1	5,500万円以上	11	782	0	0	0	0	0	0	1	114	1	114				
	A 2	1,100万円以上5,500万円未満	56	1,163	25	507	37	771	6	149	27	528	95	1,955				
	B	330万円以上1,100万円未満	157	891	41	249	17	112	12	72	31	178	101	611				
	C	330万円未満	304	522	73	137	5	10	9	13	68	133	155	293				
	小計		528	3,358	139	893	59	893	27	234	127	963	352	2,973				
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	B	2,750万円以上5,500万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	C	1,100万円以上2,750万円未満	2	27	0	0	0	0	2	33	0	0	2	33				
	D	1,100万円未満	6	22	0	0	0	0	1	3	3	8	4	11				
舗装	小計		8	49	0	0	0	0	3	36	3	8	6	44				
	A	1,100万円以上	6	134	1	47	0	0	0	0	0	0	1	47				
	B	330万円以上1,100万円未満	3	29	0	0	1	5	0	0	0	0	1	5				
	C	330万円未満	1	2	1	2	2	3	3	7	1	3	7	15				
	小計		10	165	2	49	3	8	3	7	1	3	9	67				
法面			27	479	1	2	2	16	7	32	0	0	10	50				
	橋梁補修		1	16	0	0	0	0	0	0	2	22	2	22				
	安全施設		2	3	1	34	0	0	1	6	0	0	2	40				
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	電気		3	13	1	10	0	0	0	0	2	3	3	13				
その他	管		4	19	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2				
			24	563	1	28	20	387	11	118	3	3	35	536				
	合計		607	4,665	145	1,016	84	1,304	52	433	139	994	420	3,747				

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。

※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。

※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

氷川町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A	1,000万円以上	11	214	3	93	7	130	5	115	0	0	15	338
	B	1,000万円未満	9	46	3	4	6	25	7	33	2	2	18	64
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		20	260	6	97	13	155	12	148	2	2	33	402
建築一式	A	全工事	2	134	1	25	0	0	0	0	0	0	1	25
	B	1,000万円未満	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		3	136	1	25	0	0	0	0	0	0	1	25
舗装	A	全工事	0	0	2	21	0	0	1	18	0	0	3	39
	B	500万円未満	5	15	5	10	2	7	2	5	0	0	9	22
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		5	15	7	31	2	7	3	23	0	0	12	61
	法面		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
橋梁補修		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管		0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2
その他		1	11	0	0	0	0	0	1	17	0	0	1	17
合計			29	422	15	155	15	162	16	188	2	2	48	507

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

芦北町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度												小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期							
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額				
土木一式	A 1	7,000万円以上	2	230			2	169	0	0	0	0	2	169				
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	2	56			1	46	1	43	1	19	3	108				
	B	500万円以上1,500万円未満	8	73			0	0	3	28	0	0	4	34				
	C	500万円未満	50	93			6	12	32	65	2	6	55	105				
	小計		62	452	16	28	9	227	36	136	3	25	64	416				
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0				
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0				
	B	2,750万円以上5,500万円未満	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0				
	C	1,100万円以上2,750万円未満	0	0			1	27	0	0	0	0	1	27				
	D	1,100万円未満	12	32	6	11	6	16	7	14	1	2	20	43				
舗装	小計		12	32	6	11	7	43	7	14	1	2	21	70				
	A	1,100万円以上	0	0			0	0	0	0	1	28	1	28				
	B	330万円以上1,100万円未満	2	11	1	6	1	5	0	0	0	0	2	11				
	C	330万円未満	7	11	3	3	2	3	1	4	0	0	6	10				
	小計		9	22	4	9	3	8	1	4	1	28	9	49				
法面																		
橋梁補修																		
安全施設																		
鋼構造物																		
電気																		
管																		
その他																		
合計			115	619	46	150	34	318	63	274	9	72	152	814				

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】 津奈木町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A（ＪＶ）	5,000万円以上	2	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	3,000万円以上5,000万円未満	2	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	1,000万円以上3,000万円未満	4	83	1	21	1	16	3	65	1	12	6	114
	C	1,000万円未満	25	59	6	8	11	11	8	19	4	2	29	40
	小計		33	410	7	29	12	27	11	84	5	14	35	154
建築一式	A（ＪＶ）	5,000万円以上	2	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	3,000万円以上5,000万円未満	4	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	1,000万円以上3,000万円未満	2	22	1	14	1	14	2	31	0	0	4	59
	C	1,000万円未満	10	24	0	0	4	9	2	10	0	0	6	19
	小計		18	331	1	14	5	23	4	41	0	0	10	78
舗装	A（ＪＶ）	5,000万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	3,000万円以上5,000万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	1,000万円以上3,000万円未満	1	17	0	0	2	24	0	0	0	0	2	24
	C	1,000万円未満	6	19	2	1	0	0	2	11	0	0	4	12
	小計		7	36	2	1	2	24	2	11	0	0	6	36
法面			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
橋梁補修			1	12	0	0	0	0	0	0	1	6	1	6
安全施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気			13	220	1	1	4	9	3	4	0	0	8	14
管			33	269	0	0	7	49	3	17	0	0	10	66
その他			7	91	1	1	1	3	7	77	0	0	9	81
合計			112	1369	12	46	31	135	30	234	6	20	79	435

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。

※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。

※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】 多良木町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度要約済		平成30年度												小計	
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期							
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
土木一式	A	2,000万円以上	2	53	0	0	0	0	1	20	1	39	2	59				
	B	500万円以上2,000万円未満	8	92	0	0	0	0	2	20	6	83	8	103				
	C	500万円未満	11	25	4	10	4	6	10	24	11	24	29	64				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	小計		21	170	4	10	4	6	13	64	18	146	39	226				
建築一式	A	2,500万円以上	1	33	0	0	0	0	2	68	0	0	2	68				
	B	500万円以上2,500万円未満	3	40	1	11	0	0	0	0	0	0	1	11				
	C	500万円未満	1	1	0	0	0	0	1	4	0	0	1	4				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
舗装	小計		5	74	1	11	0	0	3	72	0	0	4	83				
	A	1,000万円以上	2	24	1	12	2	24	2	28	1	14	6	78				
	B	500万円以上1,000万円未満	6	45	2	19	0	0	3	29	0	0	5	48				
	C	500万円未満	3	7	0	0	3	7	1	4	0	0	4	11				
	小計		11	76	3	31	5	31	6	61	1	14	15	137				
法面			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
橋梁補修			2	12	0	0	0	0	3	22	0	0	3	22				
安全施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
電気			7	33	0	0	0	0	2	18	0	0	2	18				
管			9	50	1	16	3	11	5	41	0	0	9	68				
その他			5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計			60	428	9	68	12	48	32	278	19	160	72	554				

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。

※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。

※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

湯前町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別				平成29年度契約済		平成30年度											
						第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計			
						件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額				
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分		件数	金額	0	0	0	0	1	39	1	22	0	0	2	61
	A 1	2,000万円以上		0	0	0	0	0	0	0	0	5	55	0	0	5	55
	A 2	500万円以上2,000万円未満		9	80	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	4	8
	B	500万円未満		1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築一式	小計			10	82	0	0	0	39	10	85	0	0	11	124	0	124
	A 1	2,500万円以上		1	40	1	28	0	0	0	0	0	0	1	28	0	28
	A 2	500万円以上2,500万円未満		5	82	1	18	1	18	1	7	1	17	4	60	0	60
	B	500万円未満		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計			6	122	2	46	1	18	1	7	1	17	5	88	2	34
	A	1,000万円以上		2	35	2	34	0	0	0	0	0	0	2	34	0	0
	B	500万円以上1,000万円未満		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	500万円未満		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法面	小計			2	35	2	34	0	0	0	0	0	0	2	34	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	橋梁補修			2	24	0	0	0	0	1	15	0	0	1	15	0	0
	安全施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気 管 その他				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計				20	263	4	80	2	57	16	158	1	17	23	312	0	0

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

水上村

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度											
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計			
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A	3,000万円以上	0	0	1	44	0	0	0	0	0	0	0	0	1	44
	B	200万円以上3,000万円未満	13	121	3	35	0	0	12	81	5	51	20	167		
	C	200万円未満	2	2	0	0	0	0	5	7	0	0	5	7		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計		15	123	4	79	0	0	17	88	5	51	26	218		
建築一式	A	3,000万円以上	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	200万円以上3,000万円未満	7	57	1	21	3	36	3	48	0	0	7	105		
	C	200万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
舗装	小計		8	90	1	21	3	36	3	48	0	0	7	105		
	A	1,000万円以上	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	1	13		
	B	200万円以上1,000万円未満	3	24	1	2	0	0	1	5	0	0	2	7		
	C	200万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計		3	24	1	2	1	13	1	5	0	0	3	20		
法面			0	0	1	67	0	0	1	12	0	0	2	79		
橋梁補修			1	16	0	0	1	55	0	0	2	67	3	122		
安全施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
電気			4	77	0	0	2	16	2	93	2	17	6	126		
管			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他			3	17	2	3	3	14	0	0	0	0	5	17		
合計			34	347	9	172	10	134	24	246	9	135	52	687		

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

相良村

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A	4,000万円以上	2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	1,000万円以上4,000万円未満	4	105	0	0	0	0	4	107	1	29	5	136
	C	1,000万円未満	8	11	1	1	0	0	7	23	4	21	12	45
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築一式	小計		14	276	1	1	0	0	11	130	5	50	17	181
	A	5,000万円以上	1	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	1,000万円以上5,000万円未満	2	61	0	0	0	0	1	20	0	0	1	20
	C	1,000万円未満	8	16	0	0	0	0	3	9	0	0	3	9
舗装			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		11	350	0	0	0	0	4	29	0	0	4	29
	A	1,000万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	500万円以上1,000万円未満	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	500万円未満	1	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	小計		2	10	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
法面			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
橋梁補修			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気			7	54	0	0	0	0	1	6	0	0	1	6
管			7	48	0	0	0	0	8	2	2	3	10	5
その他			3	88	0	0	0	0	1	25	1	17	2	42
合計			44	826	1	1	0	0	26	193	8	70	35	264

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

五木村

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A	3,000万円以上	3	128										
	B	600万円以上3,000万円未満	8	122										
	C	600万円未満	21	27										
			0	0										
	小計		32	277										
建築一式	A	7,000万円以上	1	259										
	B	2,000万円以上7,000万円未満	1	32										
	C	2,000万円未満	1	5										
			0	0										
			0	0										
舗装	小計		3	296										
	A	2,000万円以上	2	57										
	B	500万円以上2,000万円未満	1	12										
	C	500万円未満	0	0										
	小計		3	69										
法面			0	0										
橋梁補修			2	17										
安全施設			0	0										
鋼構造物			0	0										
電気	A C	A 2,000万円以上 C 500万円未満	3	30										
管	C	500万円未満	0	0										
その他			8	233										
合計			51	922	7	21	11	495	12	169	18	268	48	953

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

山江村

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	0	0	1	133	0	0	0	0	1	133
	A	3,000万円以上	1	127										
	B	500万円以上3,000万円未満	5	72	1	9	3	19	0	0	4	28	8	56
	C	500万円未満	2	4	0	0	0	0	0	0	8	25	8	25
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築一式	小計		8	203	1	9	4	152	0	0	12	53	17	214
	A	3,000万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	500万円以上3,000万円未満	8	117	0	0	1	26	0	0	0	0	1	26
	C	500万円未満	2	7	0	0	2	4	0	0	0	0	2	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装	小計		10	124	0	0	3	30	0	0	0	0	3	30
	A	3,000万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	500万円以上3,000万円未満	1	10	1	11	1	7	0	0	0	0	2	18
	C	500万円未満	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2
	小計		2	15	2	13	1	7	0	0	0	0	3	20
法面			1	12	0	0	1	15	0	0	1	7	2	22
橋梁補修			0	0	0	0	1	40	0	0	0	0	1	40
安全施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管			3	12	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2
その他			6	45	1	42	2	15	1	3	0	0	4	60
合計			30	411	5	66	12	259	1	3	13	60	31	388

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

球磨村

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度													
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計					
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額						
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額														
	A 1	7,000万円以上	1	74	0	0	0	0	0	0	1	74	1	74	1	74		
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	4	152	0	0	3	121	5	181	0	0	0	0	8	302		
	B	500万円以上1,500万円未満	7	77	0	0	2	14	3	28	0	0	0	0	5	42		
	C	500万円未満	37	56	5	10	19	18	9	20	6	14	39	62				
	小計		49	359	5	10	24	153	17	229	7	88	53	480				
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	1	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B	2,750万円以上5,500万円未満	3	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C	1,100万円以上2,750万円未満	2	38	1	20	3	44	0	0	0	0	4	64				
	D	1,100万円未満	2	14	0	0	0	0	2	8	0	0	2	8				
舗装	小計		8	313	1	20	3	44	2	8	0	0	6	72				
	A	1,100万円以上	1	16	0	0	1	13	0	0	0	0	1	13				
	B	330万円以上1,100万円未満	8	50	1	10	0	0	1	5	0	0	2	15				
	C	330万円未満	5	8	1	1	2	5	2	2	0	0	5	8				
	小計		14	74	2	11	3	18	3	7	0	0	8	36				
法面			4	23	1	5	1	25	3	29	4	99	9	158				
	橋梁補修		1	8	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				
	安全施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	電気		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
管 その他			2	5	0	0	1	20	0	0	0	0	1	20				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	合計		78	782	9	46	32	260	25	273	12	188	78	767				

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

あさぎり町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別			平成29年度契約済		平成30年度									
					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計	
					件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額		
許可業種 土木一式	発注等級	左記発注等級価格区分	件数	金額	0	0	2	55	0	0	1	21	3	76
	A	1,500万円以上	5	151	0	0	1	11	1	13	0	0	2	24
	B	1,000万円以上1,500万円未満	2	23	0	0	1	11	1	13	0	0	2	24
	C	1,000万円未満	30	120	8	11	4	15	18	66	4	7	34	99
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築一式	小計		37	294	8	11	7	81	19	79	5	28	39	199
	A	2,500万円以上	3	427	5	159	2	143	0	0	0	0	7	302
	B	500万円以上2,500万円未満	12	173	7	125	4	52	2	21	0	0	13	198
	C	500万円未満	11	9	4	2	2	5	4	4	0	0	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		26	609	16	286	8	200	6	25	0	0	30	511
	A	900万円以上	19	228	1	13	2	20	4	46	0	0	7	79
	B	300万円以上900万円未満	10	65	1	6	5	27	4	24	0	0	10	57
	C	300万円未満	1	2	1	1	0	0	3	4	0	0	4	5
法面	小計		30	295	3	20	7	47	11	74	0	0	21	141
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	橋梁補修		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気 管			8	35	3	2	9	16	6	11	0	0	18	29
			10	64	1	1	5	12	2	4	0	0	8	17
			30	129	2	1	11	107	14	74	2	2	29	184
	その他													
	合計			141	1426	33	321	47	463	58	267	7	30	145

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。

※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。

※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

様式 6

【自治体名】

苓北町

(表-1)

金額単位：百万円

発注価格帯別				平成29年度契約済		平成30年度								
						第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		小計
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A	1,500万円以上	7	175	0	0	3	188	2	68	1	35	6	291
	B	300万円以上1,500万円未満	12	94	0	0	1	6	1	15	4	27	6	48
	C	300万円未満	11	17	0	0	1	2	1	3	0	0	2	5
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		30	286	0	0	5	196	4	86	5	62	14	344
建築一式	A	1,500万円以上	1	43	0	0	0	0	1	28	0	0	1	28
	B	1,500万円未満	2	11	0	0	1	14	1	3	0	0	2	17
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舗装	小計		3	54	0	0	1	14	2	31	0	0	3	45
	ランクなし	価格指定なし	5	25	1	2	0	0	2	11	0	0	3	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		5	25	1	2	0	0	2	11	0	0	3	13
法面			0	0	0	0	3	15	0	0	0	0	3	15
	橋梁補修	価格指定なし	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鋼構造物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	管	価格指定なし	4	13	2	21	3	8	0	0	0	0	6	32
	ランクなし	価格指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計		44	396	3	23	12	233	8	128	6	65	29	449

※平成31年度以降の通常事業分は含まない。
※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。
※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

【議題 4】

「建設資機材や労働力の確保に関する
現状と課題について」

・ 国土交通省九州地方整備局

熊本県における 建設資材需給価格動向・建設労働者需給動向について

報告書

(平成31年1月版)

復旧事業円滑化官民ネットワーク

本アンケートの概要

1. 本アンケートの概要

平成28年熊本地震の発生に伴い、今後、熊本県内において、多くの災害復旧・復興工事の発注が見込まれ、これに伴い建設資材、仮設材、建設機械等の需給、価格動向及び建設労働者の需給動向に急激な変化が生じれば、円滑な工事発注、施工に影響が生じる恐れがある。このため、熊本県内の被災地区における建設資材等の需給、価格動向については、当面特に注視していく必要がある。

本資料は、前述の必要性から建設資材等の需給、価格動向を把握するために、復旧事業円滑化官民ネットワークの構成機関等が実施するアンケート結果をとりまとめたものである。

【用語説明】

1. 復旧事業円滑化官民ネットワークとは


熊本地震で被災した地域の復旧・復興に向けて、今後不足が懸念される建設資材及び人手の需給状況に関するきめ細かい情報を得て、今後の復旧・復興の支援をはかるために構成された機関。

なお、九州管内の専門工事業団体、建設業団体、資材業団体、各県、各政令市及び九州地方整備局で構成され、平成28年6月20日に設置された。（詳細は、平成28年6月20日付けで九州地方整備局ホームページに掲載した記者発表資料「復旧事業円滑化官民ネットワーク」の設置について」を参照。）

2. 被災地区とは

比較的被害の大きかった次の地区を主とし、県内のその他の地区も含むものとする。

熊本市、西原村、嘉島町、益城町、御船町、甲佐町、大津町、菊陽町
阿蘇市、南阿蘇村、高森町、山都町、宇土市、宇城市、美里町

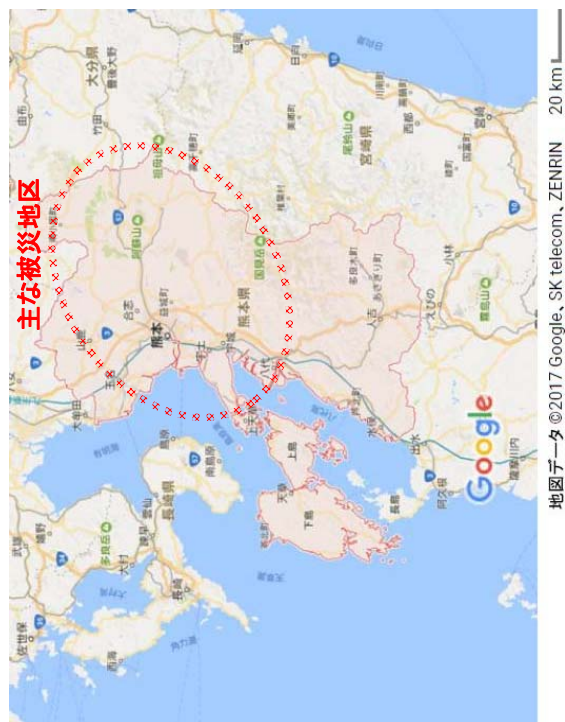

地図データ ©2017 Google, SK telecom, ZENRIN 20 km

2. 建設資材の品目及び建設労働者の職種

1) 公共工事での主要な建設資材である下表の品目をアンケートの対象とする。

＜建設資材＞・・・16品目

セメント・生コン	1	セメント	普通ポルトランド バラ物
	2	生コンクリート	28日強度 21N スランプ18cm 最大骨材寸法25mm以下
骨材	3	砂	洗・荒目
	4	碎石	クラッシャーラン C-40
	5	再生碎石	再生クラッシャーラン RC-40
アスファルト合材	6	新材	密粒度13
	7	再生	密粒度13
鋼材	8	異形棒鋼	SD295A D16
	9	H形鋼	(高さ)200mm×(幅)100mm×(厚)5.5mm×(厚)8mm
木材	10	杉正角・特1等	(長さ)3.0m×(厚さ)10.5cm×(幅)10.5cm
	11	型枠用合板 塗装品	(厚)12.0mm×(幅)900mm×(長さ)1,800mm
	12	構造用合板 特類	(厚)12.0mm×(幅)910mm×(長さ)1,820mm
石油	13	軽油	1,2号
粘土がわら	14	陶器瓦	
仮設鋼材	15	敷鉄板	リース
建設機械	16	ラフテレーンクレーン	リース

2) 公共工事での主要な建設労働者である下表の職種をアンケートの対象とする。

＜建設労働者＞・・・10職種

1	型枠工	2	左官	3	とび工	4	鉄筋工	5	特殊作業員
6	普通作業員	7	軽作業員	8	運転手(特殊)	9	運転手(一般)	10	交通誘導員

3. アンケート内容

建設資材及び建設労働者に対するアンケート内容は次のとおりである。
なお、本アンケートは毎月10日までの状況を取りまとめたものである。

- 1) アンケート対象業者は、次の(1)から(4)の各項目について、5段階評価または4段階評価で数値回答する。
- 2) 回答で得られた数値を各建設資材別、各建設労働者別に区分し、それぞれの平均値を求める。
※(計算例) 現在の価格動向について、A社の回答：「3-横ばい」、B社の回答：「4-やや上昇」、C社の回答：「4-やや上昇」の場合、
平均値 = $(3 + 4 + 4) / 3 \div 3.70$ (少数第三位を四捨五入)
- 3) 得られた各平均値について、各判定基準に基づき判定を行う。
※(判定例) 5段階評価の各数値の中間値で区分する。3. 5超 ~ 4. 5以下は、「やや上昇」と区分するので、現在の価格動向での平均値3. 7は、「やや上昇」と判定する。

<建設資材>

- (1) 価格動向(現在及び3ヶ月先)
(1-下落 ・ 2-やや下落 ・ 3-横ばい ・ 4-やや上昇 ・ 5-上昇)
- (2) 需給動向(現在及び3ヶ月先)
(1-緩和 ・ 2-やや緩和 ・ 3-均衡 ・ 4-ややひっ迫 ・ 5-ひっ迫)
- (3) 在庫状況(現在)
(1-豊富 ・ 2-普通 ・ 3-やや品不足 ・ 4-品不足)

<建設労働者>

- (4) 労働者確保の難易度(現在及び3ヶ月先)
(1-困難 ・ 2-やや困難 ・ 3-普通 ・ 4-やや容易 ・ 5-容易)

【用語説明】

- | | |
|---------|----------------------------|
| 「緩和」 | とは品物が豊富で即納が出来る場合 |
| 「やや緩和」 | とは品物が比較的豊富で比較的速やかに納入が出来る場合 |
| 「均衡」 | とは所定の期限内に必要な量の納入が可能な場合 |
| 「ややひっ迫」 | とは品不足等で納入がやや遅れる場合 |
| 「ひっ迫」 | とは品不足等で納入が著しく遅れる場合 |

(5) 判定基準

◆建設資材

＜価格動向の判定基準＞

平均値	判定
4.5超～5.0以下	上昇
3.5超～4.5以下	やや上昇
2.5超～3.5以下	横ばい
1.5超～2.5以下	やや下落
1.0以上～1.5以下	下落

＜需給動向の判定基準＞

平均値	判定
4.5超～5.0以下	ひっ迫
3.5超～4.5以下	ややひっ迫
2.5超～3.5以下	均衡
1.5超～2.5以下	やや緩和
1.0以上～1.5以下	緩和

＜在庫状況の判定基準＞

平均値	判定
3.5超～4.0以下	品不足
2.5超～3.5以下	やや品不足
1.5超～2.5以下	普通
1.0以上～1.5以下	豊富

◆建設労働者

＜需給動向(労働者確保の難易)の判定基準＞

平均値	判定
1.0以上～1.5以下	困難
1.5超～2.5以下	やや困難
2.5超～3.5以下	普通
3.5超～4.5以下	やや容易
4.5超～5.0以下	容易

4. 各アンケート対象者数及び回答数

アンケートの全対象者数は、建設資材が152社で建設労働者が42社である。

なお、アンケート対象者は、被災地区に所在、または販売エリア、施工エリアを有する資材販売業者、建設業者等である。

＜建設資材＞

品目別に、35から80社に依頼し、回答率は、2割から6割程度であった。

＜建設労働者＞

職種別に、25から40社に依頼し、回答率は、4割から6割程度であった。

アンケート結果一覧表【1月】

下表のアンケート結果は、建設資材・建設労働者の需給・価格動向等について得られた数値回答の平均値を各々の判定基準に基づき判定したものである。なお、アンケート結果として便宜上、数値回答平均値を区分して一つの判定を記載しているが、区分の境界ではわずかな数値の違いで判定が変動する可能性がある。また、各アンケート対象者からの回答は、需要側・供給側の立場や、工事条件・取引条件の違い等の回答者の個別事情を有しており、必ずしも地域の実情を網羅し、代表したものではない可能性がある。このアンケート結果の取り扱いには注意する必要がある。

なお、コメント欄については、「本アンケートの実施要領」に基づくアンケートとは別に（一社）熊本県建設業協会が会員企業を対象に実施したアンケート結果を記載している。アンケート対象者や調査方法等の違いにより、価格動向・需給動向・在庫状況欄とコメント欄は内容が異なる場合がある。

◆建設資材(1/3)

※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

	価格動向		需給動向		在庫状況		コメント (アンケート対象者や調査方法等の違いにより、価格動向・需給動向・在庫状況欄と内容が異なる場合がある。また、先月からの変更箇所は赤字としている。)
	前月比	現在 (前月に比べて)	前月比	現在	前月比	現在	
セメント	➡	横ばい	➡	均衡	—	—	
生コンクリート	➡	横ばい	➡	ややひっ迫	—	—	・現状ひっ迫状況にあり、手待ち状況にある現場も多々ある。 ・生コンの配達に合わせて仕事の内容を検討しなくてはならず、前もって予約をしても時間通りには来なく、手間待ちが発生している。 ・予定を入れても、時間通りの納入が出来ていない。 ・今のところ問題ないが、生コン車の運転手が足りない状況。 ・通常より多少納期はかかるが納入出来ている。価格は現状維持だが、今後価格上昇する可能性がある。
砂	➡	横ばい	➡	均衡	➡	豊富	・納入出来ている。災害復旧で山間部の工事が多いが、吹付け用砂等は遠隔地のために配達料が上昇している。また、10tダンプで配達できない地区が有り、小型ダンプに積替え運搬となり割高となっている。
碎石	➡	横ばい	➡	均衡	➡	普通	・製造会社が少なくなっており、工事発注量次第では不足の恐れがある。
再生碎石	➡	横ばい	➡	均衡	➡	普通	2.00
アスファルト合材(新材)	➡	横ばい	➡	均衡	—	—	・年度末に向けややひっ迫している。 ・運搬ダンプトラックの不足により1日の施工量が制限されている。ダンプトラック単価の上昇に伴い、アスファルト合材に転嫁されている。 ・需給は何とか間に合っている。価格は運賃などの上昇により全体的に上昇気味。
アスファルト合材(再生材)	➡	横ばい	➡	均衡	—	—	
異形棒鋼	➡	横ばい	➡	均衡	➡	普通	2.00
H形鋼	➡	横ばい	➡	均衡	➡	普通	2.00

アンケート結果一覧表【1月】

◆建設資材(2/3) ※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

	価格動向		需給動向		在庫状況		コメント (アンケート対象者や調査方法等の違いにより、価格動向・需給動向・在庫状況欄と内容が異なる場合がある。また、先月からの変更箇所は赤字としている。)
	前月比	現在 (前月に比べて)	前月比	現在	前月比	現在	
		数値回答 平均値		数値回答 平均値		数値回答 平均値	
杉正角・特1等	➡	横ばい	➡	均衡	➡	普通	
型枠用合板 塗装品	➡	横ばい	➡	均衡	➡	普通	
構造用合板 特類	➡	横ばい	➡	均衡	➡	普通	
軽油	➡	横ばい	➡	均衡	➡	普通	
陶器瓦	➡	横ばい	➡	均衡	➡	普通	
敷鉄板	➡	横ばい	➡	ややひっ迫	↗	品不足	・一旦返却すると再リースが困難なため、コストは掛かるが返却せず確保している状況。 ・全く確保できないため県外(福岡)にて確保している状況。
ラフデレーンクレーン	➡	横ばい	➡	均衡	➡	やや品不足	・阿蘇地域に2社しか会社が無く、今後は確保困難になると思われる。
ダンプトラック	-	-	-	-	-	-	・台数の確保困難が続いており、県外各地よりチャーターしている。 ・県外(三重県・愛知県・佐賀県)・県内(天草)より確保。通常運賃に加え、宿泊費・赴任・帰省・食事補助などの手当ての費用が発生している。 ・手配するのが非常に困難な状況。 ・今後不足状況となる。県内価格も上昇しており、福岡県内の価格も上昇すると思われる。 ・不足している状況。熊本及び城南の工事の単価が高くなっていて玉名でも高い金額が要求されている状況。 ・不足している。 ・ダンプトラック(3t～4tクラス)がリースでも不足している状況。 ・解体廃材搬出は一段落しつつあるが、河川災害復旧工事が本格化しており不足状態が続くと 思われる。 ・管内各会社、熊本方面に数台毎出張されており、舗装・路面切削時等一現場で多数必要な場合、不足して日程調整をする必要がある。(合材プラントは出荷できてもダンプトラックが不足する為。)
バックホウ	-	-	-	-	-	-	・不足しており、確保出来ない状態。価格は今後上昇すると思われる。 ・小型BH(0.1m3～0.2m2クラス)がリースでも不足している状況。 ・機種によって確保困難であり、今後の発注工事増大により不足状態が見込まれる。 ・リースに空きがある状況。 ・大さき問わず、熊本県内での確保は困難である。今後必要となる機械に関しては、事前に福岡県内で、1～2ヶ月前から仮押さえして対応している(リース代は発生)
ポンプ車	-	-	-	-	-	-	・今後の発注により不足状況となり、確保が困難になると思われる。 ・県外(宮崎県)より確保している。今後は九州全県不足すると思われる。

アンケート結果一覧表【1月】

◆建設資材(3/3)

※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

	価格動向		需給動向		在庫状況		コメント (アンケート対象者や調査方法等の違いにより、価格動向・需給動向・在庫状況欄と内容が異なる場合がある。また、先月からの変更箇所は赤字としている。)
	前月比	現在 (前月に比べて)	前月比	現在	数値回答 平均値	数値回答 平均値	
コンクリート二次製品	—	—	—	—	—	—	・災害関係の工事増加のため、運搬車両及び品物が不足している。
足場材	—	—	—	—	—	—	
仮設H形鋼	—	—	—	—	—	—	・全く確保できないため県外(福岡)にて確保している状況。
散水車	—	—	—	—	—	—	・機材不足。散水車を運転する人材も不足状態。
除雪機械	—	—	—	—	—	—	・腐食や摩耗が激しく、修理のたびに部品交換となるために機械にかかる経費が負担となっている。経費の計上をお願いしたい。
コンクリート殻	—	—	—	—	—	—	・コンクリート殻の受け入れが困難である。受け入れをして頂けないところが多い状況。
切削機	—	—	—	—	—	—	
発電機・水中ポンプ	—	—	—	—	—	—	・今のところスムーズに供給できているが、今後河川水路工事に伴い供給困難に陥ると思われる。現在価格上昇なし。今後、上昇すると思われる。

◆建設労働者(1/2)

※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

職種	需給動向 (労働者確保の難易)		価格動向		在庫状況		コメント (アンケート対象者や調査方法等の違いにより、需給動向欄と内容が異なる場合がある。また、先月からの変更箇所は赤字としている。)
	前月比	現在	前月比	現在	数値回答 平均値	数値回答 平均値	
型枠工	➡	やや困難	2.21	—	—	—	・工事が発注され始めたので不足。現場はなかなか予定が立てられない。 ・復旧工事等発注工事が増大しており逼迫している。 ・新規採用募集を出しても応募が無く、絶対数が足りない状況で元社員を再雇用(60才以上)している状況。価格を上げても、確保が困難な状況。
左官	➡	やや困難	2.29	—	—	—	・不足状態。 ・新規採用募集を出しても応募が無く、絶対数が足りない状況で元社員を再雇用(60才以上)している状況。価格を上げても、確保が困難な状況。
とび工	➡	やや困難	2.38	—	—	—	・新規採用募集を出しても応募が無く、絶対数が足りない状況で元社員を再雇用(60才以上)している状況。価格を上げても、確保が困難な状況。
鉄筋工	➡	やや困難	2.29	—	—	—	・現在もひっ迫状況であり、各現場手待ちが生じているので工程の遅れに影響している。 ・建築物件の需要増に影響され、土木工事でも不足状況となっている。 ・新規採用募集を出しても応募が無く、絶対数が足りない状況で元社員を再雇用(60才以上)している状況。価格を上げても、確保が困難な状況。
特殊作業員	➡	やや困難	2.21	—	—	—	・各地域での人材不足が継続している。 ・新規採用募集を出しても応募が無く、絶対数が足りない状況で元社員を再雇用(60才以上)している状況。価格を上げても、確保が困難な状況。 ・工程上必要な班数を確保できず、工程に遅れを生じさせている。価格は今後上昇すると思われる。

アンケート結果一覧表【1月】

◆建設労働者(2/2) ※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

職 種	需給動向 (労働者確保の難易)		コメント (アンケート対象者や調査方法等の違いにより、需給動向欄と内容が異なる場合がある。また、先月からの変更箇所は赤字としている。)
	前月比	現在	
普通作業員	➡	やや困難	2.13 ・完全な不足状態。価格については今後上昇すると思われる。 ・人材不足の為、協力会社に依頼するが、市町村の災害関連運工事も発注され金額を上乗せしても確保出来ない状況。今後、上昇すると思われる。 ・県内他地区より確保しているが、今後確保は困難と考えられる。又、県外(鹿児島)にも要請しているが全く確保できない状態。 ・需給状況に変化はなく現在も人手不足が続いている。 ・不足状況にあるが、確保できている。今後は確保困難になると思われる。 ・年度末まで現段階で不足となっている。 ・いろいろなルートで募集をしているが応募がなく、賃金などの条件をよくしても応募がない状況。また、上昇前の価格で契約している会社もあり、急な価格上昇は難しい事もある。価格を上げたからといってすぐに確保出来るわけでも無い現状もある。 ・近隣より手配するのは非常に困難な状況。 ・熊本県と福岡県で確保出来ているが、今後は不足状況となる。 ・全体的に不足している。新たに求人しても応募が無い状況。人件費は上昇しており、お金を出しても確保が困難な状況。 ・新規採用募集を出しても応募が無く、絶対数が足りない状況で元社員を再雇用(60才以上)している状況。価格を上げてても、確保が困難な状況。
軽作業員	➡	やや困難	2.38 ・新規採用募集を出しても応募が無く、絶対数が足りない状況で元社員を再雇用(60才以上)している状況。価格を上げてても、確保が困難な状況。
運転手(特殊)	➡	やや困難	2.31 ・慢性的に不足状態。機械は調達可能であるが、オペレーターの不足により不稼働状態。 ・不足しており、確保出来ない状態。価格は今後上昇すると思われる。 ・常に不足状態。機械は調達可能であるが、オペレーターの不足により不稼働状態。オペレーターも高齢化が進んでいるため来年以降が心配。 ・期間限定で県外(佐賀)から確保
運転手(一般)	➡	やや困難	2.43
交通誘導員	➡	やや困難	1.80 ・県内から確保しているが、今後は不足状況となる。 ・不足状況にあり、確保も困難な状況。今後も確保困難になると思われる。 ・慢性的に不足状態。九州全域不足状態につき県外からの確保も困難。第3四半期より第4四半期にかけて本格化するにあたり、深刻な不足状態が見込まれる。 ・手配困難な状況は解消されていない。自社誘導にも限りが生じている。 ・現在、年末・年度末竣工の工事に加え大型工事での需要が増えてきている。慢性的な人手不足のため値上げの動きがある。 ・絶対数が足りない状況のため、スポット的に警備保障会社に依頼しても人員確保が困難である。そのために困り込みを行って確保しているので余分な費用が発生している。(施工に必要な期間以外も常時確保している状況) ・確保が困難。年始から年度末は配置計画を立案し、早急に警備会社に提出しないと逼迫状況になる。 ・警備会社も慢性的な人手不足。自社作業員で誘導員の代替えを行っている現場もある。(協議了承済み)。取引価格の上昇も懸念されるが、人員が不足している。お金を出しても人がいない状態。
ブロック工	—	—	— ・県内は完全な不足。価格も高騰し始めている。(特に常用単価の高騰) ・不足状態。個人で請負されている方に当たっても確保できない状況。
大工	—	—	— ・年度末工期の工事が多く、3月中旬まではこれまでに以上の逼迫状況が続くと思われる。
石工	—	—	— ・不足している状況。価格は今後上昇すると思われる。 ・従来からの担い手不足に加えて不足状況にある。今後はさらに確保が困難になると思われる。
配管工	—	—	— ・県外業者にもあたってはいるが、逼迫状況で手配が困難である。

アンケート結果一覧表【3ヶ月先の見通し】

下表のアンケート結果は、建設資材・建設労働者の需給・価格動向等について得られた数値回答の平均値を各々の判定基準に基づき判定したものである。なお、アンケート結果として便宜上、数値回答平均値を区分して一つの判定を記載しているが、区分の境界ではわずかな数値の違いで判定が変動する場合がある。また、各アンケート対象者からの回答は、需要側・供給側の立場や、工事条件・取引条件の違い等の回答者の個別事情を有しており、必ずしも地域の実情を網羅し、代表したものではない可能性があり、このアンケート結果の取り扱いには注意する必要がある。

◆建設資材

	価格動向		需給動向	
	前月比	3ヶ月先 数値回答 平均値	前月比	3ヶ月先 数値回答 平均値
セメント	➡	横ばい 3.37	↗	ややひっ迫 3.56
生コンクリート	↗	やや上昇 3.51	➡	ややひっ迫 3.61
砂	➡	横ばい 3.19	➡	均衡 3.19
碎石	➡	横ばい 3.16	➡	均衡 3.00
再生碎石	➡	横ばい 3.19	➡	均衡 3.19
アスファルト合材(新材)	➡	横ばい 3.38	➡	均衡 2.95
アスファルト合材(再生材)	➡	横ばい 3.35	➡	均衡 3.15
異形棒鋼	➡	横ばい 3.10	➡	均衡 3.15
H形鋼	➡	横ばい 3.50	➡	均衡 3.50
杉正角・特1等	➡	横ばい 3.13	➡	均衡 3.13
型枠用合板 塗装品	➡	横ばい 3.17	➡	均衡 3.06
構造用合板 特類	➡	横ばい 3.00	➡	均衡 3.00
軽油	➡	横ばい 2.95	➡	均衡 2.95
陶器瓦	↗	横ばい 3.45	➡	均衡 2.82
敷鉄板	➡	横ばい 3.17	↘	均衡 3.50
ラフテレーンクレーン	➡	横ばい 3.09	➡	均衡 3.27

※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

◆建設労働者

職 種	需給動向 (労働者確保の難易)	
	前月比	3ヶ月先
型枠工	➡	やや困難
左官	➡	やや困難
とび工	➡	やや困難
鉄筋工	➡	やや困難
特殊作業員	➡	やや困難
普通作業員	➡	やや困難
軽作業員	➡	やや困難
運転手(特殊)	➡	やや困難
運転手(一般)	➡	やや困難
交通誘導員	➡	やや困難

※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

アンケート結果一覧表【経過】

[illegible][illegible]


アンケート結果一覧表【経過】

[illegible]


◆建設資材(在庫状況)

[illegible]


建設資材価格動向 〈セメント、生コンクリート、アスファルト合材(新材、再生材)〉

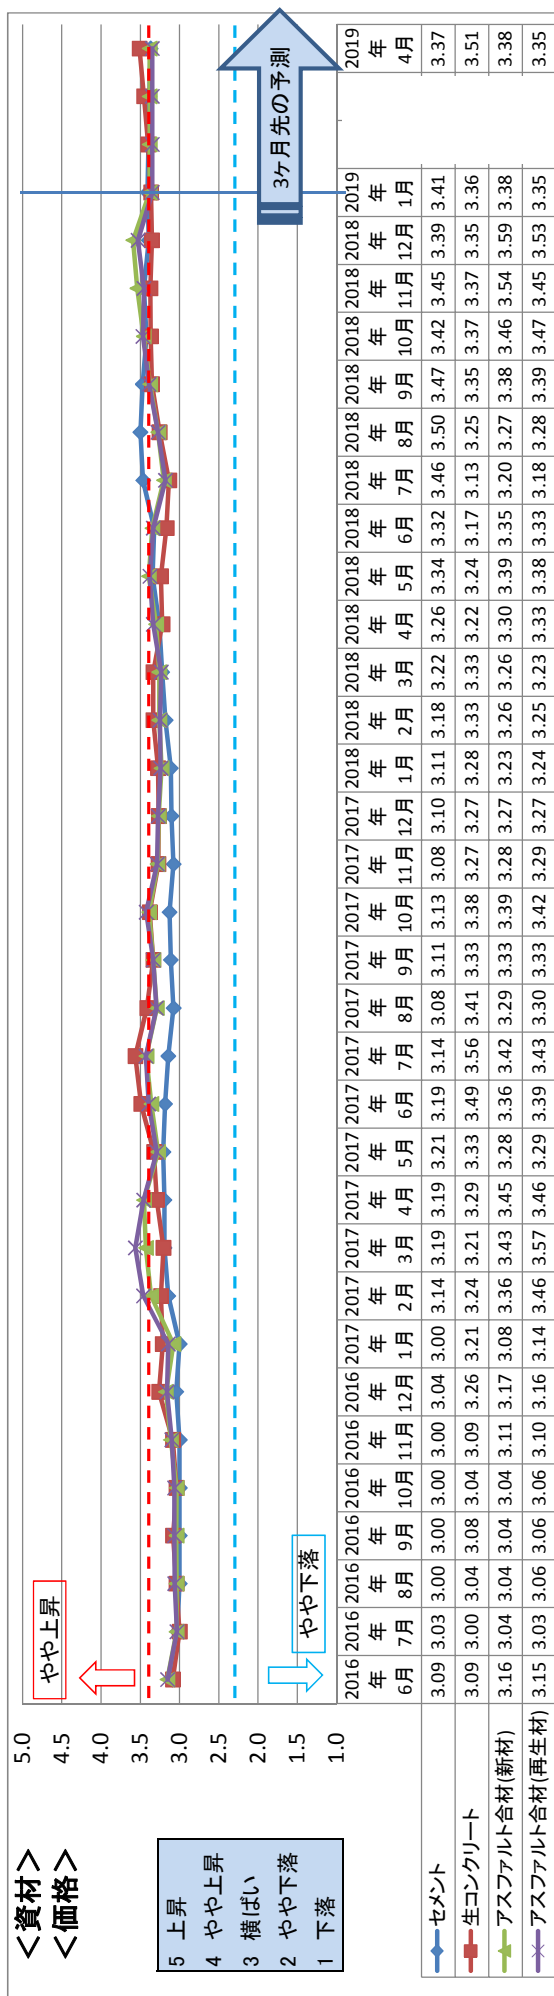


建設資材価格動向 〈砂、碎石、再生碎石、軽油〉

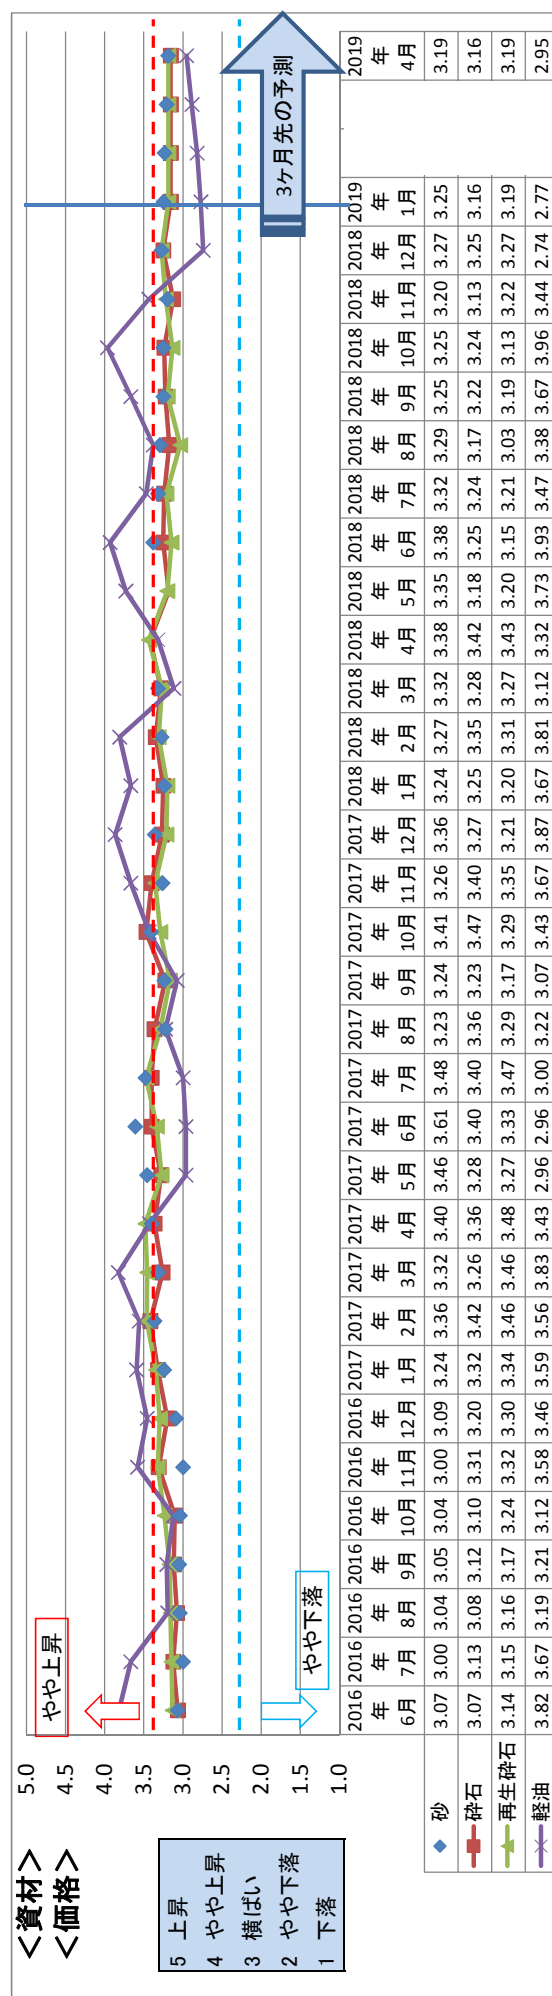


建設資材価格動向 〈異形棒鋼、H形鋼、敷鉄板、ラフテレーンクレーン〉

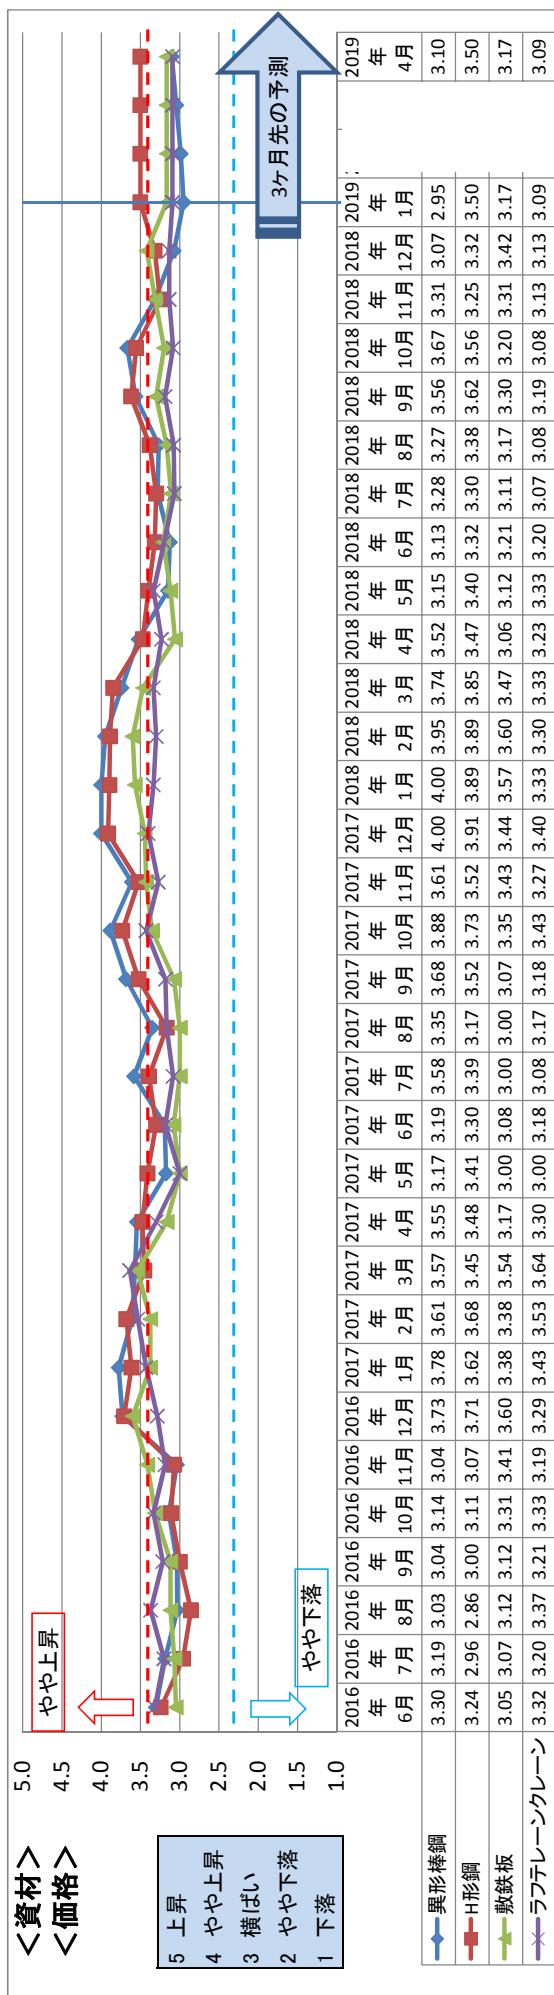


建設資材価格動向 〈杉正角、型枠用合板、構造用合板、陶器瓦〉

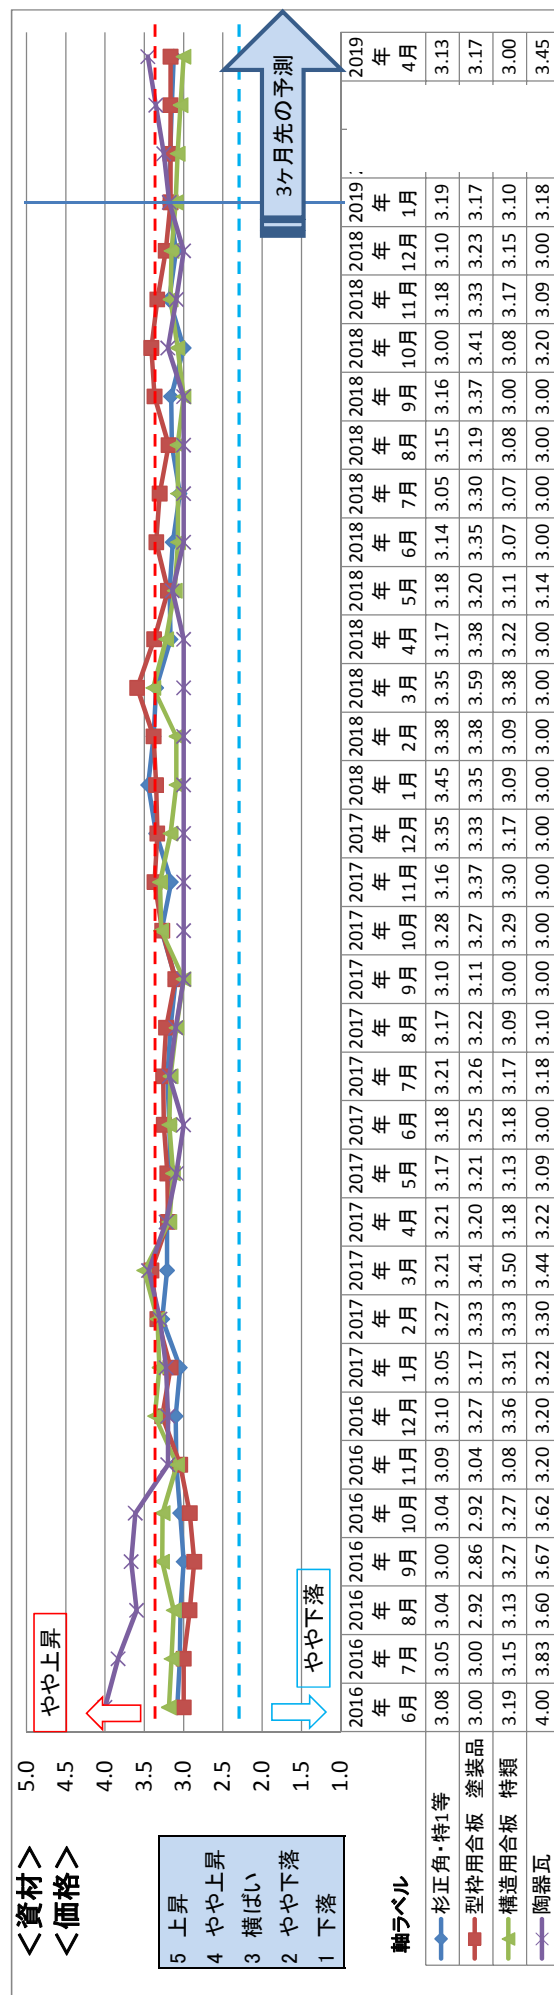


建設資材需給動向（セメント、生コンクリート、アスファルト合材（新材、再生材））

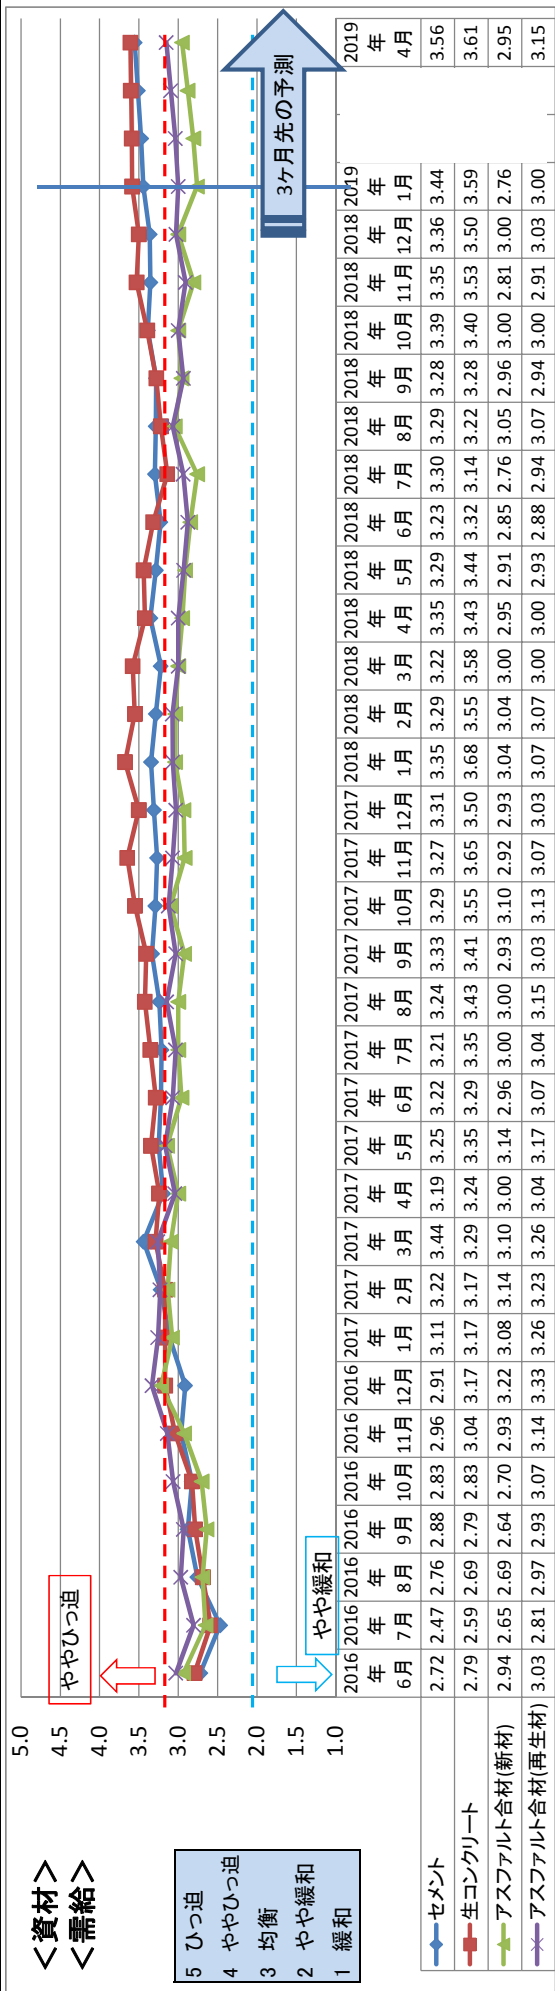


建設資材供給動向〈砂、碎石、再生碎石、輕油〉

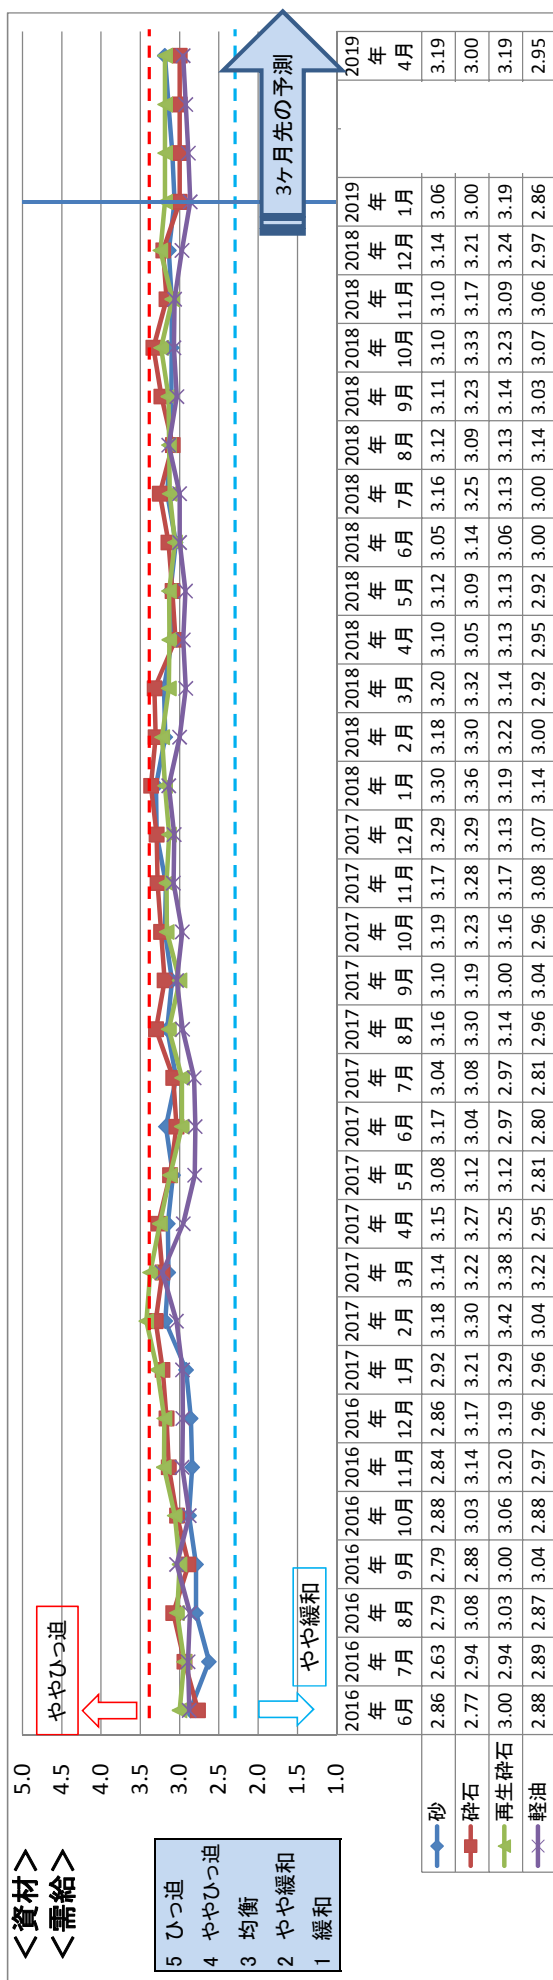


建設資材需給動向 〈異形棒鋼、H形鋼、敷鉄板、ラフテレーンクレーン〉

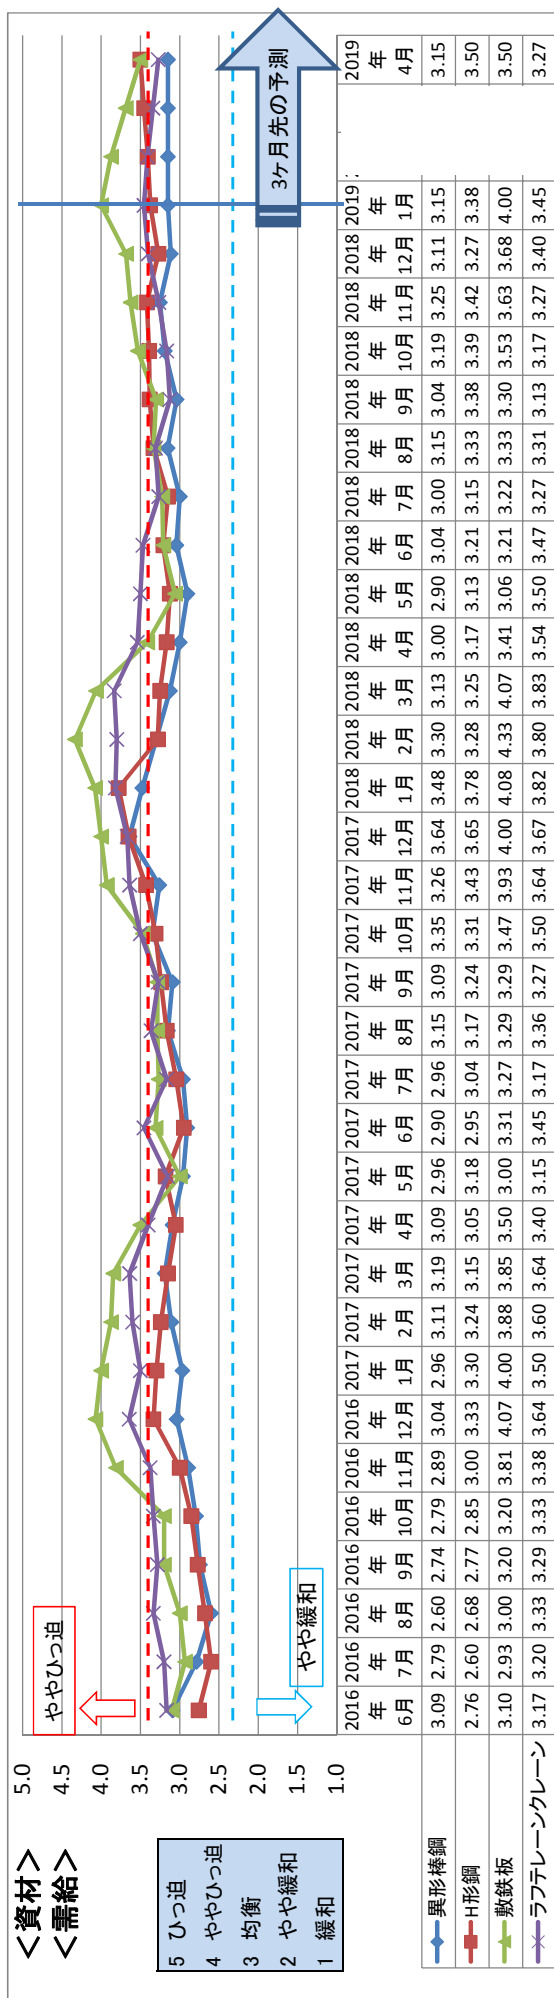


建設資材需給動向 〈杉正角、型枠用合板、構造用合板、陶器瓦〉

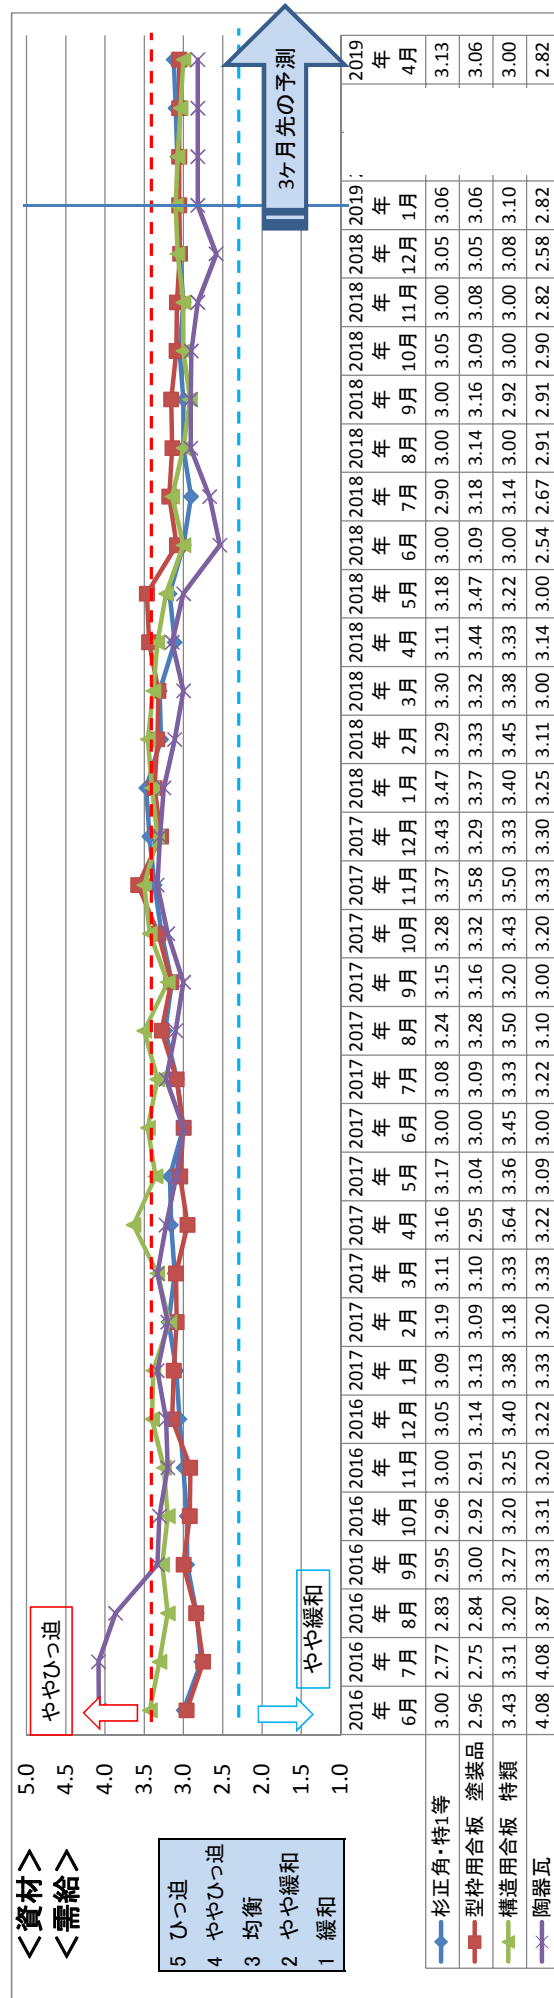


建設資材在庫状況〈砂、碎石、再生碎石〉

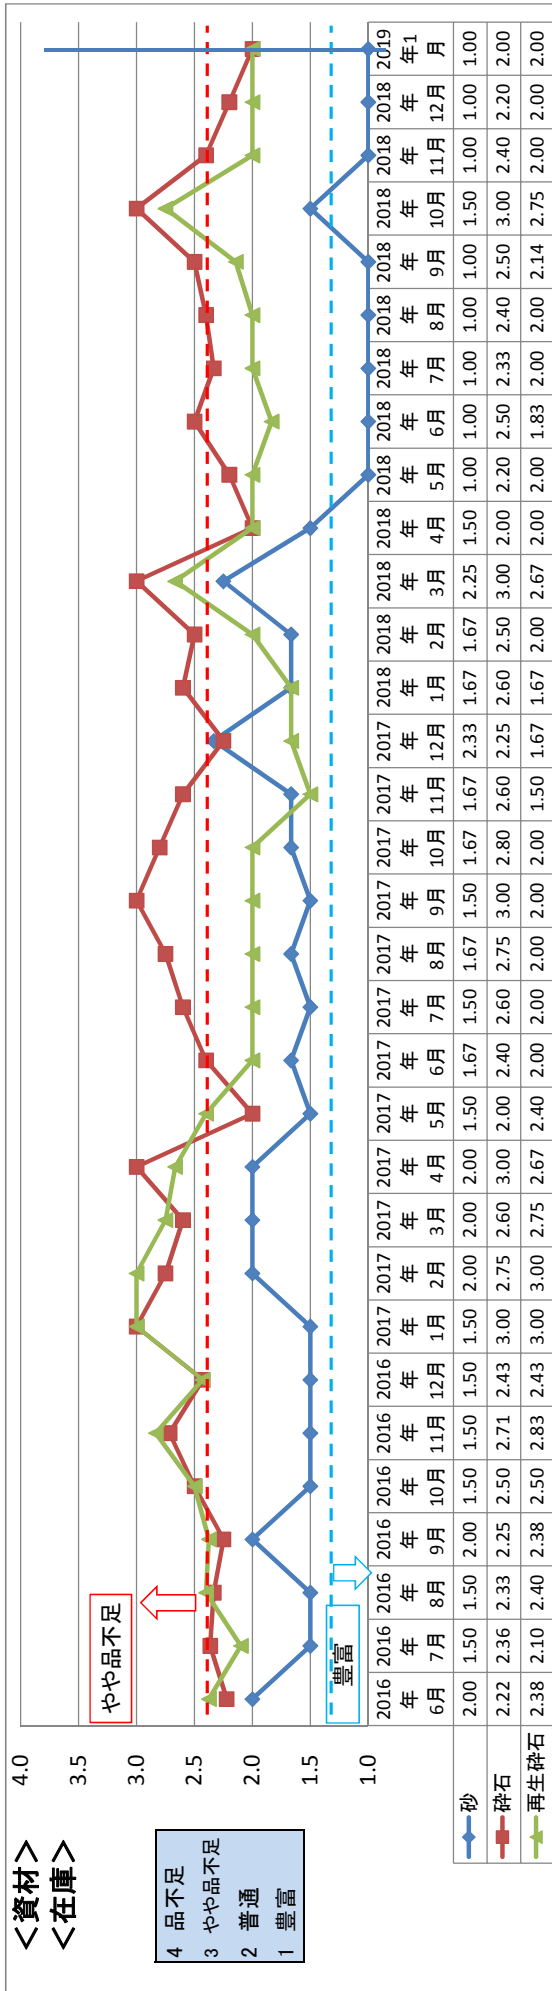


建設資材在庫状況〈異形棒鋼、H形鋼、敷鉄板、ラフテレンクレーン〉

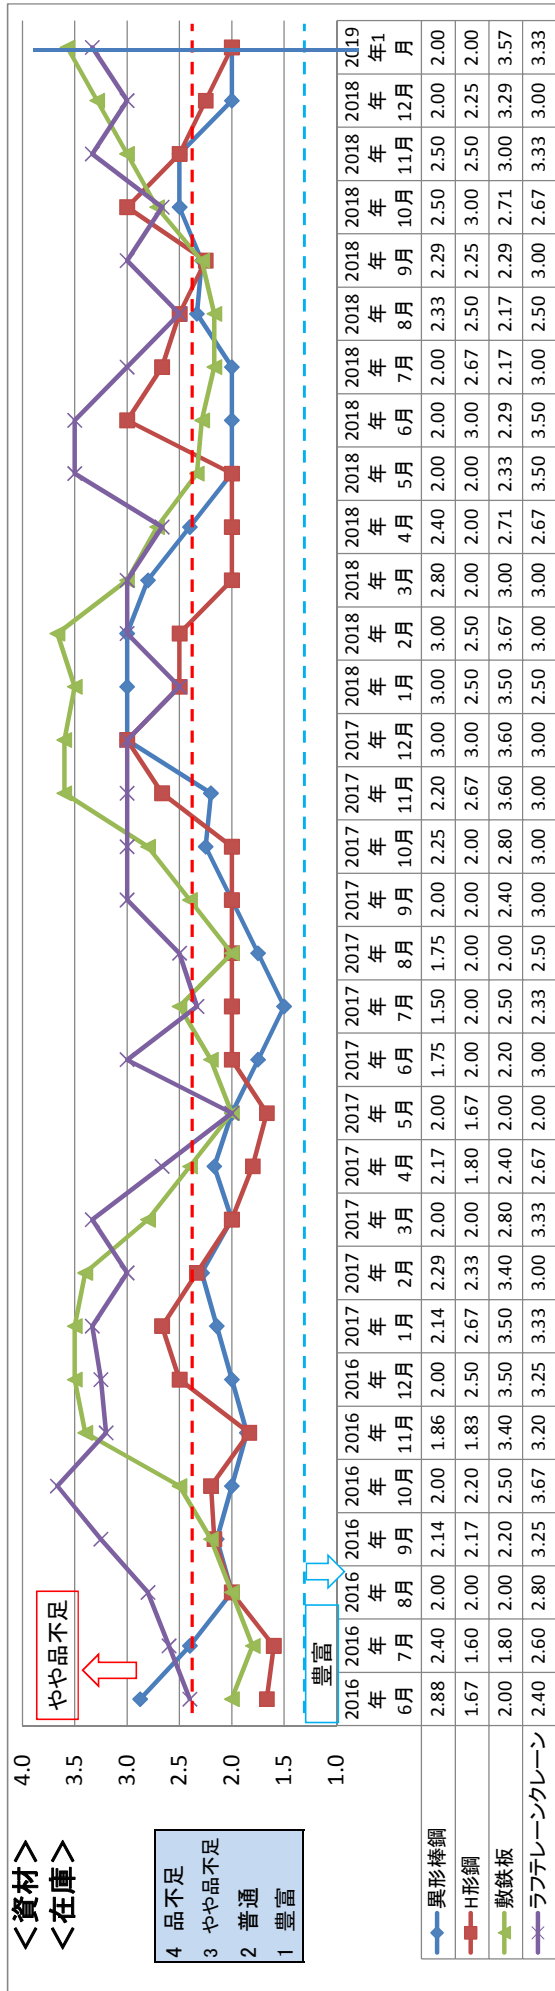


建設資材在庫状況 〈杉正角、型枠用合板、構造用合板、陶器瓦〉

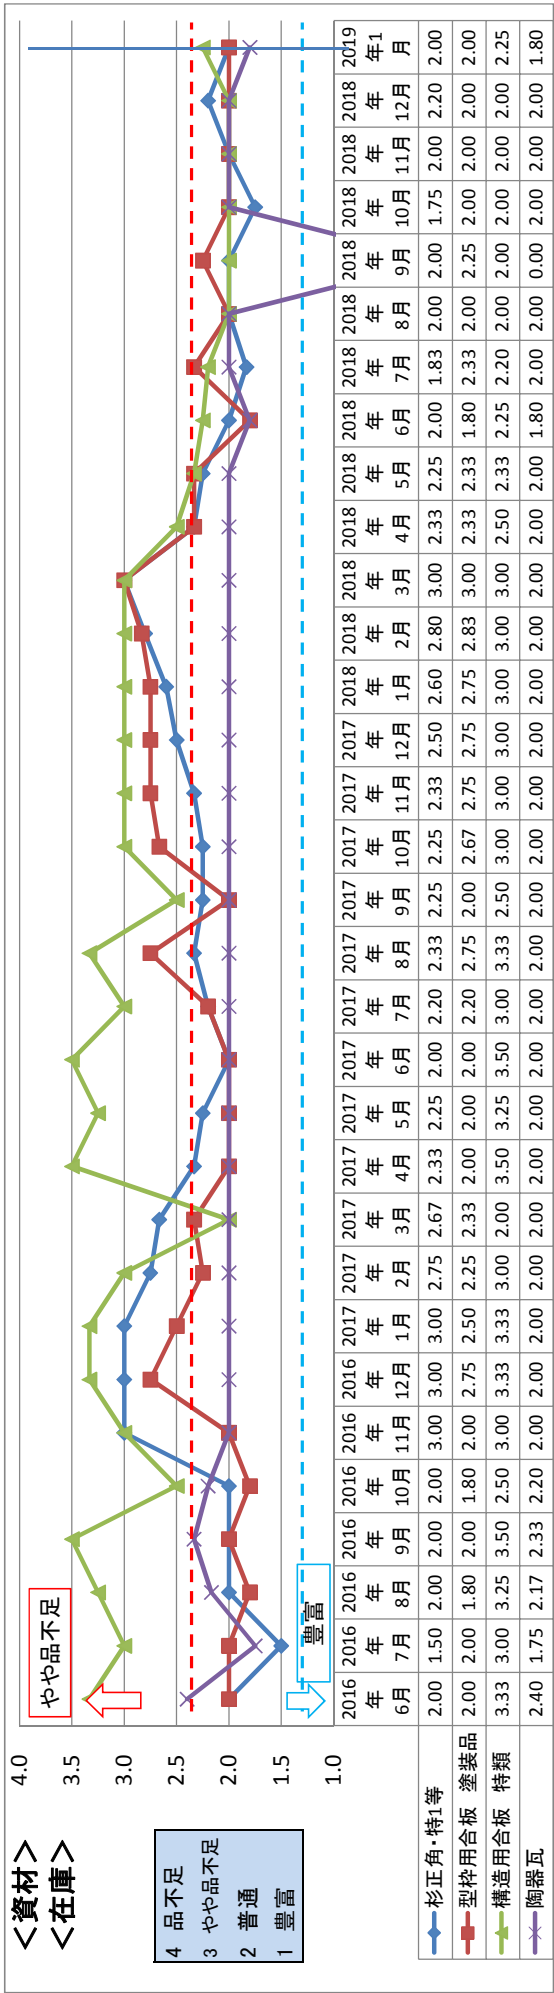

労働者確保の実績及び3ヶ月先の見通し 〈型枠工、左官、とび工、鉄筋工、交通誘導員〉

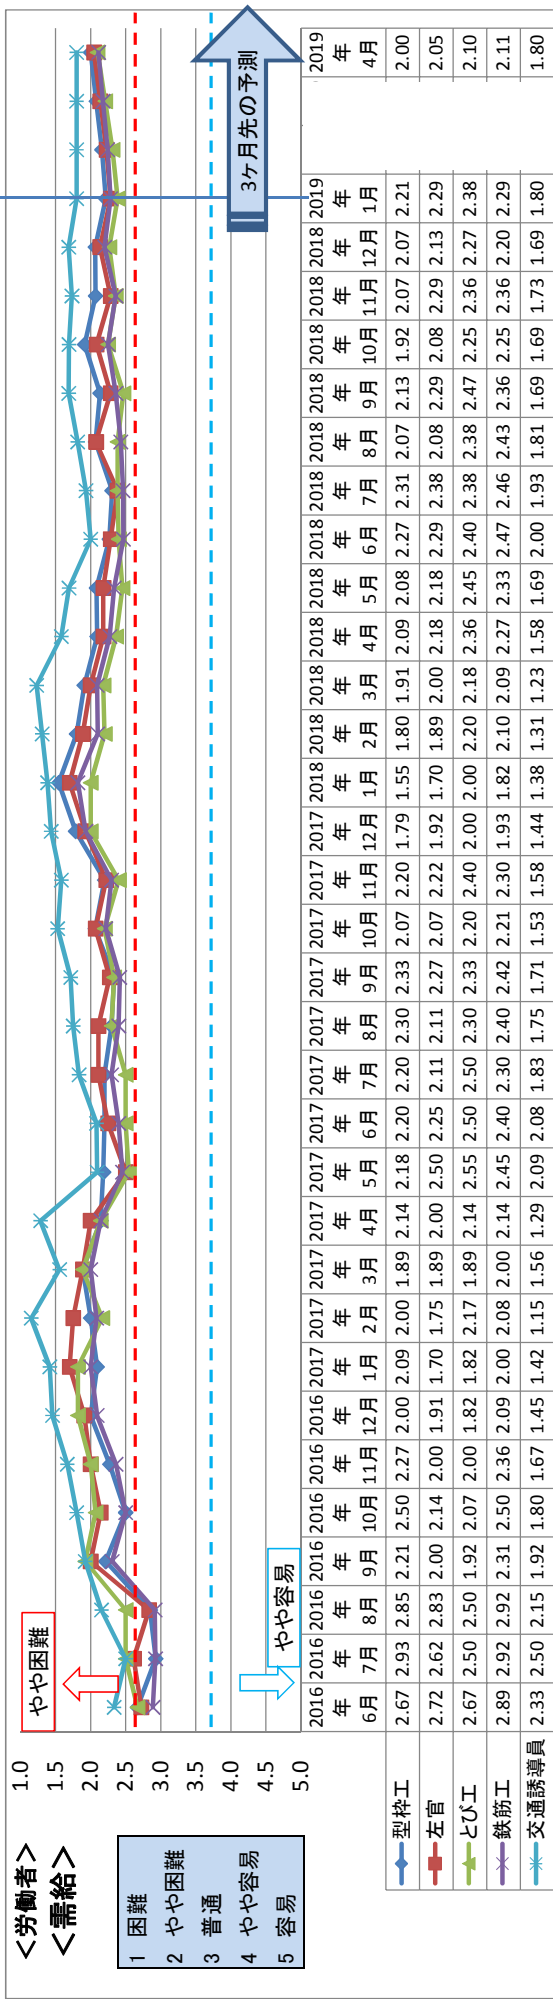

労働者確保の実績及び3ヶ月先の見通し 〈特殊作業員、普通作業員、軽作業員、運転手(特殊)、運転手(一般)〉

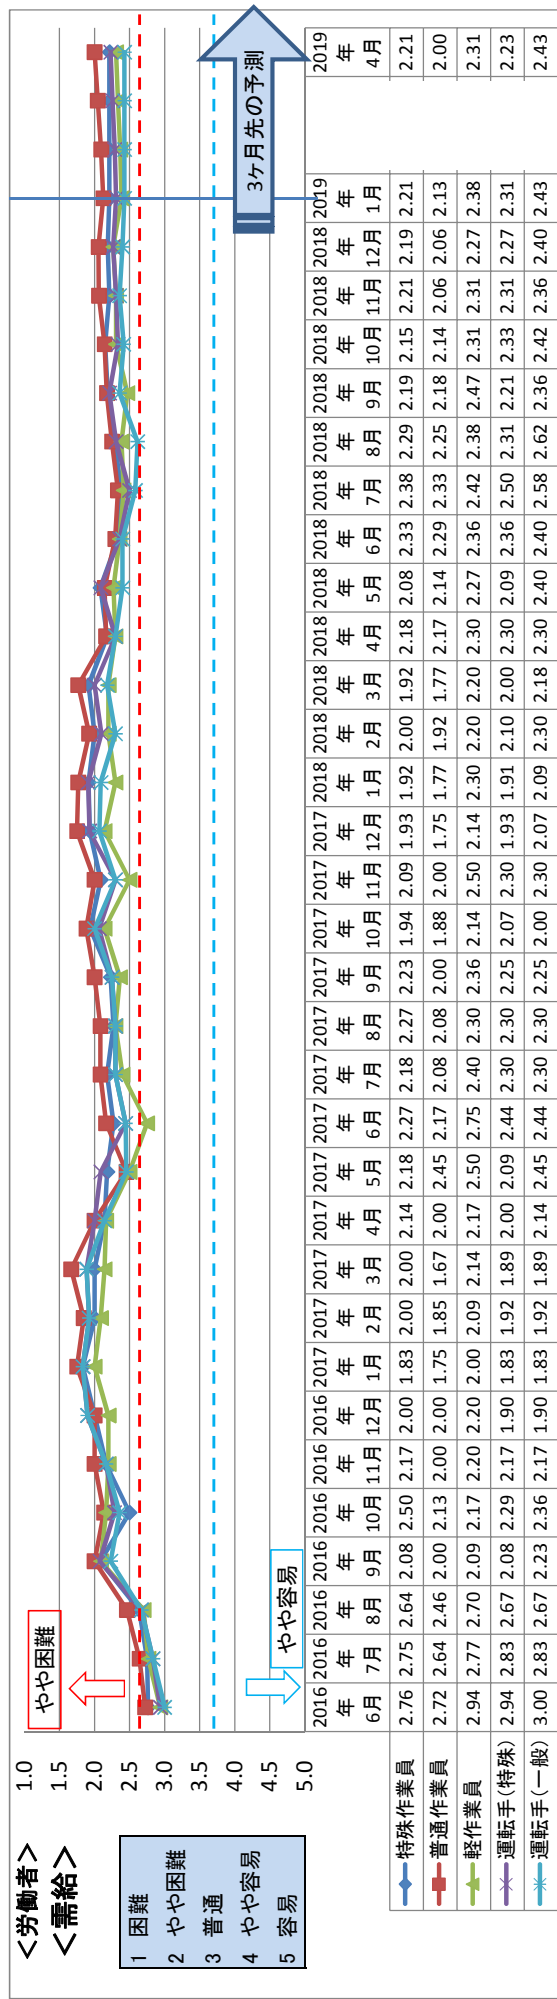

熊本地震被災による労働力の需給状況調査

<復旧事業円滑化官民ネットワーク>

平成31年1月31日時点

	現 状		今後の見通し	
	需給状況 H29.10 ↓ H31.1	状況分析・課題	見通し	分析・懸念
解体	普通 ↓ 普通	公費解体の終了に伴い、県外企業も撤収し、工事量と労働力は均衡している。	普通	今後、公共や民間分野の大型物件がなければ、現状のまま推移すると思われる。
鳶	やや困難 ↓ やや困難	発注量が増え、組合会員間のやり取りが困難になりつつある。これまでは、単発的な応援は可能であったが、それも厳しくなっている。	困難	今後は、さらに年度末に向け不足感が加速するであろう。受注を控えている企業も僅かながら出始めている。
鉄 筋	困難 ↓ 困難	非常に困難な状況。県内の労働者不足が続いている。	困難	仕事はあっても、仕事をする職人がいない。消費税が上がる前の駆け込みも増えてくると予想されるので、来年までこの状況は続くと思われる。
型 枠	困難 ↓ 困難	会員会社はどれも労働力不足の状況である。	困難	しばらくは労働不足は継続すると思われる。
瓦	やや困難 ↓ やや容易	瓦の工事量が激減している為、現状はやや容易。	容易	今後、瓦屋根の需要がなくなれば、労働力の受け入れも不要になり、ますますこの業種の高齢化に拍車がかかるのではないかと思える。
左 官	困難 ↓ 困難	全く人手が足りない状況。	困難	この状況が続くと思われる。

熊本地震被災による労働力の需給状況調査

＜復旧事業円滑化官民ネットワーク＞

平成31年1月31日時点

	現 状		今後の見通し	
	需給状況 H29.10 ↓ H31.1	状況分析・課題	見通し	分析・懸念
塗 装	困難 ↓ 困難	震災以前からの技能士不足、若手入職者の減少などにより工事は工期等に配慮して受注している。復旧工事、新築工事が重複して技能士が不足している。	困難	民間の復旧工事や新築工事が重なり、技能士不足解消は困難な状況が、今後もしばらくは続くと思われる。 大手企業は九州各地から手配して施工している。
板 金	困難 ↓ 困難	職人不足。今後も慢性的に続く。	困難	民間工事も多く発注されており年度末に向けて、ますます職人不足となるとと思われる。
室 内	困難 ↓ 困難	他県の現場への応援依頼があるほど人手は足りない。 大手ゼネコンの現場には、他県からも職人が多数来ている。	困難	3月までは現状が続く。
大工 (工務店)	困難 ↓ やや困難	木造住宅・非住宅・大型物件等着工物件の需要が出てきている。基礎工事・配筋工事・大工・板金職人等が不足しており、工期がずれこんでいる状況である。 但し、復興需要にも少し陰りが見えつつある。	やや困難	今後、職種によっては、職人が不足するため、現場の品質や施工管理が十分に出来なくなるのではないと思われる。

熊本地震被災による資材・労働力の需給状況

(1)資材 (①壊和、②やや壊和、③均衡、④ややひっ迫、⑤ひっ迫)

<復旧事業円滑化官民ネットワーク>


業種	H28												H29												H30												H31	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	見通し					
解体	ややひっ迫	ややひっ迫	均衡	均衡	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡					
	ややひっ迫	ややひっ迫	均衡	均衡	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡					
瓦	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡					
左官	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡					
塗装	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡					
板金	均衡	ややひっ迫	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡					
室内	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡					
鉄筋	／	／	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡					
型枠	／	／	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡					
大工(工務店)	均衡	やや緩和	均衡	緩和	緩和	緩和	緩和	ややひっ迫	ややひっ迫	ややひっ迫	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和	やや緩和					

(2)労働力 (①困難、②やや困難、③普通、④やや容易、⑤容易)

<復旧事業円滑化官民ネットワーク>

業種	H28												H29												H30												H31	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	見通し					
解体	やや困難	困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	やや容易	やや容易	普通	やや容易	やや容易	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通					
	やや困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	普通	普通	やや困難	普通	やや困難	やや困難	普通	普通	やや困難	やや容易	やや容易	やや容易	やや容易	普通						
瓦	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難					
左官	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難					
塗装	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難					
板金	やや困難	困難	やや困難	－	－	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	－	－	－	－	－					
室内	普通	普通	普通	普通	普通	やや困難	やや困難	困難	困難	普通	普通	普通	やや容易	やや容易	普通	やや容易	やや容易	困難	困難	困難	やや困難	普通	容易	やや容易	やや容易	やや容易	普通	普通	やや困難	やや困難	困難	困難	困難					
鉄筋	／	／	困難	困難	困難	困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難					
型枠	／	／	普通	普通	やや困難	困難	困難	困難	困難	普通	普通	やや困難	やや困難	やや困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難					
大工(工務店)	困難	困難	やや困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	やや困難	やや困難	やや困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	－	－	やや困難	やや困難	やや困難					

「復旧事業円滑化官民ネットワーク」

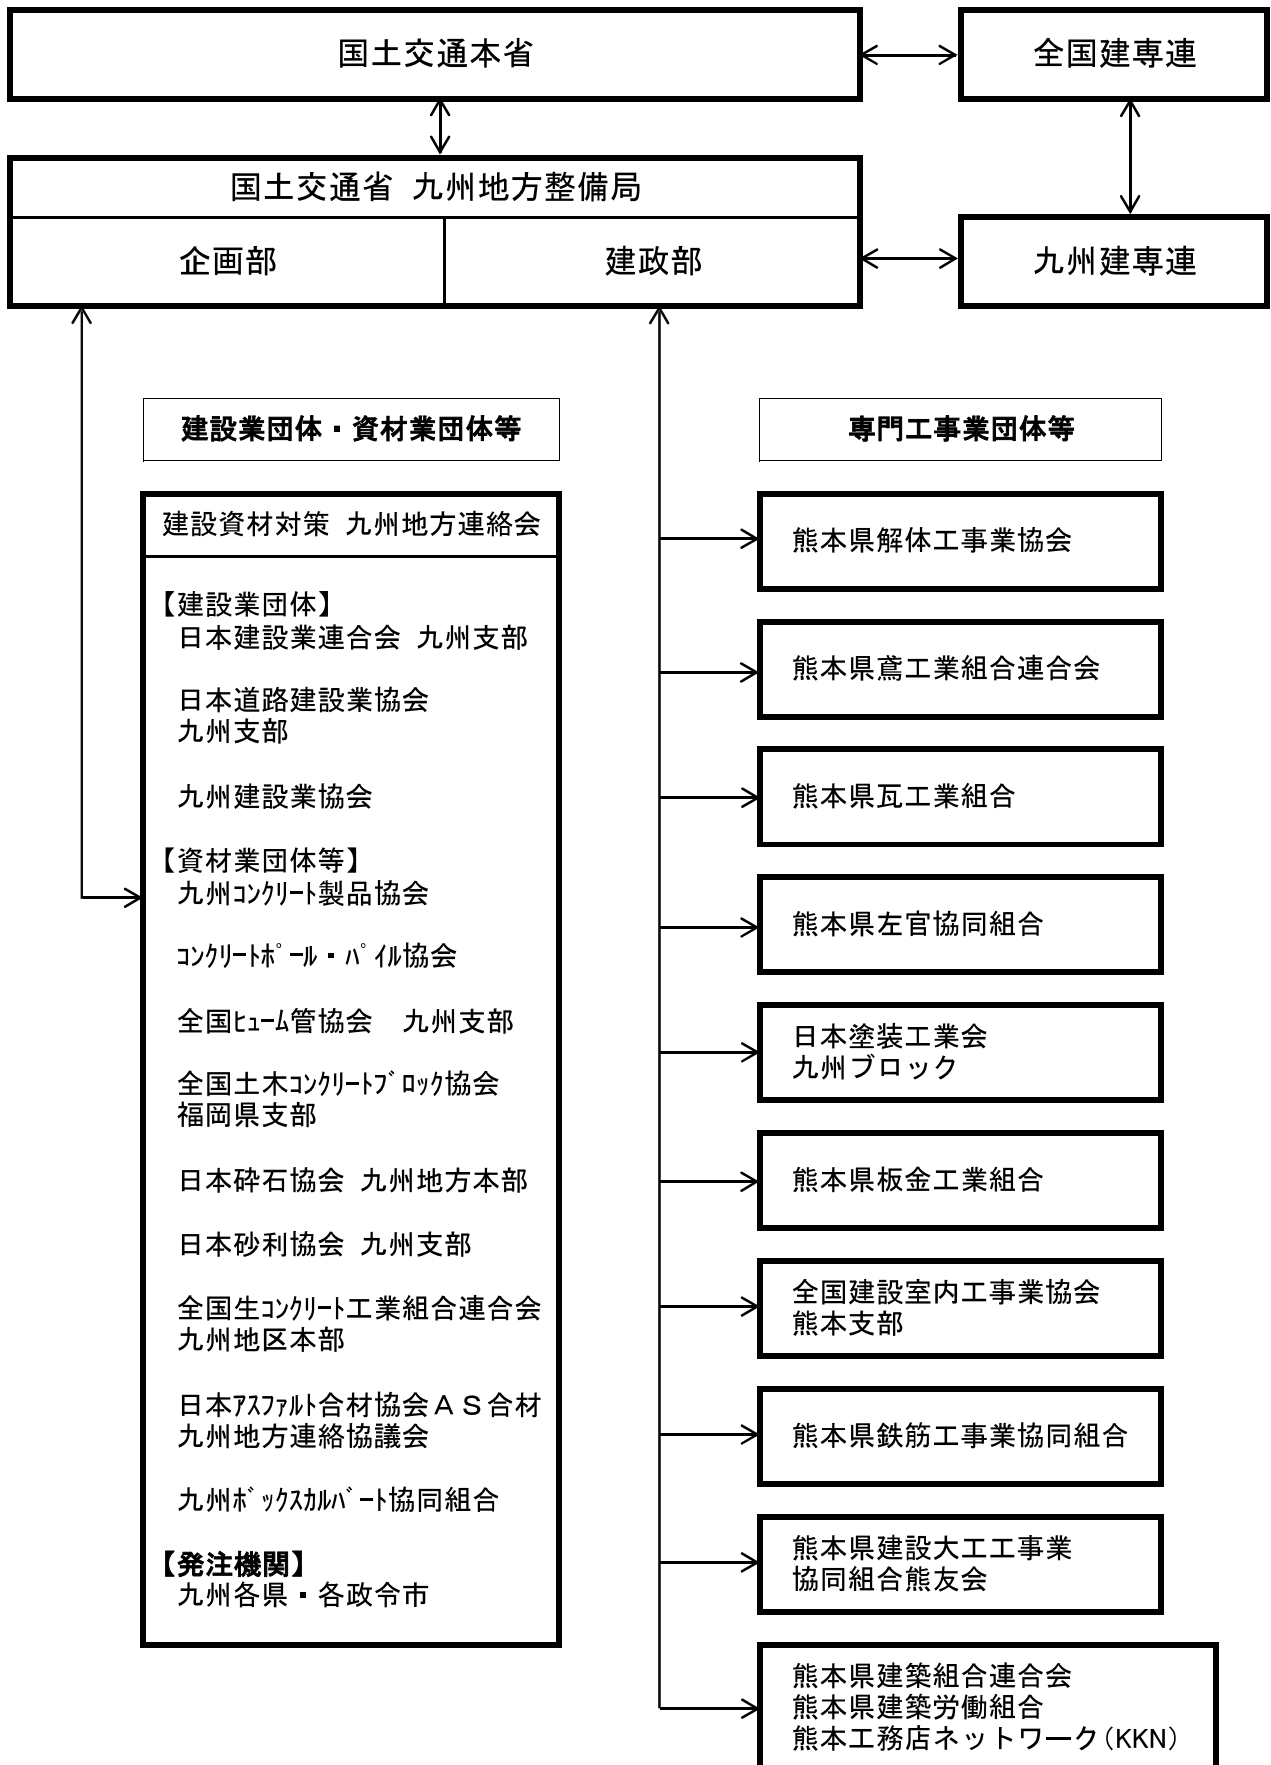

【議題 5】

「円滑な施工確保対策について」

①国土交通省九州地方整備局

②農林水産省九州農政局

③熊本県

同時発表：熊本県、九州地方整備局

平成 3 1 年 1 月 1 6 日

大臣官房技術調査課

土地・建設産業局建設業課

熊本地震復旧・復興工事の円滑な推進に向けて
～「復興係数」等の施工確保対策を継続～

現在、進められている熊本地震の復旧・復興工事において、円滑な施工の確保に万全を期すため、予定価格の設定にあたっての「復興係数」など、施工確保対策を継続することを決定しました。

国土交通省では、熊本県等、地方自治体と連携し、平成 2 8 年 4 月の熊本地震の発生後、被災地における予定価格の適切な設定や関係者間の定期的な情報共有など、公共工事の円滑な施工確保対策を実施してきました。

今回、熊本県内における復興等の状況を踏まえ、復興事業を着実に進めるために復興係数・復興歩掛を平成 3 1 年度も継続することを決定しましたので、お知らせいたします。

今後も復旧・復興工事が円滑に進められるよう万全を期すとともに、引き続き現場の状況を注視し、地方自治体、関係団体と一丸となって、復興に向けた取り組みを進めてまいります。

主な対策の内容

1. 復興係数

共通仮設費：1.4 倍（阿蘇・上益城）、1.1 倍（その他の県内）

現場管理費：1.1 倍

2. 復興歩掛

土工の日当たり標準作業量を 2 0 % 低下する補正の設定

本件に関する問い合わせ先

（直轄工事の状況、復興係数について）

国土交通省大臣官房技術調査課 辛嶋、内山

TEL：03-5253-8111（内線 22353、22355）、03-5253-8221（直通）

FAX：03-5253-1536

（地方公共団体発注工事の状況について）

土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室 伏原、山内

TEL：03-5253-8111（内線 24723、24724）、03-5253-8278（直通）

FAX：03-5253-1553

復興係数・復興歩掛（現状）

	復興係数	復興歩掛
適用時期	H29.2.1（H29.11.1一部引き上げ）	H29.2.1
対象工種	全ての土木工事	土工
補正率	共通仮設費： <u>1.4</u> （阿蘇・上益城）、 <u>1.1</u> （その他県内） 現場管理費： <u>1.1</u> 標準作業量を <u>20%低減</u>	

これまでの取組

【H26.4】「営繕工事における工事関係図書等※に関する効率化実施方針」を制定し、受注者へ提出を求める工事関係図書等の明確化及び削減を実施

○ **提出を求める工事関係図書等の考え方**を整理


① 監督行為として監督職員の所持が必要な書類

② 発注者が行った監督の経緯を明らかにするために必要な書類 **に限る**

→ この考え方にに基づき、受注者に **提出を求める「工事関係図書等一覧表」(93種類)**を設定

○ 各地方整備局等において、工事の内容に応じて必要な書類を選定するとともに **品質に影響のない範囲で協議により省略・集約を行う**こととした

(工事着手前に受発注者で省略可能な書類に係る協議を実施)

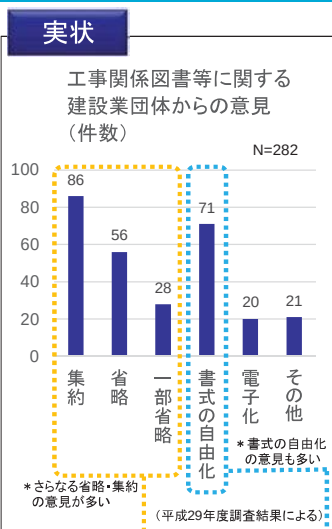

今回実施

(次の内容を地方支分部局に通知)

【H30.4】営繕工事における工事関係図書等に関する効率化の徹底

○ **省略・集約が可能な工事関係図書の考え方**を整理

① 工事関係図書等のうち、必要な内容が記載された他の書類等があるものについて、**提出または提示により、新たな図書の作成・提出を求めない**

② 関連する内容を記載する複数の工事関係図書等については、必要事項を**一つの図書に集約**してもらうことで、他の図書の提出を求めないことができる

→ この考え方にに基づき **協議による省略・集約がしやすくなるよう**

「省略・集約が可能な工事関係図書等」を明示【別紙参照】

⇒ **93種類中19種類(約2割)を削減可能**なものとしてリストアップ

○ 受注者の事務合理化のため、**受注者の独自書式の使用を可能**とした

○ 添付資料は必要最小限で簡素なものとし、二重提出(紙と電子)を求めないこととした

課題

○ 協議による工事関係図書等の省略・集約が必ずしも十分なされていない

○ 受注者の独自書式を用いることができない

※工事関係図書等とは、契約図書、契約関係書類、工事関係書類及び工事完成図書をいう。

(別紙)省略・集約が可能な工事関係図書等

国土交通省

○省略・集約等により効率化できる図書(19種類)

図書名	効率化の考え方
火災保険等加入状況報告書	保険契約締結後、直ちに証券等の写し、保険会社の証明書等を監督職員に提出することで省略
工事実績情報登録報告書	工事カルテの写しのみを提出することで省略
施工管理技術者通知書	施工管理技術者の氏名その他必要事項を(工種別)施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可
電気保安技術者通知書	電気保安技術者の氏名その他必要事項を(総合)施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可
工食用電力設備の保安責任者通知書	工食用電力設備の保安責任者の氏名その他必要事項を(総合)施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可
技能士通知書	技能士の氏名その他必要事項を(工種別)施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可
技能資格者通知書	技能資格者の氏名その他必要事項を(工種別)施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可
緊急連絡体制	緊急時の連絡体制を(総合)施工計画書に記載する等で省略可
工事安全計画書	建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)に基づく工事現場の安全対策を(総合)施工計画書に記載する等で省略可
下請負人通知書	施工体制台帳を提出する等で省略可
作業員名簿	施工体制台帳を提出する等で省略(特に厳しいセキュリティが求められ、事前登録が必要な場合等を除く)
主要(資材・機材)発注先通知書	主要資材・主要機材の発注先を(工種別)施工計画書に記載する等で省略可
週間工程表(または月間工程表)	原則として、実施工程表の補足として提出を求めるものは、月間工程表(または週間工程表)とすることで、週間工程表(または月間工程表)を省略可
確認・立会い請求書	確認・立会いの希望日その他必要事項を実施工程表、工事週報、月間工程表、工事打合せ書等に記載する等で省略可
工事材料搬入報告書	工事写真を提出する、工事打合せ書に記載する、納品書のコピーを提出する等で省略可
工事材料場外検査願	検査希望日その他必要事項を実施工程表、工事週報、月間工程表、工事打合せ書等に記載する等で省略
現場休止届	現場の休止期間その他必要事項を実施工程表、工事週報、月間工程表、工事打合せ書等に記載する等で省略
休日夜間作業届	作業日時その他必要事項を実施工程表、工事週報、月間工程表、工事打合せ書等に記載する等で省略
産業廃棄物管理表(マニフェスト)	マニフェストを提示することにより提出は不要(施工報告書等にマニフェストの添付は不要)

○一部工種または材料において効率化できる図書(2種類)

図書名	効率化の考え方
施工計画書	工数の少ない工種は、他の工種に集約して記載する等で効率化
材料の品質等を証明する資料	設計図書でJIS等の規格が指定されている材料で、全数確認が必要な工種(杭、塗装、防水、吹きつけ等)以外は、搬入時の工事写真を提出する等で効率化

円滑な施工確保対策について

九州農政局

九州農政局では、復旧・復興工事等の確実な執行を図るため、入札・契約手続きの実施にあたっては、復旧・復興係数の導入などの対策を実施。

項目	実施概要
1 復旧・復興係数の導入	平成29年2月1日以降に入札手続きを開始する工事等を対象に、熊本地震の復旧・復興事業等における積算方法（土工関係歩掛の20%補正や共通仮設費率・現場管理費に補正係数1.1を乗じる）に関する試行を開始。 更に、平成29年11月1日以降に入札手続きを開始する、阿蘇及び上益城地域で実施される工事を対象に、共通仮設費率に補正係数1.4を乗じることとする追加対策を実施。（詳細は http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/saigai.kumamoto.html を参照）
2 適切な発注ロットの設定	地域企業の活用に配慮しつつ、地域の実情に応じて、発注ロットの大型化を図り、建設技術者の一層の効率的な活用を推進。
3 工事積算方法の見直し	施工箇所が複数あり、その点在箇所が1km程度を超え、複数の施工箇所がある工事について、工事箇所毎に間接工事費の算出を可能とした。
4 簡易Ⅱ型適用範囲の拡大	技術提案を求めない総合評価落札方式（簡易Ⅱ型）の適用範囲を拡大し、入札手続きに要する期間を短縮。
5 入札参加要件の緩和	入札参加条件として求める施工実績については、「工種」のみを条件とし、施工規模を求めないこと。また、技術者に求める施工実績について、「土工」等の大括りな工種設定を推進。
6 見積活用方式の適用	標準積算と実績価格の乖離が想定される工事については、「見積活用方式」を活用すること。（入札に参加する者から、当該入札に係る工事の全部または一部の見積りを徴収し、予定価格を定めることを可能とした。）
7 適切な工期の確保	余裕期間の設定、準備期間（40日）の確保など、適切な工期の確保を推進
8 その他	・発注予定情報の一元化 ・メールマガジンによる調達情報の発信（局契約）

熊本県における震災関連等工事の施工確保の取組み

	入札制度	施工確保対策（〇国の対策を適用、●県独自の対策）
平成28年度	①発注標準の見直し 土木一式の各等級の発注標準を引き上げ（A2等級 5500万円→7000万円 等） ②復興JV制度の導入 JVを結成することで、A2等級業者も被災地の工事に参加 ③総合評価の見直し 受注機会拡大の評価項目（受注件数が少ない企業に加点）を導入 地域性評価項目の非設定 ④指名競争入札の対象金額の拡大 土木一式 3000万円未満→7000万円未満 等 ①案件ご一般競争入札の発注ランク、総合評価等の見直し(賞給) ・BC等級・指名 → 一般競争(価格競争) ・参加資格要件を「当該ランク」から「当該ランク以上」に拡大 ・A1・A2ランク：単なる修繕工事は総合評価の対象外 ②入札参加資格の要件緩和(賞給) ・単なる修繕工事の一般競争入札の参加資格で、企業の施工実績の非設定 ③指名競争入札における地域要件の見直し ・被災地域において、指名企業を隣接振興局へ拡大する等の地域要件の見直し	〇遠隔地からの建設資材・仮設材の調達に伴う設計変更(H28.10～) ・遠隔地から資材を調達する場合は輸送に係る費用を設計変更で対応 〇地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更(H28.10～) ・地域外からの確保に必要な旅費、交通費、宿泊費について設計変更で対応 ●発注機関による見積り徴収又は特別調査による単価設定(H28.11～) ・設定単価がない資材等について、見積りでも決定できる範囲を拡大 〇スライド条項の適切な活用(既存制度活用の徹底) ●現場代理人の常駐義務の緩和(H28.11～) ・一定案件のもと、複数の工事での兼任可に変更（同一振興局内3か所、7000万円以内） 〇「復興歩掛」の導入(H29.2～) ・復興歩掛：土工 日当たり20%低減 〇「復興係数」の導入(H29.2～) ・復興係数：共通仮設費1.1倍、現場管理費1.1倍 〇設計労務単価の改定(H29.3～) ・H29は3月に前倒し改定 〇営繕積算方式等の活用(H29.2～) ・被災地の実情を踏まえた積算マニュアルの作成・活用 ●発注見直し情報詳細版の公表(H29.7～) ●最新資材単価・積算基準の設計変更に係る特例措置(H29.8～) ・単価及び積算基準の適用日を、契約日時点の最新の単価・基準に設計変更で対応可 ●工事書類の簡素化(H29.8～) ・土木工事15種類の建築工事7種類の工事書類を簡素化 ●クレーム集約等の市場調査の実施(H29.10～) ・九州内同一単価となっているクレーム等の建設機械賃料を被災地域の市場調査を基に設計単価を設定 〇建設資材の見積活用(既存制度) 〇施工歩掛の見積活用(既存制度) 〇条格期間を見込んだ早期契約制の活用(既存制度)
平成29年度	①発注ロットの見直し ・合併することが可能な工事は合併方式とし1工事として発注 ②被災地域の入札方法の見直し(土木一式) ・被災3地域（熊本、阿蘇、上益城）における入札方式の見直し ・(A2等級 1回目：地域振興局内の一般競争、2回目以降：全県下の一一般競争) ③総合評価落札方式の見直し(土木一式) ・3億円未満の工事は、入札時に施工実績を求めるときを除き総合評価の対象外 ・総合評価対象工事で簡易型の拡大 ④1者入札の取り扱いの見直し ・震災関連等工事の一般競争入札は、当分の間、競争参加資格審査会の審査を経て原則1者入札可	〇「復興係数」の引上げ(H29.11～) ・対象地域 阿蘇地域及び上益城地域 ・補正内容 共通仮設費：1.4倍、現場管理費：1.1倍 ※上記の対象地域以外は、共通仮設費：1.1倍、現場管理費：1.1倍 〇「営繕積算方式」活用マニュアル(熊本被災地版)の拡充(H29.11～) ・道路通行止め等による資機材・建設機械の運搬費の増加分を変更の対象など明確化 ●「災害復旧推進チーム」の設置(H29.12～)※県央、上益城、阿蘇地域のみ ・災害復旧工事を円滑に進めるため、積算や設計変更等に関する課題への対応 ・国土交通省による技術的支援 ●「設計変更協議会」の設置(H29.12～)※県央、阿蘇地域のみ ・工事施工段階での様々な課題に対し、受発注者一体で円滑かつ迅速な解決の実施 ●工事協議等の円滑なレスポンスの確保(拡充)(H29.12～)※県央、阿蘇地域のみ ・情報交換共有システムによる決裁滞留状況の確認 ・相談窓口の設置による紙媒体の決裁滞留等の防止 ●交通誘導員の円滑な確保と効率的活用の取組み(H29.11～) ・交通誘導員の不足に対し、関係機関で情報を共有し課題の解決の実施
平成29年度／30年度	①被災地域の入札方法の再見直し(土木一式 H30.2.15～) ・被災3地域（熊本、阿蘇、上益城）における入札方式の見直し ・不調不落の観点から優先度が高いと判断される工事（国道、主要地方道、砂防など）の参加地域の要件を、原則初回入札から全県対象に拡大 ※総合評価落札方式の見直し(H30.4～) ・7千万円～3億円未満の工事を総合評価の対象に拡大（簡易型Ⅱ-JS）	〇建築関連工事の円滑な施工に向けた更なる取組み(H30.3～) ・下請経費等の増加を設計価格に適切に反映 ・必要と認める場合は現場条件等を精査し、見積単価を採用 ・特に必要と認める場合、地域外からの人材確保に要する費用として、元請の技術者に係る交通費を設計変更で対応 〇「復興歩掛・復興係数」の継続(H31.4～) ・復興歩掛：土工 日当たり20%低減 ・復興係数：補正内容 共通仮設費 1.4倍、現場管理費 1.1倍 ※阿蘇地域及び上益城地域以外は、共通仮設費 1.1倍、現場管理費 1.1倍

復興歩掛・復興係数の導入措置の継続について

【1】 熊本県から主な要望内容

平成31年1月16日に蒲島知事から石井啓一国土交通大臣へ熊本地震等からの復旧・復興工事について、円滑な施工の確保を図るため、適正な工事価格の設定に必要な、復興歩掛・復興係数の導入措置の継続を要望。

【2】 国土交通省からの回答

熊本地震等の復旧・復興工事において、円滑な施工の確保に万全を期すため、予定価格の設定にあたっての「復興係数」など、施工確保対策を継続する。

(対策の内容)

「復興係数」

全ての土木工事における共通仮設費及び現場管理費の補正

- ・共通仮設費：1.4倍（阿蘇・上益城）、1.1倍（その他の県内）
- ・現場管理費：1.1倍

「復興歩掛」

土工の日当たり標準作業量を20%低下する補正の設定

【3】 熊本県の今後の対応

平成31年4月1日以降に契約する工事についても、「復興歩掛」「復興係数」の適用を継続します。
