



八代市



人吉市



芦北町



錦町



あさぎり町



多良木町

令和3年1月29日  
球磨川流域治水協議会



湯前町



水上村



相良村



五木村



山江村



球磨村



熊本県



農林水産省  
九州農政局



九州森林管理局



熊本地方気象台



九州地方整備局

## 令和2年7月豪雨を踏まえた 「球磨川水系 緊急治水対策プロジェクト」を開始します。

～流域のあらゆる関係者が協働し、まちづくりと連携した治水対策の推進～

令和2年7月豪雨において甚大な被害が発生した球磨川水系における、今後の治水対策の取組として、「球磨川水系 緊急治水対策プロジェクト」をとりまとめました。今後、流域のあらゆる関係者が協働し、まちづくりと連携した治水対策を進めて参ります。

「球磨川水系 緊急治水対策プロジェクト」の概要

○ 以下の3つを柱として取り組んでいきます。

① 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

② 被害対象を減少させるための対策

③ 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

※詳細については、別紙をご覧ください。

【問い合わせ先】

<球磨川流域治水協議会>

事務局

国土交通省 九州地方整備局 河川部 河川計画課長 山上 直人

電話(代表)092-471-6331

熊本県

企画振興部 球磨川流域復興局 政策監 福原 彰宏 電話 096-333-2610

土木部 河川港湾局 河川課長 菰田 武志 電話 096-333-2507

# 球磨川水系 緊急治水対策プロジェクト

～流域のあらゆる関係者が協働し、まちづくりと連携した治水対策の推進～

○ 令和2年7月豪雨により甚大な被害が発生したことを踏まえ、球磨川においては、国、県、市町村等が連携し、被災した箇所、河道掘削、堤防整備、輪中堤・宅地かさ上げ、遊水地等の取り組みを集中的に実施することにより、令和2年7月豪雨と同規模の洪水に対して、越水による氾濫防止※（人吉市の区間等）、家屋の浸水防止※（中流部）など、流域における浸水被害の軽減を図る。

※従来から検討してきた貯留型ダム並びに再開発後の市房ダムによる洪水調節の効果を含む

○ 令和3年出水期に向けて、浸水被害箇所等の堆積土砂の撤去やタイムラインの改善等を緊急的に実施する。

## ■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

### ○河川区域での対策

- 河道掘削、堤防整備、輪中堤・宅地かさ上げ、遊水地、放水路（御溝川）等

全体事業費 約1,540億円

事業期間 令和2年度～令和11年度

- 新たな流水型ダム、市房ダム再開発

調査・検討に令和3年度から本格着手

- 利水ダム等6ダムにおける事前放流等の実施、体制構築 等

### ○集水域での対策

- 水田、ため池等の活用
- 下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備
- 森林の整備・保全
- 土砂や流木の流出抑制対策（砂防、治山） 等

## ■被害対象を減少させるための対策

### ○氾濫域での対策


- まちづくりと連携した高台への居住誘導
- 土地利用規制・誘導（災害危険区域等）・移転促進
- 不動産取引時の水害リスク情報提供
- 二線堤、自然堤防の保全
- 排水門等の整備や排水機場等の耐水化 等

## ■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

### ○氾濫域での対策

- R2.7豪雨の課題を受けたタイムラインの改善
- 講習会等によるマイ・タイムライン普及促進
- ネットワーク回線の二重化
- WEB版のハザードマップ作成
- 庁舎等の浸水対策の実施
- 水防備蓄倉庫の拡充 等

【位置図】

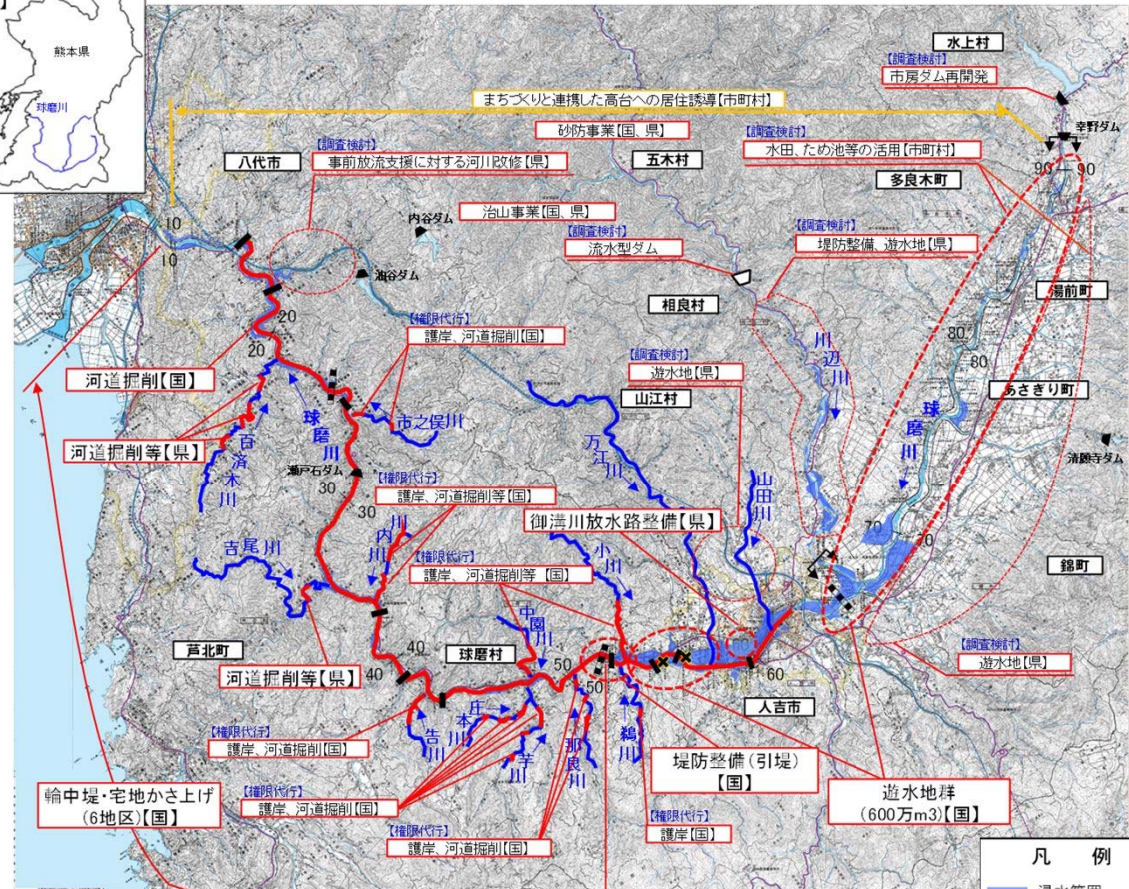

凡 例	
<span style="color: blue;">■</span>	浸水範囲
	堤防決壊箇所
	大臣管理区間
	道路橋(落橋)
	鉄道橋(落橋)


※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。

# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクトメニューの実施計画

【令和3年度出水期まで】可能な限りの堆積土砂の撤去及び堤防決壊箇所の本復旧を実施する

【第一段階】堆積土砂の撤去、災害復旧工事を進めるとともに上下流バランスを考慮の上、河道掘削を最大限実施し進捗を図る。輪中堤・宅地かさ上げをまちづくり等と連携して完成させる。また、遊水地、引堤等に必要な用地確保に着手。県区間においては放水路整備や河道掘削等を推進。流水型ダム、市房ダム再開発の調査・検討に着手し進捗を図る。

【第二段階】早期に遊水地(本川)を完成。河道掘削[拡幅部](人吉地区)、引堤、県区間堤防整備、遊水地(支川)等の完成。引き続き流水型ダム、市房ダム再開発の進捗を図る。

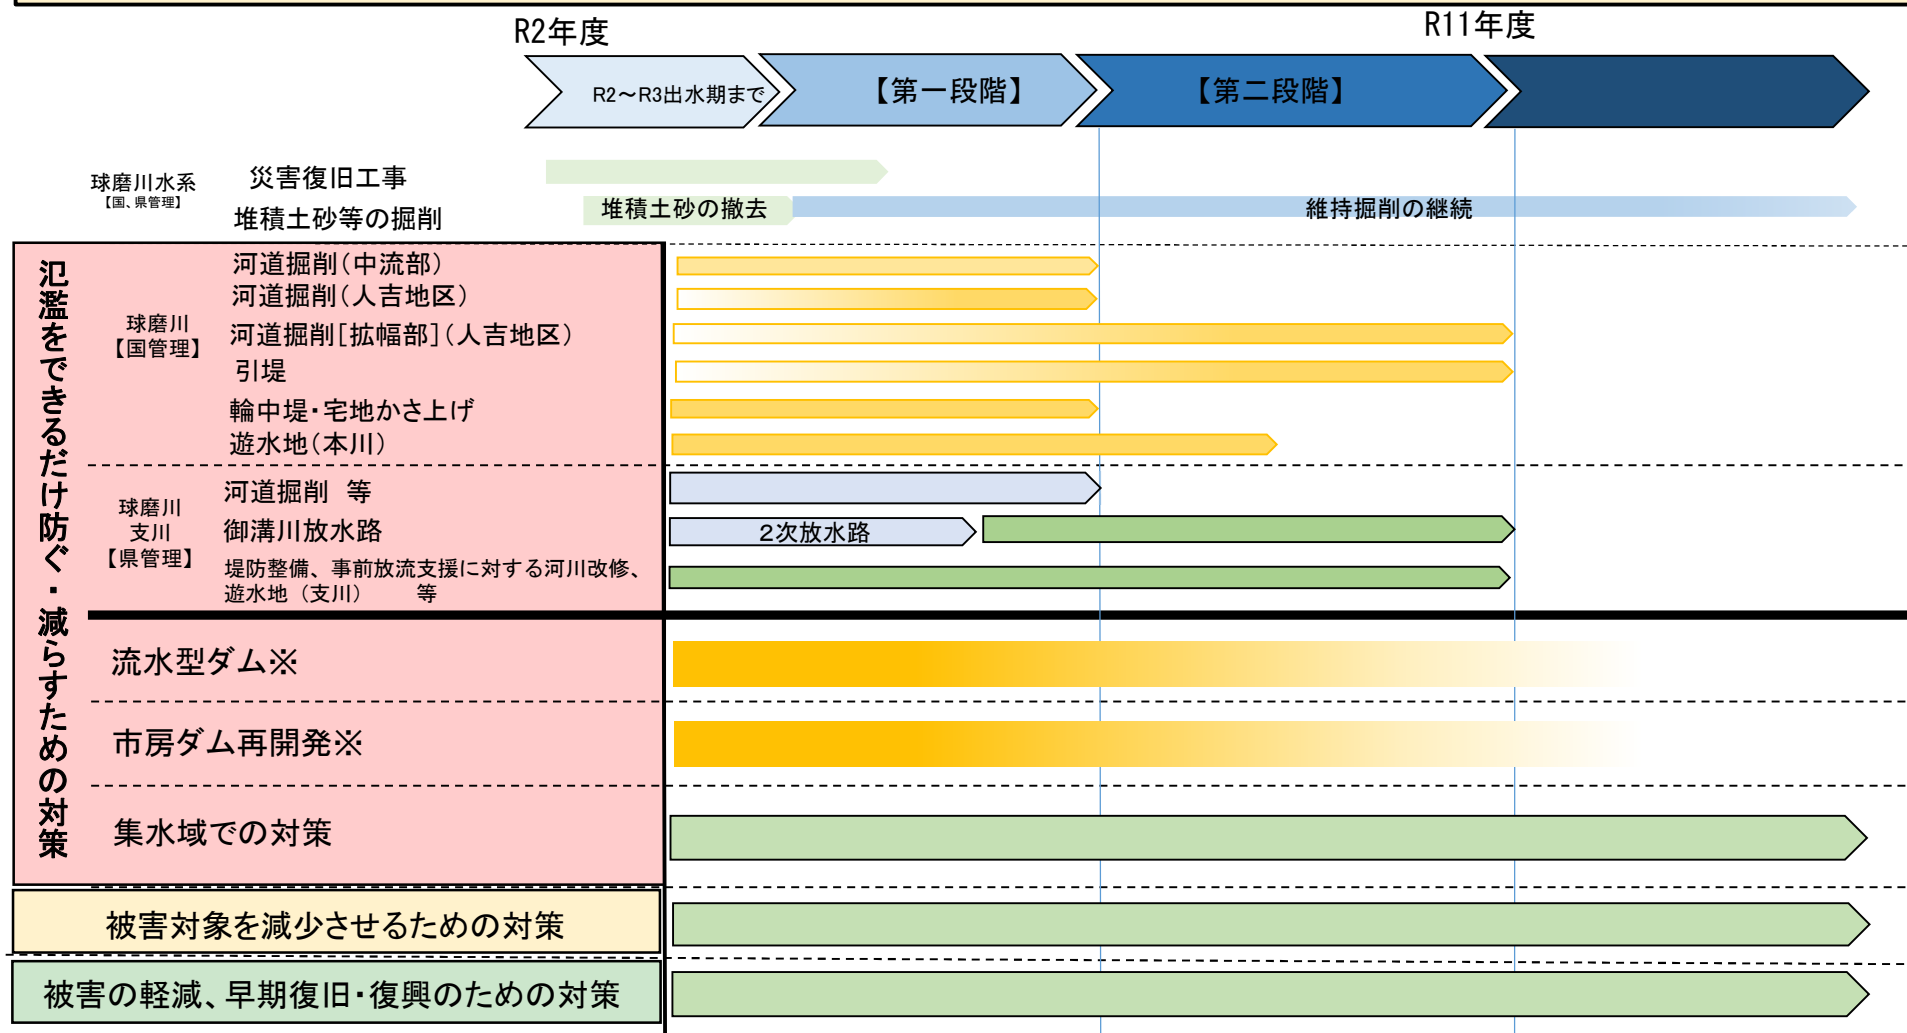

※調査・検討の結果を踏まえて、事業期間等を決定

# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクト

---


【対策内容】

# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクト

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策(堆積土砂の掘削:国管理区間等)について

○河道内の土砂掘削を令和2年12月末時点で約38万m<sup>3</sup>分を施工中であり、今後さらに32万m<sup>3</sup>を実施し、令和3年度出水期までに約70万m<sup>3</sup>の土砂を掘削予定。

## 【施工状況】

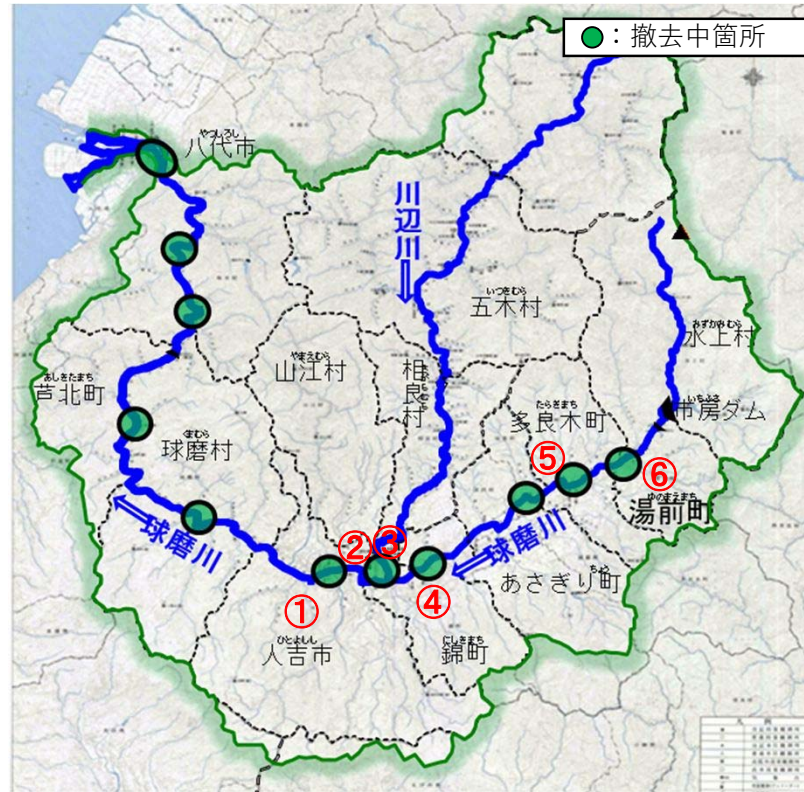

施工中 : 約38万m<sup>3</sup>  
今後の予定 : 約32万m<sup>3</sup>  
合計 : 約70万m<sup>3</sup>  
※令和3年度出水期までの対応

## 【施工状況】



# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクト

## 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策(堆積土砂の掘削:権限代行分)について

- 権限代行により直轄にて緊急復旧対策を実施中である9河川については、緊急的な対策を令和2年9月30日に完了し、現在、被災前の河道確保と被災施設の復旧を実施中。
- 引き続き、令和3年度出水期前までに可能な限り進むよう時間的緊迫性をもって取り組む。

撤去済 : 約 5万m<sup>3</sup>  
施工中 : 約 15万m<sup>3</sup>  
合計 : 約 20万m<sup>3</sup>  
※令和3年度出水期までの対応



### 施工状況

②川内川(掘削状況)



②川内川



④芋川



⑤中園川



⑧那良川




# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクト

## 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策(堆積土砂の掘削: 県管理区間)について

- 令和2年7月洪水により熊本県が管理する支川（国による権限代行分を除く）に堆積した土砂の量は約79万m<sup>3</sup>と推定。
- 令和2年12月末時点で約15万m<sup>3</sup>を撤去済み。現在、約20万m<sup>3</sup>を撤去中であり、時間的緊迫性をもって取組む。

### 【施工状況】

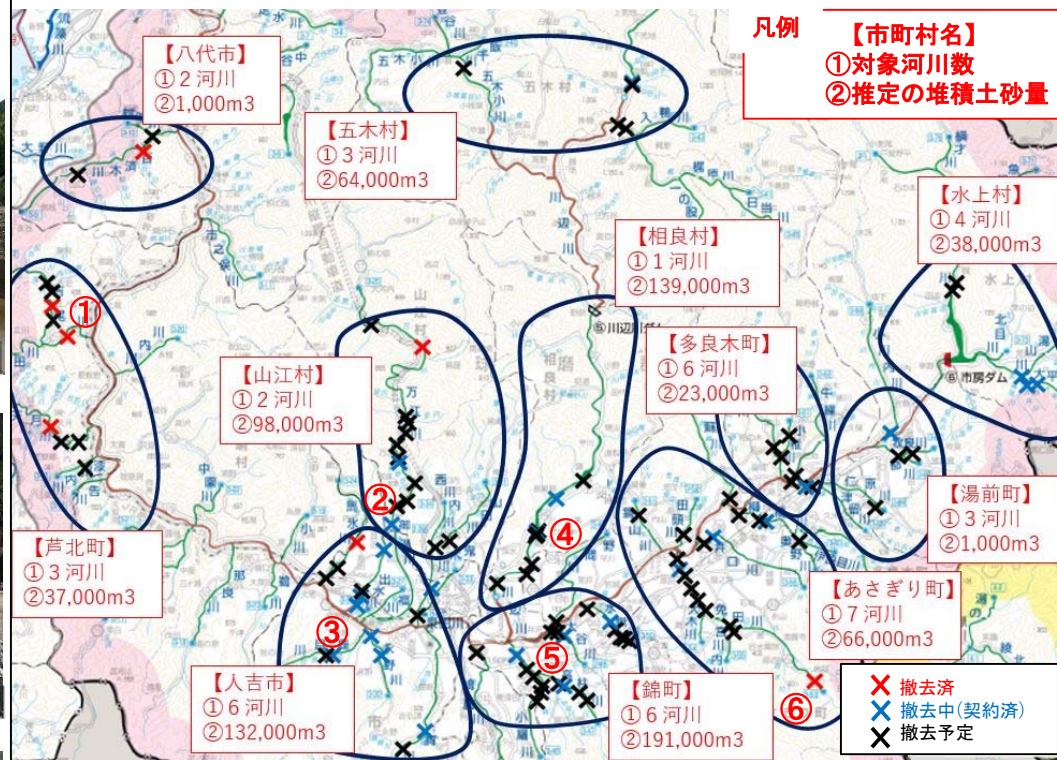

### 【施工状況】



※各数値は12月末時点の集計(速報値)であり、変更の可能性があります。  
 ※権限代行(9河川)については当該集計に含まない。

撤去済 : 約15万m<sup>3</sup>  
 施工中 : 約20万m<sup>3</sup>  
 今後の予定 : 約44万m<sup>3</sup>  
 合計 : 約79万m<sup>3</sup>  
 ※令和3年度出水期までの対応

【球磨川水系緊急治水対策プロジェクト 河川区域での対策 災害復旧】

- 対策内容 : 堆積土砂掘削、護岸補修、堤防整備他
- 事業期間 : 令和2年度～令和4年度(目標)

### 堤防決壊、護岸損傷、土砂堆積等

#### 堤防決壊(緊急復旧状況)

堤防決壊箇所(左岸55.0k付近)



堤防決壊箇所(右岸56.4k付近)



#### 護岸被災状況



#### 【復旧イメージ】



#### 堤防補修

#### 【被災状況】




#### 【復旧イメージ】



- ・堤防決壊箇所の本復旧については令和3年度出水期までの完成を目標。
- ・堆積土砂の撤去については引き続き令和3年度出水期までに可能な限り撤去を行い、その後も引き続き進めていく。

#### 【平面図】

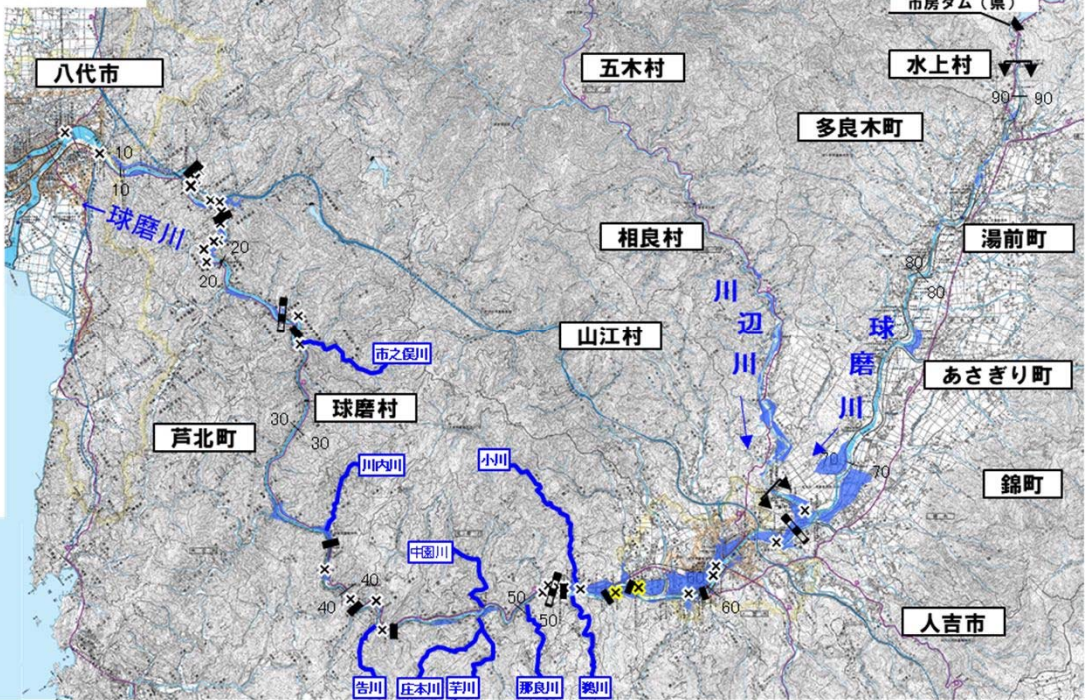

#### 凡 例

- 浸水範囲
- 堤防決壊箇所
- 被災箇所
- 大臣管理区間
- 道路橋(落橋)
- 鉄道橋(落橋)
- 権限代行河川




【球磨川水系緊急治水対策プロジェクト 河川区域での対策】

- 対策内容 : 河道掘削、引堤、輪中堤・宅地かさ上げ、遊水地(本川)
- 事業期間 : 令和2年度～令和11年度

【河道掘削】

実施箇所：遙拝堰付近～川辺川合流点付近  
河道掘削量：約300万m<sup>3</sup>

河川の流下断面積を拡大して、河道の流下能力を向上させる。掘削土の運搬・処分や仮置き場の確保が課題となることから、まちづくり等への有効活用を図る。実施にあたっては、上下流の治水安全度のバランスを考慮するとともに瀬・淵、生物等へ配慮し、掘削の進捗を図る。




考え方

- 中下流部及び人吉地区において、球磨川の瀬・淵の再生、保全、動植物の生息・生育環境や球磨川を中心として育まれた地域の歴史・文化・景観、川下りやラフティングなど河川の利活用等にも配慮した上で、最大限の掘削を実施する計画とする。
- 人吉地区において市街部へ影響させないように、現況堤防位置を極力変更せず、川側に突出した箇所の河岸掘削を実施する計画とする(河道拡幅)。
- 掘削計画立案にあたっては、河道の状況を確認しつつ上下流バランスに配慮した計画とする。
- 掘削土については、築堤材料のほか、宅地かさ上げや自治体と連携した観光・生活基盤整備等まちづくりへの活用も図るなど、地域の復旧・復興に寄与する河川事業を展開する。

【引堤】

実施箇所：渡地区付近  
実施量：延長約600m程度、最大幅50m程度

引堤は、堤防間の流下断面積を増大させるため、堤内地側に堤防を新築し、旧堤防を撤去する。堤防を引くために必要となる用地取得を先行して進める必要がある。実施にあたっては上下流の治水安全度のバランスを考慮する必要がある。



考え方

- 渡地区付近の一部区間において、今次洪水の検証結果から堤防法線の変更により水位低下効果が発揮される範囲に限定して引堤を実施する計画とする。
- 掘削土については、築堤材料のほか、宅地かさ上げや自治体と連携した観光・生活基盤整備等まちづくりへの活用も図るなど、地域の復旧・復興に寄与する河川事業を展開する。

### 【球磨川水系緊急治水対策プロジェクト 河川区域での対策】


- 対策内容 : 河道掘削、引堤、輪中堤・宅地かさ上げ、遊水地(本川)
- 事業期間 : 令和2年度～令和11年度

### 【輪中堤・宅地かさ上げ】

実施箇所：遙拝堰付近～一勝地付近

実施目標高：治水対策後の水位(計画高水位+余裕高さ相当)

輪中堤は、ある特定の区域を洪水の氾濫から防御するため、その周囲を囲んで設けられた堤防である。併せて宅地のかさ上げ(宅地の地盤高を高くしたり、建築構造を工夫する)を実施することで浸水被害の抑制を図る。



### 考え方

○今次洪水と同規模の洪水に対して家屋浸水をなくすため、治水対策実施後の水位(計画高水位+余裕高相当)を目標として輪中堤・宅地かさ上げを実施し、必要に応じて自治体のまちづくりと連携したさらなるかさ上げ等を実施。

○宅地かさ上げ等は、掘削土等を最大限活用するとともに、実施時には観光・生活基盤整備等まちづくり等と連携し進めることとする。

### 【遊水地】

実施箇所：渡地区付近～市房ダム付近

洪水調節計画容量：約600万m<sup>3</sup>

河川に沿った地域で、洪水流量の一部を貯留し、下流のピーク流量の低減を図る。農地等の利用を保全し洪水時のみ貯留する「地役権補償方式」と、現地盤を掘り下げ、調節容量を確保する「掘り込み方式」の検討を行う。



### 考え方

○今次出水の被害状況を鑑み、甚大な被害が生じた人吉市街部及び中流部で効果を発揮させられるよう、遊水地の配置を検討する。

○地域の基幹産業でもある営農等に配慮しつつ、「地役権方式」及び「掘り込み方式」の組み合わせによる配置を計画する。

○「掘り込み方式」については地下水位以上の掘り込みを条件とすることを検討(平常時の営農等への活用可能性も含め検討)。

○事業実施にあたっては、「ダムによらない治水を検討する場」での議論や土地利用状況を踏まえ、洪水調節効果、事業期間、工期も併せて総合的に評価し、効率的・効果的な箇所の抽出を行う。

# 球磨川水系緊急治水対策プロジェクト

## 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策(県管理区間:中流部)について

- 国権限代行の7河川以外でも、持続可能な河道の流下能力の維持・向上として、災害復旧事業、堆積土砂の掘削、河川法線の是正などを実施する。(吉尾川、百済木川等)
- 氾濫水を減らす対策として、堤防強化などを実施する。
- 土砂や流木の流出抑制対策として、砂防堰堤と治山ダム、山腹工、流木止め等を整備するとともに、遊砂地の検討を行う。



※対策については変更になる可能性がある



氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策(県管理区間:人吉・上流部・川辺川筋)について

- 持続可能な 河道の 流下能力の維持・向上として、災害復旧事業、堆積土砂の掘削などを実施する。
- 氾濫水を減らす対策として、築堤・堤防嵩上げ、堤防強化、放水路整備などを実施する。
- 流水の貯留対策として遊水地（堀込方式や地役権補償方式）、浸水範囲を減らす対策として輪中堤等の検討を行う。



※対策については変更になる可能性がある


- 「流水型ダム」について、治水と環境の両立を目指し調査・検討を行う。なお、本プロジェクトによる効果については、従来から検討してきた貯留型ダムでの洪水調節ルール(河川整備基本方針検討時のルール)を用いた場合の洪水調節効果として推定している。
- 現況の洪水調節機能の更なる強化を目的として市房ダム再開発の調査・検討を行う。なお、本プロジェクトによる効果については、最大放流量を650m<sup>3</sup>/sから400m<sup>3</sup>/sへ変更した場合の洪水調節効果として推定している。

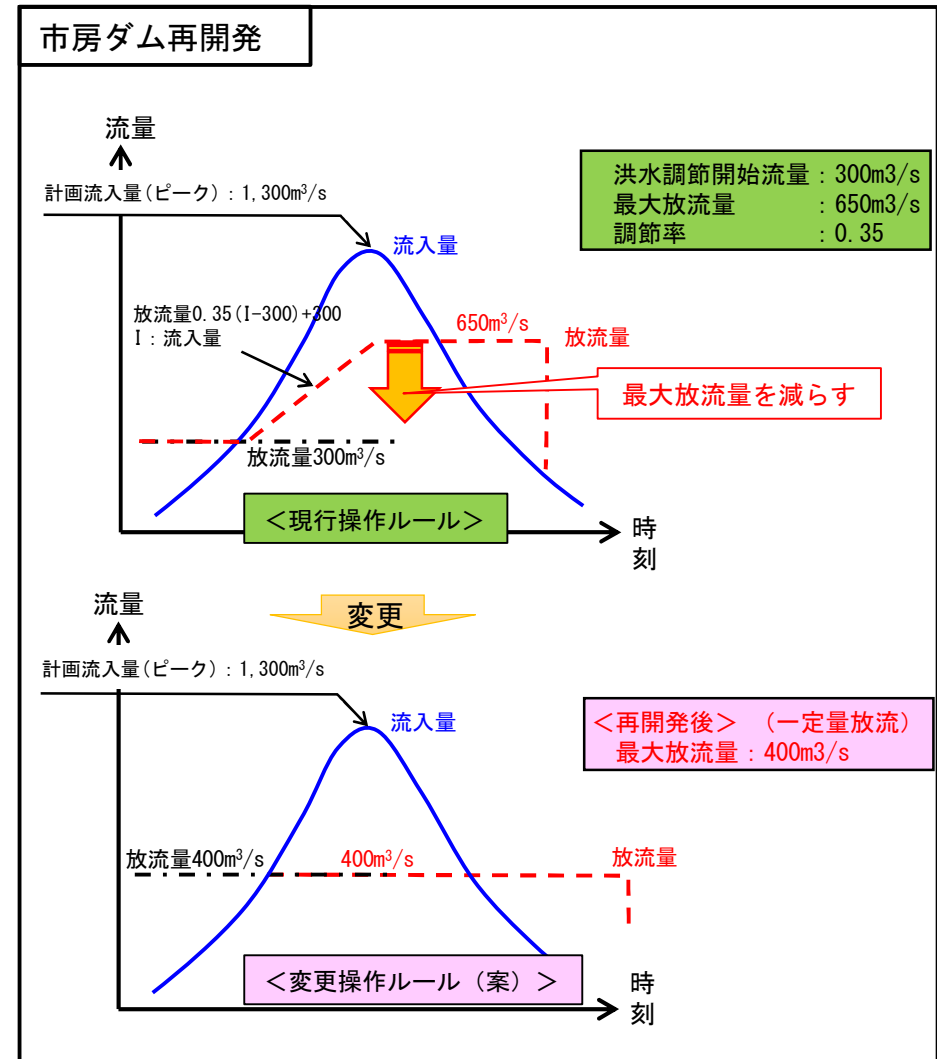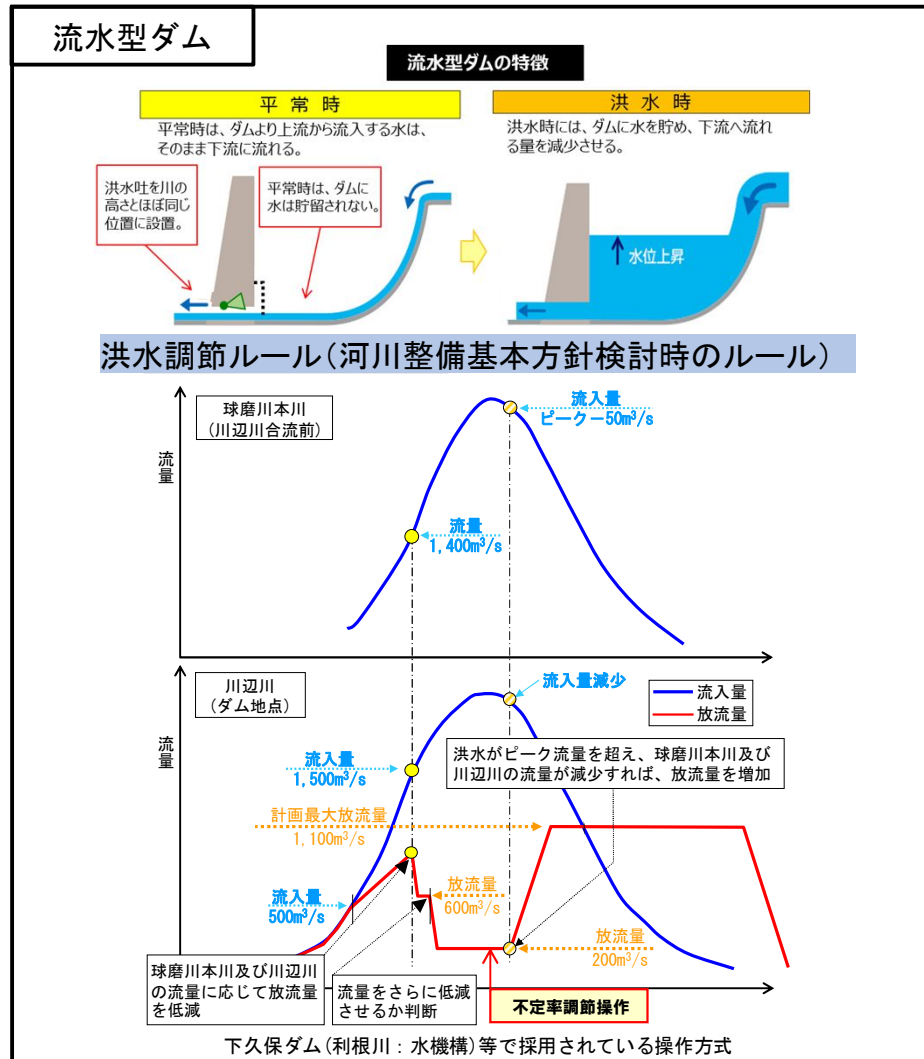

○地域及び関係機関が連携して集水域における流出抑制対策、及び土砂や流木の流出抑制対策を推進し、浸水被害軽減に繋げる取り組みの推進

### ～水田・ため池等の活用～


水田やため池へ雨水を貯留することによる流量低減の推進

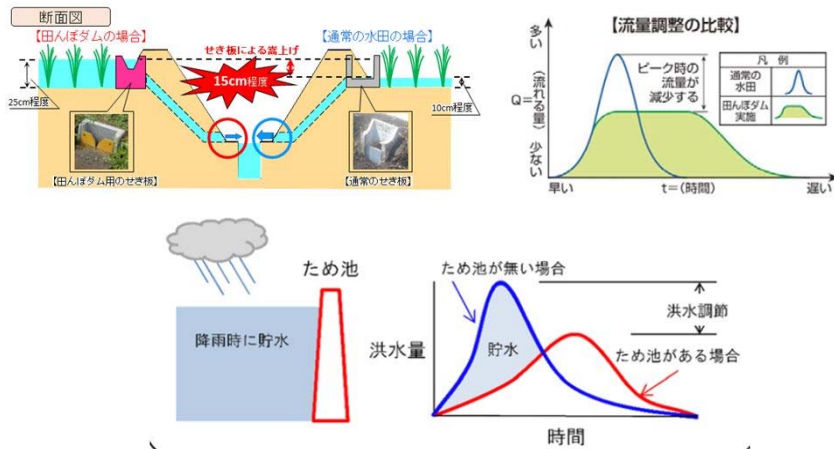

等

### ～森林の整備・保全(保水力の維持向上)～

森林は山地災害防止機能や水源涵養機能等の公益的機能を有しており、この機能の適切な発揮に向けた森林整備の実施。植林・間伐等の森林管理により、雨水を地中に素早く浸透させ、ゆっくり流出させるといふ森林の洪水緩和機能の保全

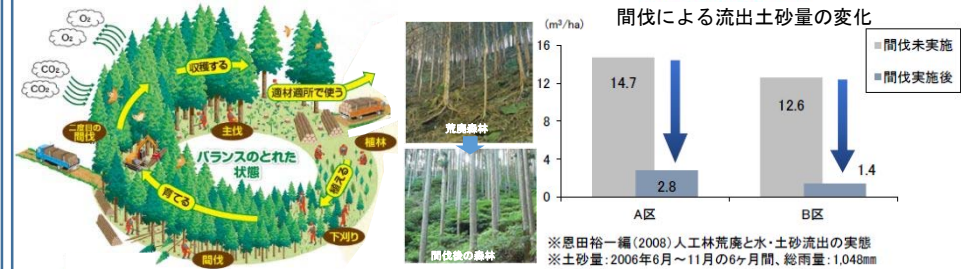


### ～土砂や流木の流出抑制対策(砂防、治山)～


人家等に対する直接的な土砂災害防止及び下流河川の河床上昇に伴う洪水被害の防止を図ることを目的として砂防事業を実施するとともに、上流域においても森林の有する山地災害防止機能等を高めることを目的として治山事業を実施。砂防・治山対策がそれぞれの役割を果たしながら連携し、土砂・流木災害及び河床上昇に伴う洪水被害を防止・軽減を図る。

### ～下水道等の排水施設、雨水貯留施設の整備～

河川に流れ込む水を地下に浸透させることで、河川への流出を遅らせる効果を期待する施設の整備を推進



#### 校庭貯留の例



#### 砂防

下流域(保全対象直上)に砂防堰堤などを整備し、土砂や流木の流出による直接的な被害を防止



#### 治山


上流域において森林整備と治山事業を一体的に実施し、森林を保全



○地域及び関係機関が連携して、リスクコミュニケーションを通じてまちづくりや住まい方の誘導等による水害に強い地域づくりを推進し、被害対象を減少させるための取り組みの推進


### ～掘削土等の活用による高台への居住誘導等～

高台移転基盤整備等、復興まちづくりにおいて必要となる盛土材料については、河川における対策での掘削土を活用できるように工程調整を行うなど、河川区域での対策の計画・実施にあたって、地域の復旧・復興へ寄与できるようにまちづくり計画との連携を図る。等

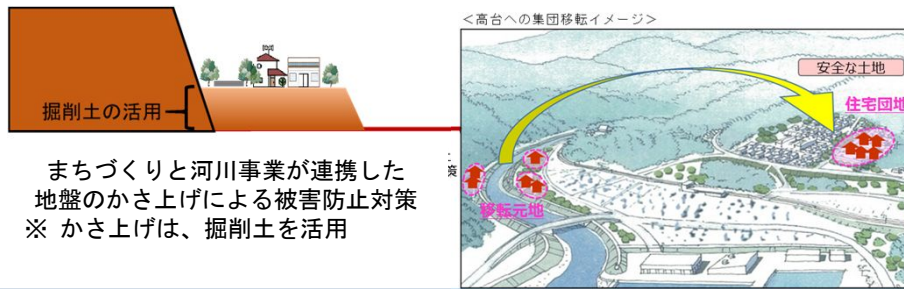

### ～二線堤、自然堤防の保全～

ハザードエリアの危険度を考慮したうえで、二線堤、自然堤防の保全等を推進。  
また、二線堤防の整備(道路造成等との連携)や現状において二線堤としての機能を持つ縦断盛土構造物の保全等を行うことにより、氾濫水による浸水範囲の軽減を図る。等



### ～不動産取引時の水害リスク情報提供～


住まい方の工夫に関する取組として、不動産関係団体への水害リスク情報の提供と周知の協力の推進 等

### ～土地利用規制・誘導(災害危険区域等)～

水害リスクを踏まえた土地利用の制限、住まいの誘導や住まい方の工夫について検討

- ・リスクの低いエリアへの誘導：土地利用規制・立地適正化計画(都市計画区域内)、災害危険区域の指定、住宅の移転
- ・住まい方の工夫：ピロティ化、構造強化、敷地かさ上げ 等

【立地適正化計画】水害リスクが低い場所への居住誘導の促進

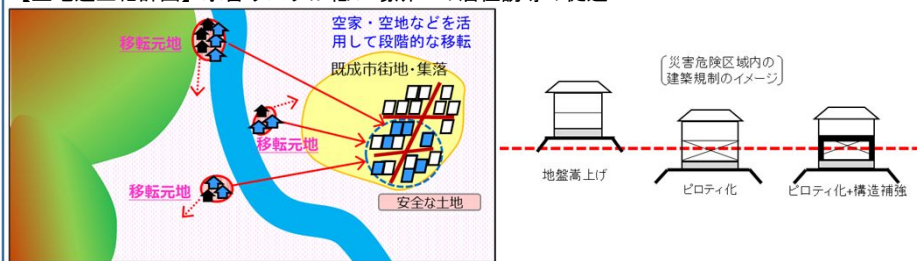

### ～排水門等の整備や排水機場の耐水化 等～

排水門の設置や排水機場・雨水ポンプ場の耐水化などを行うことにより、浸水被害が発生した場合において、早期に氾濫水や内水の排除を図る 等



## 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策(氾濫域での対策)について

○関係機関が連携して住民の避難行動につながるきめ細やかな情報提供、リスクコミュニケーションを行い、地域の人々の「迅速かつ的確な避難」と「被害最小化」を図るべく減災に向けた更なる取組の推進

### ～避難行動・水防活動に資する基盤等の整備～

避難時間の短縮のための避難所の量的・質的整備を推進。また、水防備蓄倉庫の量的・質的整備を推進  
河川カメラや水位計の設置および通行可能な避難路の状況を示す避難誘導案内板や監視カメラの検計・整備 等



### ～避難を判断するための情報伝達～

住民への確実な避難情報伝達等の伝達  
情報伝達手段を多重化、ネットワーク回線の二重化 等



住民情報サービスの配信

緊急速報メールの発信

戸別受信機を設置

### ～水害リスクの周知～

リスクマップ等の作成を進め、土地のリスク情報の周知  
リスクコミュニケーションの活用による防災意識の醸成  
WEB版のハザードマップ作成 等



### ～平時からの住民等の防災意識の醸成～

防災教育の充実を図る。  
住民一人ひとりに「自分の命は自分で守る」意識を醸成。  
防災リーダー（ファーストペンギン）を育成し、「地域ぐるみで命を守る」行動の実践 等



地域防災リーダー研修



八代市コミュニティタイムライン検討会



小学校での授業

### ～防災活動の着実な実施・連携体制の構築～

関係機関の具体的な事前防災行動計画を時系列的に整理し氾濫時の円滑な判断のための準備。事前防災行動をとるために必要な事前の情報共有会議 訓練の実施 等



項目	内容	実施時期	実施場所	実施者
事前防災行動計画の整理	球磨川水系緊急治水対策プロジェクト関係機関による事前防災行動計画の整理	令和3年度	八代市庁舎	八代市、関係機関
事前防災行動の準備	事前防災行動の準備	令和3年度	八代市庁舎	八代市、関係機関
事前防災行動の実施	事前防災行動の実施	令和3年度	八代市庁舎	八代市、関係機関


球磨川水害タイムライン検討会人吉市マルチハザードタイムライン

### ～地域と連携した排水活動及び訓練、施設運用～

大規模災害時の排水ポンプ車の設置箇所等を具体的に示した排水計画の共有と訓練による活用  
氾濫発生時にも継続的な災害対応を実施するための防災活動の拠点となる庁舎等の浸水対策の実施 等



排水ポンプ車の排水状況事例



排水ポンプ車等の配置計画



重点区画を設けて防護
