



平成24年8月17日

九州地方整備局

国道57号阿蘇市一の宮町坂梨 滝室坂の復旧状況について

～ 8月20日(月)13時に通行止めを解除します ～

1. 通行止め解除について

国道57号阿蘇市一の宮町坂梨の滝室坂においては、九州北部豪雨により7月12日から全面通行止めとしており、利用者の皆様にはご不便をおかけしています。仮道(仮橋)を設置する応急復旧工事は、現在、橋脚保護のための大型土のう設置、滑り止めカラー舗装工事を実施しており、今後、車線分離標及び標識等の交通安全施設設置工事を実施します。

以上の工事が8月20日(月)には完了し、同日13時に通行止めを解除いたします。(別紙-1)

2. 規制速度について

仮道(仮橋)は、安全のため規制速度を20km/時以下としています。ご通行の際には、標識等に従って安全運転でお願いいたします。

3. 連続雨量による通行規制について

今後、本復旧工事が完了するまでの間は、ご通行の安全を確保するため、連続雨量が140mmに達した時に通行規制(通行止め)を実施します。(別紙-1)

【通行規制(通行止め)】

- 区 間 : 阿蘇市^{なみのしょうちの}波野小地野～同市一の宮町坂梨^{いちのみやまちさかなし}
延長約4.6km
- 規制開始基準 : 連続雨量140mmに達した時

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局

道路部 道路管理課

課長 菅 伊佐男



課長補佐 谷川 征嗣

電話:092-476-3533(直通)

国道57号滝室坂の通行止の解除

【別紙-1】

- 路線名: 国道57号 たきむろざか 滝室坂
- 区間: 熊本県阿蘇市波野小地野 なみの しょうちの
～同市一の宮町坂梨 いちのみやまち さかなし
- 日時: **8月20日13時に通行止め解除**

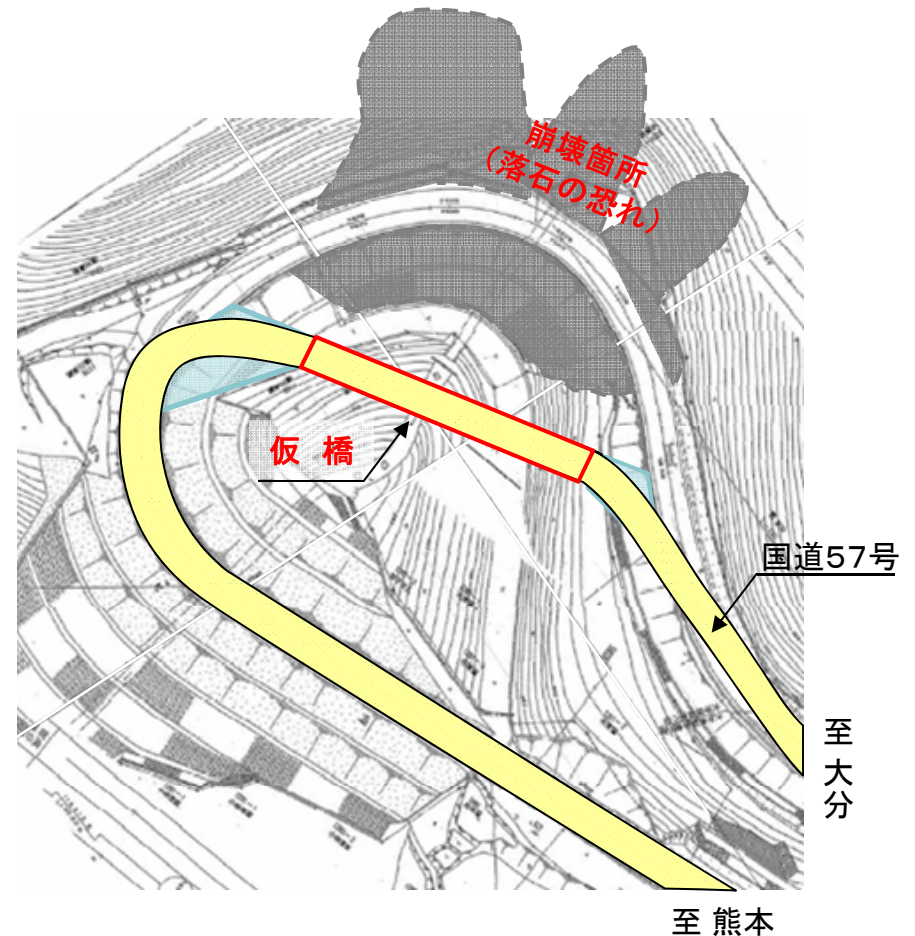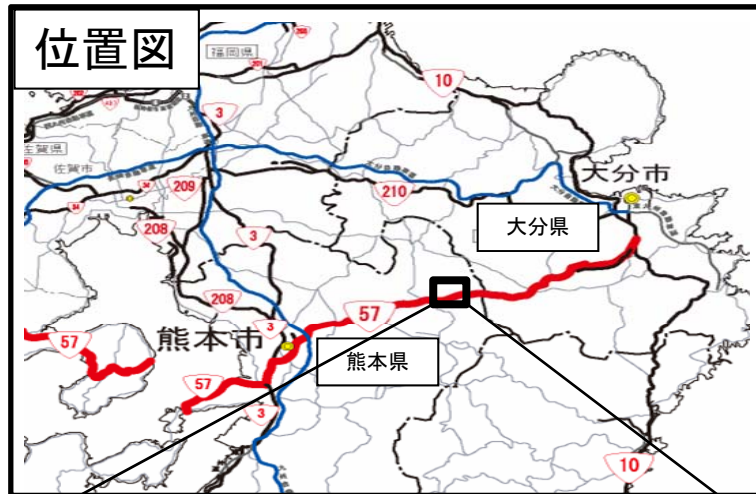

なお、今回通行止めを解除した区間については、通行の安全を確保するため、今後、連続雨量による通行規制(通行止め)を実施します。

区間: 阿蘇市波野小地野～同市一の宮町坂梨
(延長約4.6km)

基準: 連続雨量が140mmに達した時

参考資料

国道57号 阿蘇市滝室坂の応急復旧の経過

- 7月12日(木) 災害発生 【写真-1】
午前5時頃
- 7月12日午後 崩壊箇所に鋼製の仮設防護柵及び大型土嚢を設置 【写真-2】
~16日(月)
- 7月15日(日) 天候回復の機会を捉え、バルーンによる上空から斜面調査(空撮) 【写真-3】
- 7月16日(月) 専門家による現地調査を行い、被災箇所を避ける仮橋が適当と判断 【写真-4】
- 7月17日(火) 仮道に係る土地所有者から土地立入の承諾を取得
- 7月20日(金) 工事用進入路の整備完了
- 7月21日(土) 仮橋の設計完了
- 7月22日(日) 仮橋基礎部の地質調査ボーリング完了 【写真-5】
- 7月24日(火) 仮橋施工のための施工ヤードの整備完了 【写真-6】
- 7月26日(木) 専門家による浮き石転落に対する仮橋位置のチェック
- 8月4日(土) 仮橋の下部工(橋台・橋脚)工事完了 【写真-7】
- 8月8日(水) 仮橋の上部工(橋桁)工事完了 【写真-8】
- 8月9日(木) 取付盛土工事完了 【写真-9】
- 8月14日(火) 舗装工事、防護柵設置工事完了 【写真-10】
- 8月20日(月) 橋脚保護(大型土のう設置)工事、滑り止めカラー舗装工事、車線分離標及び標識等の交通安全施設設置工事完了予定
- 8月20日(月) 開通(全面通行止め解除)予定
午後1時

【写真－1】 斜面崩壊直後



【写真－2】 斜面崩壊に対する応急措置



【写真－3】 バルーンによる斜面調査



【写真－4】 崩壊箇所を回避し、仮道（仮橋）を設置



【写真－５】 地質調査ボーリング



【写真－６】 工事用進入路・仮橋施工ヤードの整備完了



【写真－ 7】 仮橋の下部工（橋台・橋脚）工事完了



【写真－ 8】 仮橋の上部工（橋桁）工事完了



【写真－ 9】 取付盛土工事完了



【写真－ 10】 舗装、防護柵設置工事完了

