第4回熊本地震等復旧·復興工事情報連絡会議

日時:平成29年11月29日(水)13時30分~

会場:熊本テルサ「テルサホール」(熊本市中央区水前寺公園 28-51)

次 第

- 1 開 会
- 2 挨 拶
- 3 議事
 - (議題1)復旧・復興工事の進捗状況について
 - ① 国土交通省九州地方整備局
 - ② 農林水産省九州農政局·九州森林管理局
 - ③ 熊本県·市町村
 - (議題2) 不調・不落の状況について
 - ① 国土交通省九州地方整備局
 - ② 農林水産省九州農政局·九州森林管理局
 - ③ 熊本県·市町村
 - (議題3) 復旧・復興工事及び通常工事に関する今後の発注計画等について
 - ① 国土交通省九州地方整備局
 - ② 農林水産省九州農政局
 - ③ 熊本県·市町村
 - (議題4) 建設資機材や労働力の確保に関する現状と課題について
 - ① 国土交通省九州地方整備局
 - (議題5) 円滑な施工確保対策について
 - ① 国土交通省九州地方整備局
 - ② 農林水産省九州農政局
 - ③ 熊本県
 - ④ 熊本市
 - (議題6) 関係機関が抱える課題について
 - ① 熊本県建設業協会
 - (議題7) 下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について
 - ① 熊本県
 - (議題8)暴力団排除対策について
 - ① 熊本県警察本部
- 4 その他
- 5 意見交換
- 6 閉 会

(名称)

第1条 本会議は、「熊本地震等復旧・復興工事情報連絡会議(以下、「情報連絡会議」 という。)」と称する。

(目的)

第2条 情報連絡会議は、熊本地震等により被災した公共土木施設等に係る復旧・復興 工事を円滑に進めるため、各地域の施工体制の確保等に係る様々な課題に対し、関係 者間において情報共有や対応策の検討を行うことを目的とする。

(協議事項)

- 第3条 情報連絡会議は、下記事項について協議する。
 - (1) 復旧・復興工事に関する発注計画の共有
 - (2) 建設産業の現状と課題の共有
 - (3) 建設資機材や労働力の確保に関する現状と課題の共有
 - (4) 適正な発注について
 - (5) 発注情報の一元化
 - (6) その他、情報連絡会議で必要と認める事項

(組織)

- 第4条 情報連絡会議は、国土交通省九州地方整備局及び熊本県で主催する。
- 2 構成員は別表1に掲げるとおりとする。

(役員)

第5条 本会議に、次の役員を置く。

議長 1名

副議長 1名

(役員の選任)

第6条 議長は、熊本県土木部長をもって充てる。

2 副議長は、国土交通省九州地方整備局企画部長をもって充てる。

(役員の職務)

- 第7条 議長は、本会議の会務を統括する。
- 2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議の開催)

第8条 情報連絡会議は、必要に応じて開催する。

(熊本地震等復旧・復興工事情報連絡準備会議)

- 第9条 情報連絡会議開催に向け、様々な課題の整理、検討等を行うため、熊本地震等 復旧・復興工事情報連絡準備会議を置く。
- 2 構成員は別表2に掲げるとおりとする。

(事務局)

- 第10条 情報連絡会議の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局は、熊本県土木部監理課に置くものとする。

(その他)

第11条 この規約に定めるもののほか、情報連絡会議の運営に必要な事項は、情報連絡会議において協議のうえ定める。

附 則

この規約は、平成28年11月10日から施行する。

附則

この規約は、平成29年2月13日から施行する。

附則

この規約は、平成29年6月2日から施行する。

附則

この規約は、平成29年11月29日から施行する。

		別表1
国土交通省	九州地方整備局	企画部長
	九州地方整備局 企画部	技術調整管理官
	九州地方整備局 企画部	技術開発調整官
	九州地方整備局 建政部	建設産業調整官
		営繕品質管理官
	熊本河川国道事務所	所長
	八代河川国道事務所	所長
	熊本復興事務所	所長
	菊池川河川事務所	所長
	川辺川ダム砂防事務所	所長
	立野ダム工事事務所	所長
		所長
	緑川ダム管理所	
曲共小本小	熊本営繕事務所	所長
農林水産省	九州農政局	設計課長
	土地改良技術事務所	所長
	九州森林管理局	治山課長
	熊本森林管理署	署長
熊本県	土木部	土木部長
		政策審議監
		監理課長
		土木技術管理課長
		営繕課長
	農林水産部	農林水産政策課長
		技術管理課長
		土木部長
		農林部長
		土木部長
	3 775-0 7753227775	農林部長
		土木部長
	工血%26%加头约	農林部長
		土木部長
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	農林水産部長
		土木部長
	玉石地域旅樂局	
		農林部長
	鹿本地域振興局	土木部長
		農林部長
	阿蘇地域振興局	土木部長
		農林部長
	県南広域本部	土木部長
		農林水産部長
	芦北地域振興局	土木部長
		農林部長
	球磨地域振興局	土木部長
		農林部長
	天草広域本部	土木部長
		農林水産部長
	教育庁	施設課長
熊本県警察本部	刑事部組織犯罪対策課	暴力対策官兼暴力対策室長
県内市町村	熊本市	土木主管課長
1	人吉市	契約主管課長

荒尾市
水俣市
玉名市
天草市
山鹿市
菊池市
宇土市
上天草市
宇城市
阿蘇市
合志市
美里町
玉東町
和水町
南関町
長洲町
大津町
菊陽町
南小国町
小国町
産山村
高森町
南阿蘇村
西原村
御船町
嘉島町
益城町
甲佐町
山都町
氷川町
芦北町
津奈木町
錦町
あさぎり町
多良木町

1	1	1
	湯前町	
	水上村	
	相良村	
	五木村	
	山江村	
	球磨村	
	苓北町	
建設産業団体	(一社) 熊本県建設業協会	会長
	(一社) 熊本県建設業協会 熊本支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 宇城支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 玉名支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 荒尾支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 鹿本支部	支部長
	(一社)熊本県建設業協会 菊池支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 阿蘇支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 上益城支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 八代支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 芦北支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 人吉支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 天草支部	支部長
	(一社) 熊本県建設業協会 建築部会	部会長
	(一社) 熊本県建設業協会 舗装部会	部会長
	熊本県管工事業組合連合会	会長
	<u>熊本県砕石業協同組合</u>	<u>理事長</u>
	熊本県鉄筋工事業協同組合	理事長
	熊本県生コンクリート工業組合	理事長
	(一社)熊本県法面保護協会	会長
	熊本県アスファルト合材協会	会長
	熊本県技能士会連合会建設専門工事業部会	部会長
	西日本建設業保証(株) 熊本支店	支店長
	<u>(一社)熊本県測量設計コンサルタンツ協会</u>	<u>会長</u>
	<u>(一社)熊本県警備業協会</u>	<u>会長</u>

[※]今後、構成員は必要に応じて追加されることもあり得る


国土交通省	九州地方整備局 企画部	技術管理課長
	九州地方整備局 建政部	建設産業課長
	九州地方整備局 営繕部	計画課長
	熊本河川国道事務所	所長
	熊本復興事務所	所長
農林水産省	九州農政局	設計課長
	九州森林管理局	治山課長
熊本県	土木部	土木部長
		政策審議監
		監理課長
		土木技術管理課長
		営繕課長
	農林水産部	農林水産政策課長
		技術管理課長
	県央広域本部	土木部長
		農林部長
	宇城地域振興局	土木部長
		農林部長
	上益城地域振興局	土木部長
		農林部長
	阿蘇地域振興局	土木部長
		農林部長
	教育庁	施設課長
県内市町村	熊本市	契約監理部長
		土木部長
		建築住宅部長
建設産業団体	(一社)熊本県建設業協会	会長

[※]構成員は、今後必要に応じて追加することもあり得る

【議題1】

「復旧・復興工事の進捗状況について」

- ①国土交通省九州地方整備局
- ②農林水産省九州農政局 · 九州森林管理局
- ③熊本県・市町村

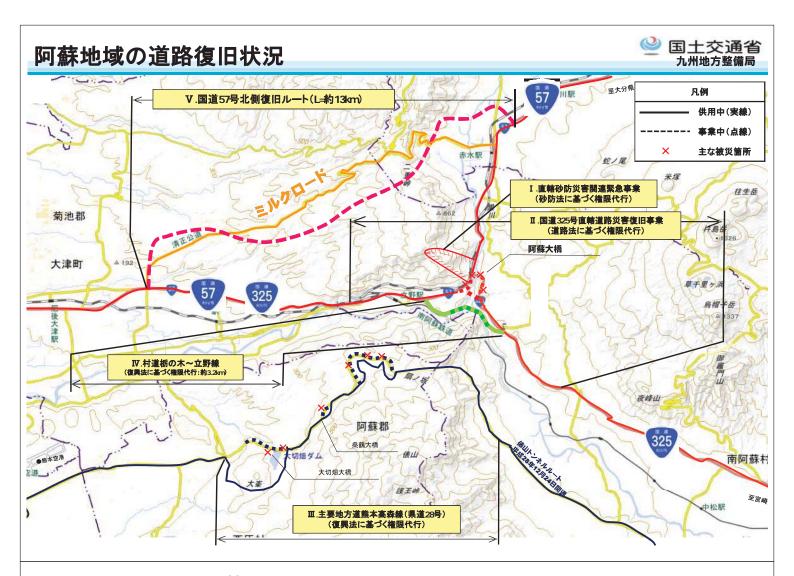

阿蘇大橋地区 大規模斜面崩壊(国道57号、国道325号、JR豊肥線)



1. 阿蘇大橋地区の進捗状況

平成29年 11月 15日現在

🎱 国土交通省 九州地方整備局

斜面中腹に堆積していた崩壊土砂等の除去が完了しました(10/31)。 現在、確実な斜面安定化を図るため、ネットエのアンカー引抜試験を実施中。



Ⅱ. 国道325号 阿蘇大橋【権限代行】



Ⅲ. 俵山トンネルルート(県道熊本高森線)【権限代行】











Ⅴ. 国道57号 北側復旧ルート





より斜面の恒久的な安定化対策を実施しています。)**砂)巧事業 (阿蘇大橋地区)** 阿蘇大橋地区で発生した大規模な斜面崩落において、



斜面下部に残る崩壊土砂の除去

地震により崩落した国道325号阿蘇大橋の架替 工事を推進し、平成32年度の開通を目指します。 国道325号、 (国道57号、 道路事業

引き続き、被災した橋梁等の復旧工事を推進します 平成28年12月24日 (土) 俵山トンネルルート開通 県道熊本高森線、村道栃の木〜立野線)

桑鶴大橋の復旧工事(県道熊本高森線)

阿蘇大橋イメージパース(国道325号) 阿蘇大橋(イメージ)

成29年8月27日(日)に長陽大橋ルート(村道栃の木〜立野線)が開通しました。 き続き、恒久復旧に向けた工事を推進します。 **コヤセヒ = wingth, | | | 長陽大橋ルートの開通式







TEL:0967-67-2017(代表) FAX:0967-67-2083(総務課)

(旧南阿蘇村長陽庁舎)

🎱 国土交通省 九州地方整備局 熊本復興事務所 https://www.gsr.mlit.go.jp/kumamoto_r 〒869-1404 熊本県阿蘇都南阿蘇村大字河陽3574

熊本地震からの復旧・復興を 加速し、強力に推進します

平成29年度 事業概要

医陽大橋ルード(村道栃の木〜立野線 平成29年8月27日(日)





熊本復興事務所 国土交通省 九州地方整備局



復旧・復興工事の進捗状況について

特定災害復旧事業 熊本農地海岸地区における工事の進捗状況について

1. 計画総事業費 : 1,680百万円

2. 事業工期 : 平成28年度~平成30年度3. 事業実施主体 : 九州農政局4. 特定災害復旧事業 熊本農地海岸地区 工事計画工程表(案:H29.11.29時点)

	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	数量(m)	(m)	# P · 4 *	平成28年度	F度			厅	平成29年度	E度							平成	平成30年度			1	ì
	区域名(上区名)	総延長	被災延長	土み工種	12 1 2	3	4 5	9	7 8	9 10	10 11	12 1	2	3	4 5	9	7	8 9	10	11 1	12 1	2	3
	飽託海岸 (熊本市西区沖新町)	3,517.5	411.0	地盤改良、堤防盛土、波返工(コンクリート)復旧																			
有明海側	四番海岸 (熊本市南区畠口町)	1,643.5	31.0	ブロック積復旧、波返エ(コンクリート)復旧																			
	海路口海岸(熊本市南区海路口町)	3,024.3	18.0	波返エ目地補修、天端被覆 (コンクリート)復旧													•						
	和鹿島海岸(八代郡氷川町)	7,412.0	1,029.0	潮遊池護岸復旧(被覆石)、地盤改良、天端被覆(コンクリート)復旧、堤防盛土、管理用道路復旧															-				
重 火 :	文政海岸 (八代市鏡町)	6,092.0	1,094.0	潮遊池護岸(被覆石)復旧、 管理用道路復旧							-	-											
E TOTAL CONTROL OF THE CONTROL OF T	昭和海岸(八代市昭和同仁町)	2,657.0	381.0	潮遊池護岸(地盤改良、被覆 石)復旧																			
	郡築海岸(八代市郡築町)	3,081.0	227.0	潮遊池護岸(被覆石)復旧			-																
*	■■■■■■■ 環境に配慮する期間、		Ail	全体工事計画、	H28年度工事(契約済み)、	事(契約	がある)	•		_	H29年度工事(契約済み)、	英工事	(契約)	済み).				129	30年)	H29·30年度工事(未契約)	(未製	(級)	

単位:百万円

災害復旧事業進捗状況

九州森林管理局

(発注担当課) 九州森林管理局·熊本森林管理署·熊本南部森林管理署

	全体	*	平成29年度第	第3四半期	契約済累計	车架計	実施率	季	工事完了	完了	完了率	掛
災害復旧事業の種類	件数	査に決定 工事費の 総額	契約件数	請負額	契約件数	左記請負額	契約件数	請負額	竣工件数	請負額	完了件数	請負額
治山施設災害復旧事業	13	899	0	0	12	747	92.3%	83.1%	0	0	%0'0	%0.0
治山災害関連緊急事業	3	675	0	0	3	662	100.0%	98.1%	0	0	%0'0	%0.0
林道施設災害復旧事業	9	116	0	0	5	104	83.3%	89.7%	2	104	83.3%	89.7%
수計	22	1,690	0	0	20	1,513	%6'06	89.5%	2	104	22.7%	6.2%

※治山施設災害復旧事業の残1件は、H29.11月公告、H29.12月入札予定。 ※林道施設災害復旧事業の残1件は、他工事との調整により繰越にて発注予定。 C



C



復旧・復興工事の進捗状況について



県・市町村(政令市含む)災害復旧事業の進捗状況(平成29年9月末時点)

〇 全災害件数10,516件のうち件数ベースで約63%が発注済、約29%が完了。

上段:平成29年9月末時点

						(下段	:平成29年3月末時点	末時点)	単位	単位:件、百万円
※実復口事業の強超	₹	***	平成29年度 第2四半期末(9月 発注済累計)年度 : (9月末) :累計	発注率		工事完了	き了	完了率	<u>₩</u>
1 X X I X X I X X I X X I X X X X X X X	件数	査定決定工事 費の総額	発注件数	左記 発注額	発注件数	発注額	竣工件数	竣工額	竣工件数	竣工額
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=C/A)	(F=D/B)	(G)	(H)	(I=G/A)	(J=H/B)
公共土木施設災害復旧事業	5,005	103,600	3,926 (2,753)	61,237 (46,694)	78.4%	59.1% (45.1%)	2,021 (970)	19,490 (6,046)	40.4%	18.8%
農業用施設災害復旧事業	2,377	17,146	1,206 (503)	5,157 (2,166)	50.7% (21.2%)	30.1% (12.6%)	400 (169)	1,421 (539)	16.8% (7.1%)	8.3%
農地災害復旧事業	2,786	8,017	1,237 (335)	3,217 (788)	44.4%	40.1%	428 (116)	437 (168)	15.4% (4.2%)	5.5% (2.1%)
林道施設災害復旧事業	303	1,829	264 (179)	1,573 (1,076)	87.1%	86.0%	127 (54)	807 (201)	41.9%	44.1%
治山施設災害復旧事業	20 (")	848	9 (7)	233 (190)	45.0%	27.4% (22.4%)	4 (1)	147 (26)	20.0%	17.4%
漁港施設災害復旧事業	25 (")	429	25 (24)	398	100.0%	92.8% (92.1%)	12 (7)	140 (48)	48.0%	32.6% (11.2%)
榅	10,516	131,870	6,667	71,814 (51,310)	63.4% (36.1%)	54.5%	2,992 (1,317)	22,442 (7,027)	28.5% (12.5%)	17.0%

県・市町村(政令市含む)の計、国直轄、代行事業は除く地震、梅雨前線豪雨等28年発生災害査定後(~1/13)建築・営繕は除く

C

復旧・復興工事の進捗状況について

県・市町村(政令市含む)公共土木施設災害復旧工事の進捗状況(平成29年9月末時点)

- 全災害件数のうち県央(熊本市、上益城、宇城)地域に約63%が集中、そのうち約75%が発注済。 県北地域の全災害件数は約32%で、そのうち約82%が発注済。
- 全体では、約78%が発注済みで、そのうち約40%が完了。

公共土木施設災害復旧事業分

上段:平成29年9月末時点(下段:平成29年3月末時点)

ぶらぶんログロナオン					(下段:平成29年3月末時点)	月末時点)		単位:件
	県	うち熊本・上苗城地域	北	うち阿蘇地域	単	天	<u></u>	うち熊本・上描域・阿蘇地域
総箇 所数A	3,153	2,388	1,577	1,236	143	132	5,005	3,624
構成比 (A/∑A)	63.0%	47.7%	31.5%	24.7%	2.9%	2.6%	100.0%	72.4%
発注済数B	2,358 (1,572)	1,701	1,296 (927)	964 (624)	142 (134)	130 (120)	3,926 (2,753)	2,665 (1,749)
発注率 (B/A)	74.8% (49.9%)	71.2% (47.1%)	82.2% (58.8%)	78.0%	99.3%	98.5%	78.4% (55.0%)	73.5%
竣工数C	1,087 (503)	739	690 (326)	415 (192)	126 (70)	118 (71)	2,021 (970)	1,154 (504)
完了率 (C/A)	34.5% (16.0%)	30.9%	43.8% (20.7%)	33.6% (15.5%)	88.1% (49.0%)	89.4% (53.8%)	40.4% (19.4%)	31.8%

[※]査定件数ベース ※県工事を含む ※地域ブロックは県の広域本部管轄区分 〇県央:熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 〇県央:熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 〇県北:荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村 〇県北:荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、北上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町 〇県南:八代市、人吉市、水保市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町 〇天草: 上天草市、天草市、 苓北町

C

復旧・復興工事の進捗状況について

É 旧工事の進捗状況(平成29年9月末時 等後 県·市町村(政令市含む)農林水産部施設災害

- 全災害件数のうち県央(熊本市、上益城、宇城)地域に約68%が集中、そのうち約37%が発注済 県北地域の全災害件数は約29%で、そのうち約74%が発注済。
- 0 全体では、約50%が発注済みで、そのうち約18%が完了

日事業分 等後| ĤI HI 農林水産部施設災

82.5% (562)41.4% (12.4%)(133)11.9% (2.9%)4,545 1,882 542 **: *** |うち熊本・||描 |城・||阿蘇地域 単位: (") 49.7% %0.001 17.6% # (1,048)(19.0%) (8.3%) (341)5,511 ~ 971 単位 盂 <□ 1.3% 90.1% (76.1%) 88.7% (10)64 (54) (14.1%) 63 7 *** *** 丰 上段:平成29年9月末時点 (下段:平成29年3月末時点) Ж 99.0% 92.8% <u>%</u> 58.8%) 96 93) 95.9%) 90 57) 97 = = 珊 账 21.8% (300)86.7% (102)23.7% (8.5%) 24.9%) 285 ,203 **>** = シ も 回 糠 地 複 28.6% (517)74.4% 26.6% 32.8%) (174)(11.0%),576 419 ` ` ***** 쓔 账 %9.09 32.3% (31) 7.7% (262)(%6.0) (7.8%) 3,342 1,079 **:** 257 = うち熊本・ 上柑掝岩域 (*) (*) 37.4% 68.4% (384)(10.2%)10.6% (106),409 399 3,767 出 账 構成比 (A/ΣA) (B/A) (C/A) 総箇所数A 発注済数B 竣工数C 発汗率 完了举

[※]査定件数ベース ※県工事を含む ※地域ブロックは県の広域本部管轄区分 〇県央:熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 〇県北:熊尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村 〇県北:荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町 〇県南:八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町 〇只南:八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町

9

復旧・復興工事の進捗状況について

県・市町村(政令市含む)災害復旧関係事業※の進捗状況(平成29年9月末時点)

※対象事業:災害関連事業、激甚災害対策特別緊急事業、災害関連緊急事業、復旧治山事業 など(平成28年災害分)

災関緊、激特)の構成比率が工事費ベースで約47%。 砂防・地すべり関係(関連、

発注率(工事費ベース)は全体で約17%。

上段:平成29年9月末時点 (下段:平成29年3月末時点)

0.0% 51.7% 8.3% 0.0% 3.7% 57.7% 16.5% 金額単位:百万円 (5.7%)0.0% 0.5%) 0.0% 0.0% (工事費ベース) (F=E/B)発汗率 1,839 (115)0 0 (2,089)(2,204)0 0 0 368 5,470 7,737 左記 発注額 滔 $\widehat{\mathbb{H}}$ 平成29年度 第2四半期末(9月末): 発注済累計 4 6 1 0 0 0 0 00 99 工事発注件数^{注2} 9 100.0% 1.5% 47.2% %8.6 0.8% 20.2% 56.9%) (11.9%) (24.4%)(1.8%) (4.7%)(0.3%) (100.0%)(工事費ベース) $(C=B/\Sigma B)$ 構成比率 (1.837)969 22,128 4,610 9,473 46,924 38,860 9,901 **" :** : **>** = 全体工事費^{注1} 全体工事費 箇所数 (B) (2) (431)230 78 " 929 89 = = = 箇所数 8 災関緊、激特) 宅地耐震化推進事業 (大規模盛土造成地滑動崩落防止事業) 災害復旧関係事業の種類 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 災関緊) 砂防・地すべり関係(関連、 (復旧治山、 (関連) 河川関係 (関連) 盂 橋梁関係 治山関係 ďП

注1:全体工事費のみを対象とする(工事費以外の用地補償費や測量試験費等は除く)

注2:1 事業において発注した複数の工事を累計した件数を記載

1-3-6

C

復旧・復興工事の進捗状況について

県・市町村(政令市含む)災害復旧関係事業※の進捗状況(平成29年9月末時点)

※対象事業:災害関連事業、激甚災害対策特別緊急事業、災害関連緊急事業、復旧治山事業 など(平成28年災害分)

- 総事業数のうち県央地域が約43%。
- 総工事費のうち県北地域が約73%であり、特に阿蘇地域に集中している。

上段:平成29年9月末時点7年8:30年3日末時点7年8:30年3日末時点7年3月

				(下段:平成29年3月末時点	年3月末時点)		(r)	金額単位:百万円
	⊪	ンカ熊本・ 上 上	⊪ 岩	うち阿蘇地域	軍	下草	仙	うち熊本・上益 城・阿蘇地域
総事業数A	281 (246)	240 (220)	360 (170)	351	13 (13)	2 (2)	656 (431)	591
事業数構成比(A/ΣA)	42.8% (57.1%)	36.6%	54.9% (39.4%)	53.5%	2.0%	0.3%	100.0%	90.1%
8肇重工%	11,816 (8,444)	10,246 (6,942)	34,212 (29,519)	33,319 (28,626)	770 (770)	126 (126)	46,924 (38,859)	43,565
工事費構成比 (B/∑B)	25.2% (21.7%)	21.8% (17.9%)	72.9% (76.0%)	71.0%	1.6%	0.3%	100.0%	92.8%
発上済工事費(1,387 (357)	1,186 (251)	5,659	5,096 (1,033)	576 (218)	116 (116)	7,738 (2,204)	6,282
発注率 (C/B) ※工事費ベース	11.7% (4.2%)	11.6%	16.5% (5.1%)	15.3%	74.8% (28.3%)	92.1%	16.5% (5.7%)	14.4%
注1: 体物け車業粉レゴス								

注1:件数は事業数とする。

注2:全体工事費のみを対象とする(工事費以外の用地補償費や測量試験費等は除く)。

※地域ブロックは県の広域本部管轄区分

〇県央:熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町 〇県北:荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村 〇県南:八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町 〇天草:上天草市、天草市、苓北町

復旧・復興工事の進捗状況について

県有施設における災害復旧工事の進捗状況(平成29年9月末時点)

上段:平成29年9月末時点

					(下段:平成29	: 平成29年3月末時点)		単位	単位:施設、百万円
	分	単	うち熊本・ 上益城地域	半	うち阿蘇地域	県南	天草	台	うち熊本・上益城・宇城地域
	施設数 計 (A) ^{注1}	34 (")	27	(")	(")	(")	2 (")	(")	28
本《二十·回十十号)	構成比 (A/ΣA)	81.0%	64.3%	14.3%	2.4%	0.0%	4.8%	100.0%	%(")
核父った派血高段	工事費 計(B) ^{注2}	7,433 (8,953)	7,043 (8,563)	307 (403)	61	(")	13 (31)	7,753 (9,387)	7,104 (8,624)
	構成比 (B/∑B)	95.9% (95.4%)	90.8%	4.0%	0.8%)	(%0.0)	0.2%	100.0%	91.6%
书 大器	発注額 (C)	6,757 (4,969)	6,403 (4,710)	193 (99)	40 (0)	(")	13 (13)	6,963 (5,081)	6,443 (4,710)
光上牛	発注率(工事費ベース)(D=C/ B)	90.9%) (55.5%)	90.9%	62.9% (24.6%)	65.6% (0.0%)	(")	100.0% (41.9%)	89.8% (54.1%)	90.7% (54.6%)
	域工額 (E)	3,437 (1,343)	3,262 (1,294)	114 (19)	(2)	(")	13 (2)	3,564 (1,364)	3,262 (1,296)
	完了率(工事費ベース)(F=E/B)	46.2% (15.0%)	46.3% (15.1%)	37.1% (4.7%)	0.0%	(")	100.0% (6.5%)	46.0% (14.5%)	45.9%
母 人	完了した施設数 (G)	12 (2)	(2)	2 (0)	(0)	(")	2 (0)	16 (2)	(2)
	完了率(施設数ベース)(H=G/A)	35.3% (5.9%)	29.6%	33.3%	(%0.0)	(")	100.0%	38.1%	28.6% (7.1%)

注1:県有施設の施設数は、土木部営繕課へ復旧事業を依頼された施設数を計上。 例)県庁舎、議会棟、各出先機関の庁舎、県立劇場、熊本産業展示場、県民総合運動公園、県立高校 など

注2:工事費は、県有施設所有所管課から土木部営繕課に依頼のあった予算額を計上。なお、復旧完了した施設については、精算額を計上。

復旧・復興工事の進捗状況について

市町村・小中学校における災害復旧工事の進捗状況(平成29年9月末時点

上段:平成29年9月末時点

数	. 14						 ※地域ブロックは県の広域本部管轄区分				性 ○ 	
単位:校	うち熊本・上益城・阿蘇地域	101	46 (")	147	69.3%	(38)	20 (11)	87 (49)	60.8% (56.3%)	66.3% (37.6%)	43.5% (23.9%)	59.2%
木 55 元 木 55 元)	合	145	(")	212 (")	100.0%	107 (64)	36 (23)	143 (87)	100.0%	73.8% (44.1%)	53.7% (34.3%)	67.5% (41.0%)
・ 干淡 2 3 平 3 万 木 時 点 : : 平成 2 9 年 3 月 末 時 点 .	天草	(")	(")	(")	0.5%	1 (1)	(0) 0	1 (1)	0.7%	100.0%	(-)	100.0%)
(大 ((((((((((((((((((県南	4 (")	3 (")	(")	3.3%	4 (4)	(3)	7 (7)	4.9%	100.0%	100.0%	100.0%
Ť E	うち阿蘇地域	11 (")	(")	17 (")	8.0%	(9)	(3)	14 (9)	9.8%	72.7% (54.5%)	100.0%	82.4% (52.9%)
	温	33	15 (")	48 (")	22.6%	28 (23)	13 (10)	41 (33)	28.7% (37.9%)	84.8% (69.7%)	86.7%	85.4% (68.8%)
•	うち熊本・上益城地域	(")	40 (")	130	61.3%	59 (32)	14 (8)	73 (40)	51.0%	65.6%	35.0%	56.2%
	県	107	49 (")	156 (")	73.6%	74 (36)	20 (10)	94 (46)	65.7% (52.9%)	69.2% (33.6%)	40.8% (20.4%)	60.3% (29.5%)
	\$	小学校	中学校	- 	構成比 (A/ ∑ A)	小学校	中学校	†	構成比 (B/ ΣB)	小学校	中学校	† -
	X			被災した学校(A)			(ロ) 井戸十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	関ロが売」した子校(5)			完了率 (A/B)	

8市町※の庁舎建替については、5市町で工事着手されている。 市町庁舎の建て替えの進捗状況(平成29年9月末時点)

※八代市、人吉市、水俣市、宇土市、天草市、大津町、小国町、 益城町

【議題2】

「不調・不落の状況について」


- ①国土交通省九州地方整備局
- ②農林水産省九州農政局 · 九州森林管理局
- ③熊本県・市町村

平成28年度発注工事(全工種)の契約状況



熊本県内国土交通省直轄工事における契約状況

〇平成28年度発注工事は、一旦不調・不落となった後、再発注等により現段階で概ね契約できている。

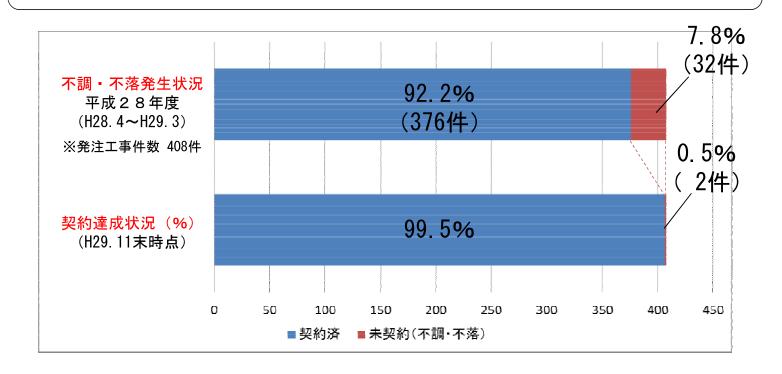


平成29年度発注工事(全工種)の契約状況



熊本県内国土交通省直轄工事における契約状況

〇平成29年度発注工事は、一旦不調・不落となった後、再発注等による手続きを進めている。

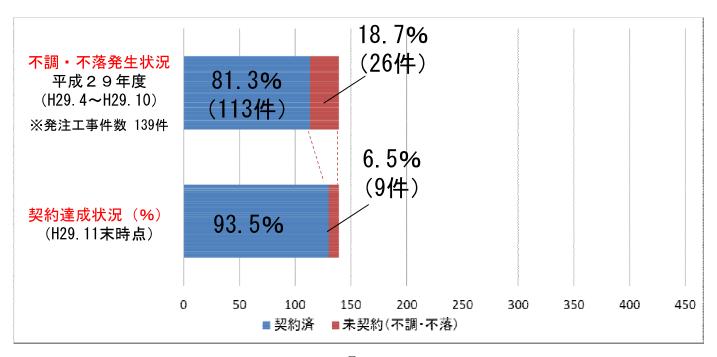


不調・不落の状況(熊本県内国土交通省直轄工事・全工種)




■ 発注件数(直轄·熊本県内)

不調不落件数(直轄・熊本県内)

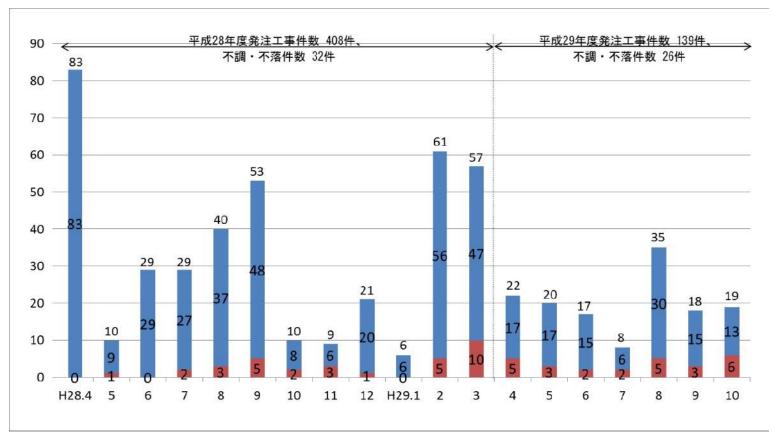

※国土交通省集計(港湾空港除く)


不調・不落の状況(熊本県発注工事・全工種)





熊本県内における平成28年度、平成29年度の発注工事件数




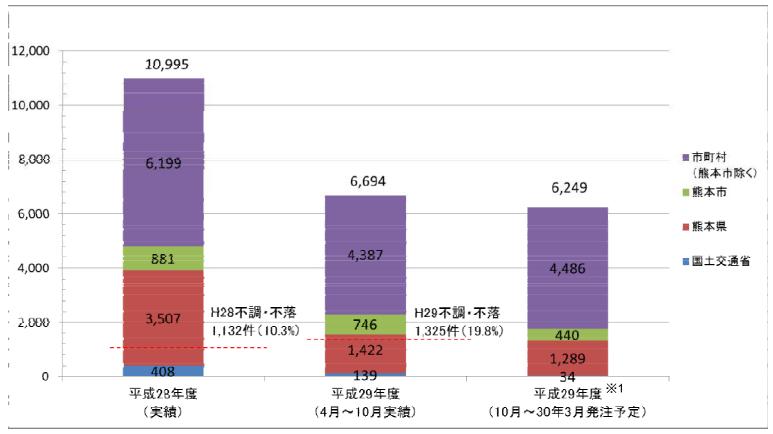


※1 平成29年度の10月~30年3月発注予定の件数については、10月時点で公表している発注見通しの件数であるため、実際の件数は変更となる場合があります。


その他に、警察庁九州管区警察局、財務省九州財務局、農林水産省林野庁九州森林管理局、国土交通省海上保安庁第十管区海上保安本部、環境省九州地方環境事務所、西日本高速道路(株)において、平成29年度の10月~30年3月に24件の発注が予定されています。

熊本県内における平成28年度発注工事の不調・不落件数



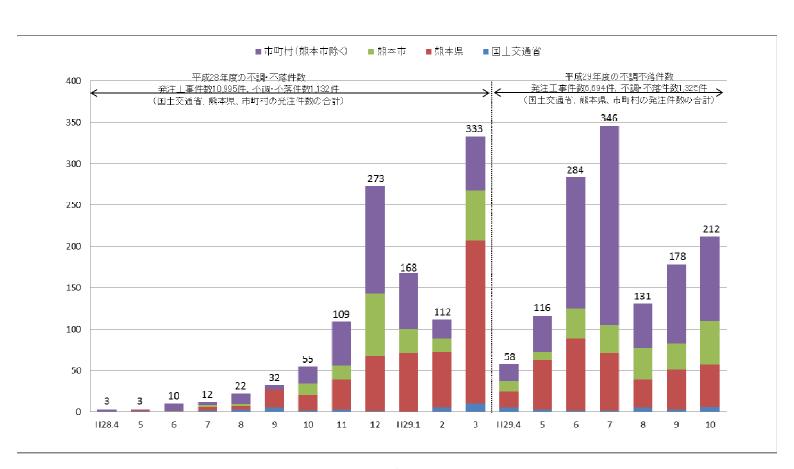

〇熊本県内の国土交通省直轄工事における現場の稼働状況については、平成28年度末から引き続き ピークを継続し続けるものの、年度末にかけて少なくなっていく傾向にある。

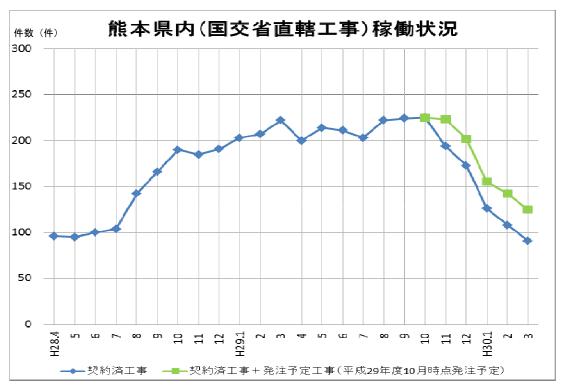

※発注予定工事(平成29年度10月時点発注予定)は、「発注情報の一元化」資料の入札予定時期(第3四半期、第4四半期)を それぞれ11月、2月に契約したとして稼働状況を算出。

不調・不落の状況について

平成29年度は、20件の工事を発注する計画であり、10月末までの間、<mark>入札不調が7件発生</mark>している。 九州農政局では、平成28年度、熊本県下において21件の工事を発注、入札不調は発生していない。 施工地域別、発注時期等の内訳は下表のとおり。

熊本県下における入札不調発生件数等

※表内の()は、工事発注(又は発注予定)件数

(単位:件)

二(当	+-	0 (12)	(0) 0	2 (2)	4 (5)	1 (1)	7 (20)
29年10月末時	第3四半期 以降	0 (1)	0 (0)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (4)
平成29年度(平成29年10月末時点)	第2四半期	0 (1)	0 (0)	(0) 0	2 (0)	1 (0)	3 (1)
平 平	第1四半期	0 (10)	0 (0)	2 (1)	2 (4)	0 (0)	4 (15)
†	平成28年度 (実績)	0 (13)	0 (2)	0 (1)	0 (2)	0 (3)	0 (21)
	施工地域	玉名	阿蘇	半 端	八代	球磨	#=

九州森林管理局 不調·不落件数一覧(11月末現在)

	1	:			区分					
局署	工種	件数	入札者なし	1者入札	失格	予定価格超過	件数	契約済	今後発注予定	繰越発注
Ш	(川県)半干	1	1				1	12	1	
/可	土木(林道)	0					0			
**************************************	(川県)半干	0					0	3		
# +	土木(林道)	0					0	1		1
能木品如果	(中県)半干	0					0			
照	土木(林道)	0					0	4		
	(中県)半干	1	1	0	0	0	1	15	1	0
抽	土木(林道)	0	0	0	0	0	0	5	0	1
	+	1	-	0	0	0	1	20	1	1

平成29年度県工事における不調不落状況一覧(農林水産部、土木部)

平成29年10月31日現在

(1)年度別件数

年度	入札件数	不調	件数	不落	件数		合計
十段	八化件数	入札者なし	1者入札	失格	内訳書不備等		
平成27年度	2,590	18	13	10	4	45	1.74%
平成28年度	3,507	372	106	6	4	488	13.92%
平成29年度	1,422	294	68	3	4	369	25.95%

(2)発注機関別件数

年度•月	本庁	熊農	熊土·駅周	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合計
H27	8	2	0	1	6	1	3	9	3	4	1	0	7	45
H28	75	14	131	19	125	8	6	3	76	14	2	12	3	488
H29	35	11	97	37	37	2	9	2	101	13	2	4	19	369
H29入札件数	119	26	209	117	101	66	52	41	284	105	52	123	127	1,422
(%)	29.4	42.3	46.4	31.6	36.6	3.0	17.3	4.9	35.6	12.4	3.8	3.3	15.0	25.9

(3)月別件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入札件数(A)	45	124	261	231	189	290	282						1,422
(うち災害関係)	(27)	(82)	(141)	(109)	(41)	(58)	(52)						(510)
不調不落件数(B)	20	60	87	69	34	48	51						369
(うち 1者入札)	(9)	(9)	(14)	(14)	(4)	(12)	(6)						(68)
(うち災害関係)	(15)	(45)	(79)	(56)	(12)	(23)	(21)						(251)
発生率(%)	44.4	48.4	33.3	29.9	18.0	16.6	18.1						25.9

(4)発注業種別件数

業種	件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	(発生率)
土木	不調 不落	14	56	80	63	28	36	41						318	35.6%
	入札件数	28	95	184	154	129	168	136						894	33.0%
建築	不調・不落	3	3	4	3	3	5	5						26	49.1%
上 建苯	入札件数	4	11	7	7	7	9	8						53	49.1%
舗装	不調 不落	0	0	0	0	0	0	0						0	0.0%
一	入札件数	3	8	41	23	21	61	36						193	0.0%
電気	不調 不落	0	0	0	0	1	0	0						1	4.8%
电机	入札件数	0	1	1	3	8	4	4						21	4.0%
管	不調 不落	1	0	1	1	0	3	0						6	25.20/
E	入札件数	1	1	3	3	3	5	1						17	35.3%
その他	不調 不落	2	1	2	2	2	4	5						18	7.4%
ての他 	入札件数	9	8	25	41	21	43	97						244	7.4%

(参考) 不調不落発生工事のその後の契約状況

① H28 年度入札執行分

不調不落発生状況 (H28.4~H29.3)



※ 契約締結済分には、他工事への増工及び取止めとした工事を含む。 未契約分には、人手不足等の状況を鑑み、発注時期の調整を行っている工事を 含む。

(参考) 不調等工事件数(実数)・契約状況(平成28年度入札実施分) ※平成29年10月31日現在 ※上益城地域振興局から熊本土木事務所に移管された事業のうち、平成28年度未契約分(49件)については熊本土木事務所に計上する。

	本庁	熊農	熊土·駅周	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合 計	割	合
入札不調等発生工事件数	56	9	144	19	50	8	6	3	59	11	2	9	3	379		
うち土木	52	-	144	17	43	7	2	3	33	7	0	4	1	313		
うち農林	4	9	-	2	7	1	4	0	26	4	2	5	2	66		
契約締結済工事件数	54	8	71	15	41	8	6	3	38	9	2	9	3	267		70.4%
うち土木	51	-	71	13	35	7	2	3	19	6	0	4	1	212		
うち農林	3	8	-	2	6	1	4	0	19	3	2	5	2	55		
未契約工事件数	2	1	73	4	9	0	0	0	21	2	0	0	0	112		29.6%
うち土木	1	-	73	4	8	0	0	0	14	1	0	0	0	101		
うち農林	1	1	-	0	1	0	0	0	7	1	0	0	0	11		

⁽注)不調等が発生した工事について、延べではなく工事単位の実数でカウントしたもの

② H29 年度入札執行分における未契約等工事件数(実数)

不調等工事件数(実数)【平成29年度入札実施分】 ※入札不調等により未契約等の工事件数(土木部・農林水産部) 平成29年10月31日現在

	本庁	熊農	熊土·駅周	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合	計	
入札不調等発生工事残件数	12	3	40	25	18	2	4	2	64	9	2	0	8		1	89
うち土木	8	-	40	15	4	1	1	1	43	2	0	0	4			119
うち農林	4	3	-	10	14	1	3	1	21	4	2	0	5			68

⁽注)不調等が発生した工事について、延べではなく工事単位の実数でカウントしたもの

※未契約等の工事: 再度の入札の結果契約に至った工事、他工事への増工、取止め等工事以外の今後も入札が必要となる工事

(参考)発注機関別入札不調等発生件数

年度	本庁	熊農	熊土·駅周	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合計
H29	35	11	97	37	37	2	9	2	101	13	2	4	19	369

市町村における不調不落状況一覧

(1)年度別件数

年度	入札件数	不調件数 (入札者なし・一者入札等)	不落件数 (失格•内訳書不備等)	合計	
平成28年度	7,080	6	12	612	8.6
平成29年度	5,133	910	20	930	18.1

(2)広域本部(地域振興局)管内別件数

年度	県央	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合計
H28	218	79	64	9	15	41	55	23	0	28	80	612
H29	214	73	437	2	11	13	142	12	0	10	16	930
H29入札件数	746	555	1,192	283	400	117	647	257	194	293	449	5,133
H29入札不調不落発生率(%)	28.7	13.2	36.7	0.7	2.8	11.1	21.9	4.7	0.0	3.4	3.6	18.1

(3)平成29年度月別不調・不落件数の推移

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入札件数	312	607	949	942	754	716	853						5,133
不調不落件数合計	33	53	195	275	92	127	155						930
不調不落等発生率	10.6	8.7	20.5	29.2	12.2	17.7	18.2						18.12%

(4)平成29年度発注業種別不調不落の件数

業種	件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	(発生率%)
土木	不調·不落件数	22	42	157	238	49	80	98						686	22.5
	入札件数	189	345	615	589	397	444	470						3,049	22.5
建築	不調·不落件数	11	5	20	20	32	27	25						140	28.9
	入札件数	34	73	60	87	79	63	89						485	20.9
舗装	不調·不落件数	0	0	5	0	2	2	2						11	2.9
間衣	入札件数	18	52	69	64	64	51	64						382	2.9
電気	不調·不落件数	О	1	1	1	0	1	0						4	2.3
电水	入札件数	6	22	30	33	43	19	20						173	2.5
管	不調·不落件数	0	3	5	11	3	9	16						47	13.0
E E	入札件数	26	64	65	69	44	35	59						362	13.0
その他	不調·不落件数	0	2	7	5	6	8	14						42	6.2
(0)	入札件数	39	51	110	100	127	104	151						682	0.2

H29.10末現在

_	. 1							-			ı		ī				0末現在
No.	地域	機関名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計		不調率等
1	県央	熊本市	12	9	36	34	38	32	53						214	746	28. 7
2	宇城	宇土市	3	2	1	3	4	3	4						20	111	18. 0
3		宇城市	0	3	5	0	0	11	6						25	98	25. 5
4		美里町	1	0	0	0	0	0	27						28	346	8. 1
		管内計	4	5	6	3	4	14	37						73	555	13. 2
5		荒尾市	0	0	0	0	0	0	1						1	28	3. 6
6		玉名市	0	2	2	1	0	0	4						9	147	6. 1
7			0	0	0	0	0	0	0						0	25	0. 1
-		玉東町			-												
8		和水町	0	0	0	0	0	0	0						0	112	0.0
9		南関町	0	0	0	0	0	0	0						0	67	0. 0
10		長洲町	0	0	0	0	0	1	0						1	21	4. 8
		管内計	0	2	2	1	0	1	5						11	400	2. 8
11	鹿本	山鹿市	0	1	0	0	0	6	6						13	117	11. 1
12	菊池	菊池市	0	0	1	0	0	0	0						1	88	1. 1
13		合志市	0	0	1	0	0	0	0						1	75	1. 3
14		大津町	0	0	0	0	0	0	0						0	69	0. 0
15		菊陽町	0	0	0	0	0	0	0						0	51	0. 0
		管内計	0	0	2	0	0	0	0						2	283	0. 7
16	- - - 阿蘇 -	阿蘇市	17	9	17	8	12	20	2						85	185	45. 9
17			0	0	0	0	0	1	1						2	18	11. 1
-		南小国町															
18		小国町	0	0	1	0	0	0	0						1	26	3. 8
19		産山村	0	0	0	0	1	0	0						1	35	2. 9
20		高森町	0	0	0	0	0	0	0						0	28	0. 0
21		南阿蘇村	0	2	0	2	23	20	1						48	233	20. 6
22		西原村	0	0	2	0	0	0	3						5	122	4. 1
		管内計	17	11	20	10	36	41	7						142	647	21. 9
23	- 上益城	御船町	0	0	0	0	1	1	0						2	167	1. 2
24		嘉島町	0	0	0	0	3	2	0						5	49	10. 2
25		益城町	0	3	2	1	6	3	2						17	111	15. 3
26		甲佐町	0	0	0	0	0	0	0						0	89	0. 0
27		山都町	0	22	123	224	0	18	26						413	776	53. 2
21		管内計	0	25	125	225	10	24	28						437	1, 192	36. 7
			-	-	- 1	_											
28		八代市	0	0	- 1	2	2	3	4						12	227	5. 3
29	八代	氷川町	0	0	0	0	0	0	0						0	30	0. 0
		管内計	0	0	1	2	2	3	4						12	257	4. 7
30	曹北	水俣市	0	0	0	0	0	0	0						0	49	0. 0
31		芦北町	0	0	0	0	0	0	0						0	108	0. 0
32		津奈木町	0	0	0	0	0	0	0						0	37	0. 0
		管内計	0	0	0	0	0	0	0						0	194	0. 0
33	 	人吉市	0	0	3	0	0	0	1						4	65	6. 2
34		錦町	0	0	0	0	0	0	0						0	8	0. 0
35		あさぎり町	0	0	0	0	0	0	0						0	58	0. 0
36		多良木町	0	0	0	0	0	3	3						6	34	17. 6
37		湯前町	0	0	0	0	0	0	0						0	12	0.0
38			0	0	0	0	0	0	0						0	23	0.0
-		水上村															
39		相良村	0	0	0	0	0	0	0						0	15	0.0
40		五木村	0	0	0	0	0	0	0						0	22	0.0
41		山江村	0	0	0	0	0	0	0						0	17	0. 0
42		球磨村	0	0	0	0	0	0	0				<u> </u>		0	39	0. 0
		管内計	0	0	3	0	0	3	4						10	293	3. 4
43	天草 -	天草市	0	0	0	0	2	3	6						11	377	2. 9
44		上天草市	0	0	0	0	0	0	5						5	52	0. 0
45		苓北町	0	0	0	0	0	0	0						0	20	0. 0
H		管内計	0	0	0	0	2	3	11						16	449	3. 6
 -	 		33	53	195	275	92	127	155	0	0	0	0	0		5, 133	18. 1
計			აა	อง	190	210	92	127	100	U	U	U	0	U	9 30	৩, ১১১	10.1

【議題3】

「復旧・復興工事及び通常工事に関する今後 の発注計画等について」

- ①国土交通省九州地方整備局
- ②農林水産省九州農政局
- ③熊本県・市町村

九州地方整備局の発注見通し(10月時点)

■発注事務所別

■発注事務所別	
発注事務所	
工事種別	平成29年度
工事規模	
熊本河川国道事務所	18
一般土木工事	7
1億円以上 2億円未満	5
50億円以上	2
アスファルト舗装工事	1
2億円以上 3億円未満	1
鋼橋上部工事	1
2億円以上 3億円未満	1
セメント・コンクリート舗装工事	1
2億円以上 3億円未満	1
通信設備工事	5
3,000万円以上 6,000万円未満	1
1億円以上 2億円未満	
2億円以上 3億円未満	2
電気設備工事	2 2 3
8,000万円以上 1億2,000円未満	1
1億2,000円以上 2億未満	
八代河川国道事務所	2 9
一般土木工事	4
6,000万円以上 1億円未満	1
1億円以上 2億円未満	2
50億円以上	1
アスファルト舗装工事	4
8000万円以上 1億2000万円未満	3
1億2000万円以上 2億円未満	1
プレストレスト・コンクリート工事	1
2億円以上 3億円未満	
川辺川ダム砂防事務所	1 2 2 2 1
一般土木工事	2
1億円以上 2億円未満	2
立野ダム工事事務所	1
一般土木工事	1
50億円以上	1
営繕部•熊本営繕事務所	4
建築工事	3
3,000万円未満	1
3,000万円以上 6,000万円未満	2
暖冷房衛生設備工事	1
3,000万円以上 5,000万円未満	1
総計	34
TO A I	J-1

※九州地方整備局における 平成29年度の発注見通しについて、下記公表 資料を基にとりまとめたものである。

・平成29年度 発注見通し公表(10月時点)(H29.10.2発表) ※発注予定であるため、実際に発注する工事が、上表の内容と異なる場合、 または、記載の無い工事が発注される場合がある。

※工事規模は、別表の区分によるものとし、発注予定が無い区分については表示していない。

(別表)

一般土木工事及び (右側に掲げる工事		アスファルト舗装工事 電気設備工事及び暖>	
	3,000万円未満		3,000万円未満
2 000 EMBL 5	6 000 T E + #	3,000万円以上	5,000万円未満
3,000万円以上	6,000万円未満	5.000 TEN I	2 200 TEL + **
	. m = + =	5,000万円以上	8,000万円未満
6,000万円以上	1億円未満		
	- 200	8,000万円以上	1億2,000万円未満
1億円以上	2億円未満	1億2,000万円以上	2億円未満
2億円以上	3億円未満	2億円以上	3億円未満
3億円以上	7億4,000万円未満	3億円以上	7億4,000万円未満
7億4,000 下田以上	4.F.PE.TT.	7億4,000万円以上	10億円未満
7億4,000万円以上	15億円未満	40/# III N	00倍四十世
45/APR 11 1	00/#FFF + '#	10億円以上	20億円未満
15億円以上	30億円未満		
30億円以上	50億円未満	20億円以上	
50億円以上			

■施工地域別

施工地域	
工事種別	平成29年度
工事規模 熊本	4
一般土木工事	3
1億円以上 2億円未満	3
鋼橋上部工事	1
2億円以上 3億円未満	1
宇城	1
建築工事	1
3,000万円以上 6,000万円未満	1
上益城	12
一般土木工事	
1億円以上 2億円未満	2
アスファルト舗装工事	1
2億円以上 3億円未満	1
セメント・コンクリート舗装工事	1
2億円以上 3億円未満	5 1
通信設備工事	5
3,000万円以上 6,000万円未満	1
1億円以上 2億円未満	2 2
2億円以上 3億円未満	2
電気設備工事	3 1
8,000万円以上 1億2,000円未満	1
1億2,000円以上 2億未満	3
阿蘇	3
一般土木工事 50億円以上	3
八代	3 3 2
一般土木工事	1
1億円以上 2億円未満	1
建築工事	1
3,000万円未満	1
芦北	9
一般土木工事	3
6,000万円以上 1億円未満	1
1億円以上 2億円未満	1
50億円以上	1
アスファルト舗装工事	4
8000万円以上 1億2000万円未満	3
1億2000万円以上 2億円未満	1
暖冷房衛生設備工事	1
3,000万円以上 5,000万円未満	1
プレストレスト・コンクリート工事	1
2億円以上 3億円未満	1 3 2 2
球磨	3
一般土木工事	2
1億円以上 2億円未満	2
建築工事	
3,000万円以上 6,000万円未満	1
総計	34

平成29年度第3四半期 発注見通し 【対象工事は、平成29年度に発注する工事及び発注手続きを開始する工事です。】

華	1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	2億円以上 3億円未満	2億円以上 3億円未満	1億円以上 2億円未満	1億円以上 2億円未満	2億円以上 3億円未満	50億円以上	50億円以上	1億2, 000万円以上 2億円 未満	8,000万円以上 1億2,000 田未謝	1億2, 000万円以上 2億円 未満	1億円以上 2億円未満	2億円以上 3億円未満	1億円以上 2億円未満	2億円以上 3億円未満	3,000万円以上 6,000万円未満	1億円以上 2億円未満
入札. 予定時期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期	第3四半期
入札及び契約の方法	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	—般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札	一般競争入札
1 金子の金工	舗装工 1式、排水構造物工 1式、精梁付属物工 1式、道路照明整備工 1式、下水道移設工 1式	道路土工 一式、補強土壁、管路、付属物基礎	管路工 一式、付属物基礎 一式、踏掛版 一式	As舗装(L=1,704m、A=20,448m2)、管路 付属物基礎、防護柵	Co舗装(L=512m、A=6,144m2、盛土2,560m3) Co舗装(L=530m、A=6,630m2)、防護柵	道路改良 L=100m	道路改良 L=100m	鋼床版箱桁橋 L=59m	トンネルエ 一式	トンネルエ 一式	小池高山 C照明影備 1式、高木トンネル(L=479m) 照明設備 1式、鶴山谷トンネル(L=288m) 照明設備 1式、低圧母変電設備 3箇所	田代第ニトンネル(L=531m)照明設備 1式、上野 1点、出版 1式、北中島 C照明設備 1式 化中島 C照明設備 1式 低圧受変電設備 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	大平・河内トンネル (L=599m)照明設備 1式、田代第一トンネル (L=477m)照明設備 1式、低圧受変電設備 2箇所	田代第二トンネル(L=531m)非常用設備 1式、 田代第一トンネル(L=477m)非常用設備 1式	高木トンネル(L=479m)非常用影響 1式、鶴山谷トンネル(L=288m)非常用設備 1式、グヤ・河内トンネル(L=599m)非常用設備 1式、大平・河内トンネル(L=599m)非常用設備 1式	道路情報表示装置(NHL2)×7面 支柱×7基	旋回式簡易カメラ装置×19台 光ケーブル敷設 SM-20C×1.2km、SM-4 C×1.2km	気象観測装置(雨量、風向風速、路面凍結検知、視程) 1箇所	護岸エ1式、根固ブロック撤去1式
工事種別		一般土木工事	一般土木工事	アスファルト舗装 工事	セメント・コンク リート舗装工事	一般土木工事	一般土木工事	網橋 上部工事	一般土木工事	一般土木工事	電気設備工事	電気設備工事	電気設備工事	通信設備工事	通信設備工事	通信設備工事	通信設備工事	通信設備工事	一般土木工事
工事の期間	約7ヶ月	約10ヶ月	約10ヶ月	約11ヶ月	約11ヶ月	約13ヶ月	約13ヶ月	約10ヶ月	約36ヶ月	約36ヶ月	約10ヶ月	約10ヶ月	約10ヶ月	約10ヶ月	約10ヶ月	約10ヶ月	約10ヶ月	約10ヶ月	約7ヶ月
工事の場所	熊本市中央区 ~ 熊本市中央区	上益城 郡御船町	上益城郡御船町	上益城郡御船町	上益城 郡御船町	熊本市北区	熊本市北区	熊本市北区	阿蘇市	阿蘇市	上益城 郡御船町 ~上益城 郡益城町	上益城 郡御船町 ~上益城 郡山都町	上描城 郡盆城町 ~上益城 郡御船町	上益城 郡御船町	上益城 郡御船町 ~上益城 郡益城町	上益城 郡御船町 ~上益城 郡山都町	上益城 郡御船町 ~上益城 郡山都町	上益城 郡御船町	八代市 ~ 八代市
丁事の名称	高取付道外工事	九州横断道(嘉島~山都)玉来地区改良 10期工事	九州横断道 (嘉島~山都)田代八丁地区改良3期工事	九州横断道(嘉島~山都)上野 高平地区 舗装工事	九州横断道(嘉島~山都)田代第一トンネル外舗装工事	熊本3号 下硯川地区改良工事	熊本3号 下硯川地区改良2期工事	熊本3号 須屋高架橋上部工(A1~P ∮ 1)工事	熊本57号 滝室坂トンネル西新設(一 期)工事	熊本57号 滝室坂トンネル東新設(一 期)工事	高木トンネル照明設備外設置工事 -	田代第二トンネル照明設備外設置工事 -	大平・河内トンネル照明設備外設置工事 -	田代第二トンネル外非常用設備設置工事	高木トンネル外非常用設備設置工事 -	上野 C外道路情報表示装置設置工事	小池高山IC・北中島 IC間CCTV設・備設置工事	八勢川橋気象観測装置設置工事	平成29·30年度萩原地区護岸工事
格一老類	禁	上益城	上替城	上益城	上一件城	熊本	熊本	熊本	阿蘇	阿蘇	上苗城	掛出	4 4	上益城	上計	上益城	4 4 4	上益城	7.tt
	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県	熊本県
相当部署	作本河川国道事務所 (1)	熊本河川国道事務所	熊 本河川国道 事務所	熊 本河川国道 事務所	熊 本河川国道 事務所	熊本河川国道事務所	熊 本河川国道 事務所	熊本河川国道事務所	熊本河川国道事務所	熊 本河川国道 事務所	熊 本河川国道 事務所	熊 本河川国道 事務所	熊 本河川国道 事務所	熊 本河川国道 事務所	熊 本河川国道 事務所	熊 本河川国道 事務所	熊 本河川国道 事務所	熊 本河川国道 事務所	八代河川国道事務所
松子楼閣		11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局	11国土交通省 九州地方整備局

【対象工事は、平成29年度に発注する工事及び発注手続きを開始する工事です。】 発注見通 し 平成29年度第3四半期

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
11国土交通省 九州地方整備局	八代河川国道事務所	熊本県	芦北	熊本3号桜戸橋上部工 (P1~A2)工 事	葦北郡 津奈木町	約10ヶ月	プレストレスト・ コンクリート工事	PC3 径間連続 ポステン 中空床版 橋 橋長88.5m	一般競争入札	第3四半期	2億 円以上 3億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	八代河川国道事務所	熊本県	非 量	熊本3号中尾山トンネル新設工事	水俣市	約33ヶ月	一般土木工事	中尾山トンネル L=1, 428m	一般競争入札	第3四半期	50億円以上
11国土交通省 九州地方整備局	八代河川国道事務所	熊本県	非	熊 本 3 号岩城 地区改良 外工事	水俣市	約10ヶ月	一般土木工事	道路土工 1式	一般競争入札	第3四半期	1億円以上 2億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	八代河川国道事務所	熊本県	非	熊 本 3 号古城 交差点改 良外工事	水俣市	約10ヶ月	一般土木工事	道路土工 1式 舗装工 1式	一般競争入札	第3四半期	6,000万円以上 1億円未 満
11国土交通省 九州地方整備局	八代河川国道事務所	熊本県	非	熊 本 3 号浜崎 地区舗装工事	華北郡 津奈木町	約10ヶ月	アスファルト舗装 工事	アスファルト舗装 4,000m2	一般競争入札	第4四半期	8,000万円以上 1億2,000 円未満
11国土交通省 九州地方整備局	八代河川国道事務所	熊本県	非某	熊 本 3 号小津 奈木地区 舗装工事	葦北郡 津奈木町 ~ 水俣市	約10ヶ月	アス ファルト 舗装 工事	アスファルト舗装 8,000m2	一般競争入札	第4四半期	1億2,000万円以上 2億円 未満
11国土交通省 九州地方整備局	八代河川国道事務所	熊本県	非量	熊 本 3 号岩城 地区外舗 装工事	水俣市	約10ヶ月	アスファルト舗装 工事	アスファルト舗装 4,000m2	一般競争入札	第4四半期	8,000万円以上 1億2,000 円未満
11国土交通省 九州地方整備局	八代河川国道事務所	熊本県	井	熊 本 3 号大迫 地区舗装 外工事	葦北郡 津奈木町	約10ヶ月	アスファルト舗装 工事	アスファルト舗装 4,000m2	一般競争入札	第4四半期	8,000万円以上 1億2,000 円未満
11国土交通省 九州地方整備局	川辺川ダム砂防事務所	熊本県	球磨	築 切砂防堰堤工事用道路(2期)工事	球磨郡五木村	約10ヶ月	一般土木工事	工事用道路 L=150m	一般競争入札	第3四半期	1億円以上 2億円未満
11国土交通省 九州地方整備局	辺川ダム砂 防事務所	熊本県	球磨	高野川第2砂防堰堤工事用道路 (3期) 工事	球磨郡五木村	約9ヶ月	一般土木工事	工事用道路 L=150m	一般競争入札	第3四半期	1億円以上 2億円未満
11国土交通省	立野ダム工事事務所	熊本県	阿蘇	立野ダム建設(一期)工事	阿蘇郡 南阿蘇村 ~ 菊池郡 大津町	約35ヶ月	一般土木工事	基礎掘削 約580,000m3、本体打設 46,000m3、基礎処理 71,000m	一般競争入札	第3四半期	50億円以上
11国土交通省 九州地方整備局	熊 本営繕事務 所	熊本県	球磨	人吉労働総合庁舎(2 9)建築改修その 他工事	人吉市	約7ヶ月	建築工事	屋上防水、外壁改修	一般競争入札	第4四半期	3,000万円以上 6,000万 円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊本営繕事務所	熊本県	宁城	ハローワーク 宇城(29)建築 改修その 他工事	宇城市	約4ケ月	建築工事	ハローワーク宇城の屋上防水・外壁改修。	一般競争入札	第3四半期	3,000万円以上 6,000万 円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊 本営繕事務 所	熊本県	八代	ハローワーク 八代(29)仮庁舎構内整 備工事	八代市	約5ヶ月	建築工事	ハローワーク八代の仮設庁舎とりこわし。	一般競争入礼	第3四半期	3,000万円未満
11国土交通省 九州地方整備局	熊 本営繕事務 所	熊本県	扩光	水 俣病研究センター(29)機 械改修工 專	水俣市	約5ヶ月	暖冷 房衛生設 備工 事	給水管更新工事	一般競争入札	第3四半期	3,000万円以上 5,000万円未離

く留意事項> 1. 平成29年10月2日時点)における工事の発注見通しを公妻します。 名機関の公妻要領等に別途公表の回数及 25時期の定めがあり、公麦時点(H29 112.2時点)における発注情報を公妻できない機関については、公麦時点における直近のものを発注情報として掲載しております。 2. 発生見通しは掲載時点における今後の予定であり、実際に発注する工事内容等が「の掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。 また、工事概要に関する再項は公麦時点の予定であり、公麦後変更されることがあります。 3. 工事に関する問合せは、各発注機関の担当部者へお願いします。

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成 29 年 10 月 26 日 九州ブロック発注者協議会

九州ブロックにおける発注情報の一元化について

~ 九州ブロックの地域毎に各機関の発注見通しをまとめて掲載 ~

- ◆平成 29 年 10 月時点の九州ブロックにおける各発注機関の発注見通しを、一元化し公表します。
- ◆各発注機関の発注見通しを一元化することで発注情報の閲覧・検索をスムー ズに行えるようになりました。
- ◆この取り組みにより、建設業者による技術者や技能者の計画的な配置や資機 材の円滑な調達に役立つことが期待されます。

く概要>

- ○発注情報を一元化することで、発注情報の入手に費やす手間を削減できます。
- ○九州ブロック(7県)を各振興局若しくは土木事務所単位(福岡県、大分県除く)で66地域に区分(福岡県:4地域、佐賀県:5地域、長崎県:10地域、熊本県:11地域、大分県:18地域、宮崎県:11地域、鹿児島県:7地域)しており、地域毎の発注情報を把握することができます。
- 〇今回のフォローアップの結果、掲載機関は、国 17 機関(発注無し6機関含む)、独立行政法人等6機関(発注無し2機関含む)及び地方公共団体 200機関(発注無し1機関含む)の合計 223機関(参画率 85%)であり、発注情報の件数は全体で 15,547件となっております(平成 29年度発注分)。
- ○一元化された情報は一覧表としてとりまとめており、フィルタ機能を活用することで、必要な工事情報を検索することができます。
- ○原則として毎年度4回の公表を行います。

【問い合わせ先】


国土交通省 九州地方整備局 企画部 技術管理課長 竹下 真治 内線 3311

課長補佐 次郎丸 敬太 内線 3313

代表: 092-471-6331 直通: 092-476-3546

発注情報の一元化について

○公表は九州地方整備局のホームページに記載 九州地方整備局HPアドレス:http://www.gsr.mlit.go.jp/

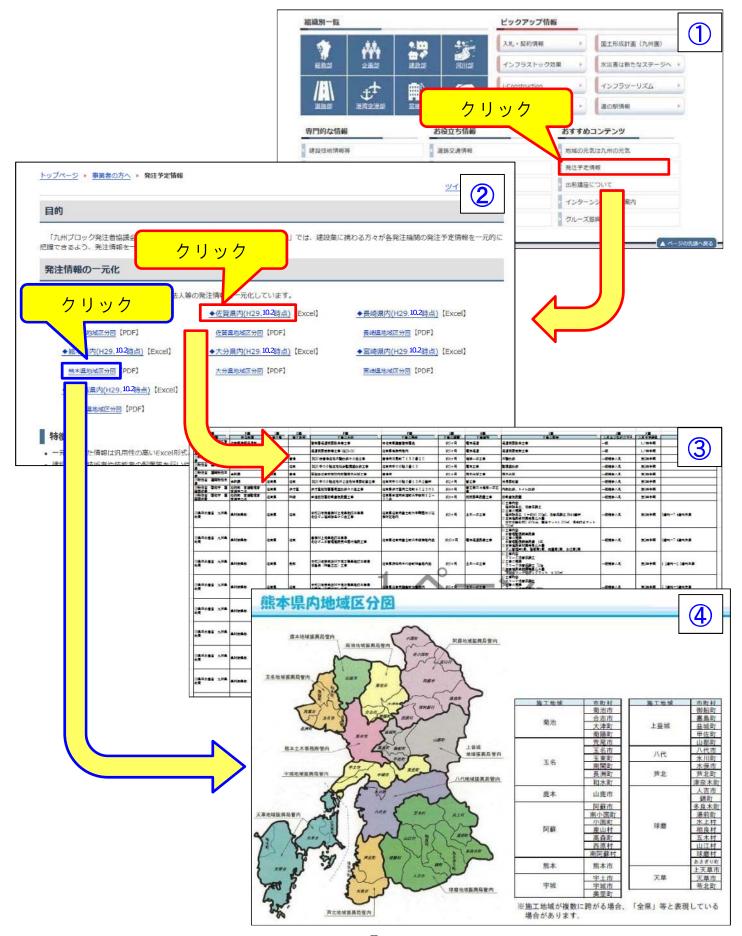

今後の工事の発注計画について

九州農政局では、平成29年度、熊本県下において、復旧・復興事業で7件、継続事業で13件、合計20件の工 事を発注する予定。(20件の内、17件については契約済み)

今後3件の工事を発注する予定であり、詳細については下表のとおり。

(H29.10月末時点)

復旧·復興事業

No	担当事業所	施工県	施工地域	工事の名称	契約予定時期	工事種別	工事種別	備考	
1	土地改良技術事務所	熊本県	熊本	熊本農地海岸特定災害復旧事業 飽託海岸堤防復旧工事	第1四半期	丰工十二	一般競争	黑半日丘子6~日丘子9	契約済み
2	土地改良技術事務所	熊本県	八代	熊本農地海岸特定災害復旧事業 和鹿島海岸堤防復旧工事	第1四半期	丰工十二	一般競争	9千万円~1.2億円未満	契約済み
3	土地改良技術事務所	熊本県	八代	熊本農地海岸特定災害復旧事業 文政海岸堤防復旧工事	第1四半期	丰工十二	一般競争	3千万円未満	契約済み
4	土地改良技術事務所	熊本県	八代	熊本農地海岸特定災害復旧事業 昭和海岸潮遊池護岸復旧工事	第1四半期	土木工事	一般競争	第十日子子—9年五日末満	契約済み
2	土地改良技術事務所	熊本県	八代	熊本農地海岸特定災害復旧事業 郡築海岸管理用道路復旧工事	第1四半期	舗装工事	一般競争	3千万円未満	契約済み
9	土地改良技術事務所	熊本県	八代	熊本農地海岸特定災害復旧事業 八代海岸堤防復旧(和鹿島海岸他)工事	第3四半期	丰工十二	随意契約	3千万円未満	契約済み
7	7 土地改良技術事務所	熊本県	熊本	熊本農地海岸特定災害復旧事業 飽託海岸堤防復旧(その2)工事	第4四半期	土木工事	一般競争	9千万円~1.2億円未満	

編車業

No	担当事業所	施工県	施工地域	工事の名称	契約予定時期	工事種別	入札方法	全 剿	
-	玉名横島海岸保全事業所	能本 県	玉名	玉名横島海岸保全事業 扶壁工(第二工区2-1)工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円~1.2億円未満	契約済み
2	玉名横島海岸保全事業所	计本消	王名	玉名横島海岸保全事業 堤防補強2次盛土(菊池工区1)工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円~1.2億円未満	契約済み
3	玉名横島海岸保全事業所	半半消	玉名	玉名横島海岸保全事業 堤防補強盛土(菊池工区2-1)工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円~1.2億円未満	契約済み
4	玉名横島海岸保全事業所	能本 県	玉名	玉名横島海岸保全事業 扶壁工(第二工区1)その他工事	第1四半期	土木工事	一般競争	6千万円~9千万円未満	契約済み
2	玉名横島海岸保全事業所	省 本消	玉名	玉名横島海岸保全事業 堤防裏法面被覆(第二工区1-2)工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円~1.2億円未満	契約済み
9	玉名横島海岸保全事業所	能本 県	玉名	玉名横島海岸保全事業 波返工(末広工区-2)その他工事	第1四半期	土木工事	一般競争	6千万円~9千万円未満	契約済み
7	玉名横島海岸保全事業所	计本消	王名	玉名横島海岸保全事業 堤防補強(横島漁港工区一1)工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円~1.2億円未満	契約済み
8	玉名横島海岸保全事業所	省 本消	玉名	玉名横島海岸保全事業 堤防根固工(大豊工区-3)その他工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円~1.2億円未満	契約済み
6	玉名横島海岸保全事業所	能本 県	玉名	玉名横島海岸保全事業 潮遊池護岸(菊池工区2-3)工事	第1四半期	土木工事	一般競争	6千万円~9千万円未満	契約済み
10	玉名横島海岸保全事業所	省 本消	玉名	玉名横島海岸保全事業 堤防補強盛土(大豊工区)その他工事	第1四半期	土木工事	一般競争	9千万円~1.2億円未満	契約済み
11	玉名横島海岸保全事業所	能本 県	玉名	玉名横島海岸保全事業 堤防補強盛土(横島漁港工区-1)その他工事	第2四半期	土木工事	一般競争	3千万円~6千万円未満	契約済み
12	玉名横島海岸保全事業所	能本 県	玉名	玉名横島海岸保全事業 大豊工区排水樋門改修その他工事	第3四半期	土木工事	一般競争	6千万円~9千万円未満	
13	川辺川農業水利事業所	熊本県	攻審	辺 農業水利事業 造成団地道路整備その他工事	第4四半期	土木工事	一般競争	3千万円未満	

百万円

単位:件、

復旧・復興工事及び通常工事に関する今後の発注計画等



(土木部・農林水産部)のブロック別工事予算総括 冊 H 些

6,140 52,426 20,914 46,827 15,521 金額 8年度未契約繰越分) 盂 69/ 459 249 2,258 781 作数 (平成2 13,176 5,553 8,077 1,323 8年度通常・災害・補正予算 28,129 金額 農林水産 148 486 183 54 10 件数 N 中限 92,785 39,250 9,968 4.817 38,750 29年度年度通常、 金額 十十部 598 358 195 1,772 621 中、 件 数 ブロック 県北 県 中 県南 天草 合

は豪雨災害からの復旧・復興事業などの平成29年度以降に発 平成28年度に発生した地震あるい 注予定工事件数及び金額(平成28年度未契約繰越分)。 平成29年度の通常事業、

県工事における平成29年度の発注予定件数及び金額

(平成28年度未契約繰越分を含む)

の構成比率

金額

仟数

農林水産

割と 構成比率について工事件数及び金額の双方で土木部が約8 なっている。

嘉島町、益城町、 玉東町、 **小** 小 小 小 菊池市、阿蘇市、 大津町、菊陽町、 御船町、 字城市、美里町、 ※地域ブロックは県の広域本部管轄区分 荒尾市、玉名市、山鹿市、 南関町、長洲町、和水町、 护士市、 山都町

○県央:熊本市、

甲佐町、

○県北:

南小国町、小国町、

多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、 津奈木町、錦町、 :八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、 南阿蘇村 産山村、高森町、西原村、 ○県南

あみばり町

桃光町 :上天草市、天草市、 ○天草

十十部 77% 産部, 23% 十十部, 78% 部, 22%

農林水

金額及び時期については、現段階の予定であり、今後変更の可能性有り。

※平成28年度予算は平成27年度繰越を含む。 ※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。

※H29の件数・金額はH30に繰り越す可能性がある。

※発注見通しが不確定な案件については含まれていない。



部

K


+

驰 ₩

県工事(土木部・農林水産部)のブロック別発注予定

百万円 # 単位

	4	\$ 77° H					平成29年度	年度					平成30年度)年度	1	
ブロック	+ 及28年	以28年度深刻済	第1四半期	未期	第2四半期		第3四半期		第4四半期	半期	11年	<u>+</u>	以降	郊	<u> </u>	L
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
県央	1,447	47,521	105	5,410	215	13,718	366	22,153	83	5,546	69/	46,827	-	120	2,217	94,468
県北	1,412	41,112	111	7,675	190	16,924	357	19,046	123	8,781	781	52,426	25	208	2,218	94,046
県南	919	27,850	47	1,165	184	7,175	187	5,808	41	1,373	459	15,521	က	29	1,381	43,430
天草	459	20,013	19	325	86	2,198	121	2,798	Ξ	819	249	6,140	-	21	709	26,174
中二	4,237	136,496	282	14,575	687	40,015	1,031	49,805	258	16,519	2,258	120,914	30	708	6,525	258,118
比率	64.9%	52.9%	4.3%	9.5	10.5%	15.5%	15.8%	19.3%	4.0%	6.4%	34.6%	46.8%	0.5%	0.3%		



4,500

┛━年数

金額(億円)

237 4

1,400

1,200

1,000

800

世

全体発注予定件数及び金額(県工事)

龜田 田əə 3-③-2 1,600



※件数、金額及び時期については、現段階の予定であり、今後変更の可能性有り。

500

031

98

365

200

400

9

687

※H29の件数・金額はH30に繰り越す可能性がある。

※発注見通しが不確定な案件については含まれていない。

(土木部·農林水産部)

県全体

【総江地域】

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

表-1)

金額単位:百万円

6,392 100,704 48,679 13,902 21,669 4,996 47,381 14,395 (2,018) (649) (150) (122) (309) (1,341) (113) (1,823) 3,540 11,688 15,304 3,380 3,173 4,358 699 13,137 農林水産部 (308) (106) (64) (223) (593) (16) (61) 6) **4**数 202,870 2,852 11,015 4,327 35,693 85,400 35,543 10,729 17,311 金 十十 (134) (1,514) (5,444) (543) (1,795) (248) (1,048) (58) (104) **作数** 平成27年度補正 平成27年度当初 平成28年度当初 平成28年度災害 平成28年度補正 平成29年度当初 平成27年度災害 その他 子算別 华

258,118 (6,525) 55,248 (1,081)

(表-2)

金額単位:百万円

1,679 2,263 17,668 20,378 2,615 5,598 5,449 3,708 258,118 26,355 61,762 156,822 19,155 15,307 25,754 12,631 4,341 971 59,091 9,614 金額 (718) (366) (165) (614) (3,714) (153) (313) (100) (147) (1,709) (1,503)(29) (25) (43) (26) (40) (1,071) (86) (23) (449) \odot 6/ (6,525)32 9 173 120 228 351 22 708 平成30年度以降 0 (5) Ξ (9) \equiv 8 0 0 0 (2) 0 ନ୍ତ Ξ (3) 4 0 0 E 0 6) (30) 件数 11,270 7,568 71,463 2,396 6,870 14,510 1,114 3,943 2,468 120,914 29,351 23,898 2,342 7 24 132 681 3 52 2,552 5,674 15,872 8,017 (504) (655) (1,228) (72) (284) (374) (178) (33) (18) (59) (7.7) 5 $\widehat{\Xi}$ (84) (9) (190)(29) (59) (38) (49) (2,258)(336)(41) 8,899 1,924 16,519 5,479 1,148 840 129 1,669 1,056 2,594 347 137 449 486 520 2,451 211 金 第4四半期 (42) (70) (15) 4 (2) \equiv 0 0 8 (45) (11) (7 (28) (23) 5 \equiv 4 5 9) (1 6) (258) (129) 2,290 12,966 10,074 26,353 4,386 1,172 6,046 2,815 3,168 6,333 1,879 1,438 2,919 49,805 1,023 3 55 3 50 419 254 966 132 金額 平成29年度 第3四半期 (165) (5 69) (147) (206) (38) (121) 9) (84) (14) 8 8 \equiv (43) Ξ (76) (36) (22) (21) (27) (27) (36) (1,031) 1,419 2,112 26,746 1,902 348 83 2,088 40,015 7,545 7,768 759 456 230 210 1,777 1,068 10,674 733 4,001 373 金 第2四半期 (78) (103) (401) (13) (25) (14) (19) (57) (219) (106) (2) (5) (9) 0) 0 0 (52)(16) 9 (12) 6 (63) (687) 件数 9,465 14,575 2,068 3,605 1,229 1,140 1,582 150 39 95 1,881 171 147 3,361 431 557 1,097 金額 第1四半期 (192) (14) 0 £ E \equiv (282) 9 (21) (89) 4 8 (2) 0 0 (40) (5) (3) 84 (18) 9 6 (97) **作**数 7,843 10,043 8, 40 5 5,868 1,655 1,240 136,496 34,965 85,008 316 609 19,907 10,483 32,291 7,269 4,614 1,945 955 1,557 1,441 2,882 金額 平成28年度契約済 (20) (244) (1,048) (1,166)(2,478) (56) (7.7) (2) 433) (526) (34) (693) (506) (70) (48) (427) (4,237) (11) (23) (6/) (101) (97) (38) 件数 5,500万円以上1億3,200万円未満 左記ランク発注価格帯区分 1,500万円以上7,000万円未満 2,750万円以上5,500万円未満 1,100万円以上2,750万円未満 330万円以上1,100万円未満 7,000万円以上3億円未満 1億3,200万円以上 1,500万円未辦 1,100万円未辦 1,100万円以上 330万円未満 雅**冶価格帯**別 霏 ランク等 В, С 丰 A 1 A 1 A 2 A 1 A 2 回転 œ ပ < 安全施設 許可業種 土木一共 羅鰲一式 橋梁補修 鋼構造物 その 無無 舗装 調例 Ąш

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。 ※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。

3-3-3

	_
a	5
T	Ã
4	

₩₩

【 絮**汗鬼**域】

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

金額単位:百万円 2,249 9 882 4,842 13,288 10,350 422 35,584 3,491 (21) (150) (204) (51) (109) (294) (48) 6 (4) **4**数 322 1,508 419 1,364 1 22 5,252 635 882 御 農林水産部 (6) (16) (24) (31) (0) (11) (21) (113) (1) **4**数 1,927 09 2 47 3,960 11,780 3,072 986'8 3 00 30,332 (H) 土木部 (481) (1 26) (33) (-) (5) (173) (40) (88) 4数 (3) 平成27年度補正 平成28年度当初 平成28年度補正 平成27年度当初 平成28年度災害 平成29年度当初 平成27年度災害 その色 子算別 华 (表-1)

(表-2)

金額単位:百万円

		一番単名 大名	₩#	\$1.00 E					平成29年度	4度					1000年日	×4 ×1 ±	4	
	R		十双 204及 米档点	· 京 京 京	第1四半期	未期	第2四半期	半期	第3四半期	半期	第4四半期		本小	盂	#nc%+	を文章	īā	
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	帝 親	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金 額
土木一共	A 1	3億円以上	(1)	3 09	(0)	0	(2)	902	(0)	0	(1)	5 40	3	1,246	(0)	0	(4)	1,555
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(42)	5,811	(9)	850	(19)	2,557	6	668	(5)	200	37	4,806	(0)	0	(67)	10,617
	A 2	1,500万円以上7,000万円未謝	(56)	3,657	(8)	288	(10)	311	(23)	958	(2)	66	43	1,656	(0)	0	(138)	5,313
	B, C	1,500万円未辦	(96)	554	(7)	31	(14)	108	(9)	45	(0)	0	27	184	(0)	0	(123)	738
	14		(234)	10,331	(21)	1,169	(45)	3,682	(36)	1,902	89	1,139	110	7,892	9	0	(344)	18,223
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(5)	1,808	(4)	1,229	(1)	23.8	(4)	3,506	(1)	9 0 5	10	5,875	(0)	0	(15)	7,683
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(13)	1,149	(4)	256	(3)	280	(5)	370	(0)	0	12	906	(0)	0	(25)	2,055
	m	2,750万円以上5,500万円未満	(8)	285	(0)	0	(3)	113	(4)	170	(1)	4	80	327	(0)	0	(16)	612
	ပ	1,100万円以上2,750万円未満	(3)	61	(0)	0	(0)	0	(E)	22	(0)	0	-	22	(0)	0	9	83
	D	1,100万円未辦	(1)	4	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(1)	4
	小評		(30)	3,307	8	1,485	9	631	(14)	4,068	(2)	946	۳	7,130	9	0	(61)	10,437
舗装	¥	1,100万円以上	(12)	3 58	(0)	0	(1)	32	(8)	202	(1)	24	10	258	(0)	0	(22)	919
	æ	330万円以上1,100万円未満	(3)	16	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(3)	16
	ပ	330万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	0
	小計		(12)	374	(0)	0	(1)	32	(8)	202	(1)	24	10	258	(0)	0	(22)	632
米 画			(9)	1 63	(0)	0	(0)	0	(3)	61	(0)	0	3	61	(0)	0	(6)	224
橋梁補修			(1)	22	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(1)	22
安全施設			(2)	10	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(2)	10
銅構造物			(4)	1 36	(0)	0	(0)	0	(1)	4	(0)	0	1	4	(0)	0	(2)	140
電気			(10)	3.71	(1)	39	(3)	762	(5)	531	(2)	3 42	11	1,674	(0)	0	(21)	2,045
柳			(6)	4 06	(0)	0	(2)	175	(13)	975	(1)	2 40	16	1,390	(0)	0	(22)	1,796
その告			(7 0)	9 44	(1)	7.2	(17)	423	(8)	596	(5)	3 50	31	1,111	(0)	0	(101)	2,055
		合計	(381)	16,064	(31)	2,765	(75)	2,705	(88)	8,009	(61)	3,041	213	19,520	(0)	0	(294)	35,584

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。

※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

【郑江地域】

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画 /#-1)

10	十十部	輪	農林力	農林水産部	iliicz	盂
T T T	牛数	※	件数	金額	件数	金
平成27年度当初	(33)	265	(2)	119	(32)	711
平成27年度災害	(11)	80	(0)	0	(11)	80
平成27年度補正	(4)	3.24	(1)	25	(5)	349
平成28年度当初	(88)	1,541	(20)	1,110	(108)	2,651
平成28年度災害	(2 42)	4,888	(1 4)	618	(256)	5,506
平成28年度補正	(22)	576	(6)	663	(31)	1,239
平成29年度当初	(81)	1,832	(59)	1,234	(110)	3,066
408	(3)	212	(1)	177	(4)	389
小	(484)	10.045	(92)	3.946	(1560)	13 991

(表-2)														
	ě	高州学見大橋	中央元本	\$1.00 m					平成2	:成29年度				
	ĸ		# 07 % +	五章光	第1四	四半期	第2四半期	半期	雅3四	第3四半期	第4四半		中小	at-
許可業種	ランク等	左記ランク器注価格帯区分	牛数	金額	件数	金	件数	金額	件数	金	4数	金額	件数	金額
十十一 其	A 1	3億円以上	(1)	330	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(1 4)	1,912	(1)	7.2	(3)	266	(1)	70	(0)	0	5	408
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(84)	2,710	(15)	418	(21)	865	(28)	1,050	(11)	3.82	75	2,715

金額単位:百万円

	8	《小佰校 報》	サるで世出	以					平成29年度	年度					終 N 曲 少 O C 管 日	三	#	
	ĸ		100	K	第1四半期	米期	第2四半期	半期	第3四半期	#超	第4四半期	作期	本		100%	# 1	ā	
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件 数	御	件数	金	井	御	4数	金	件数	金額	件 燚	金額	牛数	金
土木一県	A 1	3億円以上	(1)	330	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(1)	330
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(1 4)	1,912	(1)	7.2	(3)	566	(1)	70	(0)	0	2	408	(0)	0	(19)	2,320
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(84)	2,710	(15)	418	(21)	865	(28)	1,050	(11)	3.82	75	2,715	(0)	0	(159)	5,425
	ပ မ်	1,500万円未辦	(126)	823	(14)	103	(7)	89	(27)	206	(3)	19	51	396	(0)	0	(177)	1,219
	小		(225)	5,775	(30)	593	(31)	1,199	(95)	1,326	(14)	104	131	3,519	9	0	(356)	9,294
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	430	(0)	0	-	430	(0)	0	(1)	430
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(2)	1 29	(1)	7.5	(0)	0	(1)	120	(1)	121	ю	316	(0)	0	(2)	445
	m	2,750万円以上5,500万円未満	(3)	1 28	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(3)	128
	ပ	1,100万円以上2,750万円未満	(1)	25	(0)	0	(0)	0	(2)	45	(0)	0	2	42	(0)	0	(3)	29
	۵	1,100万円未辦	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	6	0
	14		(9)	282	Ξ	75	6	0	€	265	£	121	9	788	9	0	(12)	1,070
舗装	∢	1,100万円以上	(56)	472	(1)	29	(5)	139	(15)	273	(2)	20	23	491	(0)	0	(49)	963
	В	330万円以上1,100万円未満	(11)	95	(0)	0	(0)	0	(3)	19	(0)	0	e	19	(0)	0	(14)	75
	ပ	330万円未辦	(8)	21	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	8)	21
	14		(45)	549	ε	62	(2)	139	(18)	292	<u>(S</u>	20	56	510	9	0	(7)	1,059
無無			(1 4)	3.71	(0)	0	(4)	242	(11)	263	(3)	118	18	623	(0)	0	(32)	994
橋梁補修			(1 0)	1 22	(0)	0	(1)	26	(1)	9	(0)	0	2	32	(0)	0	(12)	154
安全施設			(9)	56	(0)	0	(2)	20	(5)	63	(1)	15	80	86	(0)	0	(14)	124
鋼構造物			(9)	20	(0)	0	(1)	6	(2)	30	(1)	e	4	42	(0)	0	(10)	92
電気			(8)	45	(0)	0	(2)	116	(1)	09	(0)	0	e e	176	(0)	0	(11)	221
細			(1)	89	(0)	0	(0)	0	(2)	99	(0)	0	2	99	(0)	0	(3)	133
その他			(27)	220	(0)	0	(4)	521	(8)	109	(0)	0	12	630	(0)	0	(39)	850
		中	(348)	7,508	(32)	269	(20)	2,272	(108)	2,806	(22)	708	212	6,483	ව	0	(290)	13,991

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。 ※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画 /#-1)

10.562	Ŧ	土木部	農林水産部	(産部		丰	_
· [小 弄 小]	件数	金額	件数	金額		件数	金 額
平成27年度当初	(41)	772	(0)	0		(41)	772
平成27年度災害	(32)	317	(0)	0		(32)	317
平成27年度補正	(4)	191	(0)	0		4	191
平成28年度当初	(112)	1,943	(25)	587		(137)	2,530
平成28年度災害	(7 05)	33,938	(64)	3,260		(69/)	37,198
平成28年度補正	(10)	210	(1)	72		(11)	282
平成29年度当初	(51)	1,681	(1 4)	491		(65)	2,172
40名	(0)	0	(4)	1,431		4	1,431
十二	(922)	39,052	(108)	5,841		(1,063)	44,893

(表-2)

金額単位:百万円

	6		サので背出	次の仕事がのでませ					平成29年度	年度					終 い曲サoc 計員	1 H		į.
	Th.		107	K SEK	第1四半期	半期	第2四半期	半期	第3四半期		第4四半期	半期	中小	_	100%	# K		_
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	御	牛数	金	# 数	金	件数	金額	4数	金額	牛数	御
十十一 洪	A 1	3億円以上	(1 4)	5,626	(0)	0	(3)	1,152	(2)	449	(0)	0	5	1,796	(0)	0	(19)	7,422
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(3.7)	5,884	(1)	119	(5)	768	(25)	3,476	(7)	673	38	5,165	(1)	120	(76)	11,169
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(135)	4,055	(14)	483	(30)	1,180	(05)	1,696	(5)	1 57	66	3,516	(0)	0	(234)	7,571
	ပ မွ	1,500万円未辦	(297)	1,744	(2)	15	(18)	16	(71)	103	(2)	25	39	234	(0)	0	(336)	1,978
	神小		(483)	17,309	(17)	617	(99)	3,320	(94)	5,919	(14)	855	181	10,711	ε	120	(999)	28,140
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(2)	1,611	(0)	0	(0)	0	(2)	297	(1)	3.47	т	644	(0)	0	(5)	2,255
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(2)	2.38	(2)	147	(0)	0	(2)	157	(0)	0	4	304	(0)	0	9)	542
	æ	2,750万円以上5,500万円未満	(2)	96	(1)	5.4	(2)	68	(0)	0	(0)	0	ж	143	(0)	0	(5)	239
	ပ	1,100万円以上2,750万円未満	(1)	13	(0)	0	(0)	0	(1)	19	(0)	0	-	19	(0)	0	(2)	32
	۵	1,100万円未辦	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	6	0
	小軒		9	1,958	(9)	201	(2)	68	(2)	473	E	347	1	1,110	6	0	(18)	3,068
舗装	4	1,100万円以上	(73)	1,685	(14)	526	(5)	150	(12)	506	(6)	228	40	1,110	(0)	0	(113)	2,795
	æ	330万円以上1,100万円未満	(20)	3.75	(3)	21	(2)	19	(8)	64	(9)	49	19	153	(0)	0	(69)	528
	ပ	330万円未謝	(8)	17	(0)	0	(0)	0	(1)	æ	(1)	2	2	2	(0)	0	(10)	22
	小計		(131)	2,077	(17)	547	6	169	(21)	273	(16)	279	19	1,268	<u>(0)</u>	0	(192)	3,345
運			(32)	831	(2)	38.4	(6)	465	(32)	3,174	(9)	242	49	4,265	(0)	0	(81)	2,096
橋楽編 修			(1 0)	1 44	(0)	0	(3)	148	(0)	0	(0)	0	3	148	(0)	0	(13)	292
安全施設			(3)	12	(0)	0	(0)	0	(2)	28	(0)	0	2	28	(0)	0	(2)	94
鋼構造物			(5)	36	(1)	150	(3)	1,261	(2)	1,190	(1)	10	7	2,611	(0)	0	(12)	2,647
電気			(3)	7 62	(0)	0	(0)	0	(5)	139	(1)	19	9	1 58	(0)	0	(6)	420
柳			(3)	46	(0)	0	(0)	0	(2)	45	(0)	0	2	45	(0)	0	(5)	91
その他			(41)	1,274	(2)	49	(10)	589	(7)	76	(3)	45	22	480	(0)	0	(69)	1,754
		合計	(718)	23,949	(42)	1,948	(06)	5,741	(170)	11,338	(42)	1,797	344	20,824	Ð	120	(1,063)	44,893

| (718) 23,949 | 8.3.946 | (718) 23,949 | ※8.注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。 ※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

(\$-1)					金額単	金額単位:百万円
þ	¥∓	土木部	農林才	農林水産部	ilue	抽
元	件数	金	4数	金	4数	金
平成27年度当初	(57)	1,321	(9)	283	(63)	1,604
平成27年度災害	(15)	448	(2)	10	(17)	458
平成27年度補正	(16)	3 42	(10)	427	(56)	692
平成28年度当初	(1 57)	4,346	(16)	483	(173)	4,829
平成28年度災害	(64)	2,426	(9)	5 50	(20)	2,976
平成28年度補正	(28)	1,046	(16)	1,060	(44)	2,106
平成29年度当初	(68)	3,283	(15)	2 68	(104)	3,851
その他	(17)	1 75	(0)	0	(11)	175
合計	(443)	13,387	(7)	3,381	(514)	16,768

0 0 0 0 0 金額 平成30年度以降 0 9 0 0 0 ව 0 件数 1,322 2,589 92 4,003 202 495 金額 崇 4 4 16 74 **弁数** 0 0 7 82 32 0 814 0 金額 第4四半期 4 (5) 0 0 0 0 9 0 1,505 2,064 0 498 61 123 金額 平成29年度 部3四半期 8 0 (14) (33) Ξ (11) 9 0 302 624 31 957 495 第2四半期 (23) (5) (2) (I) 0 0 (30) 件数 0 168 0 0 4 168 第1四半期 0 (5) 0 (E) 0 0 **牛**戮 3 6,916 2,907 3,521 488 773 ∞ 金額 平成28年度契約済 (113) **作数** (24) (207) (5) \equiv 0 (70) 5,500万円以上1億3,200万円未満 左記ランク総注価格帯区分 1,500万円以上7,000万円未満 7,000万円以上3億円未満 1億3,200万円以上 1,500万円未満 樂**丫笛格蒂**別 3億円以上 ランク等 B, C A 2 神小 A 1 A 1 A 2 許可業種 羅察一式 土木一共

金額単位:百万円

215

3

0 0

0 0

132

0 0

0

132

3

0 0

0 0

0 0

0

83 20

(5)

2,750万円以上5,500万円未満 1,100万円以上2,750万円未満

œ

20

283

4,843

5,496

(38) (157)

9 午数

報

10,919 1,268

(281)

 $\widehat{\mathbb{C}}$ \mathfrak{S}

580

(86)

1,786

1,411

208

1,619 1,066 183 32

221 278 565

8

16,768

O O ÷	1.100万円以上2.750万円未満	(1)	UC	(0)	C	(0)	0	(5)	c	(0)	0	0	0	(0)	0	£
		-	3	(2)	,		_	9	>	<u> </u>		_			_	3
小手	1,100万円未辦	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)
		(9)	957	ε	62	Ð	495	(4)	255	(0)	0	9	829	9	0	(12)
舗装A	1,100万円以上	(52)	938	(0)	0	(1)	29	(15)	294	(9)	1 50	22	473	(0)	0	(74)
8	330万円以上1,100万円未満	(1 8)	1 45	(0)	0	(1)	6	(9)	54	(0)	0	7	63	(0)	0	(25)
ပ	330万円未謝	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	6)
14小		(70)	1,083	9	0	62	38	(21)	348	9	150	53	236	9	0	(66)
米 画		(1 5)	456	(0)	0	(7)	291	(4)	319	(0)	0	=	610	(0)	0	(26)
植淡猫		(1 4)	1 38	(0)	0	(0)	0	(2)	34	(2)	1	4	45	(0)	0	(18)
安全施設		(6)	95	(0)	0	(0)	0	(3)	7	(0)	0	e e	7	(0)	0	(12)
銅構造物		(9)	32	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(9)
1000		(6)	1 93	(0)	0	(1)	28	(0)	0	(0)	0	-	28	(0)	0	(10)
柳		(3)	123	(0)	0	(0)	0	(2)	155	(0)	0	2	1 55	(0)	0	(5)
その告		(33)	3.75	(0)	0	(2)	3.7	(8)	143	(2)	10	12	1 90	(0)	0	(45)
	宇	(372)	10,365	(9)	247	(43)	1,846	(77)	3,325	(16)	982	142	6,403	9	0	(514)

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。

※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

【 絮**汁鬼**類】

金額単位:百万円

報

件数

金額

平成30年度以降

3,750 1,675

(15) (106)

0 54

0 (I) 0

0 件数

9

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

10.44	十十部	金	農林才	農林水産部		ilia	
元	牛数	舟	4数	金額	件 数	数	金
平成27年度当初	(36)	668	(3)	136)	(6E)	1,035
平成27年度災害	(9)	21	(0)	0		9)	21
平成27年度補正	(4)	213	(1)	24		(2)	237
平成28年度当初	(1 29)	2,989	(3.5)	2,495	٤	(164)	5,484
平成28年度災害	(4)	450	(0)	0		4	450
平成28年度補正	(21)	787	(0)	0		(21)	787
平成29年度当初	(67)	2,152	(27)	951		(94)	3,103
そのも	(52)	613	(0)	0)	(25)	613
合計	(332)	8,124	(99)	3,606	(3:	(368)	11,730

1,255 1 687 金額 崇 38 = 件数 0 270 371 12 金額 第4四半期 (3) (10) 0 (5) **件**数 0 0 45 442 御 平成29年度 第3四半期 0 0 9 (17) 件数 19 0 280 311 第2四半期 (3) 0 (8) (5) 件数 0 137 131 金額 第1四半期 (E) (3) (E) 0 件数 988 2,441 461 金額 平成28年度契約済 **作数** 8 (82) 0 (67) 左記ランク総注価格帯区分 1,500万円以上7,000万円未満 7,000万円以上3億円未満 1,500万円未辦 樂**丫笛格蒂**別 3億円以上 ランク等 B, C A 2 A 1 A 1 許可業種 土木一共

					1		1		1	1		1	1		1			
	B, C	1,500万円未辦	(82)	461	(1)	1	(2)	19	(9)	45	(2)	12	11	77	(0)	0	(63)	538
	神小		(157)	3,890	(5)	569	(13)	610	(23)	487	(15)	653	26	2,019	(1)	54	(214)	5,963
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	9	0
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(1)	99	(0)	0	(0)	0	(1)	62	(0)	0	-	62	(0)	0	(2)	145
	æ	2,750万円以上5,500万円未満	(1)	28	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	£	28
	ပ	1,100万円以上2,750万円未満	(2)	23	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(2)	23
	۵	1,100万円未辦	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	0
	14		(4)	117	9	0	6	0	(1)	62	<u>(0)</u>	0	-	62	6	0	(5)	196
輔装	4	1,100万円以上	(44)	006	(1)	59	(1)	15	(10)	291	(0)	0	12	365	(0)	0	(26)	1,265
	В	330万円以上1,100万円未満	(6)	9/	(0)	0	(0)	0	(4)	40	(0)	0	4	40	(0)	0	(13)	116
	ပ	330万円未離	(0)	0	(1)	3	(0)	0	(0)	0	(0)	0	-	3	(0)	0	(1)	ю
	小計		(53)	926	(2)	62	(1)	15	(14)	331	(0)	0	17	408	(0)	0	(70)	1,384
無無			(8)	1 08	(0)	0	(0)	0	(5)	99	(1)	10	9	9/	(0)	0	(14)	184
橋梁補修			(8)	225	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(3)	118	3	118	(0)	0	(11)	343
安全應設			(11)	1 48	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(11)	148
鋼構造物			(2)	7	(0)	0	(2)	31	(3)	20	(1)	14	9	95	(0)	0	(8)	102
電気			(1 2)	3.97	(0)	0	(0)	0	(3)	39	(0)	0	3	39	(0)	0	(15)	436
柳			(5)	2.20	(0)	0	(0)	0	(1)	59	(0)	0	-	59	(0)	0	(9)	249
その他			(36)	2,421	(0)	0	(2)	159	(5)	125	(1)	20	80	304	(0)	0	(44)	2,725
		合計	(296)	8,509	8	331	(18)	815	(55)	1,206	(21)	815	101	3,167	(1)	54	(368)	11,730

※発注件数、金額及び 時期については、現段階の 予定であるため 今後可能性となることがある。

※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。

※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

鹿本

金額単位:百万円

俄

2,129

2,417

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

4	# T	土木部	農林水産部	(産部		抽
小草	牛数	州	4数	金額	4	金
平成27年度当初	(24)	483	(4)	1 35	(28)) 618
平成27年度災害	(0)	0	(0)	0	0)	_
平成27年度補正	(0)	0	(5)	131	(2)	131
平成28年度当初	(66)	1,791	(6)	2 69	(104)	2,060
平成28年度災害	(10)	212	(2)	7	(12)	219
平成28年度補正	(9)	96	(1)	25	8	121
平成29年度当初	(20)	1,005	(10)	260	(09)	1,265
40急	(3)	26	(0)	0	(3)) 26
合計	(188)	3,613	(31)	827	(219)	4,440

2,839 ※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 (147)

4,440

(219)

1,601

(15)

[22]

(32)

※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。

※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

(表-1)					:	- CI . H
10 46 01	土木部	鍋	農林水産部	産部		抽
	牛教	金	4	金	件数	御
平成27年度当初	(119)	5,605	(3.6)	1,499	(155)	7,104
平成27年度災害	(5)	28	(4)	70	(6)	154
平成27年度補正	(2)	62	(7)	1 94	(6)	256
平成28年度当初	(131)	5,042	(22)	7 89	(153)	5,831
平成28年度災害	(459)	76 2'62	(63)	8,629	(552)	37,926
平成28年度補正	(43)	2,527	(4)	375	(47)	2,902
平成29年度当初	(1 06)	3,978	(47)	2,853	(153)	6,830
その他	(8)	1 00	(1)	5	(6)	105
中	(873)	46,695	(214)	14,414	(1,087)	61,108

 合計
 (873)
 46,695
 (214)
 14,414
 (1,087)
 61,108

金額単位:百万円

2,196 2,469 8,344 14,253 46,338 490 19,084 1,580 230 118 9/ 8 523 257 16 137 617 11,421 **類** (100) (119) (229) (733) (10) (147) (89) (50) (14) (10) (53) Ξ Ξ 2 3 Ξ <u>6</u> 5 (362)0 0 0 0 0 32 25 0 0 09 10 0 151 154 22 金額 平成30年度以降 (L) (3) 9 0 4 E 9 0 0 0 0 0 9 0 ₹ 0 (5) \equiv 0 **件**数 1,518 11,782 6,658 30,032 118 34 1,555 7,266 48 11,070 522 230 382 37 230 468 売 99 22 99 149 72 309 6 46 300 2,345 594 8 3,287 230 0 0 0 0 230 3 92 9 0 398 2,167 218 0 110 金額 幣4四半期 (1 4 0 (7 7) Ξ 0 (18) (12) 0 Ξ E (1 4) 0 0 0 Ξ (5) (2) 34 $\widehat{\Xi}$ 1,646 5,253 3,217 15 0 1,663 161 10,277 118 0 34 0 152 954 696 12 48 20 帝 (4) 平成29年度 部3四半期 4 (53) (33) (35) (7 (22) 9 \equiv 0 (2) 0 9 (2) 0 (13) \subseteq 4 (2) (126) 0 16 0 2,589 0 7,056 2,075 1,195 0 0 0 0 44 0 8 308 131 10,457 第2四半期 (11) (12) (2) (5) (12) Ξ (28) (18) 0 0 0 0 0 9 0 € 0 0 69) **弁数** 2,109 0 0 0 0 0 128 0 0 128 0 0 0 2,068 1,652 847 182 6,011 第1四半期 (11) 0 0 0 6) 0 0 (9) 0 0 0 (9) (36) (27) (80) 0 9 [€ 6 **件**数 7,302 7,444 1,055 16,152 0 9/ 26 0 14 646 1 95 16 857 1,078 200 79 149 351 平成28年度契約済 (509) (156) (419) Ξ (32) 5 6 Ξ (53) 0 0) (2) (3) 9 (38) (22) (12) 6) 9) 件数 5,500万円以上1億3,200万円未満 左記ランク発注価格帯区分 1,500万円以上7,000万円未満 2,750万円以上5,500万円未満 1,100万円以上2,750万円未満 330万円以上1,100万円未満 7,000万円以上3億円未満 1億3,200万円以上 1,500万円未辦 1,100万円未辦 1,100万円以上 330万円未満 3億円以上 **樂注価格** ランク等 ည (၁ A 2 幸 声 崇 A 1 A 2 ۵ ⋖ 安全施設 **極楽編** 許可業種 土木一川 羅察一式 鋼構造物 無無 舗装

 合計
 (597)
 19,399

 ※第 洋本教、金額及び 時期については、 財政階の 予定であるため今後可能無となることがある。

そのも

齜

調例

115

(5)

0

(0) (0) (**5**

39

32 120 0 **6,562**

9 9 9

 \equiv

0

(0) (0) (8) **(76)**

0 0 0

ê ê ê

76 95 572

(10) (4) (32)

0

0

0

120

0

1,860

173 **454**

1,115

26

466

 $\widehat{\mathbb{E}}$

14,130

(18) (**203**)

163 **13,577**

(92)

(1,087)

※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。 シエーチの Arters Asset エチュン Arters on 1 1841 - 1 4 4 4 4 5

※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

金額単位:百万円

3,358 4,003 658

(31) (112) (82)

0 0 0 0

0 0 0 ව

0

2,479

₹

御

件数

金 額

4数

平成30年度以降

113 87 9

10,498

(232) 9 € @ E

> 0 0 0 0

0 0 0) 0

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

10 Mg Di	¥∓	土木部	農林才	農林水産部	ijiaz	丰
一本	牛数	金	件数	金	件数	金
平成27年度当初	(41)	1,249	(2)	94	(43)	1,343
平成27年度災害	(7)	45	(0)	0	6	45
平成27年度補正	(9)	321	(16)	1,739	(22)	2,060
平成28年度当初	(1 64)	4,557	(15)	1,245	(179)	5,802
平成28年度災害	(4)	1,838	(4)	392	(48)	2,230
平成28年度補正	(23)	1,094	(2)	85	(25)	1,179
平成29年度当初	(111)	3,037	(39)	2,460	(150)	5,497
408	(4)	40	(2)	1,438	(9)	1,478
4-	(400)	12.181	(80)	7.453	(480)	19.634

(表-2)

		Ø	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	於 於 於 於 是 由 中 の に も に に に に に に に に に に に に に	一种					1	十八人					
		К		+07%(-	K W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	第1四	四半期	第2四	第2四半期	第3匹	第3四半期	第4四半	未期	小計	+	
	許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金	牛数	御	4数	金	件数	金額	*
	11十十二	A 1	3億円以上	(2)	1,195	(0)	0	(2)	1,284	(0)	0	(0)	0	2	1,284	
		A 1	7,000万円以上3億円未満	(22)	2,567	(0)	0	(5)	429	(3)	292	(1)	70	6	791	
		A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(89)	2,418	(1)	15	(24)	821	(17)	629	(2)	1 20	4	1,585	
3-(B, C	1,500万円未辦	(65)	485	(9)	41	(4)	40	(10)	95	(0)	0	20	173	
3)-		14		(157)	6,665	6	29	(35)	2,574	(30)	1,013	(3)	190	75	3,833	
-11	建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	
		A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(0)	0	(0)	0	(1)	113	(0)	0	(0)	0	-	113	
		m	2,750万円以上5,500万円未満	(1)	34	(0)	0	(0)	0	(1)	53	(0)	0	-	53	
		ပ	1,100万円以上2,750万円未満	(1)	16	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	

19 19 19 19 19 19 19 11		۵	1,100万円未辦	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	-	(0)	0	_	-	(0)	0	(£)	_
A 1,100万円以上 (51) (57) (6) (13) (16) (15) (51) (51) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (10) <		小計		(2)	20	9	0	£)	113	8	24	0	0	e	167	0	0	(2)	217
B 330万円決当 (10) 67 (0) (4)<		A	1,100万円以上	(51)	196	(9)	131	(16)	519	(9)	135	(3)	87	31	872	(0)	0	(82)	1,839
C 380万円未満 (4) (8) (1) 38 (1) 65 (8) (1) (9) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (20) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (7)		В	330万円以上1,100万円未満	(1 0)	29	(0)	0	(4)	40	(2)	20	(0)	0	9	09	(0)	0	(16)	127
Aith		ပ	330万円未建	(4)	80	(1)	е	(0)	0	(0)	0	(0)	0	~	ю	(0)	0	(2)	7
The contract of the contract	•	小計		(9)	1,042	6	134	(20)	559	8)	155	<u>®</u>	87	38	935	9	0	(103)	1,977
Color Colo	無			(1 4)	3 99	(2)	19	(9)	276	(4)	204	(1)	57	13	556	(0)	0	(27)	955
(5) (2) (2) (0) <th>橋梁補修</th> <th></th> <td></td> <td>(6)</td> <td>93</td> <td>(0)</td> <td>0</td> <td>(1)</td> <td>20</td> <td>(5)</td> <td>143</td> <td>(0)</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>163</td> <td>(0)</td> <td>0</td> <td>(15)</td> <td>256</td>	橋梁補修			(6)	93	(0)	0	(1)	20	(5)	143	(0)	0	9	163	(0)	0	(15)	256
(8) (8) (8) (9) (0) <th>安全施設</th> <th></th> <td></td> <td>(5)</td> <td>59</td> <td>(0)</td> <td>0</td> <td>(0)</td> <td>0</td> <td>(0)</td> <td>0</td> <td>(0)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(0)</td> <td>0</td> <td>(2)</td> <td>29</td>	安全施設			(5)	59	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(2)	29
(7) 461 (9) (3) 71 (3) 71 (3) 71 (4) (7) 48 71 (4) (7) 48 71 (4) 71 (4) (7) 48 73 71	鋼構造物			(8)	68	(0)	0	(0)	0	(9)	420	(0)	0	9	420	(0)	0	(14)	209
(3) (3) (3) (4) (7) (7) (7) (7) (4) (7) (4) (7) (5) (5) (5) (7) (62) (4) (7) (4) (7) (4) (7) (4) (7) (4) (7) (4) (7) (4) <th>電気</th> <th></th> <td></td> <td>(-)</td> <td>461</td> <td>(0)</td> <td>0</td> <td>(3)</td> <td>71</td> <td>(3)</td> <td>53</td> <td>(1)</td> <td>19</td> <td>7</td> <td>1 43</td> <td>(0)</td> <td>0</td> <td>(14)</td> <td>604</td>	電気			(-)	461	(0)	0	(3)	71	(3)	53	(1)	19	7	1 43	(0)	0	(14)	604
ABIT (42) 3.551 (1) 2 (5) 59 (7) 626 (4) 25 17	柳			(3)	93	(1)	171	(0)	0	(1)	14	(1)	48	3	233	(0)	0	(9)	326
031 311 (611 (03) (13) (13) (13) (13) (14) (16)	その他			(42)	3,551	(1)	2	(5)	59	(7)	979	(4)	25	17	712	(0)	0	(29)	4,263
01 024 (1) 7007 (00) 7000 (11) 200 (01) 470 (12)			수計	(312)	12,472	(18)	382	(71)	3,672	(99)	2,682	(13)	426	168	7,162	6)	0	(480)	19,634

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。

※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画 ⑷→- ⑴

					-		
100	十十	舱	農林水産部	(開助		抽	
	件数	金額	件数	金額		件数	金額
平成27年度当初	(39)	1,172	(0)	0		(39)	1,172
平成27年度災害	(16)	2 08	(0)	0		(16)	208
平成27年度補正	(0)	0	(0)	0		0	0
平成28年度当初	(1 22)	2,313	(11)	207		(133)	2,520
平成28年度災害	(18)	1 99	(0)	0		(18)	199
平成28年度補正	(13)	2 59	(2)	98		(15)	345
平成29年度当初	(80)	1,970	(11)	244		(91)	2,214
そのも	(3)	18	(0)	0		(3)	18
수計	(291)	6,139	(24)	537		(315)	9/9/9

金額単位:百万円

	ĕ	高神学児の後	からの世	対象は世分のでもは					平成29年度	1年度					SAM DOCTO	2	i	
	ĸ		- 17X-1	K SK	第1四半期	未期	第2四半期	未期	第3四半期		第4四半期	半期	÷	小計	1000	# X X		
許可業種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	泰	件数	金額	件数	÷	牛数	金	#	金額	件数	金額	件業	金額	牛教	金
十十一 注	A 1	3億円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	6)	0
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(11)	1,000	(0)	0	(3)	263	(0)	0	(1)	73	4	336	(0)	0	(15)	1,336
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(48)	1,554	(4)	105	(14)	586	(10)	342	(3)	104	31	1,137	(0)	0	(67)	2,691
	S B	1,500万円未辦	(51)	2 47	(0)	0	(2)	1	(10)	61	(2)	17	14	68	(0)	0	(65)	336
	小		(110)	2,801	4	105	(19)	980	(20)	403	(9)	194	49	1,562	6	0	(159)	4,363
羅燦一式	A 1	1億3,200万円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	9	0
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	99	(0)	0	-	99	(0)	0	3	65
	m	2,750万円以上5,500万円未満	(0)	0	(1)	41	(0)	0	(0)	0	(0)	0	-	41	(0)	0	3	4
	ပ	1,100万円以上2,750万円未満	(2)	45	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(2)	45
	۵	1,100万円未辦	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	9	0
	小軒		(2)	45	(F)	4	<u>6</u>	0	3	65	0	0	2	106	9	0	(4)	148
輔装	∢	1,100万円以上	(27)	434	(0)	0	(9)	126	(5)	68	(2)	30	13	245	(0)	0	(40)	629
	æ	330万円以上1,100万円未満	(22)	1 55	(1)	6	(4)	27	(4)	30	(2)	18	1	84	(0)	0	(33)	239
	ပ	330万円未建	(3)	80	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(3)	00
	小軒		(52)	297	(J)	6	(10)	153	6)	119	₹	48	24	329	<u>©</u>	0	(9 <i>L</i>)	926
無			(17)	3 09	(1)	13	(1)	28	(9)	113	(0)	0	80	154	(0)	0	(25)	463
橋梁補修			(5)	59	(0)	0	(1)	80	(2)	28	(0)	0	æ	36	(0)	0	8)	95
安全施設			(5)	33	(0)	0	(0)	0	(1)	4	(0)	0	-	4	(0)	0	(9)	37
鋼構造物			(1)	14	(0)	0	(0)	0	(1)	59	(0)	0	_	29	(0)	0	(2)	43
電気			(2)	30	(0)	0	(1)	6	(0)	0	(0)	0	-	6	(0)	0	(3)	39
和			(1)	9	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(1)	9
その他			(1 9)	1 98	(2)	14	(0)	0	(6)	274	(1)	20	12	358	(0)	0	(31)	556
		合計	(214)	4,089	(6)	182	(32)	1,058	(49)	1,035	(11)	312	101	2,587	6)	0	(315)	9/9/9

※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。 ※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

	_
a	5
T	Ã
4	

茶雕

【郑江地基本】

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

金額単位:百万円 1,619 3,151 496 5,266 458 729 5,232 169 17,120 (13) (11) (253) (23) (194) (286) (28) (7) **4**数 925 330 2,008 335 1,733 5,914 3 62 221 御 農林水産部 (22) (-) (64) (33) (148) (7) ((8) 0 **4**数 694 2,789 1 66 3,258 1 23 2 08 3,499 1 69 11,206 金 土木部 (9) (4) (189) (16) (19) (1 61) (438) 4数 (36) 6 平成27年度補正 平成28年度当初 平成28年度補正 平成27年度当初 平成28年度災害 平成29年度当初 平成27年度災害 その色 子算別 华 (表-1)

(表-2)

金額単位:百万円 平成29年度

	椰	操坏自体	平成28年	平成28年度整約浴	:				+W23+B	# W					平成30年度以經		1	
					第1四半期	半期	第2匹	第2四半期	第3四半期	米 類	第 4四 半期	作期	十十	±			i	
計可業 種	ランク等	左記ランク発注価格帯区分	件数	金額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	4 数	金	件数	金額	件 数	金額	件数	金 額
十十一 洪	A 1	3億円以上	(1)	2,672	(0)	0	(1)	476	(0)	0	(0)	0	-	476	(0)	0	(2)	3,148
	A 1	7,000万円以上3億円未満	(1 4)	1,363	(1)	7.4	(3)	329	(5)	509	(4)	335	13	1,247	(0)	0	(27)	2,610
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	(94)	3,118	(9)	165	(19)	581	(13)	476	(8)	2 41	46	1,463	(1)	23	(141)	4,604
	В, С	1,500万円未辦	(81)	575	(3)	18	(6)	53	(10)	63	(0)	0	22	134	(0)	0	(103)	709
	神小		(190)	7,728	(10)	257	(32)	1,439	(28)	1,048	(12)	925	82	3,320	(1)	23	(273)	11,071
建築一式	A 1	1億3,200万円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	153	(0)	0	-	1 53	(0)	0	£	153
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(2)	134	(0)	0	(1)	63	(1)	63	(0)	0	2	126	(0)	0	4)	260
	m	2,750万円以上5,500万円未満	(3)	88	(0)	0	(1)	28	(0)	0	(0)	0	-	28	(0)	0	4)	116
	ပ	1,100万円以上2,750万円未満	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(1)	21	9	21
	۵	1,100万円未辦	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	9	0
	14		(2)	222	0)	0	(2)	9	(2)	216	0	0	4	307	(1)	72	(10)	550
輔装	4	1,100万円以上	(45)	727	(3)	62	(12)	187	(10)	171	(2)	42	27	462	(0)	0	(72)	1,189
	В	330万円以上1,100万円未満	(40)	2 65	(1)	4	(6)	7.4	(9)	55	(2)	14	18	1 47	(0)	0	(28)	412
	ပ	330万円未満	(0)	0	(1)	3	(0)	0	(0)	0	(1)	3	2	9	(0)	0	(2)	9
	小計		(82)	992	(2)	69	(21)	261	(16)	526	(2)	59	47	615	(0)	0	(132)	1,607
厘 纸			(3 2)	1,367	(5)	27.5	(2)	28	(2)	258	(0)	0	14	561	(0)	0	(49)	1,928
橋梁補修			(15)	1 63	(0)	0	(10)	146	(1)	22	(0)	0	11	1 68	(0)	0	(56)	331
安全施設			(8)	31	(0)	0	(0)	0	(1)	8	(0)	0	1	8	(0)	0	(4)	39
鋼構造物			(1)	6	(0)	0	(2)	42	(1)	9	(0)	0	3	48	(0)	0	(4)	22
電気			(7)	113	(0)	0	(3)	7.4	(2)	63	(0)	0	5	1 37	(1)	15	(13)	265
Яп			(2)	16	(0)	0	(1)	29	(2)	29	(0)	0	3	96	(0)	0	(2)	112
その他			(20)	6 48	(0)	0	(8)	33.5	(12)	177	(0)	0	20	512	(0)	0	(20)	1,160
		수計	(393)	11,289	(20)	601	(81)	2,445	(72)	2,091	(17)	635	190	5,772	(3)	65	(286)	17,120

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。

※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

金額単位:百万円

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画 _(表-1)

į į	土木部	鍋	農林水産部	(産部		抽	
了异 为!	件数	金額	件数	金額		件数	金額
平成27年度当初	(78)	2,597	(2.2)	8 45		(100)	3,442
平成27年度災害	(53)	275	(3)	227		(32)	505
平成27年度補正	(13)	986	(1)	35		(14)	1,021
平成28年度当初	(2 01)	3,953	(89)	1,613		(569)	2,566
平成28年度災害	(20)	2 49	(2)	5		(22)	254
平成28年度補正	(23)	8 40	(7)	374		(30)	1,214
平成29年度当初	(1 64)	4,1 20	(47)	626		(211)	5,099
そのも	(31)	9/0'6	(0)	0		(31)	9/0/6
合計	(223)	22,096	(150)	4,078		(602)	26,174

	6		サので背点	※ ※ は 曲 サ の で 背 山					平成29年度)年度					終い曲 byoc もら	三	į	
	n.		+07×//-	T TEX	第1四半期	未期	第2四半期	半期	第3四半期	半期	第4四半期	半期	小計		toc XIII	# X X !	112	
許可業種	ランク等	左記ランク総は価格帯区分	件数	金	件数	金	件	金額	本	金	4数	金額	件数	金額	件 数	金額	件数	数
十 十 十 十	A 1	3億円以上	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	9	0
	A 1	7,000万円以上3億円未猶	(19)	2,557	(0)	0	(2)	147	(9)	962	(3)	431	=======================================	1,540	(0)	0	(30)	4,097
	A 2	1,500万円以上7,000万円未謝	(91)	2,842	(2)	69	(23)	743	(25)	740	(4)	115	54	1,667	(0)	0	(145)	4,509
	ပ	1,500万円未辦	(120)	652	(8)	40	(22)	164	(23)	134	(0)	0	53	338	(0)	0	(173)	066
	小計		(230)	6,051	(10)	109	(47)	1,054	(54)	1,836	6	546	118	3,545	<u>6</u>	0	(348)	965'6
羅黎一式	A 1	1億3,200万円以上	(1)	2 00	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(1)	1 90	-	1 90	(0)	0	(2)	390
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	(1)	88	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	Ð	88
	m	2,750万円以上5,500万円未満	(4)	137	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	9	137
	ပ	1,100万円以上2,750万円未満	(2)	43	(0)	0	(0)	0	(1)	15	(0)	0	-	15	(1)	21	9	62
	۵	1,100万円未辦	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(0)	0
	本		(8)	468	9	0	6	0	€	15	(F)	190	7	202	Ξ	72	(11)	694
舗装	∢	1,100万円以上	(45)	867	(9)	162	(25)	602	6	200	(1)	15	39	979	(0)	0	(84)	1,846
	æ	330万円以上1,100万円未満	(23)	1 54	(0)	0	(2)	16	(9)	38	(0)	0	80	54	(0)	0	(31)	208
	ပ	330万円未満	(4)	11	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	0	(4)	11
	小		(72)	1,032	9)	162	(27)	618	(13)	238	(1)	15	47	1,033	ව	0	(119)	2,065
洪 画			(32)	655	(2)	44	(5)	5.8	(11)	189	(0)	0	18	291	(0)	0	(20)	946
橋梁補修			(1 5)	251	(0)	0	(0)	0	(19)	144	(0)	0	19	1 44	(0)	0	(34)	395
安全施設			(1 0)	1 04	(0)	0	(4)	63	(9)	96	(0)	0	10	1 59	(0)	0	(20)	263
鋼構造物			(6)	1,133	(0)	0	(3)	126	(2)	39	(0)	0	2	1 65	(0)	0	(14)	1,298
寓领			(24)	8 69	(0)	0	(1)	8	(2)	104	(1)	20	6	132	(0)	0	(33)	1,001
柳			(4)	68	(0)	0	(4)	169	(E)	10	Ξ	48	9	227	(0)	0	(10)	316

20,013 ※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 (429) 华

009'6 26,174

(0Z) (60Z) (10)

ê ê **E**

239 6,140 227

15 **249** 9

> 0 819

127 2,798

(121) 5

102 **2,198**

(5**86**)

10 0

(E) (E) 0

9,361 83

(2 2)

325

0 0 0 7

Ξ Ξ (0) (11)

※平成30年度以降の予算に関わるものは含まれない。 ※平成29年度の件数・金額は平成30年度に繰り越す可能性がある。

そのも 侧侧 摦

県内市町村(政令市含む)工事のブロック別工事予算総括

ポストョ↑	二叉币币品	宗で中国で(政治ではの)上事のノログ	ノフロシン形	/7別上事予昇	异杉石		車	単位:件、百万円
		ा	平成28年度通常・災害		• 補正予算、平月	平成29年度通常	JF To	
	4	公共	農林水産	水産	その他) 街	l ijina	盂
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
県	3,773	95,100	3,096	11,000	1,683	42,999	8,552	149,100
県北	2,520	30,885	1,045	7,068	1,570	33,349	5,135	71,302
県南	1,358	15,839	358	3,293	828	14,975	2,544	34,107
天草	856	5,249	186	1,783	537	12,244	1,579	19,276
中二	8,507	147,073	4,685	23,144	4,618	103,567	17,810	273,785

県内各市町村が自ら集計した平成28・29年度の通常事 補正された事業について、平成28年度以降に発注する 平成28年度に発生した地震あるいは豪雨災害から の復旧事業及び平成28年度に経済対策などの理由で 事件数と金額 H O

額では、農林水産関係が約1割と少ない。 ⇒少額工事が 産関係及びその他が約5割となっているが、発注予定金 構成比率について工事件数では公共が約5割、農林水 O

の発注予定件数及び金額の構成比率 市町村工事における平成28・29年度


齠

佃

数

世





公共 54%

8

※件数、金額及び時期については、現段階の予定であり、今後変更の可能性有り。

※H30以降の通常費は含まれない。

※H29の件数・金額はH29に繰り越す可能性がある。

復旧・復興工事及び通常工事に関する今後の発注計画等



部


K

泄

∀

県内市町村(政令市含む)工事のブロック別発注予定

、百万円			金額	49,100	71,302	34,107	19,276	273,785	
単位:件、	#	Ē	श्रम						<u>/</u>
			件数	8,552	5,135	2,544	1,579	17,810	
	物(中:	Ř Ž	金額	4,804	2,182	0	0	986'9	2.6%
	亚品30年申131略	1003/	件数	285	180	0	0	762	4.3%
		丰	金額	87,380	33,439	13,996	11,661	146,476	83.5%
		本	件数	4,946	2,252	1,106	683	8,987	20.5%
		半類	金額	16,253	3,231	1,212	290	20,986	7.7%
		第4四半期	件数	1,310	281	41	38	1,670	9.4%
	9年度	未期	金額	31,552	12,613	6,672	4,381	55,218	20.2%
	平成29年度	第3四半期	件数	1,776	684	475	321	3,256	18.3%
		第2四半期	金額	20,454	9,270	4,116	2,042	35,882	13.1%
		第2四	件数	920	703	369	203	2,225	12.5%
		1半期	金額	19,120	8,326	1,996	4,948	34,390	12.6%
		第1四半期	件数	910	284	221	121	1,836	10.3%
	中部公公	Fight K	金額	56,074	35,417	19,978	7,615	119,084	43.5%
	证明90年申却纷次	+ 0 13/4 +	件数	2,925	2,655	1,423	968	7,899	44.4%
				県央	県北	県南	天草	合計	比率

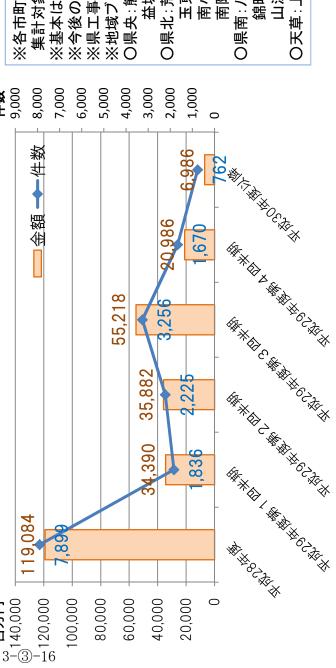

※各市町村により集計した件数及び金額を集計したもので、 集計対象事業は各市町村の判断に依る。

百万円

※基本は入札件数ベースである。

※今後の入札件数・金額や発注時期は変動する。

※県工事は含まない。

※地域ブロックは県の広域本部管轄区分

〇県央:熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、 益城町、甲佐町、山都町

〇県北:荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、 玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、 南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、 南阿蘇村

〇県南:八代市、人吉市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、 錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村

〇天草:上天草市、天草市、苓北町 山江村、球磨村、あさぎり町

> ※件数、金額及び時期については、現段階の予定であり、今後変更の可能性有り。 ※H30以降の通常費は含まれない。

※H29の件数・金額はH29に繰り越す可能性がある。

熊本市

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

百万円		金額	18,621	40,142	3,105	27,829	37	89,734
金額単位:	ilia	件数	429	683	33	553	5	1,703
	の 他省庁所管	金額	4,387	12,948	1,112	8,739	8	27,194
	その他省	件数	96	526	56	168	-	517
	省所管	金額	242	842	0	909	0	1,690
	農林水産省所管	件数	17	62	0	30	0	109
	省所管	金額	13,992	26,352	1,993	18,484	59	60,850
	国土交通省所管	件数	316	395	7	355	4	1,077
(表-1)	N W		平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	40

金銭単位・日力円 ::		金額	28,071	4,349	1,533	652	34,605	14,989	2,938	351	18,278	4,150	428	191	4,769	1,201	657	603	1,306	4,358	680'2	6,419	1,585	6,419	89,734
正統正	ħa	件数	199	140	116	106	561	41	96	52	189	98	27	31	144	27	21	22	13	86	204	113	49	113	1.703
40000	数	金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	半5%30年度交降	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	金額	16,455	2,251	761	207	19,674	9,674	1,946	526	11,846	847	115	34	966	805	396	9/	84	2,639	5,166	2,946	688	2,946	20,960
	世小	件数	115	75	62	33	285	56	65	31	116	23	7	5	35	20	10	5	4	55	130	48	16	48	998
	難	金額	1,938	355	136	15	2,444	1,450	125	0	1,575	241	19	6	569	200	0	99	0	653	614	0	52	0	6,838
	第4四半期	件数	12	14	6	3	38	3	4	0	7	8	1	1	10	15	0	2	0	8	11	0	2	0	103
年度	- 開	金額	4,586	924	428	120	6,058	4,550	877	100	5,527	386	34	0	420	305	193	ec e	31	1,467	2,096	486	313	486	18,981
平成29年度	第3四半期	件数	31	32	32	17	112	11	25	15	51	6	2	0	11	5	9	-	3	20	53	6	80	6	337
	第:	金額	3,942	371	121	30	4,464	2,817	406	75	3,298	73	59	20	122	0	21	5	53	357	831	836	498	9836	12,382
	第2四半期	件数	56	11	11	9	54	9	13	8	27	2	2	3	7	0	-	-	1	16	22	15	2	15	200
	1	金額	686'5	109	92	42	6,708	857	538	51	1,446	147	33	2	185	0	182	er.	0	162	1,625	1,624	56	1,624	12,759
	第1四半期	件数	46	18	10	7	18	9	17	8	31	4	2	1	7	0	m	-	0	8	44	24	-	24	226
oper children	英家派	金額	11,616	2,098	772	445	14,931	5,315	992	125	6,432	3,303	313	157	3,773	396	261	527	1,222	1,719	1,923	3,473	969	3,473	38,774
1	半成28年限業約済	件数	84	99	54	73	276	15	37	21	73	63	20	56	109	7	11	17	6	46	74	99	33	99	837
25. 37 ber 16 ette 0.1	発压恤格带 別	左記発注等級価格帯区分	5,000万円以上	2,000万円以上5,000万円未満	1,000万円以上2,000万円未満	1,000万円未離		8,000万円以上	1,000万円以上8,000万円未猶	1,000万円未滞		2,000万円以上	1,000万円以上2,000万円未満	1,000万円未満											#40
		発注等級	A	В	O	Q	小計	Α	В	O	小計	A	В	S	小計										
(7 🔉		許可業種	土木一式					建築一式				舗数				垣	橋梁補修	安全施設	鋼構造物	電気	細	水道	題	その他	
(7 XX)			## 					3-	<u>-(3</u>	<u>) —]</u>	17	舗装					橋梁補	安全施	鋼構造:	電気	争	水道	魍魍	その住	

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

[※]件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計止する。

八代市

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

: 百万円		金額	8,709	505	629	3,945	17	13,835
金額単位:百万円	ita	4数	348	92	46	317	4	791
	寸所管	金額	5,351	9	188	1,682	0	7,227
	その他省庁所管	件数	98	-	19	18	0	187
	省所管	金額	425	243	0	503	4	1,175
	農林水産省所	件数	49	35	0	62	-	147
	省所管	金額	2,933	256	471	1,760	13	5,433
	国土交通省所管	件数	213	40	27	174	3	457
		-	4成28年度通常	:成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	

14歳年12・12/13		金額	1,685	1,669	1,099	4,453	2,687	260	63	3,010	1,564	441	88	88	m	926	228	1,154	377	112	489	2,545	13,835
計 清	ī	件数	32	103	210	345	9	12	13	31	155	46	o	7	-	28	35	63	6	25	34	100	791
80	世	金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国际20年间级	4/4/2044/A	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	731	738	515	1,984	0	125	28	153	647	84	35	77	0	94	110	204	126	46	172	926	4,312
	44小	件数	=	46	111	168	0	7	7	14	65	10	3	3	0	4	18	22	4	12	16	44	339
	- 御	金額	267	0	18	285	0	0	0	0	176	0	0	27	0	17	0	17	0	0	0	220	725
	第4四半期	件数	c	0	5	8	0	0	0	0	2	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	5	17
年度	半期	金額	0	319	238	557	0	110	19	129	270	41	0	0	0	77	71	148	27	23	20	223	1,418
平成29年度	第3四半期	件数	0	20	51	71	0	9	2	1	28	2	0	0	0	m	6	12	2	2	7	12	146
	ド類	金額	312	340	218	870	0	0	0	0	176	43	35	6	0	0	24	24	66	0	66	382	1,632
	第2四半期	件数	4	21	48	73	0	0	0	0	24	5	c	-	0	0	9	9	2	0	2	18	132
	- 瀬	金額	152	62	41	272	0	15	6	24	25	0	0	47	0	0	15	15	0	23	23	131	537
	第1四半期	件数	4	5	7	16	0	1	2	c	2	0	0	-	0	0	3	e	0	7	7	6	44
8	# F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	金額	954	931	584	2,469	2,687	135	35	2,857	917	357	53	11	0	832	118	950	251	99	317	1,589	9,523
公司 中央 公司 五	SI+07701+	件数	21	57	66	177	9	5	9	17	96	36	9	4	-	24	17	41	5	13	18	95	452
西镇癸进州教	75.7E IIII/181767.03	発注等級 左記発注等級価格帯区分	A 2,500万円以上	B 1,100万円以上2,500万円未満	C 1,100万円未満	小青十	A 5,000万円以上	B 1,000万円以上5,000万円未満	C 1,000万円未謝	사람						A 1,000万円以上	B 1,000万円未満	사람	A 1,000万円以上	B 1,000万円未満	사람사		中
Ž		許可業種	土木一式				建築一式				舗装	用班	橋梁補修	安全施設	鋼構造物	極			盘			その他	
(女 7)	76.7E, [III/4P) 4			が 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	お B B	知 S B C C C	20元中級 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1	2024-2888 C C B B A A A A A A A A A A A A A A A A	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1	1	1	1	1	1	### ### ### ### ### #################	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1

 合計
 452
 9,523
 44

 ※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。
 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。
 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。

 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

人吉市

金額単位:百万円

ifia

1,212

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0

15 16 34

2,904

0 0 0 0 0

0 0 0

金額

件数

0 0 0

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

4 数	国土交通省所管	農林水産治所管 年参	2省所管	その他名	その他省庁所管数	松林										
53	246	4	3	35	185	H*X	434									
=	37	2	4	32	144	48	482									
20	111	4	35	19	310	43	456									
62	786	7	32	42	450	111	1,469									
2	2	1	23	1	38	4	63									
148	1,383	21	26	129	1,424	298	2,904									
I																
				:						平成2	平成29年度					
	発注価格帯別			平成28年	平成28年度契約済	第12	第1四半期	第2匹	第2四半期	第3匹	第3四半期	第4四半期	半期	本		平成30年度以降
発注等級	左記系	左記発注等級価格帯区分	区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数
	2,200万円以上			4	220	-	34	0	0	4	358	2	143	7	535	0
	1,100万円以上2,200万円未渐	200万円未満		7	96	0	0	-	17	3	57	0	0	4	74	0
	550万円以上1,100万円未満	00万円未満		7	65	2	14	-	-	7	51	0	0	10	99	0
	550万円未満			47	87	2	7	0	0	19	19	~	S	22	73	0
				9	464	5	55	2	18	33	527	e e	148	43	748	0
	4,400万円以上			0	0	0	0	0	0	2	103	0	0	2	103	0
	2,200万円以上4,400万円未辦	400万円未選		-	31	0	0	0	0	2	95	0	0	2	56	0
	880万円以上2,200万円未満	00万円未満		3	42	0	0	0	0	-	17	0	0	-	17	0
	880万円未満			17	59	2	9	2	5	-	80	0	0	2	19	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				21	102	2	9	2	5	9	184	0	0	10	195	0
	1,100万円以上			-	12	0	0	0	0	0	0	2	35	2	35	0
	330万円以上1,100万円未満	00万円未満		6	09	0	0	2	13	4	21	0	0	9	34	0
	330万円未満			10	12	4	80	-	-	-	2	0	0	9		0
				20	84	4	8	6	14	2	23	2	35	4-	80	0
				2	42	0	0	0	0	2	6	0	0	2	6	0
				0	0	-	243	0	0	0	0	0	0	-	243	0
				11	14	0	0	2	4	2	5	0	0	4	6	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17	49	2	7	2	12	2	5	0	0	9	33	0
				13	63	-	-	2	35	6	16	0	0	9	52	0
				27	173	9	148	80	9/	21	270	-	20	36	544	0

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

※件数は入札手続きの件数とし、合田入札を行う場合は、合田工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。※集計時点で合田入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、非定決定箇所の件数及び金額を計上する。

荒尾市

自治体名】

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

大衛四		国土交通省所管	版杯水库有所面	看所官	4の街道下所道		ha	-								
高 古 古	4	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額								
平成28年度通常	64	1,097	2	63	2	150	89	1,310								
平成28年度災害	1	14	0	0	0	0	1	14								
平成28年度補正	. 2	23	0	0	0	0	2	23								
平成29年度通常	42	787	-	5	10	112	53	904								
平成29年度災害	0	0	0	0	0	0	0	0								
中	109	1,921	3	89	12	292	124	2,251								
(表-2)																
						1					平成	平成29年度				
		発注価格帯別			平成28年度契約済	医影影场	第1匹	第1四半期	第2匹	第2四半期	第35	第3四半期	第4四半期	半期	 	小計
許可業種	発注等級	左記条	左記発注等級価格帯区分	区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
上木一式	ď	2,000万円以上			15	109	-	39	9	191	-	35	-	20	6	315
	A · B	1,000万円以上2,000万円未辦	000万円未辦		41	180	0	0	m	41	9	9/	0	0	6	117
	C (H28)	300万円以上1,000万円未満	20万円未満		14	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B. O	500万円以上1,000万円未満	20万円未満		0	0	0	0	-	6	2	12	0	0	3	21
	U	300万円以上500万円未満	万円未満		0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	
	۵	300万円未満			3	5	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
	小計				46	828	1	68	10	241	11	130	2	55	24	462
建築一式	A (H28)	1,000万円以上			5	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A·B (H28)	500万円以上1,000万円未満	20万円未辦		4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B · C'H28)	500万円未満			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C · D (H28)	300万円未満			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	А	2,000万円以上			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A · B	1,000万円以上2,000万円未満	000万円未満		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	മ	500万円以上1,000万円未満	20万円未消		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	300万円以上500万円未満	(万円未満		6	310	0	0	2	12	6	159	2	14	13	185
	C . D	300万円未満			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	사람				6	310	0	0	2	12	6	159	2	14	13	185
舗装					2	24	0	0	-	7	2	63	0	0	m	70
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計				2	24	0	0	-	7	2	63	0	0	m	70
川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
橋梁補修					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全施設					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鋼構造物					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気					9	75	0	0	1	4	1	3	0	0	2	7
和					1	5	0	0	Ω	64	-	4	0	0	4	89
その他					7	75	2	41	0	0	5	95	0	0	7	112

1,320

70

0

0

283

2

27

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

495

94

0 0 0

0 0

0 0

0

0

94

0 0 0 0 8

0 0

0

0

82 73 187 2,251

0 0

0

124

0

0

495

0

0

0 22 0 23

金額単位: 百万円

1000

平成30年度以降

916 297 72 21

23 23 14

0 0

0

金額

件数

金額

件数

[※]発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※エキュカム中中に1984の、※当中業人は今まかい。

[※]平成30年度以降の通常事業分は含まない。 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

水俣市

[自治体名]

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

155

155 70 40

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

古

> σ

40 45

m 950,

橋梁補修 安全施設 鋼構造物

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

										第4四半																	
										報	件数	0	1	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									年度	半期	金額	0	20	40	9	99	155	0	0	0	14	169	0	56	1	27	0
									平成29年度	第3四半期	件数	0	1	5	4	10	-	0	0	0	3	4	0	3	-	4	0
										半期	金額	0	0	32	27	59	0	70	0	0	0	02	0	4	2	9	7
										第2四半期	件数	0	0	4	14	18	0	-	0	0	0	1	0	-	-	2	-
: 百万円	金額	966	81	0	771	29	1,877			半期	金額	0	0	0	11	11	0	0	40	45	4	68	14	14	5	33	0
金額単位:百万円 計	件数	117	25	0	87	3	232			第1四半期	件数	0	0	0	12	12	0	0	-	6	-	2	-	2	3	9	0
广 所管	金額	414	0	0	321	0	735		\$2.4% E##	兵(2)张	金額	0	22	106	78	506	0	218	0	0	26	244	0	22	5	27	-
その他省庁所管	件数	46	0	0	56	0	72		からなれた	十0%28年辰类約6	件数	0	1	13	51	99	0	2	0	0	00	10	0	3	9	6	-
省所管	金額	13	20	0	18	0	51				≤分							中									
農林水産省所管	件数	3		0	4	0	18				左記発注等級価格帯区分		000万円未満	00万円未満			4	億3,200万円未清	500万円未満	750万円未満				00万円未満			
省所管	金額	695	19	0	432	59	1,091		百年 华进 火	充注価格市別	左記	7,000万円以上	1,500万円以上7,000万円未満	500万円以上1,500万円未満	500万円未満		1億3,200万円以上	5,500万円以上1億3,200万円未満	2,750万円以上5,500万円未満	1,100万円以上2,750万円未満	1,100万円未満		1,100万円以上	330万円以上1,100万円未満	330万円未満		
国土交通省	仲数	89	14	0	57	3	142			ŧtīs	発江等級	A 1	A 2	В	C	小計	A 1	A 2	ω	C 1	D 1	小計	A	<u>a</u>	C	小計	
(表-1)	E I	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	合計	(表-2)			許可業種	上十一式		<u></u>			建築一式			<u> </u>			舗装				法面
								ı	_		-	-					3-	3)-2	21			-				

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

その他

部然 ĮII ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計止する。

※「独自の価格帯区分なし」

玉名市

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

(表-1)							金額単位	金額単位:百万円					
外	国土交	国土交通省所管	農林水産省所管	省所管	その他	その他省庁所管	ilia	+					
17 14 71	件数	金額	牛数	金額	件数	金額	件数	金額					
平成28年度通常	59	564	13	571	153	4,487	195	5,622					
平成28年度災害	2	14	6	21	29	29	40	102					
平成28年度補正	-	935	0	0	2	59	m	964					
平成29年度通常	100	1,366	36	292	11	3,737	247	5,868					
平成29年度災害	2	28	0	0	0	0	2	28					
合計	137	2,907	58	1,357	295	8,320	490	12,584					
(表-2)													
		百年 年 年 年 月 大 久 名			You H	\$2.4% IC# IC#					平成29年度	9年度	
		充注[[[格帝]]]			# 12.28 #	牛队28年辰类約済	第1四	第1四半期	第2四	第2四半期	第3四半期	11未期	第4四半期
許可業種	発注等級	左記多	左記発注等級価格帯区分	区分	件数	金額	4数	金額	件数	金額	件数	金額	件数
上木一.洪	⋖	1,500万円以上			22	1,113	£	250	88	322	21	1,007	2
	В	600万円以上1,500万円未満	00万円未満		35	309	4	40	10	108	29	285	0
	U	600万円未離			29	200	23	19	29	40	5	18	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計				124	1,622	30	309	47	470	55	1,310	2
建築一式	A	3,000万円以上			5	3,338	m	945	0	0	0	0	0
	В	3,000万円未辦			18	09	2	17	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	사計				23	3,398	2	396	0	0	0	0	0
舗装	A	600万円以上			7	53	9	06	33	85	2	15	0
	8	130万円以上600万円未消)万円未消		18	62	7	26	9	23	2	6	0
	U	130万日未辦			5	5	-	-	0	0	0	0	0
	小計				0	0	14	117	6	108	4	24	0
洪画					3	9	0	0	0	0	0	0	0
橋梁補修					4	33	0	0	2	38	-	4	0

3,769

2,147

 4,360

> Ξ

 2,944

12,584

780 1,552 968'5

1,190 2,986

Ξ

1,392

768,

安全施設 鋼構造物

金額

件数

金額

件数

金額

件数

丰

1,637

金額

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

6,551 ※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

その他

氰 ĮII ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発法など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計止する。

金額単位:百万円

ilia

金額

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

山鹿市									外	金額 件数	0 30		0 19		0 13		0 37	0 166	0	0 15	0	0 4	0 26	0		0 0		7 0			0 2	0	0	0 11	0 2	0	0 4	9 0	
体名】									平成30年度以降		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 1	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【自治体名】								-	T	件数	0	0	0	0	119	126	105	350	0	0	80.	27	35	0	0 1	0 0	0 0	12	22	0	0	0	0	30	0	0	151	21	
									小計	金額											1,708		1,735		_														
										件数	0	0	0	0	13	21	37	1.2	0	0	3	4	7	0	0	0		7 9	00	0	0	0	0	6	0	0	4	9	
									- 御	金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									第4四半期	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
								±		金額	0	0	0	0	66	96	73	268	0	0	1,531	15	1,546	0	0	0 0	0 1	V 17.	10	0	0	0	0	0	0	0	35	10	
								平市200年	第3四半期	件数	0	0	0	0	12	18	27	22	0	0	-	1	2	0	0	0 0	> r	- cr	4	0	0	0	0	0	0	0	-	3	
										金額	0	0	0	0	20	12	17	49	0	0	145	6	154	0	0	0) L	0 0	7	0	0	0	0	28	0	0	116	11	
									第2四半期		0	0	0	0	-	-	4	9	0	0	1	2	3	0	0	0) F	- -	2	0	0	0	0	2	0	0	3	en	
カ田			180	0	64	131	78			件数	0	0	0	0	0	18	15	33	0	0	32	3	35	0	0	0	0 0	0 6	- 2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
金額単位:百万円	ıılıcı	<##	0		2,449		8,478		第1四半期	金額																													
		4数	109	0	75	44	279		無	件数	0	0	0	0	0	2	9	8	0	0	1	1	2	0	0	0			2	0	0	0	0	-	0	0	0	0	
	中所管	金額	5,109	0	1,993	9	7,120		5契約済	金額	673	198	09	48	0	0	0	626	134	73	0	0	207	60	25	12	0		55	0	13	17	24	142	72	17	0	0	
	その他省庁所管	件数	2 4 %	0	38	-	06		平成28年度契約済	件数	30	27	19	91	0	0	0	96	4	15	0	0	19	-	4	20 0	0	0 0	13	0	2	4	4	00	2	en	0	0	
	縆	金額	VIO 40	0	330	35	615	+																															
	農林水産省所管		0 1	0	50	16	99			左記発注等級価格帯区分		担米	擬												瞑														
-			D 00	0	9	0	3		_	この発生等		2,000万円	.000万円未	振.	괵	擬	無			無米	4	無			,000万円米 **	揮	#									担 生	븬	振	
	国土交通省所管	金額	128		126	06	743		発注価格帯別	7	2,000万円~	1,000万円~2,000万円未満	500万円~1,000万円未避	無米田公005~	1,000万円以上	2,000万円未滞	1,000万円未満		2,000万円~	~2,000万円未満	1,000万円以上	2,000万円未満		1,000万円~	500万円~1,000万円米舗	~ 500万五米道	300万日秋十								1,500万円~	~1,500万円未辦	1,000万円以上	2,000万円未満	
	国土交	# 禁:	34	0	17	27	123			発注等級	A (H28)	B (H28)	C (H28)	D (H28)	A (H29)	B (H29)	C (H29)	小計	A (H28)	B (H28)	A (H29)	B (H29)	小計	A (H28)	B (H28)	C (H28)	A (F29)	G (H29)	小字						A (H28)	B (H28)	A (H29)	B (H29)	
(表-1)	光便品	1 34-013	平成28年長迪吊平成28年度後害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	中中	(表-2)		許可業種	十十一年								離郷一式					舗装				1.7		川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川	橋梁補修	安全施設	鋼構造物	明河		#			

1,329 134 73

0 17 7

17 24 172 72

126

198 60 48 119

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

渐光市

[自治体名]

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

								-		_	\vdash	_	\vdash	ш						\vdash	\vdash	ч	\vdash	+	+	+	+	+	+	+	+
									the state of	金額	529	342	102		973	523	59	124	85		791	141		141		20	3 6	2	191	134	989
									44小	件数	12	20	30		62	9	2	7	36		51	14		41		~	1 4	-	10	8	09
									E類	金額	41	12	2		55							18		87	2					15	47
									第4四半期	件数	-	-	1		3							С		c c						-	4
								年度		金額	402	194	63		629	246		87	19		352	122		122	1	20) "		16	19	134
								平成29年度	第3四半期	件数	8	=======================================	16		35	4		2	10		19	10		10	2	~	1 +	-	2	2	13
										金額	09	91	35		186	83	59	37	24		173	-		-			0		53	88	62
									第2四半期	件数	2	9	11		19	-	-	2	4		8	-		·			0		-2	m	10
	3,308	1,941	280	1,953	43	7,525				金額	56	45	2		73	194	30		42		599								122	12	393
教	156	183	4	145	2	490			第1四半期	件数	-	2	2		5	-	1		22		24								m	2	33
广 所管 金額	823	1,585	279	828	43	3,558		**************************************		金額	992	175	130		1,071	1,798	142	70	139		2,149	159		159	5 6	12 129	0 7	2	40	81	096
その他省庁所管 件数 金	80	151	3	62	2	298		於	十7%28年5	件数	21	18	46		85	4	4	4	64		92	27		7.0		2 7			1	6	95
省所管金額		37				37				₹%	E)	《上500万円未満》	湯)																+		
農林水産省所管 件数 金		10				10				左記発注等級価格帯区分	2,500万円以上(災害500万円以上)	,000万円以上2,500万円未清(災害200万円以上500万円未清)	1,000万円未満(災害200万円未満)				000万円未満	500万円未辦													
省所管 金額	2,485	319	1	1,125		3,930		28次年4年日	5.生11114年117月	左記条	.,500万円以上(,000万円以上2,500万户	1,000万円未満(5,000万円以上	1,000万円以上5,000万円未満	1,000万円以上2,500万円未満	1,000万円未満												
国土交通省所管 件数 金	92	22	1	83		182			ĸ	発注等級	A 2	B	C 1		小計	A 5	B 1	0	1		小計			#W							
予算別	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	合計	(表-2)			許可業種	土木一式	•				建築一式		•				舗装			用	所 極勢補修	日本書き	文 士 Jusux 組 株 江 伽	H 12 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	和工	その他

2,940

127

300

4

300

4

149

6

7

56

215 1,596

17

116

490

231

194

100

2,047

148 9

201

517

38

22

1,295 235

33

金額

件数

金額

件数

[※]発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

[※]件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発法など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

									金額単位:百万円			金額	1,639.73	261.64	123.85	41.70	2,066.92	96.989	47.25	2.46	736.67	240.00	185.59	82.00	55.00	562.59	201.33	95.94	7.40	00.00	451.40	78.36	425.28
中十十									金額卓	स्र	īū	件数	64	46	53	95	255	15	13	4	32	16	39	40	82	177	3	3	14	0	14	4	35
										20 Z	世太区	金額	335.00	5.00	00.9	00.00	346.00	00.00	00.00	00.00	00'0	00'0	0.00	00:00	00:00	00'0	00'0	86.94	00:00	00.00	00'0	00.00	00:00
【課名】										を出せる。	T,M204.	件数	6	-	3	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
_											+	金額	929.05	111.10	58.50	19.98	1,118.60	624.48	21.34	06:0	646.72	167.00	121.00	54.00	28.00	370.00	201.33	00.6	7.40	00.00	335.81	61.55	172.61
											小計	件数	28	20	25	39	112	10	7	-	18	6	27	56	38	100	33	1	14	0	11	3	21
												金額	101.00	2.00	11.50	2.50	120.00	224.48	2.15	00:00	226.63	86.00	2.00	00:00	10.00	101.00	168.47	00:00	3.00	00:00	00.00	00.00	30.00
											第4四半期	件数	9	-	5	9	18	2	-	0	3	4	1	0	13	18	1	0	5	0	0	0	-
										9年度	米期	金額	523.74	64.02	14.70	4.36	606.82	76.85	4.77	06:0	82.52	00'0	78.00	39.00	1.00	118.00	00'0	00'6	3.60	00:00	3.00	23.16	27.28
										平成29年度	第3四半期	件数	11	1	9	6	37	3	8	-	7	0	18	19	-	38	0	1	7	0	1	2	5
												金額	242.66	23.08	10.64	7.92	284.30	144.41	7.70	00:00	1152.11	25.00	17.00	5.00	1.00	48.00	32.86	00:00	08:0	00:00	148.87	38.39	84.74
											第2四半期	件数	7	2	5	14	31	4	-	0	5	2	3	2	2	6	2	0	2	0	5	1	11
百万円		金額	618.61	2,783.89	359.19	750.94	113.26	4,625.89			+類	金額	61.62	19.00	21.66	5.20	107.48	178.74	6.72	00:00	185.46	26.00	21.00	10.00	16.00	103.00	00.00	00:00	00:00	00:00	183.94	00.00	30.59
金額単位:百万円	nha i	件数	107	240	6	170	11	537			第1四半期	件数	4	m	6	10	56	1	2	0	3	c	5	5	22	35	0	0	0	0	2	0	4
	宁 所管	金額	47.69	572.19	359.19	84.31	00:00	1,063.38		95.84c	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	金額	375.71	145.54	59.35	21.72	602.32	62.48	25.91	1.56	89.95	73.00	64.59	28.00	27.00	192.59	00.00	00:00	00:00	00:00	115.59	16.81	252.67
	その他省庁所管	件数	10	18	6	15	0	52		平 中 中 中 中	T1X20+15	件数	27	25	25	53	130	2	9	3	14	7	12	14	44	77	0	0	0	0	3	1	14
	省所管	金額	109.10	89.11	00:00	90.02	00:00	288.23				£3⁄																					
	農林水産省所管	件数	12	20	0	10	0	45				左記発注等級価格帯区分		万円未消	万円未満				万円未満				万円未満	争									
	(省所管	金額	461.82	2,122.59	00:00	576.61	113.26	3,274.28		百年华进大名	E/III/101/101/101	左記条	800万円以上	400万円以上800万円未満	130万円以上400万円未満	130万円未満		800万円以上	130万円以上800万円未満	130万円未満		800万円以上	300万円以上800万円未満	130万円以上未満	130万円未満								
	国土交通省所管	件数	85	202	0	145	11	443			<i>p</i>	発注等級	8 8	B 4	C	1	小計	A 8	B 1		小計	8 8	B 3	C		小計							
	- 1		\vdash	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害					許可業種	土木一式 A		U	1	N.	建築一式 A	ш		Α,	4	В	U		N.		橋梁補修	安全施設	鋼構造物			その他

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※承成30年度以降の通常事業分は含まない。 ※件数は入札手続きの件数とし、台冊入札を行う場合は、台冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及が金額を計上する。

上天草市

【自治体名】

金額単位: 百万円

平成30年度以降

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

											金額	617	118	106	26	867	325	125	42	1-	503	121	0	121	62	0	62	98	13	66	108	0	108	405
										小計	件数	4	4	17	15	40	ec .	4	9	4	17	m	0	3	2	0	2	17	5	22	4	0	4	00
										- 御	金額	20	23	0	0	73	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6	30	0	30	0
										第4四半期	件数	-	-	0	0	2	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	2	0	2	-	0	1	c
									年度	片期	金額	456	65	74	21	616	241	125	7	80	381	95	0	95	0	0	0	45	2	20	70	0	70	33.4
									平成29年度	第3四半期	件数	2	2	Ε	1	26	2	4	-	e	10	-	0	1	0	0	0	80	2	10	2	0	2	ч
										半期	金額	111	0	56	-	138	84	0	17	e	104	56	0	56	56	0	56	32	89	40	80	0	8	-
										第2四半期	件数	-	0	.5	-	7	-	0	m	-	2	2	0	2	-	0	-	7	m	10	-	0	1	
百万田	\$ \$	670	78	0	2,128	37	2,913			半期	金額	0	30	9	4	40	0	0	6	0	6	0	0	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0	
金額単位:百万円計	### ###	T3.	19	0	82	14	188			第1四半期	件数	0	-	~	æ	2	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	
参担土		357	0	0	1,397	0	1,754		1	医製剤済	金額	54	120	158	56	358	0	0	33	21	54	0	5	5	16	0	16	31	38	69	43	24	29	7 10
から名述下浮剤	年 本	35	0	0	30	0	99			平成28年度契約済	件数	-	4	8	15	38	0	0	2	9	00	0	1	1	2	0	2	4	12	16	4	7	11	9.
· ·	11/11日	22	54	0	191	14	281				至分	刊以上)	H28:2,000万	28:400万円	(握		3以上)	H28:2,500万	28:1,000万	(擬米		(1	(握		(1	〔振		(ग	(握		(7	(痕		
即林火帝处评争	株地	ž.	13	0	9	7	27				左記発注等級価格帯区分	(H28:2,000万F	(1000万円未計 (13未計)	00万円未満(H2(活)	128:400万円未		(H28:2,500万F	(1000万円未補 (1)300(1)30(1)30(1)30(1)30(1)30(1)30(1)3	00万円未満 (H.3 3未満)	128:1,000万円;		128:500万円以	128:500万円未		128:500万円以	128:500万円未		128:500万円以	128:500万円未		128:500万円以	128:500万円未		
· 新二	- FEM E	291	24	0	540	23	878			%	左記多	1,500万円以上 (H28:2,000万円以上)	1,500万円以上5,000万円未満(H28:2,000万円以上5,000万円未満)	300万円以上1,500万円未潜(H28:400万円以上2,000万円未満)	300万円未満(H28:400万円未満)		2,000万円以上(H28:2,500万円以上)	2,000万円以上7,000万円未満(H28:2,500万円以上7,000万円未満)	500万円以上2,000万円未満(H28:1,000万円以上2,500万円未満)	500万円未満 (H28:1,000万円未満)		300万円以上(H28:500万円以上)	300万円未満(H28:500万円未満)		300万円以上 (H28:500万円以上)	300万円未詳(H28:500万円未詳)		300万円以上(H28:500万円以上)	300万円未満(H28:500万円未満)		300万円以上(H28:500万円以上)	300万円未満 (H28:500万円未満)		
1000年以上 1000年 1000		37	9	0	46	7	96			ort.	発注等級	A 1	A 2	8	C	小計	A 1	A 2	ω ω	0	小計	A	В	小計			小計	A	B	小計	A	8	小計	
(表-1)	予算別	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	40	(表-2)			許可業種	土木一式	•		, ,		建築一式	•	1		,	侧须	·——I		∯m			舗装			水道施設			Z 0 44

 1,225

 金額

件数

金額

件数

 œ

2,913

0 0

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※件数は入札手続きの件数とし、合用入札を行う場合は、合用工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合用入札や分離発法など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。 ※発注等級**価格帯区分見直しにより、() 内に平成28年度の価格帯区分を表記。** ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

宇城市

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

国土交	国土交通省所管	農林水産省所管	省所管	その他省	の他省庁所管	l a								
件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額							
平成28年度通常 97	2,502	7	44	29	440	171	2,986							
平成28年度災害 217	1,693	46	432	62	712	342	2,837							
平成28年度補正 6	113	0	0	21	563	27	929							
平成29年度通常 70	1,105	12	69	54	750	136	1,924							
平成29年度災害	89	9	12	0	0	23	80							
407	5,481	17	557	221	2,465	669	8,503							
	10## 4F# 57.88			1	the thru left, ride					平成2	平成29年度			
	充注価格市別			卡灰28年辰类档片	医米割饼	第1四半期	半期	第2匹	第2四半期	第3四	第3四半期	第4四半期		
発汗等級	左記条	左記発注等級価格帯区分	(4)	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数
A	2,600万円以上			13	857	2	138	5	294	5	417	20	722	
Ф	800万円以上2,600万円未満	10万円未満		36	517	4	99	6	14	12	139	-	20	
U	800万円未満			118	526	10	36	9	32	56	109	∞	25	
۵	200万円未満			19	77	21	24	21	18	12	15	6	12	
小計				228	1,977	37	263	35	385	55	089	23	6//	11
A	2,000万円以上			7	579	2	54	2	297	1	152	0	0	
ω	2,000万円未辦			48	276	-	10	0	0	3	13	2	7	
ပ	130万円未満			56	22	0	0	0	0	9	9	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計				81	877	3	64	2	297	10	171	2	7	
∢	400万円以上			20	589	0	0	0	0	4	98	0	0	
В	400万円未満			21	57	0	0	2	5	1	4	0	0	
ပ	130万円未満			13	12	2	2	1	-	2	2	0	0	
小計				0	0	2	2	3	9	7	45	0	0	
				2	62	ļ	10	-	2	0	0	0	0	
				-	31	-	73	0	0	-	80	0	0	
	0 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D				- 2,000.2月3米海 130万円未満 400万円以上 130万円未満 130万円未満 130万円未満 130万円未満	48 130万円未満 26 130万円水計 0 400万円以上 50 400万円未満 21 130万円未満 13 2 2 2 2 13 1 13 1 14 1	48 2/0 130万円未満 26 22 130万円未満 0 0 400万円以上 50 589 400万円未満 21 57 130万円未満 13 12 2 62 2 62 3 13	48 270 130万円未満 26 22 0 130万円未満 0 0 0 400万円未満 21 57 0 130万円未満 13 12 2 2 6 0 2 3 0 2 0 400万円未満 13 12 2 400万円未満 13 12 2 400万円未満 13 12 2 400万円未満 13 1 2	48 20 130万円未満 26 22 0 0 130万円未満 0 0 0 0 400万円以上 50 589 0 0 130万円未満 13 12 21 27 0 130万円未満 13 12 2 2 130万円未満 13 12 2 2 2 6 0 2 2 2 6 0 2 2 3 6 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1 1 1	48 200 130万円未満 26 22 0 0 0 130万円未満 0 0 0 0 0 400万円以上 50 589 0 0 0 130万円未満 13 12 2 1 130万円未満 13 0 0 0 0 2 62 1 1 1 1 3 64 2 2 2 400万円水井 50 0 0 0 0 5 5 5 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 <t< td=""><td>45000J17AcM 45000J17AcM 2/10 1 10 0<!--</td--><td>48 20 1 10 0<td>4,000.1743.mil 4,8 2,00 1 10 0</td><td>4.000.719X.ml 48 2.70 1 10 0 0 3 13 2 130万月X.ml 130万月X.ml 22 0</td></td></td></t<>	45000J17AcM 45000J17AcM 2/10 1 10 0 </td <td>48 20 1 10 0<td>4,000.1743.mil 4,8 2,00 1 10 0</td><td>4.000.719X.ml 48 2.70 1 10 0 0 3 13 2 130万月X.ml 130万月X.ml 22 0</td></td>	48 20 1 10 0 <td>4,000.1743.mil 4,8 2,00 1 10 0</td> <td>4.000.719X.ml 48 2.70 1 10 0 0 3 13 2 130万月X.ml 130万月X.ml 22 0</td>	4,000.1743.mil 4,8 2,00 1 10 0	4.000.719X.ml 48 2.70 1 10 0 0 3 13 2 130万月X.ml 130万月X.ml 22 0

4,084

2,107

5 6 6 0

 1,416

m

4,201

= 1,285

Ξ

安全施設 鋼構造物 0 0

> 1,357

_

金額

件数

金額

件数

金額

小学

1,571

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

その他

氰 ĮII

^{3,644} ※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

[※]件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発法など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計止する。

阿蘇市

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

[自治体名]												l				l												1	l			1
_								田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	1/20	件数	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
									_	金額	1,609	968	166	0	2,671	1,271	4	0	0	0	1,275	197	91	89	356	386	236	22	85	0	0	
									骨小	件数	31	61	85	0	177	4	2	0	0	0	9	10	14	59	53	2	12	-	2	0	0	
									羅	金額	254	289	35	0	578	0	0	0	0	0	0	09	23	-	84	39	107	0	7	0	0	
									第4四半期	件数	7	19	14	0	40	0	0	0	0	0	0	m	3	-	7	-	5	0	-	0	0	
								丰度	- 御	金額	423	243	43	0	402	423	0	0	0	0	423	98	56	16	128	0	83	0	74	0	0	!
								平成29年度	第3四半期	件数	9	17	13	0	36	-	0	0	0	0	-	4	5	7	16	0	2	0	m	0	0	
									 	金額	569	183	20	0	505	848	3	0	0	0	851	27	37	40	104	324	41	22	4	0	0	
									第2四半期	件数	4	14	27	0	45	3	-	0	0	0	4	-	2	18	24	m	m	-	-	0	0	
百万円	金額	6,399	5	729	51	7,670			半期	金額	699	181	38	0	882	0	-	0	0	0	-	24	2	=	40	23	32	0	0	0	0	
金額単位:百万円計	4数	318	m	86	13	577			第1四半期	件数	14	=	31	0	26	0	-	0	0	0	1	2	-	e	9	-	2	0	0	0	0	:
(m)	金額	1,491	5	165	0	1,756		中初%次	H H H H H H	金額	487	412	202	0	1,101	104	16	0	0	0	120	205	138	96	438	148	116	0	0	-	9	
その他省庁	件数	57	0	13	0	91		於 最 世 中 の で 社 か	SI+102201/1	件数	10	33	137	0	180	9	=	0	0	0	17	-	14	59	4	2	6	0	0	-	m	
資所管	金額	1,425	0	16	0	1,459				令																						
農林水産省所管	4数	113	0	m	0	120				左記発注等級価格帯区分		0万円未満											0万円未消									
省所管	金額	3,483	0	548	51	4,455		2000年4年日	5.1E.1IM/1EP170'9	左記発	3,000万円以上	500万円以上3,000万円未満	500万円未満			500万円以上	500万円未避					1,000万円以上	500万円以上1,000万円未満	500万円未離								
国土交通省所管	4数	148	0	82	13	366		R	ĸ	発注等級					小計						小計			0	小計							
(表-1)	五成20年中海市	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	수라	(表-2)			許可業種	土木一式 A	Ω	U		~	建築一式 A	Δ.		I		~	舗装A	ш		<u> </u>	恒規	橋梁補修	安全施設	鋼構造物	部刻	橅	2
**		-	#	F	#		(*)	L								3-	3)-2	28													L

3,780

5,466

,462

1,933

1,238

1,395

Ξ

1,316

金額

件数

金額

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

※発注件数、金額及び時期については、現段略の予定であるため今後可能性となることがある。

※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

その街

※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発法など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

天草市

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

											小計	金額	992	466	259	161	1,878	3,167	19	199	114	0	3,541	540	31	12	2						16	0	895	46					
												件数	33	99	29	94	259	5	6	19	29	0	26	45	12	8	99	2	-	5		2	4	0	80	6	10	72	80	7	
											半期	金額	0	ις	0	-	9	0	0	75	49	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											第4四半期	件数	0	-	0	1	2	0	0	89	8	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										年度	 	金額	527	246	95	73	938	196	45	80	46	0	367	171	3	3	177	32	4	10	46	49	0	0	322	37	12	371	43	18	
										平成29年度	第3四半期	件数	14	34	25	45	118	2	2	7	13	0	24	13	-	2	16	2	-	4	7	2	0	0	2	7	6	19	m	4	
											+期	金額	414	107	101	52	674	134	16	44	12	0	506	230	80	4	242	36	0	2	38	0	4	0	48	6	2	59	59	4	
											第2四半期	件数	16	15	25	27	83	2	-	4	9	0	13	13	Э.	3	19	-	0	-	2	0	-	0	m	2	-	. 9	m	~	
百万円		金額	5,808	331	271	8,579	44	15,033			(期	金額	51	108	99	35	260	2,837	0	0	7	0	2,844	139	20	5	164	21	0	0	21	0	12	0	525	0	0	525	917	6	
金額単位:百万円	ilia	件数	497	160	28	496	15	1,226			第1四半期	件数	3	15	17	21	95	1	0	0	2	0	3	19	89	3	30	2	0	0	2	0	6	0	2	0	0	2	2	2	
	计所管	金額	4,114	83	139	5,592	0	9,928		1	大 海 海 海 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高	金額	647	344	178	288	1,457	2,067	174	68	86	0	2,428	165	24	25	214	19	21	2	45	62	2	56	235	23	6	267	308	59	
	その他省庁所管	件数	506	6	51	162	0	428			平成28年度契約済	件数	21	52	20	224	347	4	80	80	48	0	89	56	6	20	55	2	4	2	00	9	9	3	6	4	21	34	6	9	
	9所管	金額	648	4	7	513	80	1,220				\$																													
	農林水産省所管	件数	53	14	2	39	cc	138				左記発注等級価格帯区分)万円未満	5.田未研				00万円未満	0万円未満					5円未満				海米田5							5.日未避				7円未満	
	對所管	金額	1,046	204	125	2,474	36	3,885		200 1111 111 111	米川田格明沼	左記発	1,100万円以上	500万円以上1,100万円未満	280万円以上500万円未満	280万円未満		3,000万円以上	1,500万円以上3,000万円未満	800万円以上1,500万円未満	800万円未満			330万円以上	200万円以上330万円未満	200万円未満		800万円以上	330万円以上800万円未消	330万田米渊					800万円以上	330万円以上800万円未消	330万円未辦		800万円以上	330万円以上800万円未満	
	国土交通省所管	件数	238	110	2	295	12	099		i i	然	発注等級					小計						小計				±.				小計										
(表-1)	子管別	E t	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	中世	(表-2)			許可業種	上木一式 A	Ω	U	Ω	₹	建築一式 A	<u>в</u>	O				舗装A	ω	O		■ 国 田 田 田	ω	υ		橋梁補修	安全施設	鋼構造物	電気A	ω	U	1	御	Ω	

5,234

 5,969

 ω

 1,130

1,222 1,327

1,460 1,942

> 1,226

15,033

3,335

金額

件数

金額

李

金額単位: 百万円

ilia

平成30年度以降

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

子算別	XX H HI	国土交通省所管	農林水産名所衙	40000000000000000000000000000000000000	そのも治庁	亡	ilia :										
# 1	# # !	金額	#	(明)	# # !	金额	一	金額									
平成28年度通常	49	299	2	9 !	46	2,553	97	3,129									
平成28年度災害	27	88	71	15	20	1,127	86	1,230									
平成28年度補止	0 :	0	0	0 ,	9 8	207	9 8	207									
平成29年度週帘平成29年度淡害	0	4443	4 0	<u>6</u> 0	1 23	1,033	1 68	74									
4	117	1,091	27	20	126	4,994	270	6,135									
(表-2)											五年30年中	24年					
		発注価格帯別			平成28年度契約済	复契約済	第1四半期	半期	第2四半期		第3四半期	3+校 - - -	第4四	第4四半期	44	1	
許可業種	発注等級	左記多	左記発注等級価格帯区分	₹分	件数	金額	件数	金額	4数	金額	件数	金額	4数	金額	年数	金額	
上木一式 A	A (H29)	2,200万円以上			0	0	0	0	-	28	22	210	0	0	9	238	
<u>α</u>	B (H29)	700万円以上2,200万円未避	00万円未消		0	0	-	13	4	62	4	19	0	0	6	136	
O	C (H29)	700万円未満			4	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	A (H28)	1,800万円以上			22	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⋖	A · B (H28)	1,500万円以上1,800万円未辦	800万円未消		45	402	-	13	8	103	12	284	0	0	21	400	
<u> </u>	B (H28)	700万円以上1,500万円未辦	00万円未満		c	1,781	-	362	0	0	-	155	0	0	2	517	
ш	B · C (H28)	500万円以上700万円未満	万円未満		4	25	2	171	-	74	0	0	0	0	6	245	
O	C (H28)	500万円未満			22	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
÷	小計				45	402	1	13	8	103	12	284	0	0	21	400	
建築一式 A	A 1	1億3,200万円以上			m	1,781	-	362	0	0	-	155	0	0	2	517	
⋖	A 2	5,500万円以上1,	5,500万円以上1億3,200万円未満	75	-	64	2	171	-	74	0	0	0	0	cc	245	
Ω		2,750万円以上5,500万円未満	500万円未辦		c	112	-	31	0	0	2	83	0	0	6	114	
ပ		1,100万円以上2,750万円未満	750万円未満		6	188	2	49	0	0	2	44	0	0	4	93	
		1,100万円未満			22	49	-	7	-	4	0	0	0	0	2	11	
1	小計				38	2,194	7	620	2	78	5	282	0	0	14	086	
舗装	A (H29)	1,000万円以上			0	0	7	103	-	15	m	58	0	0	11	176	
<u>m</u> [600万円以上1,000万円未辦	00万円未消		0	0	2	17	-	7	m	22	0	0	9	46	
ပ		600万円未辦			18	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
∢	A (H28)	1,200万円以上			47	359	16	150	∞	14	00	888	0	0	32	279	
∢	A·B (H28)	1,000万円以上1,200万円未満	200万円未満		9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ш	B (H28)	600万円以上1,000万円未辦	00万円未満		0	0	0	0	0	0	-	6	0	0	-	6	
ш	B· C (H28)	500万円以上600万円未消	万円未消		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O	C (H28)	500万円未消			18	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
\(\frac{1}{2}\)	小計				47	359	16	150	8	41	80	88	0	0	32	279	
					9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
橋楽補参					0	0	0	0	0	0	-	6	0	0	-	6	
安全施設					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
鋼構造物					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L
電気					-	385	2	29	-	31	2	325	0	0	5	385	<u> </u>
和					6	285	-	80	0	0	-	70	0	0	2	78	
その他					37	365	-	-	0	0	-	10	0	0	2	11	
		44			193	3,993	28	821	19	253	30	1,068	0	0	77	2,142	$oxed{oxed}$

2,298

 2,298

金額

4数

金額

金額単位:百万円

ilia

平成30年度以降

3,174

-

6,135

=

 美里町

自治体名】

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

件数

金額

件数

1,072

202

金額 1,567 641

46

19

20

622

384

3,902

699

0 0 0 0

117

19

9

0

129

45 5

0 0

0 0

235

56

0

0 0

187

13

15

0 0 0 0

0 0

388 388 984

111

350

20

0

0

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

										第4四半期 小計	金額 件数	24 60 24	4 57 29	3 22 116	3 29 182	2 168 351	0 6	0 0 (0 0 (0 0 0	0 0 0	0 0 5	0 0	0 0 2	0 0 0	0 0	0 2	0 0	2 1	0 0 (0 0	3 10 32	0 0
										搬	件数	2	4	m	23	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	8	
									9年度	半期	金額	449	06	154	111	804	4	0	0	0	0	4	54	18	0	72	12	36	0	0	2	7	2.5
									平成29年度	第3四半期	件数	11	9	30	74	121	-	0	0	0	0	1	2	1	0	3	2	1	0	0	-	9	ć.
										第2四半期	金額	208	157	241	116	722	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
										第2四	件数	5	11	43	64	123	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	î
	金額	1,170	3,982	0	909	84	5,841				金額	363	96	204	30	669	4	0	0	0	0	4	28	12	0	40	0	0	0	0	0	25	
ilia	件数	124	948	0	06	28	1,190			第1四半期	# 禁	9	80	40	21	75	2	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	6	
丁所管	金額	470	1,108	0	133	0	1,711		40.19	兵 英家张	金額	467	222	442	331	1,462	16	111	7	0	0	509	47	15	13	0	0	0	7	0	98	334	
その他省庁所管	件数	62	368	0	99	0	512		1	牛成28年長栗約万	件数	12	16	85	199	312	41	9	-	0	0	21	2	1	5	0	0	0	2	0	14	62	
当所管	金額	96	1,022	0	69	84	1,271				少.																						
農林水産省所管	件数	12	342	0	4	28	386				左記発注等級価格帯区分		100万円未満	0万円未満										100万円未満									
省所管	金額	604	1,852	0	403	0	2,859		一世の世の大人	充注[固格帝列	左記発	2,000万円以上	1,000万円以上2,000万円未満	300万円以上1,000万円未満	300万円未満								2,000万円以上	1,000万円以上2,000万円未満	1,000万円未満								1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
国土交通省所管	件数	33	238	0	21	0	292		8	K	発圧等級	A 2				小計	即內建築	町外建築	即內外建築			小計	A 2			사람							
	↑ 算別 —	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	수計	(表-2)			許可業種	土木一式	8	U	۵	,	産業一式 田	##4	_==			,	舗装	8	U	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	用紙	橋梁補修	安全施設	鋼構造物	阿河	和	3 6

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

※・アルン・アスペインのコーチェンで、ロース・スペーンで、 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発法など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。 玉東町

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

	田十分	医十分溢物层物	甲林水肝必定御	北外岸御	クラの名が下げ物	中に出	ili		_							
子算別	4 数件	金和川昌	麻酔が置	金額	イ数	金額	4数	金額								
平成28年度通常	19	164	0	0	0	0	19	164								
平成28年度災害	10	17	14	18	19	37	38	72								
平成28年度補正	-	15	4	45	0	0	2	09								
平成29年度通常	33	215	e	5	6	259	45	479								
平成29年度災害	0	0	0	0	34	88	34	88								
수計	58	411	21	89	62	384	141	863								
(表-2)																
		E#47.E%			1	40.00					平成2	平成29年度				
		充注[画伶帝別			牛灰28年長栗約万	在 经	第1四半期	半期	第26	第2四半期	第3四	第3四半期	第4四半期	100	4年小	土
許可業種	発圧等級	左記多	左記発注等級価格帯区分	区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	4数	金額	件数	金額
上木一共	A 1	7,000万円以上			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	,000万円未満		-	19	0	0	-	16	0	0	0	0	-	16
	В	500万円以上1,500万円未満	00万円未満		9	48	-	7	2	21	9	09	e	43	12	131
	U	500万円未満			22	37	3	9	-	2	14	40	0	0	18	48
	小計				59	104	4	13	4	39	20	100	3	43	31	195
3-	A 1	1億3,200万円以上	ᅬ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	億3,200万円未決	握	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ш	2,750万円以上5,500万円未満	,500万円未辦		m	89	0	0	-	28	-	36	4	176	9	240
32	U	1,100万円以上2,750万円未満	,750万円未満		0	0	-	26	-	19	2	35	0	0	4	80
	۵	1,100万円未満			0	0	0	0	-	4	2	10	0	0	cc	14
	小計				3	89	1	56	3	51	2	18	4	176	13	334
舗装	¥	1,100万円以上			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ω	330万円以上1,100万円未辦	00万円未消		2	=	0	0	-	9	2	7	-	10	4	23
	O	330万円未辦			0	0	L	2	0	0	0	0	0	0	-	2
	小哥				0	0	-	2	_	9	2	7	-	10	2	25
恒採					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
極梁補修					3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全施設					2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鋼構造物					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
師べ					-	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その街					19	37	11	20	=	19	11	23	0	0	33	62
		1111			57	236	17	61	19	115	38	211	00	220	82	616

80 14 402

 金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

金額

件数

金額

件数

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

南関町

自治体名】

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

 金額

件数

金額

件数

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

																																		L
										+	金額	408	112	10	0	530	93	99	22	0	0	180	13	0	0	13	-	13	-	0	30	12	37	017
										小計	件数	22	17	2	0	44	-	2	4	0	0	7	3	0	0	6	-	2	-	0	4	2	18	00
										無	金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c
										第4四半期	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c
									:度	羅	金額	Ξ	6	4	0	24	93	0	19	0	0	112	6	0	0	6	-	6	0	0	0	0	7	167
									平成29年度	第3四半期	件数	-	-	2	0	4	-	0	-	0	0	2	2	0	0	2	-	-	0	0	0	0	3	10
										米	金額	205	51	-	0	257	0	99	0	0	0	99	4	0	0	4	0	4	-	0	6	12	6	361
										第2四半期	件数	7	6	-	0	17	0	2	0	0	0	2	-	0	0	-	0	-	-	0	2	2	7	00
	金額	452	535	0	586	0	1,573			- ##	金額	192	52	5	0	249	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21	NOC.
ilia	件数	7.5	95	0	63	0	233			第1四半期	件数	14	7	2	0	23	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	90
宁 所管	金額	127	89	0	121	0	256			1	金額	183	182	102	0	467	0	0	6	0	0	6	55	0	0	55	0	13	-	0	0	09	151	756
その他省庁所管	件数	37	3	0	19	0	59			半成28年度契約済	件数	12	34	99	0	102	0	0	4	0	0	4	9	0	0	9	0	-	-	0	0	9	31	151
省所管	金額	0	278	0	96	0	373				€3																							
農林水産省所管	件数	0	24	0	4	0	28				左記発注等級価格帯区分		00万円未満					超半田丘000																
省所管	金額	325	249	0	370	0	944			光江自格市河	左記条	1,000万円以上	300万円以上1,000万円未満	300万円未満			5,000万円以上	2,500万円以上5,000万円未消	2,500万円未満				等級なし											#4
国土交通省所管	件数	38	89	0	40	0	146			**	発注等級	A	3	C		小計	A 5	B 2	C			小計	A	В	O	小計								
出泉发	57#	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	神	(0 +)	(7_%		許可業種	上木一共		<u>. </u>		S	建築一式 /					×'	舗装			S'		橋梁補修	安全施設	鋼構造物	巡	钷	その他	

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

長洲町

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

 金額

件数

金額

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

14	1987年 1982
1987 1987	
(2)	1975 1975
1	1971
1	148
148 448 458	1
特別	特別
1982 1985	1915 1915
1982 1985	1915 1915
#1029年版 第2020年版 3	(2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
 (本) 10 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	(2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
第3四半期 第3四半期 金額	### 第4四半期 (本報
第4四半期 55	(2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
第4四半期 金額 00000000000000000000000000000000000	第4四半順 金額 件数 金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(金)	金額 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
	から 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[※]発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

[※]件数は入札手続きの件数とし、合用入札を行う場合は、合用工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合用入札や分離発法など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。 ※土木一式以外の業種には独自の価格帯区分なし

和水町

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

1,117

金額

件数

金額

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

Public State Sta										1	Ħ N															Ш	L							
Part										1	+19230	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.000 147.000 147.0												金額	205	569	41	0	515	0	162	13	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	10	7	98	54
14 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14											4年小	件数	7	04	31	0	78	0	5	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	2	39	9
14 12 - 12 13 14 15 15 14 15 15 15 15												金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
14											第4四半期	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
													73	72	20	0	165	0	11	7	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	10	9	80	22
11日文語析形										平成29年度	第3四半期		e	12	16	0	31	0	-	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	-	2	n
1													66	80	4	0	111	0	48	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	-	7	13
											第2四半期		e	2	m	0	80	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	80	2
1		金額	528	417	312	535	31	1,823					33	189	17	0	239	0	103	9	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0
(中央	ilia		84	94	19	86	16	311			第1四半期		-	26	12	0	39	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0
(中央数 本級			161	154	193	176	0	684					158	362	82	0	602	0	40	9	0	0	46	47	0	0	47	0	0	0	0	4	40	237
(中級) 金額 (特数 金額 (4数 (4数 (4数 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4	他省庁所管	金額					0			4 th th	8年医米約済	州				0		0	5	5	0	0	4	2	0	0		0	0	0	0		_	
(4数 金額 244 金額 44数 金額 44数 金額 44数 44数 44数 44数 44数 44数 44数 44数 44数 44	40	件数	.33			5		10		î Î	+ 126.2	件数		9	.9		13.						•										5.	-
100万円以上 100万円以上 100万円以上 100万円以上 1000万円以上	省所管	金額	9	52	43	31	00	140				≤分																						
国土交通舎所令	農林水産	件数	2	36	2	7	9	95				%注等級価格帯[00万円未満					6,000万円未満						100万円未消									
画土 交換	省所管	金額	361	211	9/	328	23	666		日報発見り	江何春帝別	左記発	,000万円以上	00万円以上2,00	00万未満			,000万円以上	,000万円以上~	,000万円未満				,100万円以上	30万円以上~1,	30万円未満								
	国土交通	年数	45	53	2	37	10	150		8	民	発注等級					声			1			丰				古							
【 " 【 집 [집 [집 [집]]]	外	I Git	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	40	(表-2)			許可業種	上木一式 A	1 80	LO		7	建築一式 A	ω.	O		I	~	舗装A		LU	7	囲揺	看梁補修	安全施設	鋼構造物	部	柳	その名

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

1,823

大津町

[自治体名]

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

1,567

 金額

件数

件数

金額

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

											km,	399	79	83	78	37	10	989	0	58	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	,
										小計	金額																								
										7	件数	20	5	21	59	25	11	111	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	•
										難	金額	49	9	0	10	9	4	75	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										第4四半期	件数	2	-	0	9	2	3	14	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									逐	崩	金額	98	20	33	36	15	-	191	0	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,
									平成29年度	第3四半期	件数	m	-	89	7	6	2	30	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
										(#)	金額	126	49	19	13	6	3	219	0	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	,
										第2四半期	件数	2	2	e	9	9	3	25	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	,
	金額	626	950	55	313	207	2,484			上期	金額	138	4	31	19	7	2	201	0	en	0	0	0	m	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	
ilia	件数	59	144	2	42	52	599			第1四半期	件数	10	-	10	10	8	3	42	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
于所管	金額	182	358	0	35	4	625		age 770 major		金額	605	103	153	38	15	16	834	728	200	0	0	0	608	12	m	0	0	0	0	0	0	36	10	
その他省庁所管	件数	28	32	0	16	2	78		1	平成28年度契約済	件数	30	12	19	15	13	18	107	12	24	0	0	0	36	9	6	0	0	0	0	0	0	10	-	r
 斯管	金額	0	126	0	2	191	319				令		~600万円未満)	~400万円未満)	~200万円未満)	-100万円未潰)																			
農林水産省所管	件数	0	59	0	c	45	77				左記発注等級価格帯区分	100万円以上)	H未満 (400万円以上	· · · · · · · · · · · · · ·	· - - - - - - - - - - - - -	I未満(40万円以上~	万円未消)																		
当所管	金額	777	466	55	276	12	1,586		1044	光江首格市沿	左記発	2,000万円以上 (400万円以上)	2,000万円以上~3,000万円未満(400万円以上~600万円未満)	500万円以上~2,000万円未滑(100万円以上~400万円未渤)	500万円以上~1,000万円未満(100万円以上~200万円未満)	300万円以上~500万円未満(40万円以上~100万円未潢)	300万円未満 (40万円未満)		1,000万円以上	1,000万円未満					500万円以上	500万円未満									
国土交通省所管	件数	31	83	2	23	5	144		1	Ж.	発注等級		A · B 2,0		B · C 50		C. D 30	小計	A· B 1,	C. D 1,				小計	A· B 5(C. D 50		小計							
子田田	1. M. M. J.	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	中計	(表-2)			許可業種	土木一式 A	◀	8	8	U	U		建築一式	ΙÚ				<u> </u>	舗装	<u> </u>			洪画	橋梁補修	安全施設	鋼構造物	電気	和	7 0 1/1

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

2,484

-

※平成30年度以降の通常事業分は含まない。 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

菊陽町

[自治体名]

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

金額

件数

金額

件数

金額

526 295

302

1,412

 ∞

205,1

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

											#																							
										半期	金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										第4四半期	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									4年度	半期	金額	74	20	80	5	137	0	0	69	15	9	06	0	0	4	4	0	0	0	0	56	24	55	336
									平成29年度	第3四半期	件数	2	6	-	2	8	0	0	2	-	-	4	0	0	2	2	0	0	0	0	-	2	2	19
										半期	金額	123	35	15	0	173	177	190	127	0	0	464	0	7	0	7	0	0	0	0	0	79	6	762
										第2四半期	件数	2	2	2	0	9	-	2	en en	0	0	9	0	-	0	-	0	0	0	0	0	4	-	18
: 百万円	金額	877	693	555	943	0	3,038			半期	金額	96	81	0	4	180	0	0	106	51	0	157	0	2	-	9	0	0	0	0	21	45	0	409
金額単位:百万円計	件数	65	58	12	40	0	169			第1四半期	件数	e	4	0	1	8	0	0	m	2	0	2	0	-	-	2	0	0	0	0	2	2	0	19
の他省庁所管	金額	303	250	276	595	0	1,694		40.7%	医紫翘苯	金額	196	180	55	34	465	0	118	224	229	100	671	79	38	24	141	0	0	0	12	20	166	95	1,531
その他省	件数	15	36	9	20	0	77		1	半成28年度契約済	件数	4	10	∞	6	31	0	-	7	12	19	39	5	5	6	19	0	0	0	-	4	6	10	113
省所管	金額	9	44	0	136	0	186				区分		00万円以上)					出田						未辦(500万円以上)										
農林水産省所管	件数	3	89	0	S	0	16				左記発注等級価格帯区分	(3,000万円以上	00万円未端 (1,0	(500万円以上)	500万円未満)		ᅫ	億3,200万円未消	,500万円未辦	,750万円未満			(1,000万円以上)	00万円未消 (50	500万円未満)									
省所管	金額	268	69	279	242	0	1,158		1004440	発圧信格帯別	左記	1,000万円以上 (3,000万円以上)	500万円以上3,000万円未満 (1,000万円以上)	1,000万円未満 (500万円	500万円未満(500万円未満)		1億3,200万円以上	5,500万円以上1億3,200万円未満	2,750万円以上5,500万円未満	1,100万円以上2,750万円未満	1,100万円未満		500万円以上 (1,000万円	300万円以上1,000万円	500万円未満 (500万円未満)									卓
国土交通省所管	件数	41	14	9	15	0	92		6	ND.	発注等級	A	ω	O	j 0	小計	A 1 (町なし) 1	A 2 (町なし)	B (町なし)	C (町なし) 1	D (町なし) 1	小計	A	m	0	小計	町なし	町なし	町なし	町なし	町なし	町なし	町なし	
(表-1)	丁异州	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	中計	(表-2)			許可業種	上木一式		•			建築一式				•		舗装				展報	橋梁補修	安全施設	鋼構造物	例	和	そのも	
~ <u>L</u>		त	न	न	l et	Į PŤ					<u> </u>						3-	-(3)–(37												<u> </u>		

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

南小国町

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

										金額 件数	314	22	30	0	366	210	0	0	0	0	210	107	0	0	107	0	0	0	0	37	2	390
									小計	件数	13	80	18	0	39	2	0	0	0	0	2	5	0	0	2	0	0	0	0	-	-	9
									fit	金額	115	8	24	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O
									第4四半期	件数	7	e	12	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
								丰度	₹前	金額	20	0	-	0	21	20	0	0	0	0	50	29	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0
								平成29年度	第3四半期	件数	-	0	2	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
									半期	金額	173	14	5	0	192	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	0	0	0	0	37	2	888
									第2四半期	件数	2	5	4	0	14	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	-	-	ď
	金額	538	218	896	542	2,266			半期	金額	9	0	0	0	9	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
市	件数	71	0	32	138	272			第1四半期	件数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		_	0 0	556	0	756				金額	328	91	38	0	457	57	0	0	0	0	57	91	0	0	0	0	0	0	0	14	45	20
15所管 計	金額	200				7		主契約洛	K K	Al-I																		H		1		
その他省庁所管	件数金額		0 0	7	0	28 7		平成28年度超%%	H/(5/4/X/X/H/07X/)		15	27	32	0	74	3	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	-	80	10
その他省庁所管		21	0 0 0		198 0			が と		件数	15	27	32	0	74	3	0	0	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	-	00	10
	件数	17 21				28	,	平成28年度契約落		件数			32	0	74	3	0	0	0	0	m	9	0	0	0	0	0	0	0	-	σ	100
農林水産省所管	金額 件数	6 17 21	95	60 209	198	480 28				記発注等級価格帯区分件数		250万以上500万未潜 27	250万未満 32	0	74	ランクなし 3	0	0	0	0	8	ランクなし 6	0	0	0	0	0	0	0	-	00	10
その他省庁所管	件数 金額 件数	321 6 17 21	0 0	203 6 209	91 198	121 480 28	,	多法面的 20 年度 20 多级		記発注等級価格帯区分件数				0	小計 74		0	0	0		小計 3		0	0	0 HBV	0	0	0	0	-	8	01

1,218

Ξ

Ξ

 2,266

件数

金額

金額単位:百万円

qha

[※]発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

[※]平成30年度以降の通常事業分は合まない。 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

農林水産省所管 その他省庁所管 件数 金額 件数 金額 作	本水産省所管 その他省庁所管 金額 件数	その他省庁所管 額 件数	の他省庁所管金額	※		[]	5日 金額								_	【自治体名】		小国町	
			18	9 (48	55	332												
	0 0 0	0	0	0	0	8/ 0	316												
1	10 194	7	57	-	10	18	261												
	3 7	0	0	0	0	3	7												
	104 920	43	138	7	58	154	1,116												
																		金額	金額単位:百万円
	10111141141			1	19					平成2	平成29年度					1	401.11	q	
	発汗価格帯別			平成28年展契約済		第1四半期		第2匹	第2四半期	第3匹	第3四半期	第4四半期	自	小計		平成30年度以降	がなる	tha	
発注等級		左記発注等級価格帯区分	×分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	7,000万円以上			m	95	4	142	0	0	_	46	0	0	5	188	0	0	80	283
	1,500万円以上	1,500万円以上7,000万円未満		6	242	2	31	0	0	0	0	0	0	2	31	0	0	11	273
	500万円以上1,500万円未満	,500万円未満		55	192	-	13	0	0	9	11	0	0	7	24	0	0	62	216
	500万円未満			51	137	2	4	0	0	2	5	-	2	5	11	0	0	99	148
14計				118	999	6	190	0	0	6	62	1	2	19	254	0	0	137	920
	1億3,200万円以上	以上		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5,500万円以上	5,500万円以上1億3,200万円未満	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,750万円以上	2,750万円以上5,500万円未満		2	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	81
	1,100万円以上	1,100万円以上2,750万円未満		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,100万用米辦	ale a		-	2	2	7	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	m	6
十計小				3	83	2	7	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	06
	1,100万円以上			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	330万円以上1,100万円未満	,100万円未満		-	10	-	10	0	0	0	0	0	0	-	10	0	0	2	20
	330万円未満			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
业业				0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	2	20
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
				2	43	0	0	3	35	0	0	0	0	e	35	0	0	8	78
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4-			128	800	12	207	e	35	6	62	-	2	25	306	0	0	154	1,116

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。 ※件数は入札手続きの件数とし、台冊入札を行う場合は、台冊工事の予定価格の合計機に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

産山村

自治体名】

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

金額

件数

金額

件数

 7.5

 熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

国土交通省所管	予算別 件数	平成28年度通常	平成28年度災害 73	平成28年度補正 0	平成29年度通常 5	平成29年度災害 0	수計 80		(表-2)	発送	許可業種 発注等級	土木一式 A 1 7,00	A 2 1,50	B 5007	C 5007	小計	建築一式 A 1 1億3	A 2 5,50	B 2,75	C 1,10	D 1,10	小計	舗装 A 1,10	B 3307	C 3307	48小	洪画	橋梁補修	安全施設	鋼構造物	副	和	
所管	金額	24	322	0	45	0	391			発注価格帯別	左記発法	7,000万円以上	1,500万円以上7,000万円未満	500万円以上1,500万円未満	500万円未満		1億3,200万円以上	5,500万円以上1億3,200万円未満	2,750万円以上5,500万円未満	1,100万円以上2,750万円未満	1,100万円未満		1,100万円以上	330万円以上1,100万円未満	330万円未満								
農林水産省所管	件数	0	55	0	2	0	22				左記発注等級価格帯区分		00万円未満)万円未満				3,200万円未滞	00万円未済	50万円未満)万円未満									
省所管	金額	0	213	0	4	0	217				至分							450															-
その他	件数	0	0	0	ec .	0	3			平成28年	件数	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	5	12	24	14	0	0	0	0	0	0	
その他省庁所管	金額	0	0	0	239	0	239			平成28年度契約済	金額	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	75	84	46	205	0	0	0	0	0	0	_
.,,	件数	2	128	0	10	0	140			第12	件数	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	-	0	0	0	0	0	
ilia	金額	24	535	0	288	0	847			第1四半期	金	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	4	0	0	0	0	0	
	 							Ì		第25	牛数	0	0	2	34	36	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	
										第2四半期	金額	0	0	25	144	169	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	
									1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第31	件数	0	0	10	0	10	0	0	2	0	0	2	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	
									平成29年度	第3四半期	金額	0	0	19	0	19	0	0	25	0	0	25	0	99	0	99	0	0	0	0	0	0	_
										第44	件数	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										第4四半期	金額	0	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											件数	0	0	17	40	57	0	0	2	0	0	2	0	37	0	37	-	0	0	0	0	0	
										小計	金額													136		136							

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

高森町

自治体名】

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

件数

金額

件数

金額

1,007

 熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

金额単位:百万円	その他省庁所管計	件数金額件数金額	0 0 12 156	2 128 44 371	0 0 1 100	0 0 16 577	0 0 5 13	2 128 78 1,217			平成28年度契約済 第1四半期 第2四半期	全額 件数	2 146 0 0 0 0 0 0	8 170 0 0 0 0 0	14 82 0 0 3 15	28 51 3 5 2 3	52 449 3 5 5 18	0 0 0 0 0	1 93 0 0 0 0	1 35 0 0 0 0 0	1 14 1 16 0 0	1 9 0 0 1 6	4 151 1 16 1 6	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	1 27 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4
(表-1)	マニニ 国土交通省所管 農林水産省所管	予算別 企額 件数 金額 件	平成28年度通常 12 156 0 0 0	平成28年度災害 33 232 9 11	平成28年度補正 1 100 0 0 0	平成29年度通常 15 561 1 16	平成29年度災害 4 11 1 2	合計 65 1,060 11 29	-	(表-2)	発注価格带別		A 1 5,500万円以上	A 2 1,100万円以上5,500万円未満	330万円以上1,100万円未満	C 330万円未満	小哨	建築一式 A 1 1億3,200万円以上	A 2 5,500万円以上1億3,200万円未辦	B 2,750万円以上5,500万円未辦	C 1,100万円以上2,750万円未満	D 1,100万円未満	사람·	舗装 A 1,100万円以上	B 330万円以上1,100万円未離	C 330万円未満	사람	法面	橋梁補修	安全施設	鋼構造物	1分	Apple

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

西原村

自治体名】

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	特数 金額 2.299 2.299 2.298 2.398 2.	特数 金額 250	特数
<u> </u>	第2日本期 第3日本期 第3日本期 第3日本期 第3日本期 第3日本期 1 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	第2日平期 第2日平期 第3日平期 1 全額 1 49 0 0 0 8 69 2 16 8 69 2 16 9 78 4 8 8 69 24 1 65 0 0 0 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	平成29年度 金額 年数 第4四半期 金額 年数 第4回半期 2 37 0 0 8 69 2 16 0 0 8 69 2 16 0 0 9 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<
	平成29年度 第3四半期 49 件数 69 2 2 69 2 2 69 2 2 69 2 2 69 0	平成29年度 第3四半期 件数 49 企額 件数 53 0 0 0 69 2 16 0 78 4 8 8 78 4 8 8 0 1 65 41 0 1 6 41 0 1 9 6 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	平成29年度 第4四半期 49 企額 件数 金額 59 2 16 0 69 24 0 0 0 1 65 0 0 1 65 0 0 1 9 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,974

金額

件数

金額

件数

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

南阿蘇村

[自治体名]

金額単位: 百万円

219

38

2,882

136

96 11 119 110

4

19

398

09

15

17

459

36

15

154

0

0

0 0

0 2

0 0 0 0

225

383

283

1,153

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

丰

平成30年度以降

193

1,637 620 371 254

09

5

42 80 1161 315

207

108

20 20 0 0 0 0

444

38

186

16

219

0 2 5

1,487

432

1,055

504

0 0

894

116

726

1,541

22

5,116

702

60

357

29

154

959

0

11

26

0

0 88 88

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 2 2 8

0 0 0 0 250 250

0 0 0 8

0 0 0

0 0

橋梁補修 安全施設 鋼構造物

0

33

10

15

27

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

											第4四半期	金	2	8	30	71	1	1	4	-	0	0	9	0	0	0	0	4	L
											1 1995	件数			3	7	111												
										年度	半期	金額	124	179	80	57	440	0	40	3	0	0	43	9	0	0	9	410	
										平成29年度	第3四半期	件数	4	12	17	30	63	0	3	1	0	0	4	1	0	0	1	2	
											米類	金額	711	592	151	95	1,219	0	18	0	0	0	18	138	4	0	142	141	
											第2四半期	件数	14	17	32	09	123	0	1	0	0	0	1	7	-	0	8	4	
: 百万円		金額	316	7,298	152	306	46	8,118			米期	金額	742	79	4	0	825	26	0	0	0	0	95	71	0	0	71	0	
金額単位:百万円	#	件数	82	603	9	31	4	726			第1四半期	件数	12	5	1	0	18	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	
	1.斤所管	金額	112	1,086	151	229	0	1,578		外がは世	医米割饼	金額	444	340	68	109	985	123	61	50	0	0	234	8	26	5	39	0	
	その他省庁所管	件数	18	117	5	27	0	167		からなれた	十7%26年及关料并	件数	1	23	19	113	166	2	6	13	0	0	24	1	7	4	12	0	
	省所管	金額	20	867	0	0	0	887				≤分																	
	農林水産省所管	件数	3	252	0	0	0	255				左記発注等級価格帯区分		以上2,500万円未満	以上700万円未満				马以3,000万円未満						以上700万円未消				
•	省所管	金額	184	5,345	-	77	46	5,653		百年华世 火	死在加格市が	左記多	2,500万円以上	700万円以上2,50	300万円以上700	300万円未満		3,000万円以上	1,000万円以3,00	1,000万円未満				700万円以上	200万円以上700	200万円未満			
	国土交通省所管	件数	19	234	-	4	4	304		6	Б.	発注等級	A	A · B	B. C	C · D	小計	A	A · B	B. C			小計	A	A · B	B. C	小計		
(表-1)	光色图	J. #4.03	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	合計	(表-2)			許可業種	土木一式	, ,		. •		建築一式						舗装				法面・とび	
ı									1	_								3-	3)—4	13								

| 会計 | 261 | 1,461 | 1,461 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

※光江円数、亜色(XO 時期については、発収階のデたる米平成30年度以降の通常事業分は含まない。

その他

骶 御

御船町

【自治体名】

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

								9年度	半期	金額	2,000	0	365	0	2,365	0	0	
								平成29年度	第3四半期	件数	5	0	366	0	371	0	0	
										金額	0	415	744	35	1,194	244	0	
									第2四半期	件数	0	18	108	14	140	-	0	
	金額	95	8,952	0	35	36	620'6		半期	金額	176	166	222	56	290	0	0	
ilia	件数	4	1,116	0	2	14	1,136		第1四半期	件数	2	9	63	11	82	0	0	
广所管	金額	49	664	0	35	0	748	40,77	2 条刻游	金額	78	434	448	157	1,117	0	0	
その他省庁所管	件数	2	136	0	2	0	140	1	半规28年度买剡净	件数	-	23	51	62	137	0	0	
当所管	金額	0	1,258	0	0	19	1,277			\$2								
農林水産省所管	件数	0	529	0	0	80	537			左記発注等級価格帯区分		000万円未満	0万円未満			T.	意3,200万円未消	
(省所管	金額	7	7,030	0	0	17	7,054	10 mm (c)	光江信格市別	左記条	7,000万円以上	1,500万円以上7,000万円未満	500万円以上1,500万円未満	500万円未満		1億3,200万円以上	5,500万円以上1億3,200万円未満	
国土交通省所管	件数	2	451	0	0	9	459		₩.	発注等級	A 1	A 2			小計	A 1	A 2 5	
N N	EV It	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	40			許可業種	土木一式	Ĭ <u>«</u>	8	<u> </u>	7	建築一式	Ĭ _¶	L

検数 (20年20	0年度								
上のの方子母後の (中級) 金銭 有数 金銭 有数	発注価格帯別	発活価格辯	881	平成28年,	度契約済	第1四		第2四字	半期	平成2 第3四	半期	第4四半	# #	4小	+	平成30年度以降	度以降	da	
1 7 7 17 6 10 6 6 6 6 6 7	発注等級 左記	左記	発注等級価格帯区分	件数	金額	牛数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
LYANONTHANN CASE 448 6 16 415 6 416 415 6 416 6 416 6 416 6 416	A 1 7,000万円以上	7,000万用以	4	-	78	2	176	0	0	5	2,000	0	0	7	2,176	0	0	∞	2,254
1,500万円未満 51 446 63 222 108 744 366 365 365 365 365 365 365 11 448 150 12 448 749 365 60 12 60 11 52 149 371 2.05 149 371 2.05 149 371 2.05 145 371 2.05 145 371 2.05 145 371 2.05 145 371 2.05 145 371 2.05 145 371 2.05 145 371 2.05 145 371 2.05 145 371 2.05 145 371 2.05 371 372	A 2 1,500万円以	1,500万円以	〈上7,000万円未満	23	434	9	166	18	415	0	0	0	0	24	581	0	0	47	1,015
(143 日	8 500万円以	500万円以	上1,500万円未満	51	448	63	222	108	744	366	365	9	17	543	1,348	148	277	742	2,073
4.1 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 6.3 7.1 <td>C 500万円未満</td> <td>500万円未</td> <td>無.</td> <td>62</td> <td>157</td> <td>11</td> <td>56</td> <td>14</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>120</td> <td>200</td> <td>145</td> <td>261</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>207</td> <td>418</td>	C 500万円未満	500万円未	無.	62	157	11	56	14	35	0	0	120	200	145	261	0	0	207	418
(1) (1) <td>사람 사람</td> <td></td> <td></td> <td>137</td> <td>1,117</td> <td>82</td> <td>290</td> <td>140</td> <td>1,194</td> <td>371</td> <td>2,365</td> <td>126</td> <td>217</td> <td>719</td> <td>4,366</td> <td>148</td> <td>277</td> <td>1,004</td> <td>2,760</td>	사람 사람			137	1,117	82	290	140	1,194	371	2,365	126	217	719	4,366	148	277	1,004	2,760
0 0	A 1 1億3,200	1億3,200	億3,200万円以上	0	0	0	0	-	244	0	0	0	0	-	244	0	0	-	244
(1) (25)	A 2 5,500万	5,500万	5,500万円以上1億3,200万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1 2 1 0	B 2,750万	2,750万	2,750万円以上5,500万円未辦	7	253	0	0	0	0	5	138	-	34	9	172	0	0	13	425
4 5 11 2 10 0 2 12 0 2 14 363 15 16 14 244 9 185 6 110 11 18 19 11 11 11 11 14 4 6 11	C 1,100万	1,100万	円以上2,750万円未満	5	66	0	0	0	0	2	39	4	73	9	112	0	0	1	211
4 363 2 10 11 244 9 185 6 110 118 119 118 119 118 11 114 4 67 0 <td>D 1,100万円未避</td> <td>1,100万</td> <td>無米田</td> <td>2</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>80</td> <td>-</td> <td>m</td> <td>2</td> <td>21</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>32</td>	D 1,100万円未避	1,100万	無米田	2	11	2	10	0	0	2	80	-	m	2	21	0	0	7	32
4 4 4 6 6 7 4 4 6 6 6 6 7 7 8 7 8 7 8 9	사람			14	363	2	10	-	244	6	185	9	110	18	549	0	0	32	912
4 32 6 23 6 6 23 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6 7	A 1,1007	1,1007	1,100万円以上	9	138	0	0	-	14	4	29	0	0	5	81	0	0	11	219
26 66 67 68 69<	B 330万	330万月	330万円以上1,100万円未満	4	32	0	0	9	23	0	0	0	0	9	23	0	0	10	55
34 187 0 0 44 64 67 0 15 <td>C 330万円未満</td> <td>330万F</td> <td>9未満</td> <td>56</td> <td>99</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>72</td>	C 330万円未満	330万F	9未満	56	99	0	0	4	9	0	0	0	0	4	9	0	0	30	72
40 0 0 40 1,500 0 40 1,500 0 40 1,1 40 1	사람수			34	187	0	0	11	43	4	29	0	0	15	110	0	0	51	346
Mode of the control of the c				0	0	0	0	0	0	40	1,500	0	0	40	1,500	0	0	40	1,500
Mathematical Lange (1) Columnation				0	0	1	100	- 2	190	0	0	1	120	7	410	1	150	8	260
Material Control Contro				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material Lange Of Example Lange <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0				-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
186 1,68 85 700 1,671 424 4,117 133 447 799				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	合計		186	1,668	85	200	157	1,671	424	4,117	133	447	799	6,935	149	427	1,136	6/0/6

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は合まない。 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合田工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

)-44

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

							単位:百万円			金額	585	171	61	393	103	16	0	1,404	329	287	616	266	38	304	0	6	0	0	9	0	36	2,375
							金	q	ha	件数	56	19	21	6	4	4	0	83	2	11	13	17	7	24	0	-	0	0	4	0	5	130
								400 111	対 位 位 公 位	金額	16	19	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
								4	+)X30+	件数	1	2	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n
										金額	379	96	23	104	103	0	0	705	329	101	430	201	38	239	0	6	0	0	1	0	0	1,384
									小計	件数	14	10	7	2	4	0	0	37	2	2	7	13	7	50	0	1	0	0	1	0	0	99
									崩	金額	240	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	14	9	20	0	6	0	0	0	0	0	569
									第4四半	件数	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	-	2	0	1	0	0	0	0	0	10
								₩X		金額	0	25	0	0	58	0	0	83	0	36	36	43	10	53	0	0	0	0	0	0	0	172
								平成29年	第3四半其	件数	0	1	0	0	2	0	0	3	0	2	2	3	2	22	0	0	0	0	0	0	0	10
										金額	111	49	16	72	0	0	0	248	329	9	394	71	18	68	0	0	0	0	1	0	0	732
									第2四半其	件数	2	7	5	1	0	0	0	18	2	3	2	5	3	80	0	0	0	0	1	0	0	32
金額	306	1,280	2	326	461	2,375				金額	28	22	7	32	45	0	0	134	0	0	0	73	4	7.7	0	0	0	0	0	0	0	211
4数	Ε	95	1	14	12	130			第1四半期	件数	2	2	2	1	2	0	0	6	0	0	0	4	-	2	0	0	0	0	0	0	0	14
製	0	194	2	184	509	589		9	<u></u>		190	99	38	289	0	91	0	664	0	186	186	65	0	46	0	0	0	0	5	0	36	937
	0	12	1	2	3	18		る時間大の合作品	十成28年版深#		11	7	14	7	0	4	0	43	0	9	9	4	0	æ	0	0	0	0	3	0	2	09
最	0	242	0	0	6	251																										
	0	30	0	0	-	31				級価格帯区分		5日未謝			7円未満	7円未満																
最	306	844	0	142	243	1,535		5	Maren	左記発注等	万円以上	円以上、1,000万	田米選	万円以上	万円以上3,000万	万円以上3,000万	万円未満		万円以上	万円未謝		万円以上	万円未満									中計
-	Ε	20	0	12	8	81		8	第八書	1等級	1,000.	500万	500万						5,000;	5,000;		1,000.	1,000.									\(\pi \)
	度通常	度災害	度補正	度通常	医災害	+					-共 A	ω	ပ	下水道	下水道	下水道	下水道	小計	-# A	ω	14	¥¥	æ	小計	ū	自修	発表	生物	دی		(年)	
子質〉	平成28年息	平成28年	平成28年	平成29年	平成29年	包	(表-2)				十十一								横横			舗装			照	橋梁編	安全施	劉構品	無河	₩	404	
	-	件数 全額 件数 全額 件数 全額 件数 金額	件数 金額 件数 4 11 306 0 0 0 11 3 2 4 3 3 2 4 3 4 92 3	件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 11 306 0 0 0 11 30 11 5 11 5 11 11 2 11 11 11 2 11 11 11 2 11 12 11 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12	件数 金額 11 12 13 242 12 194 92 242 12 13 242 12 14 22 11 24 14 <t< td=""><td>件数 金額 件数 企 11 12 11 9 11 9 12 13 12 11 12 11 12 11 12 11 12</td></t<> <td>件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 分 金額 金額 金額 本額 金額 金額 本額 本額</td> <td>件数 全額 件数 全額 件数 全額 1 306 0 0 0 11 306 50 844 30 242 12 194 92 1,280 0 0 0 1 2 1 2 1 2 12 142 0 0 2 184 14 326 8 243 1 9 3 209 12 461 81 1,535 31 251 18 589 130 2,375</td> <td>件数 全額 件数 全額 件数 全額 11 306 6 4 4 36 4 36 50 844 30 242 12 194 92 1,280 0 0 0 0 1 2 1 2 12 142 0 0 2 184 14 326 8 243 1 9 3 209 12 461 81 1,535 31 251 18 130 2,375</td> <td>件数 全額 件数 全額 件数 全額 件数 全額 11 306 0 0 0 0 1 306 1.280 12 844 30 242 12 194 92 1.280 12 0 0 0 1 1 2 1 2 8 243 1 2 1 461 3 461 8 243 1 8 3 209 12 461 8 1,535 31 251 18 3 237 平成26栋榜場別 平成26年度契約済 平成26年度契約済 平成26年度契約済 平成26年度契約済 平成26年度契約済 平成26年度</td> <td>中 本</td> <td>体験 金額 件数 企業 上级 上级</td> <td>体数 金额 件数 全额 件数 全额 上级 公 上级 公 日本 日本<!--</td--><td> 4 株</td><td>件数 金額 件数 企額 上级 上级</td><td> 4</td><td> 1</td><td> 40</td><td> 中級</td><td> 1</td><td> 1 日</td><td>(</td><td> 1</td><td></td><td> 14 14 14 14 14 15 14 14</td><td></td><td>14.8. 6480 <t< td=""><td> 143 14</td><td> This See 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14</td><td> 1</td><td> 1</td><td> Fig. 10 Fig.</td></t<></td></td>	件数 金額 件数 企 11 12 11 9 11 9 12 13 12 11 12 11 12 11 12 11 12	件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 分 金額 金額 金額 本額 金額 金額 本額 本額	件数 全額 件数 全額 件数 全額 1 306 0 0 0 11 306 50 844 30 242 12 194 92 1,280 0 0 0 1 2 1 2 1 2 12 142 0 0 2 184 14 326 8 243 1 9 3 209 12 461 81 1,535 31 251 18 589 130 2,375	件数 全額 件数 全額 件数 全額 11 306 6 4 4 36 4 36 50 844 30 242 12 194 92 1,280 0 0 0 0 1 2 1 2 12 142 0 0 2 184 14 326 8 243 1 9 3 209 12 461 81 1,535 31 251 18 130 2,375	件数 全額 件数 全額 件数 全額 件数 全額 11 306 0 0 0 0 1 306 1.280 12 844 30 242 12 194 92 1.280 12 0 0 0 1 1 2 1 2 8 243 1 2 1 461 3 461 8 243 1 8 3 209 12 461 8 1,535 31 251 18 3 237 平成26栋榜場別 平成26年度契約済 平成26年度契約済 平成26年度契約済 平成26年度契約済 平成26年度契約済 平成26年度	中 本	体験 金額 件数 企業 上级 上级	体数 金额 件数 全额 件数 全额 上级 公 上级 公 日本 日本 </td <td> 4 株</td> <td>件数 金額 件数 企額 上级 上级</td> <td> 4</td> <td> 1</td> <td> 40</td> <td> 中級</td> <td> 1</td> <td> 1 日</td> <td>(</td> <td> 1</td> <td></td> <td> 14 14 14 14 14 15 14 14</td> <td></td> <td>14.8. 6480 <t< td=""><td> 143 14</td><td> This See 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14</td><td> 1</td><td> 1</td><td> Fig. 10 Fig.</td></t<></td>	4 株	件数 金額 件数 企額 上级 上级	4	1	40	中級	1	1 日	(1		14 14 14 14 14 15 14 14		14.8. 6480 <t< td=""><td> 143 14</td><td> This See 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14</td><td> 1</td><td> 1</td><td> Fig. 10 Fig.</td></t<>	143 14	This See 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14	1	1	Fig. 10 Fig.

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は合まない。 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。 ※下水道A2については、Bクラスの入札不調を受けて、期間を限定したAクラスの発注価格帯とする。

益城町

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

国土交通省所管				—	平成29年度通常	平成29年度災害						上木一式				- ×	建築一式 /											橋梁補修	安全施設	鋼構造物	
NEE!	件数	2	203	0	17	0	225		, R	tts.	発汗等級	A	8	C 2		小計	A 1	A 2 5	B	C	D 1	小計	A 2	-	C 1	小計					
省所管	金額	71	6,749	0	224	0	7,044		※ 公 任 校 拱 归	6.生加4合体が1	左記多	1,000万円以上	2,000万円未満	700万円未満			1億2,200万円以上	5,000万円以上1億2,000万円未満	2,500万円以上5,000万円未満	1,000万円以上2,500万円未満	1,000万円未満		2,000万円以上	1,000万円以上2,000万円未辦	1,000万円未満						
農林水産省所管	件数	0	43	0	0	0	43				左記発注等級価格帯区分						괴	億2,000万円未清	施米田丘000/	,500万円未満				握米田丘000							
省所管	金額	0	608	0	0	0	608	ŀ			区分							井田													
その他省庁所管	件数	10	99	-	6	0	82		平成20年	+7%.284	件数	25	14	17	0	99	0	0	m	5	9	14	3	5	9	10	0	0	0	0	0
45所管	金額	309	5,630	62	164	0	6,165		五成28年度初約3条	·	金額	892	159	55	0	1,106	0	0	122	77	28	227	71	58	47	135	0	0	0	0	0
ilii 🗆	件数	15	311	1	26	0	353			部1四	件数	10	10	4	0	24	0	0	0	0	2	2	1	0	1	2	0	0	0	0	0
ila	金額	380	13,188	62	388	0	14,018			第1四半期	金額	837	122	22	0	186	0	0	0	0	10	10	21	0	3	24	0	0	0	0	0
										第26	件数	12	12	5	0	29	0	0	·-	0	0	1	0	-	5	9	0	0	0	0	0
										第2四半期	金額	530	157	25	0	712	0	0	44	0	0	44	0	12	32	4	0	0	0	0	0
									平成2	第3四半期	件数	34	17	9	0	25	1	-	-	0	-	4	2	4	3	6	0	0	-	0	2
									平成29年度	日本期	金額	1,542	190	24	0	1,756	596	53	48	0	1	398	49	104	18	171	0	0	1	0	35
										第4四半期	件数	56	7	0	0	33	2	-	m	2	1	6	4	9	4	14	0	0	0	0	0
										半期	金額	1,899	96	0	0	1,994	1,384	62	102	36	9	1,590	122	84	21	227	0	0	0	0	0
										44小	件数	82	46	15	0	143	3	2	2	2	4	16	7	11	13	31	0	0	-	0	2

7,197

216

648 2,159

17

5,443

115

780

64

33

金額 6,287

119

587

件数 12

4,808

金額

564

件数

金額

平成30年度以降

316

金額単位: 百万円

4,428

31

2,042 192 200 74 766

36

376

73

45

10

2,159 113 164

422

27

F

20

921

09

279

15

913

32

766 219 8,972

0

0

14,018

353

3,086

219

3,823

0 57

197

82

49

22

1,201

304

ω

523

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

※光圧円数、重要次の時期については、発尿性の1元※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

その街

甲佐町

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

2,187

金額

件数

金額

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

山都町

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

: 百万円	#=	金額	1,695	8,367	0	1,572	24	11,658
金額単位:百万円	illia	4数	103	2,367	0	81	9	2,557
) 庁所管	金額	1,004	736	0	611	0	2,351
	その他省庁所管	件数	44	34	0	35	0	113
	省所管	金額	107	4,167	0	99	24	4,363
	農林水産省所	件数	12	1,793	0	7	9	1,818
	省所管	金額	584	3,464	0	968	0	4,944
	国土交通省所管	件数	47	540	0	39	0	979
(表-1)	N N	IV#	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	#4

(表-2)																	金額	金額単位:百万円
			五百20年申封約3	2000年					平成29年度	F度					日世のの世界に終	20 N	qfi	
		76./E. [W/TP'/D',03]	+17%20+1	XXVH XXVH	第1四半期	半期	第2四半期		第3四半期	(権)	第4四半期	==	44/		4/4204/	# X X	īā	
許可業種	第 世 報	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	A 1	5.500万円以上	7	692	2	164	0	0	2	146	5	345	6	929	0	0	16	1,347
	A 2	1,100万円以上5,500万円未満	56	457	2	66	15	320	18	425	2	18	40	925	0	0	99	1,382
	В	330万円以上1,100万円未満	96	520	47	243	99	339	17	130	137	626	257	1,671	0	0	353	2,191
	C	330万円未満	167	312	130	220	46	85	468	932	718	1,436	1,362	2,673	375	750	1,904	3,735
	小計		596	1,981	184	726	117	744	202	1,633	862	2,821	1,668	5,924	375	750	2,339	8,655
建 二二	A 1	1億3,200万円以上	-	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	237
<u>-(3</u>	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未満	c	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	261
\	ш	2,750万円以上5,500万円未渐	-	34	0	0	0	0	-	7	0	0	-	7	0	0	2	14
48	O	1,100万円以上2,750万円未満	9	76	0	0	-	13	-	-	0	0	2	14	0	0	80	111
	٥	1,100万円未満	17	74	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	19	62
	小計		28	703	0	0	1	13	4	13	0	0	2	56	0	0	33	729
舗装	A	1,100万円以上	5	85	1	16	4	93	0	0	0	0	5	109	0	0	10	194
	В	330万円以上1,100万円未満	11	74	0	0	2	19	0	0	0	0	2	19	0	0	13	93
	၁	330万円未満	36	64	0	0	-	2	-	10	0	0	2	12	0	0	38	92
	小計		55	223	1	16	7	114	1	10	0	0	6	140	0	0	61	363
洪画			33	322	8	95	5	16	1	2	0	0	14	185	0	0	47	202
橋梁補修			2	12	0	0	0	0	2	17	-	153	m	170	0	0	22	182
安全施設			2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
師			3	17	0	0	2	7	2	80	0	0	4	15	0	0	7	32
揰			9	121	0	0	2	13	-	-	0	0	3	14	0	0	6	135
その他			59	483	0	0	18	466	7	101	0	0	25	292	0	0	54	1,050
		수計	451	3,867	193	834	152	1,448	523	1,785	863	2,974	1,731	7,041	375	750	2,557	11,658

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計止する。

3-3-48

米三甲

金額単位: 百万円

ηĥα

 金額

件数

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

									40 to 140 ±	半成30年度以降	金額																							
Î									1	+1230:	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										+	金額	207	53	0	0	260	135	2	0	0	0	137	14	0	0	4-	0	0	0	0	0	0	-	
										本小	件数	12	13	0	0	25	2	-	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-	
										半期	金額	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
										第4四半期	件数	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									年度		金額	96	33	0	0	128	49	0	0	0	0	49	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	
									平成29年度	第3四半期	件数	4	7	0	0	11	-	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
											金額	35	7	0	0	42	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
										第2四半期	件数	m	m	0	0	9	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
	金額	963	49	19	20	0	1,051			角	金額	7.7	4	0	0	81	98	2	0	0	0	88	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	=======================================	-
ithe	- 一	77	12	-	-5	0	95			第1四半期	件数	2	-	0	0	9	-	-	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-	-
- 正	金額	287	25	19	0	0	331		40.79	左	金額	367	70	0	0	437	31	23	0	0	0	54	24	0	0	24	0	0	3	0	m	7.1	37	
その先治庁所管	件数	41	7	-	0	0	22		110041	牛队28年返买約万	件数	22	15	0	0	37	-	9	0	0	0	7	9	0	0	9	0	0	4	0	-	-	2	
4所管	金額	47	7	0	0	0	54				\$																							-
即林大麻省所衙	件数	2	۲	0	0	0	9				左記発注等級価格帯区分																							
省所衛	金額	629	17	0	20	0	999		10年4年4月	充土価格帝別	左記発	1,000万円以上	1,000万円未満				全工事	1,000万円未滞					全工事											
国土交通省所管	4数	58	4	0	2	0	29		8	€₹	発注等級					小計						小計	411			小計								
	子算別	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	수計	(美-2)			許可業種	土木一式 A	ω_			Ŕ	建築一式 A	Δ.	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Ŕ	舗装	<u> </u>	I	Ŕ	米画	看梁猫 修	安全施設	鋼構造物	師	和	その街	
		Ĭ¥.	#	#	-	<u></u>		(E	; 								3-	3)—∠	49														1

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

芦北町

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

1,170

金額

件数

金額

 熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

I I I									平成30年度	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I								\vdash	Τ		230	99	73	98	445	0	0	0	0	26	26	0	=	12	23	0	0	0	0	22	30	61
									小評	金額	2				4																	
									7	件数	2	2	80	48	09	0	0	0	0	13	13	0	2	7	6	0	0	0	0	14	6	7
									-期	金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									第4四半期	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
								上海	:賴	金額	0	32	27	36	95	0	0	0	0	2	2	0	2	e	∞	0	0	0	0	10	0	
								平成29年度	第3四半期	件数	0	-	3	20	24	0	0	0	0	2	2	0	-	2	e	0	0	0	0	9	0	
									- 御	金額	230	24	39	59	322	0	0	0	0	2	5	0	0	4	4	0	0	0	0	5	21	
									第2四半期	件数	2	-	4	14	21	0	0	0	0	4	4	0	0	2	2	0	0	0	0	m	en en	
	金額	910	83	19	602	22	1,619		#	金額	0	0	7	21	28	0	0	0	0	19	19	0	9	20	=	0	0	0	0	7	6	
i iii	4数	129	24	-5	113	m	274		第1四半期	件数	0	0	-	14	15	0	0	0	0	7	7	0	-	m	4	0	0	0	0	-2	9	
「所管	金額	178	12	0	144	0	334		契約済	金額	340	164	94	127	725	0	0	0	39	23	62	0	12	14	56	09	0	0	10	34	32	
その他省庁所管	件数	38	4	0	36	0	78		平成28年度契約済	件数	-	9	12	20	68	0	0	0	2	=	13	0	m	00	Ξ	9	0	0	-	4-	00	
所管	金額	137	36	0	51	5	229			\$																						-
農林水産省所管	件数	10	80	0	=	m	32			左記発注等級価格帯区分		20万円未満	(万円未満				3,200万円未満	90万円未満	50万円未満				万円未産									
当所管	金額	595	35	19	407	0	1,056		発注価格帯別	左記発	7,000万円以上	1,500万円以上7,000万円未満	500万円以上1,500万円未満	500万円未満		1億3,200万円以上	5,500万円以上1億3,200万円未満	2,750万円以上5,500万円未満	1,100万円以上2,750万円未満	1,100万円未満		1,100万円以上	330万円以上1,100万円未消	330万円未辦								
国土交通省所管	4数	18	12	-5	99	0	164		*	発注等級			Ĭ.	15	+			2,	1,	1,	+	1,	m	m	+							
The same of the sa	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	수타	-2)		許可業種	土木一式 A 1	A 2	89	U	十十	建築一式 A 1	A 2	ω	O	Δ	4小	舗装A	ω	U	十二		看梁補修	安全施設	鋼構造物	過	極	
	<u>щ</u> Н	平成28年	平成28年	平成28年	平成29年	平成29年	[⊕] □	(表-2)		潜口品	十十一						-(3)–(50			翻拳				一	看	安全推	鋼構造	過	柳	

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

津奈木町

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

M M	国土交通省所管	省所管	服林 水	農林水産省所管	その他	その他省庁所管		ilia										
上昇別	件数	金額	件数	金額	年数	金額	件数	金額										
平成28年度通常	21	185	4	104	48	329	73	618										
平成28年度災害	0	0	-	2	0	0	-	2										
平成28年度補正	-	12	0	0	0	0	1	12										
平成29年度通常	80	145	2	95	27	497	37	737										
平成29年度災害	0	0	0	0	0	0	0	0										
华	30	342	7	201	75	826	112	1,369										
(表-2)																		
	8	百申学見火名			l oct II	が 2000年日 ・ 1000年日					平成29年度	9年度					ocat II	40 IN 200
	K .	江间格市別			+ 19,28	中医类約済	第14	第1四半期	第26	第2四半期	第3四	第3四半期	第4四半期	1半期	小計	+	#198305	半败30年医以降
許可業種	発注等数	左記多	左記発注等級価格帯区分	\$区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
土木一式	9	6,000万円以上			-	86	0	0	-	16	0	0	0	0	-	16	0	
	A 3	3,000万円以上6,000万円未満	000万円未辦		-	38	0	0	0	0	-	14	0	0	-	14	0	
		2,000万円以上3,000万円未満	000万円未満		2		0	0	-	27	0	0	0	0	-	27	0	
	C 1,	1,000万円以上2,000万円未満	000万円未満		0	0	0	0	0	0	0	0	-	12	-	12	0	
		200万円以上1,000万円未満	,000万円未満		9	2	c	15	2	9	0	0	0	0	2	21	0	
	ш	200万円未消			13	13	0	0	-	1	0	0	0	0	-	-	0	
	사람 나				23	217	3	15	2	125	1	41	1	12	10	193	0	
建築一式	5,	5,000万円以上			0	0	0	0	0	0	2	179	0	0	2	179	0	
	A 2,	2,500万円以上5,000万円未満	000万円未辦		2	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	1,500万円以上2,500万円未満	500万円未満		2	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C	800万円以上1,500万円未満	,500万円未満		-	12	0	0	0	0	1	10	0	0	1	10	0	
	Q	200万円以上	800万円未満		2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	Į.	5	0	
	Е	200万円未満			7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計				14	137	0	0	-	5	3	189	0	0	4	194	0	
舗装	9	6,000万円以上			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A 3,	3,000万円以上6,000万円未満	000万円未辦		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8 2,	2,000万円以上3,000万円未満	000万円未満		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C 1,	1,000万円以上2,000万円未満	000万円未満		-	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	٥	200万円以上1,000万円未満	,000万円未満		0	0	0	0	0	0	3	16	0	0	m	16	0	
	ш	200万円未満			ĸ	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計				4		0	0	0	0	æ	16	0	0	m	16	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
橋梁補修					-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全施設					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鋼構造物					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電気					00	91	2	23	m	106	0	0	0	0	2	129	0	
#11					20	111	0	0	2	74	80	84	0	0	13	158	0	
その他					5	44	-	m	-	4	0	0	0	0	2	47	0	
													_					

 金額単位: 百万円

金額

件数

[※]発注件数、金額及び 時期については、現段階の予定であるため 今後可能性となることがある。

[※]平成30年度以降の通常事業分は合まない。 ※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

錦町

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

											金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										第4四半期	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									年度		金額	0	127	10	137	0	48	0	0	48
									平成29年度	第3四半期	件数	0	7	c	10	0	-	0	0	-
											金額	0	0	2	2	0	0	0	0	0
										第2四半期	件数	0	0	2	2	0	0	0	0	0
	金額	1,403	105	7	379	0	1,894				金額	0	0	0	0	0	0	0	-	-
iha I	件数	34	2	-	19	0	86			第1四半期	4数	0	0	0	0	0	0	0	2	2
の他有圧所官	金額	103	0	0	84	0	187		\$2.43 E##		金額	45	99	45	156	0	96	0	7	103
	件数	4	0	0	47	0	51		一大の公子	十0%26年辰天料月	件数	-	7	10	18	0	-	0	6	4
	金額	9	0	0	0	0	9				x x									
辰^小小性自/川官	件数	-	0	0	0	0	-				8注等級価格帯区分		00万円未満				超米田郷	20万円未辦		
国土父迪省所官	金額	1,294	105	7	295	0	1,701		百年辛丑火火	无法训作市別	左記発注	4,000万円以上	700万円以上4,000万	700万円未避		1億円以上	4,500万円以上1億円	800万円以上4,500万円未満	800万円未満	
H H H H H H	件数	59	2	-	14	0	46			in.	発注等級	A	8	U	사람	A 1	A 2	<u>a</u>	S	小計
四	1 34-703	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	合計	(表-2)			許可業種	土木一式		. –		解案一式	<u> </u>		<u> </u>	

金額単位: 百万円

金額

件数

金額

件数

金額

件数

丰

平成30年度以降

1,000万円以上2,000万円未満

舗装

,0000万円未滞 2,000万円以上

1,086

o. Ε

~ ∞

20 20

1,410

1,086

1,299

Ξ

1,894

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。

300百万円以上800百万円未満

300百万円未満

800百万円以上

その他

※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。

※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計上する。

多良木町

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

金額

件数

金額

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

[※]発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

[※]件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発法など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計止する。

湯前町

自治体名】

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

金额 平成29年度 第4四年期 第4四年期 第4四年期 第4日年期 第5日年期 第5日年 中央 中央 中央 <th colspan<="" th=""><th>金飯町 444 20 203 263 263 263 263 264 265 30 444 266 267 268 268 269 260 260 260 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260</th><th>その他省庁所管計</th><th>件数金額件数</th><th>14 155 42</th><th>0 0 2</th><th>0 0 1</th><th>12 164 20</th><th>0 0 0</th><th>26 319 65</th><th>からかれ 神 かんない</th><th>十成26年发来57月 第1四半</th><th>件数 金額 件数</th><th>1 21 0</th><th>20 246 0</th><th>4 15 0</th><th>0 0 0</th><th>25 282 0</th><th>0 0 0</th><th>4 54 0</th><th>m</th><th>0</th><th>0</th><th></th><th>13 114 2</th><th>1 9 0</th><th>0 0 0</th><th>14 123 2</th><th>0 0 0</th><th>1 11 0</th><th>0 0 0</th><th>0 0 0</th><th>0 0</th><th>0 0 0</th><th>0</th></th>	<th>金飯町 444 20 203 263 263 263 263 264 265 30 444 266 267 268 268 269 260 260 260 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260</th> <th>その他省庁所管計</th> <th>件数金額件数</th> <th>14 155 42</th> <th>0 0 2</th> <th>0 0 1</th> <th>12 164 20</th> <th>0 0 0</th> <th>26 319 65</th> <th>からかれ 神 かんない</th> <th>十成26年发来57月 第1四半</th> <th>件数 金額 件数</th> <th>1 21 0</th> <th>20 246 0</th> <th>4 15 0</th> <th>0 0 0</th> <th>25 282 0</th> <th>0 0 0</th> <th>4 54 0</th> <th>m</th> <th>0</th> <th>0</th> <th></th> <th>13 114 2</th> <th>1 9 0</th> <th>0 0 0</th> <th>14 123 2</th> <th>0 0 0</th> <th>1 11 0</th> <th>0 0 0</th> <th>0 0 0</th> <th>0 0</th> <th>0 0 0</th> <th>0</th>	金飯町 444 20 203 263 263 263 263 264 265 30 444 266 267 268 268 269 260 260 260 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260	その他省庁所管計	件数金額件数	14 155 42	0 0 2	0 0 1	12 164 20	0 0 0	26 319 65	からかれ 神 かんない	十成26年发来57月 第1四半	件数 金額 件数	1 21 0	20 246 0	4 15 0	0 0 0	25 282 0	0 0 0	4 54 0	m	0	0		13 114 2	1 9 0	0 0 0	14 123 2	0 0 0	1 11 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0
	第3四半期 (4数	ilia	金額								第1四半期																								
第3四半期 第3四半期 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										第2四半期																								
第4四半期 金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	第4四半期 (4数 (4数 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (00 (0									平成29年度	第3四半期							1 40																	
	4 年										第4四半期		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

金額

件数

金額

件数

 -

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

水上村

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

Ξ 金額

件数

金額

件数

金額

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

[※]発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

[※]件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発法など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計止する。

相良村

金額単位: 百万円

ηĥα

325

 金額

件数

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

マー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 0 0 8 8 0 0 0 7 1 1 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0		0000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 0 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		65 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		59 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 - 1 - 0 - 0		000万円未満	200万円未満 200万円以上5, 200万円以上 00万円以上1,00		
(1 回	\perp	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0					河 題 題
14 14 14 14 14 14 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 14	L	0	0	0	0	Ļ	0	0	0	0	0		0	0					水道
1 日		0	0	0	0		0	0	0	0	0		4	-					% II
		0	0	0	0	_	0	0	0	0	0		0	0					恒州
		-	0	0	4		-	0	0	0	0		2	-				青	~
(4 6 回		1	0	0	4		1	0	0	0	0		2	-			0万円未満		O
(中部) (金額) (特別 (特別 (特別 (特別 (特別 (4別) (4別) (4別) (4別) (4別) (4別) (4別) (4別		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0万円未満	0万円以上1,00		ш
		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0			000万円以上		
4条	464	7	0	0	377		3	22	-	65	3		74	5				丰	
48	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0					
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 有額 本額 本	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0					
作数 金額 件数 金額 分類 金額 分類 全額 公司 公	10	2	0	0	2		1	0	0	8	1		15	3			000万円未満		0
作数 金額 件数 金額 件数 金額 条額 金額 件数 金額 作数 金額 全額 金額 本籍 本	129	4						22	-	57	2		59	2		000万円未満	000万円以上5,		ш
特別 金額 体数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 日本 日	325	1	0	0	50				,								TV-1 157000		
件数 金額 中级 公 <td>84</td> <td>9</td> <td>0 0</td> <td>0 0</td> <td>325</td> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1007 1007 1007</td> <td></td> <td></td>	84	9	0 0	0 0	325		1	0	0	0	0		0	0			1007 1007 1007		
特数 金額 特数 金額 特数 金額 特数 金額 4 12 13 64 15 29 361 4 12 15 29 361 5 0	0	0	0 0 0	0 0	61 325 50		4 1	21	- 0	2 0	1 0		192	12			1 MHZ000		
体数 金額 体数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 年期 本額	12	3	0 0 0 0	0 0 0	0 61 325 50		0 4 1	0 21	0 - 0	0 2 0	0 1 0		192	0 12 0			1 2 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		
件数 全額 件数 金額 中数 本限 本股	72	3	0 0 0 0	0 0 0 0	10 0 61 325 50		0 0 4 1	0 0 21 0 0	0 0 - 0	2 0 2 0	- 0 - 0		45 0 192 0	8 0 0			2000万円未満		
性数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 年報 金額 年報 金額 年報 金額 金額 金額 本額	0	0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	51 10 0 61 61 50		2 0 0 4 1	21 0 0 21 0 0	- 0 0 - 0	0 2 0 0	0 1 0 1 0		76 45 0 192 0	9 8 0 0 0 0 0		000万円未満	2000万円以上4,2000万円未満		
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 1 12 13 84 12 15 29 361 1 1 1 12	金額	件数	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 51 10 0 61 8325 50		0 2 2 0 4 1	21 21 0	0 - 0 0 - 0	0 0 5 0 0	0 0 1 0 0		71 76 45 0 192 0	1 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		000万円未満	200万円以上 200万円以上4, 200万円未避 200万円未避 200万円未避 200万円未避 200万円以上		
件数 金額 件数 金額 件数 金額 4 122 13 84 12 29 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 91 7 83 13 674 23 848 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213 20 167 25 829 52 1,209	量	₩			0 10 0 0 0 52 55			1 10					金額 76 45 0 0 0 0	# 1 3 3 1 1 1 2 0 0 0 0	4	注等級価格帯區000万円未満	左記為 2000万円以上 2000万円未満 2000万円未満	線	
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 4 122 13 84 12 155 29 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 91 7 83 13 674 23 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 213 20 167 25 829 52 1,22					0 0 10 0 0 661 52 50	金額	(2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				第1四半期 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	本	1mm/	件数 件数 1 1 1 1 0 0 0	\$	沿等級面格特[000万円未満	在配券 200万円以上 200万円以上4, 200万円未満	海線	
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 4 12 13 84 12 29 29 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 91 7 83 13 674 23 84 0 0 0 0 0 0 0 0			強		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3四半期 金額	平 _万 第 第 4数 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1 1	一 第			第1四半期 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	₩ ₩	1mm²	平成28年 件数 1 3 3 8 8 0 0	4	注等級価格特[5000万円未満	主価格特別 左配3 200万円以上4, 2000万円以上4,	黎	種式式
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 4 122 13 84 12 15 29 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 3 91 7 83 13 674 23 88					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3四半期 企業	平原 (新) (4 (章		91 1 1 1 1 1 1 1 1	32 第	4	ω _{1mr} -	平成28年 平成28年 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		20 公子 经基本 经银币 经银币 经银币 经银币 经银币 化二甲苯酚	213 主価格特別 左配3 200万円以上4, 2000万円未消	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	種 式
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 4 122 13 84 12 155 29 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0 0 0 110 100 100 100 100 100 100 100 1	2.29年度 3.72年度 企業	平 (\$1四半期 3100半期 30000000000000000000000000000000000	4 株		7 平成28年 平成28年 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		20 20 注等級債格特E 2000万円未満	213 213 左記者 左記者 2000万円以上4, 2000万円未満	2 2	
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 4 122 13 84 12 155 29 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0			一		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2004度 2000年期 金額	平板 (新) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本				23 25 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25 2 25	十 株 株	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	13 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 5 6 0 0 0 0		20 20 注等級債格特E	91 0 0 213 左記3 200万円以上4, 2000万円以上4, 2000万円未満	8	
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 4 122 13 84 12 155 29			() () () () () () () () () ()		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	209年度 2四半期 金額	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	() () () () () () () () () ()			23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25			13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1		20 20 22 22 22 22 24 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	213 213 全価格特別 左記3 000万円以上4, 000万円表清	の D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	
件数 金額 件数 金額 件数					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	229年度 200半期 金額	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		9 8 = =	平成28年 平成28年 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		0 0 7 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	黎 線狀	
					0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	次29年度 2012年期 金.格	(2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	4		12 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 4数 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	が が が が が が が が が が が が が の の の の の の の の の の の の の	

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

五木村

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

金額

件数

金額

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

上江村

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

										小計	金額	159				207		111														
											件数	2	5	1	0	8	-	8	3	0	0	12	0	1	-	2	-	0	0	0	0	0
										半期	金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										第4四半期	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									4年度	半期	金額	159	20	2	0	181	30	111	6	0	0	150	0	0	5	2	12	0	0	0	0	0
									平成29年度	第3四半期	件数	2	2	1	0	5	-	8	2	0	0	11	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0
										未開	金額	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0
										第2四半期	件数	0	-	0	0	1	0	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
	金額	572	2	80	359	0	1,013			半期	金額	0	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ilia	件数	17	1	9	23	0	47			第1四半期	件数	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庁所管	金額	282	0	89	71	0	361		\$7.1%1C# III		金額	168	17	2	0	190	0	79	2	0	0	81	0	22	0	22	9	0	0	0	0	0
その他省庁所管	件数	3	0	1	9	0	10		外景様となっても	+W284H	件数	2	2	2	0	9	0	7	-	0	0	89	0	2	0	2	-	0	0	0	0	0
\$所管	金額	3	0	0	4	0	7				\$																					
農林水産省所管	件数	-	0	0	2	0	3				左記発注等級価格帯区分		0万円未満					0万円未満						0万円未消								
所管	金額	287	2	72	284	0	645		1000年年	机械体带力型	左記発	3,000万円以上	500万円以上3,000万円未満	500万円未満			3,000万円以上	500万円以上3,000万円未満	500万円未満				3,000万円以上	500万円以上3,000万円未満	500万円未満							
国土交通省所管	件数	13	1	5	15	0	34		1 8	H.	発注等級			20		사람			50			小計			50	사람						
18日	50446	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	合計	(表-2)			許可業種	土木一式 A	æ	U		7.	建築一式A	8	U			7	舗装A	8	<u> U </u>	7	洪画	橋梁補修	安全施設	鋼構造物	例	和

金額

件数

金額

件数

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

球磨村

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

百万円		金額	617	95	135	538	27	1,412
金額単位:百万円	ilia	件数	58	14	9	39	5	122
	广 所管	金額	227	0	124	251	0	602
	その他省庁所管	件数	13	0	5	80	0	56
	林水産省所管	金額	116	63	0	06	9	275
	農林水産	件数	17	80	0	=	2	38
	省所管	金額	274	32	11	197	21	535
	国土交通省所管	件数	28	9	-	20	3	58
(表-1)	TE SE	1.44.03	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	#4
				•				

(表-2)																	金額	金額単位:百万円
		% 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	於於居由 40c 世出	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					平成29年度	年度					対応の仕事に象	中国多	qi	
		26./E. (III/1E/TO/201	14.02%	XXXIII	第1四半期	半期	第2四半期	# 羅	第3四半期	卡期	第4四半期		松小		4/304	世 本 本	ī	
許可業種	発注等級	左記発注等級価格帯区分	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
十十一二	A 1	7,000万円以上	0	0	0	0	0	0	-	74	0	0	-	74	0	0	-	74
	A 2	1,500万円以上7,000万円未満	-	275	0	0	0	0	4	149	0	0	4	149	0	0	15	424
	В	500万円以上1,500万円未満	16	136	6	24	2	19	4	40	0	0	12	125	0	0	28	261
	C	500万円未満	30	57	11	32	10	16	9	16	0	0	27	64	0	0	22	121
	小計		57	468	14	95	15	77	15	279	0	0	44	412	0	0	101	880
無 無 3-	A 1	1億3,200万円以上	0	0	0	0	-	140	0	0	0	0	-	140	0	0	-	140
- (3	A 2	5,500万円以上1億3,200万円未辦	-	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	76
<u> </u>	ω	2,750万円以上5,500万円未満	0	0	0	0	0	0	2	81	0	0	2	180	0	0	2	8
5 9	O	1,100万円以上2,750万円未満	5	74	0	0	0	0	c	19	0	0	e	19	0	0	∞	135
	۵	1,100万円未満	-	3	0	0	0	0	-	10	0	0	~	10	0	0	2	13
	小計		7	174	0	0	1	140	9	152	0	0	7	292	0	0	14	466
舗装	Ą	1,100万円以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	330万円以上1,100万円未離	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ပ	330万円未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
囲災			-	1	-	9	0	0	0	0	0	0	-	9	0	0	2	7
橋梁補修			2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20
安全施設			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鋼構造物			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
栭			0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	-	4	0	0	-	4
その他			2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
			69	869	15	62	16	217	22	435	0	0	53	714	0	0	122	1,412

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計止する。

3-3-59

あさぎり町

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

: 百万円		金額	898	0	66	738	0	1,705
金額単位:百万円	ilia	件数	77	0	2	71	0	153
	广 所管	金額	385	0	55	232	0	672
	その他省庁所管	件数	40	0	m	21	0	64
	省所管	金額	221	0	12	31	0	564
	農林水産省所管	件数	2	0	-	2	0	=
	省所管	金額	262	0	32	475	0	692
	国土交通省所管	件数	32	0	-	45	0	78
(表-1)	N 和 N	EV It	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	#4

		金額	195	23	123	0	341	289	306	=	0	0	909	311	103	14	428	0	29	0	0	41	124	86	1,705
qh	īā	件数	7	2	56	0	35	m	24	25	0	0	32	25	18	9	49	0	6	0	0	4	14	10	153
FIN 8%	世をな	金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
为任DOA 年 日 1 後	4	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金額	147	10	44	0	201	31	201	6	0	0	235	197	40	2	539	0	29	0	0	0	80	15	837
	44	件数	2	-	10	0	16	-	15	2	0	0	18	16	9	-	23	0	6	0	0	0	7	e	9/
	- 御	金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第4四半期	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度	ド期	金額	0	10	22	0	32	0	14	0	0	0	14	146	32	2	180	0	32	0	0	0	43	10	311
平成29年度	第3四半期	件数	0	-	5	0	9	0	-	0	0	0	1	12	5	-	18	0	4	0	0	0	e	-	33
	- 御	金額	147	0	7	0	154	0	89	c	0	0	71	33	8	0	14	0	35	0	0	0	36	2	342
	第2四半期	件数	2	0	-	0	9	0	7	2	0	0	6	m	-	0	4	0	2	0	0	0	m	2	59
	- 御	金額	0	0	15	0	15	31	119	0	0	0	150	18	0	0	18	0	0	0	0	0	-	0	184
	第1四半期	件数	0	0	4	0	4	-	7	0	0	0	8	-	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	14
* 120 % 1-30	H M K	金額	48	13	79	0	140	258	105	00	0	0	371	114	63	12	189	0	0	0	0	41	44	83	898
外级属电量00倍出	TW20+12	件数	2	-	16	0	19	2	6	m	0	0	14	6	12	5	56	0	0	0	0	4	7	7	77
% 注 世	25.2E (M/TF/TD/D)	左記発注等級価格帯区分	1,500万円以上	1,000万円以上1,500万円未満	1,000万円未避			2,500万円以上	500万円以上2,500万円未満	500万円未謝				900万円以上	300万円以上900万円未消	300万円未満									
**		雅 発注等級	A A	8	U		小計	4	ω	U			小計	A	В	U	小音上		會	蒙	物			护	
		許可業種	上十一二					3-	<u>-(3</u>		30			舗装					橋梁補修	安全施設	鋼構造物	領	和	その他	

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

※件数は入札手続きの件数とし、合冊入札を行う場合は、合冊工事の予定価格の合計額に応じた等級区分に1回を計上することとする。 ※集計時点で合冊入札や分離発注など発注方法が不明の場合は、査定決定箇所の件数及び金額を計止する。

3-3-60

落北町

[自治体名]

熊本地震等復旧・復興工事及び通常工事の発注計画

																								Н					Н	_		
									the state of the s	金額	159	115	21	0	295	0	11	0	0	0	11	17	0	0	17	0	18	0	0	0	16	0
									44	件数	9	16		0	33	0	2	0	0	0	2	4	0	0	4	0	2	0	0	0	9	0
									# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	金額	0	18	20	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									第4四半期	件数	0	e	10	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								F度	- 御	金額	56	51	-	0	78	0	3	0	0	0	3	6	0	0	6	0	0	0	0	0	=	0
								平成29年度	第3四半期	件数	-	7	-	0	6	0	-	0	0	0	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	е	0
										金額	114	23	0	0	137	0	8	0	0	0	8	8	0	0	8	0	18	0	0	0	4	0
									第2四半期	件数	4	4	0	0	8	0	-	0	0	0	1	-	0	0	-	0	2	0	0	0	2	0
金額	873	107	0	313	37	1,330			 	金額	19	23	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
件数	94	56	0	33	12	165			第1四半期	件数	-	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
 守所管 金額	416	0	0	146	0	562		\$2.0% U#1	上	金額	458	151	34	0	643	148	33	0	0	0	181	59	0	0	59	0	41	0	0	0	11	89
その他省庁所管 件数 金	24	0	0	20	0	44		外がは世上のでも氏	半成28年度	件数	22	51	23	0	96	3	4	0	0	0	7	4	0	0	4	0	3	0	0	0	2	m
省所管 金額	131	22	0	120	6	282				\$																						
農林水産省所管 件数 金	c	7	0	9	5	21				左記発注等級価格帯区分		000万円未満	0万円未満																			
省所管金額	326	85	0	47	28	486		百年条进火	光江[[[左記発	7,000万円以上	1,500万円以上7,000万円未満	500万円以上1,500万円未満	500万円未満		1,500万円以上	1,500万円未満					価格指定なし					価格指定なし				価格指定なし	価格指定なし
国土交通省所管 件数 金	29	19	0	7	7	100		8	ĸ	発注等級	A 1 7,	A 2 1,	B 5	C 5	小青什	A 1,	1,				小計	ランクなし 値			사하		ランクなし 値				ランクなし 値	ランクなし 値
	平成28年度通常	平成28年度災害	平成28年度補正	平成29年度通常	平成29年度災害	合計	(表-2)			許可業種	上木一式		س	J	,	建築一式 /			I	1	× 1	舗装			,		橋梁補修	安全施設	鋼構造物	例	御	その他

 Ξ

金額

件数

金額

件数

金額単位: 百万円

ηĥα

平成30年度以降

※発注件数、金額及び時期については、現段階の予定であるため今後可能性となることがある。 ※平成30年度以降の通常事業分は含まない。

【議題4】

「建設資機材や労働力の確保に関する 現状と課題について」

· 国土交通省九州地方整備局

熊本県における 建設資材 需給価格 動向・建 設労働者 需給動向 について

報告書

(平成29年11月版)

※アンケート結果一 覧表のコメント欄 は、集計時 期の都合 により、10月分の 結果を 記載しています。また、アンケート結果一覧 表[3ヶ月先の 見通し]の建 設労働者 の需給動 向については、集計時期 の都合により、暫 定値となります。

復旧事業円滑化官民ネットワーク

本アンケートの概要

本アンケートの概要

価格動向及び建設労働者の需給動向に急激な変化が生じれば、円滑な工事発注、施工に影響が生じる恐れがある。このため、熊本県内の被災地区における建設 平成28年熊本地震の発生に伴い、今後、熊本県内において、多くの災害復旧・復興工事の発注が見込まれ、これに伴い建設資材、仮設材、建設機械等の需給、 資材等の需給、価格動向については、当面特に注視していく必要がある。

本資料は、前述の必要性から建設資材等の需給、価格動向を把握するために、復旧事業円滑化官民ネットワークの構成機関等が実施するアンケート結果をとり まとめたものである。


(用語説明)

1. 復旧事業円滑化官民ネットワークとは

熊本地震で被災した地域の復旧・復興に向けて、今後不足が懸念される建設資材及び人手の需給状況に関するきめ細かい情報を得て、今後の復旧・復興の支 **瞏をはかるために構成された機関。** なお、九州管内の専門工事業団体、建設業団体、資材業団体、各県、各政令市及び九州地方整備局で構成され、平成28年6月20日に設置された。(詳細は、平 **載28年6月20日付けで九州地方整備局ホームページに掲載した記者発表資料「復旧事業円滑化官民ネットワーク」の設置について」を参照。**

2. 被災地区とは

比較的被害の大きかった次の地区を主とし、県内のその他の地区も含むものとする。熊本市、西原村、嘉島町、益城町、御船町、甲佐町、大津町、菊陽町阿蘇市、南阿蘇村、高森町、山都町、宇土市、宇城市、美里町

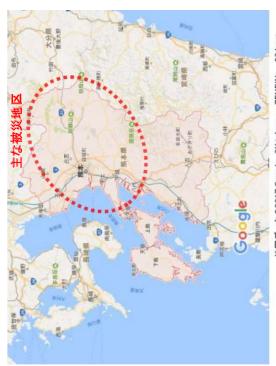

地図データ@2017 Google、SK telecom、ZENRIN 20 k

2. 建設資材の品目及び建設労働者の職種

1)公 共工事での主 要な建 設資材である下 表の品目をアンケートの対象とする。

く建 設資材>・・・16 品目

· 본 자연 개			
オキュー・チョン・	1	セグト	普通 ポルトランド バラ物
\ H :\	2	生コンクリート	28日強度 21N スランプ18cm 最大骨材寸法25mm以下
	3	仓	光- 荒目
骨材	4		クラッシャラン C-40
	5	再生砕石	再生クラッシャラン RC-40
# \$ 1 = ~ C	9	新村	密粒度13
マロイバンクン	7	再生	密粒度13
++ 550	8	異形棒鋼	SD295A D16
	6	工形鍋	(高さ) 200mm × (幅) 100mm × (厚) 5.5mm × (厚) 8mm
	10	杉正角 特1等	(長さ) 3.0m × (厚さ) 10.5cm × (幅) 10.5cm
*	11	型枠用合板 塗装品	(厚)12.0 mm × (幅)900 mm× (長さ)1,800mm
	12	構造用合板 特類	(厚)12.0 mm × (幅)910 mm × (長さ)1,8 20mm
石油	13	軽沖	1,2号
粘土がわら	14	陶器瓦	
仮設 鋼材	15	刺鉄 板	1)—X
建設 機械	16	ラフテレーンクレーン	1)—X

2)公共工事での主要な建設労働者である下表の職種をアンケートの対象とする。

く建 設労働者 >・・・1 0職種

1	型枠工	2	卓 子	3	とびエ	4	鉄筋工	5	特殊作業員
9	普通作業員	7	軽作業員	8	運転手(特殊)	6	(一一) 重輕重	10	交通誘 導員

3. アンケート内容

建設 資材及び建 設労働者に対するアンケート内容は次のとおりである。 なお、本アンケートは毎月 10日までの 状況をとりまとめたもの である。

- 1) アンケート対象業者は、次の(1)から(4)の各項目について、5段階評価または4段階評価で数値回答する。
- 回答で得られた数値を各建設 資材別、各建設労働者別に区分し、それぞれの平均値を求める。 5

※(計算例) 現在の価格動向について、A社の回答:「3-横ばい」、B社の回答:「4-やや上昇」、C社の回答:「4-やや上昇」の場合、 平均 値 = (3+4+4)/3 = 3.70 (少数第三位を四捨五入)

得られた各平均値について、各判定基準に基づき判定を行う。 $\widehat{\mathfrak{S}}$ ※(判定例) 5 段階評価 の各数値 の中間値 で区分する。3.5超 ~ 4.5以下は、「やや 上昇」と区分するので、現在 の価格動 向での 平均値3.7は、 「やや上昇」と判定する。

<建 設資材>

(1)価格動向 (現在及び3ヶ月先)

(1-下落・2-やや下落・3-横ばい・4-やや上昇・5-上昇

(2) 需給動向 (現在及び3ヶ月先)

(1-緩和・2-やや緩和・3-均衡・4-ややひっ道・5-ひっ迫

(3) 在庫状況 (現在)

(1-豊富・2-普通・3-やや品不足・4-品不足

(4) 労働者確 保の難易 度 (現在及 び3ヶ月先)

- 5-容易 (1-困難・2-やや困難・3-普通・4-やや容易

【用語説明】

「緩和」

とは品 物が比較 的豊富で比較 的速やか に納入が とは品 物が豊富 で即 納が出来る場合 - やや緩和

出来る場合

とは所 定の期限 内に必要量 の納入が 可能な場合

「圴衡」

とは品 不足等で納入 がやや遅れる場合 ややひつ道

とは 品不足等で納入 が著しく遅れる場合 ひっ通」 く建 設労働者 >

(5) 判定基準

◆建設 資材

<価格動向の判定基準>

平均值	判定
4.5超~5.0以下	上昇
3.5超~4.5以下	哲工中中
2.5超~3.5以下	横ばい
1.5超~2.5以下	やや下落
1.0以上~1.5以下	下落

く需給動向の判定基準>

	т	辺		和	
判定	ひつ迫	や やひっ迫	均衡	やや緩和	緩和
平均值	4.5超~5.0以下	3.5超~4.5以下	2.5超~3.5以下	1.5超~2.5以下	1.0以上~1.5以下

く在 庫状況の 判定基準 >

判定	品不足	やや品不足	普通	即
平均值	3.5超~4.0以下	2.5超~3.5以下	1.5超~2.5以下	1.0以上~1.5以下

◆建設 労働者

く需給動向(労働者確保の難易)の判定基準>

判定	困難	선상 困難	票票	俗 슏	容易
平均值	1.0 以上~1.5以下	1.5 超~2.5以下	2.5 超~3.5以下	3.5 超~4.5以下	4.5 超~5.0以下

4. 各アンケート対象者数及び回答数

アンケートの全対象者数は、建設資材が178社で建設労働者が44社である。

なお、アンケート対象者は、被災地区に所在、または販売エリア、施工エリアを有する資材販売業者、建設業者等である。

く建設 資材>

品目別に、30から75社に依頼し、回答率は、2割から5割程度であった。

く建設 労働者>

職種別に、25から40社に依頼し、回答率は、2割から4割程度であった。

アンケート結果一覧表

下表 のアンケート結果は、建設資材・建設労働 者の需給・価格動 向等について得られた数値回 答の平均 値を各々 の判定基 準に基づき判 定したもの である。<u>なお、アンケート結果として便宜</u> 上、数 値回答平 均値を区 分して一 つの判定を記載しているが、区 分の境界 ではわずかな数値の違いで判 定が変動 する場合 がある。また、各アンケート対象者 からの回答 は、需要 側・供給側 6 立場や、工事条 件・取引条 件の違い等 の回答者 の個別事 情を有しており、必ずしも地域の 実情を網 羅し、代表したものではない可能性 があり、このアンケート結果の取り扱いには注意する必

<u>がある。</u> なお、コメント欄については、「本アンケートの実 施要領」に基 づくアンケートとは別に(一 社)熊本 県建設業 協会が会 員企業を対象に実施したアンケート結果を記載している。アンケート対象 者 や調査 方法等の 違いにより、価格動 向・需給 動向・在庫 状況欄とコメント欄は 内容が異 なる 場合が ある。 ◆建設 資材 (1/3)

※ 表中の矢 印は、牛 日からの変 動(判定基 進の表にだける ト下) を ます

◆建設貸材(1/3)										※ 表中の矢 印は、先 月からの変動 (判定基 準の表における 上下)を表す。
		価格動向			需給動向			在庫状況		コメント[10月分の回答]
	前月比	現在 (前月に比べ で)	数值 四 平均 基本 基本 基本 基本 基本 基本 重	前月比	現在	数值回 平均值	前月比	現在	数值回 答 平均值	(アンケート対象者や調金万法等の違いにより、価格動向・需給動向・任庫状況欄と内容が異なる場合がある。)
セメント	1	横ばい	3.08	1	均衡	3.27	ı	I	ı	
生コンクリート	•	横ばい	3.2.7	•	むゃひっ道	3.65	1	I	l	・今後、値上 げするとの事。 ・生コンの配達に合わせ で仕事 の内容を検討しなくてはならず、前もって予約をしていても時間通りには来なく、手間待ちが発生している。 ・予定を入れても、時間通りの納 入が出来 ていない。 ・大型車両 による材料は通常 の納入が 出来ているが小型 車での配車が 困難になってきている。 ・今のところ問題ないが、生コン車の 運転手が 足りない状況。
砂	1	横ばい	3.26	1	均衡	3.17	1	興	1.67	・納入出来ている。災害復旧で山間部の工事が多いが、吹付け用砂等は遠隔地のために配達料が上昇している。また、10tダンプで配送できない地区が有り、小型ダンプに積替え運搬となり割高となっている。 ・若干の不 足感がある。従来から設計価格の約120%
砕石	•	横ばい	3.40	•	均衡	3.28	•	やや陽不足	2.60	•4月以降に値 上げをしている状況であるが、今後も価 格上昇する 見込み である。 •ダンプトラック不足 の為か解 らないが、指 定した時間に配達してもらえない状況。 •製造会社 が少なぐなっており、工 事発注量 次第では不足の 恐れがある。 •10月より値上 げとの事。 •1節地が、ゴトニュカの 死足に 上口 ロ の44 1 是 が細間され アフス・が、ゴトニュカの ぎロロ は 無の トロ
再生砕石	•	横ばい	3.35	•	均衡	3.17	⇗	個用	1.50	・ 生版アンファンテンプルイルによっ! ロ の耐入車 がではなれている。メントングノボルギー間の工井に加えて、砕石組合から値上 げ要請がなされており、更なる上昇が見込まれる。・ 阿蘇地区 からの取引 が困難であるため地区 外との取引となっている。資材の 運賃が発生するため、取引価格 が上昇している。・ 不足感はない。 従来 から設計価 格の約110%
アスファルト合材(新材)	1	横ばい	3.28	•	均衡	2.92	ı	I	I	・今後値上がりの見通しあり。 ・年度末工事が終わったため、余裕がある状況。 ・運搬ダンプトラックの不足により日の施工量が制限されている。ダンプトラック単価の上昇に伴
アスファルト合材(再生材)	^	横ばい	3.29	•	均衡	3.07	I	ĺ	1	い、アスファルト合材に転嫁されている。 ・需給は何とか間に合っている。価格 は運賃などの 上昇により全体 的に上昇気 味 ・不足感はない。スポ・外買いで設計 価格の約 120%程度となっている。震災前からの 状況であり、石 油価格の 上昇による影響で今後は 上昇が予 測される
異形棒鍋	1	やや上昇	3.6 1	1	均衡	3.26	1	票	2.20	- 先月からの 値下げ基調が続いている。5月に入っても弱 含みで推移すると思われる。
H形鋼	1	描てみみ	3.52	1	均衡	3.43	尽	かか 闘 不 屈	2.6 7	

						1	ジャー	アンケート結果・	- 霓表	表【11月】
◆建設資材(2/3)										※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。
		価格動向			需給動向			在庫状況		コメント[10月分の回答]
	部月比	現在 (前月に比べて)	数 计 物 约 回 便	前月比	現在	数 計 を	野河比	現在	数面 外出 经	─ (アンケート対 象者や調 査方法等 の違いにより、価格 動向・需給 動向・在 庫状況欄 と内 容が異なる場 合がある。)
杉正角 特1等	⇑	横ばい	3.16	1	均衡	337	1	普通	233	
型枠用合板 塗装品	1	横ばい	3.37	尽	ややひつ道	3.58	1	やや闘不足	2.75	
	1	横ばい	3.30	_	均衡	3.50	1	やや闘不足	3.00	
	尽	やや上昇	3.67	⇑	均衡	3.08			V	
陶器瓦	⇑	横ばい	3.00	⇑	均衡	3.33	1	開開	2.00	_
敷鉄板	1	横ばい	3.43	尽	ややひっ追	3.93	尽	晶不足	3.60	・県内市場にて確保が困難。リースを工事完了後、返却せず長期リースに切り替え各社が確保しているため品薄。他地区から確保する場合、上昇傾向にある輸送費が含まれてくると思われる。・年度末工事が終わったため、余裕がある状況。・全く確保できないため県外(福岡)にて確保している状況。・10月からは年末、年度末竣工工事での需要が増えてくると思われる。
ラフテレーンクレーン	1	横ばい	3.27	尽	ややひつ道	3.64	1	やや唱不屈	3.00	
										・現在、需要は落ち着いているが、今後の工事発注により不足状況となる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
										・県外(三重県・愛知県・佐賀県)、県内(天草)より確保。通常運賃に加え、宿泊費・赴任・帰省・食事補助などの手当ての費用が発生している。
										・不足している状況。熊 本及び城南 の工事の 単価が高くなっていて 玉名 でも高い金 額が要求 されている状況。
										・西回り自動車道 工事や、電源開発 球磨川掘 削工事等 の発注により不 足。 県外 (鹿児島)より確保 している状 況。
ダンプトラック	I	l	l	ı	ı	I	ı	1	I	・不足している。 ・ダンブトラック(3t~ 4tクラス)がリースでも不足している状況。
										・慢性的な不足状態が続いており解体廃材機 出終了まで続くと思われ、加えて九州北部 豪雨の影 響でより深刻化すると思われる。また、価格も上昇値向にある。
										・管内各会社、熊本方面に数台毎出張されており、舗装・路面切削時等一現場で多数必要な場合、不足して日程調整をする必要がある。(合材プラントは出荷できてもダンプトラックが不足する
										為。) ・現在・県南 から2台確 保しているが年内の 契約となっているため、年明け(H29)から県 外より調
										整 中。今後 発注が増えることからさらなる 高騰が予 想される。 ・不足しており、県外 (鹿児島、宮崎)からの調達が 続いている状況。価格上昇しており、確 保が 困難な状況。
										・不足しており、確保出来ない状態。価格は今後上昇すると思われる。 作用 まがぬね ラナボ か かがばも 沖に
										・ 牛皮木土 事かられ シュニの・ホ Ħかのる かん。 ・小型BH(0.1m3~0.2m2クラスがリースでも不 足している状 況。
/*//**/	ı	l	Ī	ı	ļ	ı	ì	ı	I	・機種によって確保困難であり、今後の発注 工事増大 により不足状態 が見込まれる。
										・梅雨は「よいる」となる。 ・梅間はよりは、開始予定としており、現時点での確保はできているが、7月末より不足すると ュヘナム・間に アンプ
										リーAst化がら聞いている。 ・大きさ問わず、熊本県内 での確 保は困難である。今後必要となる機械に関しては、事前に福岡 県 内で、1~2ヶ月前から仮押さえして対応している(リース代は発生)
ポンプ車	I	I	I	ı	ı	I	ı	ı	I	・今後の発注により不足状況となり、確保が困難になると思われる。 ・県外(宮崎県)より確保している。今後は九州全県不足すると思われる。

[11月] 尾湯 アンケート結果ー

建設資材(3/3)

※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

		価格動向			需給動向			在庫状況		コメント【10月分の回答】
	前月比	現在 (前月に比べ て)	数值回 答 平均值	前月比	現在	数值回 答 平均值	前月比	現在	数值回 答 平均值	「(アンケート対 家者や調 食方法等 の違いにより、恤格 動向・需給 動向・任 庫状沈禰と内 谷か異なる場合がある。)
足場材	1	_	_	ı		ı	1	_	-	・夏休み期間での学校の改修工事で需要伸びているが需給は均衡状況。
仮設H形鋼	-	_	_	ı	-	ı	-	—	-	・全く確保できないため県外(福岡)にて確保している状況。
散水車	ı	ı	Ì	ı	Î	l	I	Ī	I	・機材不足。散水車を運転する人材も不足状態。
除雪機械	ı	ı	ı	ı	_	I	I	I	I	・腐食や摩耗が激しく、修理のたびに部 品交換となるために機械にかかる経費 が負担となっている。経費の計上をお願いしたい。
コンクリート設	l	l	l	I	I	I	I	_	l	・コンクリート殻の受け入れが困難である。 受け入れをして頂けないところが多い状況。
切削機	l	I	I	ı	I	I	ı	I	I	・やや不足 状況。3月 末で一 時的に緩和され るが繰 越工事発 注により不足状況 は変わら ない。 価格 は争奪戦 により上昇する と思 われる。
発電機・水中ポンプ	l	1	I	ı	l	ſ	ı	I	l	・今のところスムーズに供給できているが、今後河川水路工事に伴い供給困難に陥ると思われる。現在価格上昇なし。今後、上昇すると思われる。

·建設 労働者(1/2)

※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

コメント【10月分の回答】 (アンケート対象者や調査方法等の違いにより、需給動向欄と内容が異なる場合がある。 需給動 向 働者確保の難易) 現在 前月比 ·张 颧

2.20

か を 困 難

1

型枠工

・エ 事が発注 され始めたので不足。現場はなかなか予定が 立てられない。 ・復 旧工事等 発注工事 が増大しておりひっ迫している。 ・新 規採用募 集を出しても応募が 無く、絶対数 が足りない状況 で元社員を再 雇用(60 才以上)している状況。価格を上げても、確保が困難な状況。

・不 足状態。熊本近郊 (震災関連工事)の 上昇により、先 月より上昇している。 ・新 規採用募 集を出しても応募が 無く、絶対数 が足りない状況 で元 社員を再 雇用(60 才以上)している状況。価格を 上げても、確保が困 難な状況。 ·夏 休み期間を利用した工事 が増えており、人手 不足が続いている。 ·新 規採用募 集を出しても応募が 無く、絶対数 が足りない状況 で元社員を再 雇用(60 才以上)している状況。価格を上げても、確保が困難な状況 2.40 2.22 やや困難 やや困難 1 1

·県 内で手配できず、県外 業者へ手 配しても通 常の1.5~2倍の 費用がか かる。 ·建 築物件の 需要増に影 響され、土木 工事でも不足状況*と*なっている。今後 は市民病 院の立て替えなどの大型 建築物件 の影響で、確保 が困難になると思われ 2.30 やや困難 1

る。 ・新規採用募集を出しても応募が無く、絶対数が足りない状況で元社員を再雇用(60才以上)している状況。価格を上げても、確保が困難な状況。 ・各地域での人材 不足が継続している。 ・新規採用募集を出しても応募が無く、絶対数が足りない状況で元社員を再雇用(60才以上)している状況。価格を上げても、確保が困難な状況。 2.09 やや困難 1

特殊作業 員

鉄筋工

Z,Č,T 左官

				アンケート結果一覧表 【11月】
◆建設労働者(2)	/2)			※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。
響	(労人	需給動 向 (労 働者確保 の難易) ^{数値} 問比 現在 ²⁰ 億	羅別》 数値回 各値回 古	コメント【10月分の回答】 (アンケート対象者や調査方法等の違いにより、需給動向欄と内容が異なる場合がある。)
部 通作業 章	•	か む 翻	2.00	・完全な不足状態。価格については今後上昇すると思われる。 ・人 材不足の為、協力会社に依頼するが、市町村の災害関連工事も発注され金額を上乗せしても確保出来ない状況。今後、上昇すると思われる。 ・人 材不足の為、協力会社に依頼するが、市町村の災害関連工事も発注され金額を上乗せしても確保出来ない状況。今後、上昇すると思われる。 ・県 内他地区より確保しているが、今後保は 困難と考えられる。又、県外(鹿児島)にも要請しているが全(確保できない状態。 ・不足状況にあるが、確保できているが応募がな、賃金などの条件をよくしても応募がない状況。また、上昇前の価格で契約している会社もあり、急な価格上昇は、いろいろなルートで募集をしているが応募がな、賃金などの条件をよくしても応募がない状況。また、上昇前の価格で契約している会社もあり、急な価格上昇は、主にないるが応募がな、賃金などの条件をよくしても応募がない。また、上昇前の価格で契約している会社もあり、急な価格上昇は、主なる。価格を上げたからといってすぐに確保出来るわけでも無い現状もある。 ・熊本県と福岡県で確保出来ているが、今後は不足状況となる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
軽作業員	1	やや困難	2.50	・新 規採用募 集を出しても応募が 無く、絶対数 が足りない状況 で元 社員を再 雇用(60 才以上)している状況。価格を上げても、確保が 困難な状況。
運転手(特殊)	•	か 圏 業	2.30	・慢性的に不足状態。機械は調達可能であるが、オペレーターの不足により不稼働状態。 ・・不足しており、確保出来ない状態。価格は今後上昇すると思われる。 ・常に不足状態。機械は調達可能であるが、オペレーターの不足により不稼働状態。オペレーターも高齢化が進んでいるため来年以降が心配。 ・現在は、県南から確保してるが今後、県全域で工事が発注されるため年内までの契約となっている。来年(H29)からは県外から確保せざるを得ない状況。価格は 今後も上昇すると思われる。 ・期間限定で県外(佐賀)から確保
運転手(一般)	1	やや困難	2.30	
次 通誘 導 員	1	羅 田 や	1.58	・若 干余裕が ある状況。年度末工 事が終わりか けているか と思われる。しかし、人村不足 の状況は変わらず。交 通誘導員 に合わせて施工を行っている状況。・ 岩 干余裕が ある状況。年度末工 事が終わりか けているか と思われる。しかし、人村不足 の状況は変わらず。交 通誘導員 に合わせて施工を行っている状況。・ 場 内から確保しているが、今後は不足状況となる。 ・予 足状況にあり、確保も困難な状況。今後も確保困難になると思われる。 ・受 性的に不足 状態。九州 全域不 足状態につき県 内からの確 保も困難。第3四半期 より第4四半 期にかけ本格化 するにあたり、深刻な不足状態 が見込まれる。 ・災 性 信 明 運 で 他県 へぶ しか これでもり確保 が困難。 ・今後、 年末・年 度末竣工 の 未要 不 で が で の 需要が増 えてくると思われる。 ・移 後、 年末・年 度末竣工 の まれており確保 が困難。 ・今後、 年末・年 度末域工 の まれでおり確保 が困難。 てくると思われる。 ・総 対数が足 りない状況のため、スポット的に警備 保障会社 にな 頼しても人 員確保が 困難である。そのために囲い込みを行って確保しているので余分な費用 が発生している。(施工に必要な期間 以外も常時 確保している 状況を 注視している。 ・希 たましているがなんとか確保 出来ている。4月 以降の 状況を 注視している。 ・森 格あり。年度末工 事が終わりと思われる。 ・森 格あり。年度末工 事が終わりと思われる。 ・森 株あり。 住様 工事が終わりと思われる。 ・森 株あり。 在は、本は、地域、(様)、全にが発達しなる。、特に不足となる。 ・ 電 条件と福岡県 で確保 出来ているが、今後は不足状況となる。 ・ 電 機会社も優性的な 人手を記す なが、今後は不足状況となる。 ・ 言 機会社も優性的な 人手を記す、ましてい 表現 場もある。(協議了 承 済み)。取引価格の 上昇も懸念 されるが、人員が不足している。お金を出しても人がいない状態。
ブロックエ	ı	I	I	・県 内は完全 な不 足。価格も高 騰し始めている。(特 に常 用単価の 高騰) ・不 足状態。個人で請負されている方に当 たっても確保できない状況。
ΥH	ı	ı	ı	・人 手不足により需給がひっ迫している。県 外から人手を確保する会社も出てきている。
石工	ı	I		・不 足している 状況。価 格は今後 上昇すると思わ れる。 ・従 来からの担 い手不足に加 えて不足状況 にある。今後 はさらに確保が困 難になると思 われる。

[3ヶ月先の見通し] アンケート結果一覧表

下表のアンケート結果は、建設資材・建設労働 者の需給・価格動向 等について得られた数値回答 の平均値を各々の判定基 準に基づき判定したものである。<u>なお、アンケート結果として便宜 上、</u> 数値回 答平均値 を区分して一つの判 定を記 載しているが、区分の 境界ではわず かな数 値の違いで判定 が変動する場合がある。また、各 アンケート対象者からの回答は、需要側・供給側の 立場 や、工 事条件・取 引条件の 違い等の回 答者の個 別事情を有しており、必ずしも地域の実情を網羅し、代表したものではない可能性があり、このアンケート結果 の取り扱いには注意する必要が あ

◆建設資材							◆建設労働者【『	【暫定値】
		価格動向			需給動向			
	前月比	3ヶ月先	数值回答 平均值	前月比	3ヶ月先	数值 回答 平均 值	日本	前月出
セメント	•	横ばい	3.15	•	均衡	3.42	型枠工	1
生コンクリート	≅	横ばい	3.49	•	更らわみず	3.80	左官	1
伦	⊼	横ばい	3.43	•	均衡	3.35	とびエ	1
砕石	•	横ばい	3.48	•	均衡	3.40	鉄筋工	1
再生砕石	⇧	横ばい	3.48	•	均衡	3.47	特殊作業員	⇧
アスファルト合材(新材)	•	やや上昇	3.52	•	均衡	3.32	普通作業員	1
アスファルト合材(再生材)	•	やや上昇	3.61	⇗	均衡	3.50	軽作業員	1
異形棒鋼	≅	横ばい	3.43	•	均衡	3.35	運転手 (特殊)	1
H形鍋	•	불구수수	3.57	K	更らわみや	3.52	運転手(一般)	1
杉正角 特1等	•	横ばい	3.42	≧	更らわみず	3.58	交通誘導員	1
型枠用合板 塗装品	•	横ばい	3.42	×	更らわみや	3.68	※表中の矢印は、先月からの	も月からの
構造用合板 特類	•	横ばい	3.40	K	もやひっ道	3.80		
軽油	ĸ	やや上昇	3.59	•	均衡	3.23		
陶器瓦	•	横ばい	3.11	•	均衡	3.22		
敷鉄板	•	格や上昇	3.64	•	もやひっ道	4.07		
ラフテレーンクレーン	•	별구하다	3.55	•	割りとなる	3.82		
	# # # ()	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 				-	

※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

)	需給動 向 (労 働者確保 の難易)	
職種	前月比	3ヶ月 先	数値回 答 平均 値
型枠工	1	藤堅分や	1.80
左官	•	藤図分分	2.00
とびエ	1	藤図分々	2.10
鉄筋工	•	藤図分や	2.00
特殊作業員	•	兼図分分	1.91
普通作業員	•	藤図分分	1.75
軽作業員	•	藤図分分	2.20
運転手 (特殊)	•	神を困難	2.00
運転手 (一般)	•	藤図分分	1.90
交通誘導員	•	難区	1.50

※表中の矢印は、先月からの変動(判定基準の表における上下)を表す。

			11月	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	やや上昇	やや上昇	横ばい	横ばい	横ばい	やや上昇	横ばい	横ばい	横ばい			11月	拉	むらびつは	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	ややひつ迫	均衡	均衡	均衡	更ら244	かんひつ迫	
			10月	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	やや上昇	やや上昇	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい]		月0月	立	ややひつ道	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	
			月6	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	やや上昇	やや上昇	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	•		月6	立	り	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	
			8月	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい			8月	な	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	
			ĦL	横ばい	格子を	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	格が上昇	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい			Ħ2	公	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	
		H29	畄9	横ばい	横ばい	哲丁아아	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	が制	横ばい	いり	横ばい		H29	任9	拉衛	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	
			日3	横ばい	横ばい	はばり	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	はい	横ばい	が制	横ばい			5月	小小	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	対衡	刘衡	刺魚	対衡	均衡	
			日4	横ばい	横ばい	はばり	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	やや上昇	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	はばい	横ばい	が制機	横ばい			4月	小小	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	更くりなみ	刘衡	刺魚	対衡	均衡	
覧表[経過]	必要がある。		3月	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	やや上昇	やや上昇	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	格구하	横ばい	やや上昇	哲工分分			3月	立衛	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	更くひみみ	ややひっ追	
	及いこ注意する		2月	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	やや上昇	やや上昇	横ばい	横ばい	横ばい	哲 干みみ	横ばい	横ばい	格工分分			2月	立	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	更く/244	むやひつ迫	
アンケート結果ー	説明同様 に取り		月1	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	やや上昇	やや上昇	横ばい	横ばい	横ばい	格工中	横ばい	横ばい	横ばい			月	ひ	め	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	中でひかみ	均衡	
アンケ	前ページ迄の言		12月	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい		やや上昇	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	格子の	横ばい			12月	な	50	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	中でひかみ	むらひかみ	
	。なお、判定は、		日11	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	皆不아아	横ばい	横ばい	横ばい			11月	拉衛	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	更くりなみ	均衡	
	めたものである		10月	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	やや上昇	横ばい	横ばい			月0月	ひ御	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	
	- 結果をとりまと	H28	月6	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	やや上昇	横ばい	横ばい		H28	月6	を	功衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	
	て、毎月判定した		8月	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	ります。	皆干아아	機ぽい	横ばい			8月	ひ	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	更く2044	均衡	均衡	
	各動 向等につい		Ħ1	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	皆干みみ	格工分分	横ばい	横ばい			1,B	もか織和	り	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	更らわみみ	均衡	均衡	
	1者の需約・価格		日9	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	横ばい	哲工中中	やや上昇	横ばい	横ばい			6月	拉衛	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	むやひつ道	均衡	均衡	
	- 下表は、建設資材・建設労働者の需給・価格動向等について、毎月判定した結果をとりまとめたものである。なお、判定は、前ページ迄の説明同様に取り扱いに注意する必要がある。 ◆建設資材(価格動向)			セメント	生コンクリート	他	砕石	再生砕石	アスファルト合材(新材)	アスファルト合材(再生材)	異形棒鐗	H形鋼	杉正角 特1等	型枠用合板 塗装品	構造用合板 特類	軽沖	陶器瓦	敷鉄板		【◆建設資材(需給動向)			4.×4	年コングリート	仓	砕石	再生砕石	アスファルト合材(新材)	アスファルト合材(再生材)	異形棒鋼	H形 鋼	杉正角 特1等	型枠用合板 塗装品	構造用合板 特類	軽沖	陶器瓦	敷鉄板	ラフテレーンクレーン	

アンケート結果一覧表【経過】	8明同様に取り扱いに注意する必要がある。
オンオ	下表は、建設資材・建設労働者の需給・価格動 向等について、毎月判定した結果をとりまとめたものである。なお、判定は、前ページ迄の説明同様に取り扱いに注意する必要がある ◆建設資材(在庫状況)

	11月	1	ı	票票	やや 品不足	明明	ı	ı	更調	やや 品不足	普通	やや 品不足	やや 品不足	ı	普通	品不足	やや 品不足			11月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難
	10月	l	I	元	やや 品不足	計通	1	I	票票	票票	票通	수수 品不足	수수 品不足	1	普通	やや 品不足	수수 믦不足			10月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難
	日6	I	I	制成	수수 믦不足	票通	1	I	聖理	票通	要是	要是	要是		要是	要是	유수 매不足			9月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	類図み み	類図み み	類図み み	乗困み み	乗困み み	華国 みみ
	8月	ı	ı	押	やや品不足	罪	1	ı	押	票	票運	やや品不足	수 사 마 자 교	1	景運	元	景運			8月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難
	月7	ı	ı	制成	やや品不足	票课	1	ı	{10H # P	票票	票通	票	수수 유구足	1	華通	票	華通			7月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難
67H	任9	1	ı	元	華通	票课	1	ı	頭頭	票课	票運	票票	やや品 不足	ı	票	票	수수品 不足		H2 9	6月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	票運	やや困難	やや困難	やや困難
	5月	ı	ı	制成	票票	票课	1	ı	興	票课	票	票	やや品不足	1	票	票	票			5月	やや困難	やや困難	畑	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難
	4月	1	ı	押	やや品不足	やや品不足	1	ı	軍	票票	票	票票	やや品不足	1	華通	押	やや品不足			4月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	困難
	3月	ı	ı	押	やや品不足	やや品不足	1	ı	押	票票	やや品不足	票	豐	1	元	やや品不足	やや品不足			3月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや 困難
	2月	ı	ı	押	やや品不足	やや品不足	I	ı	押	罪	やや品不足	票票	수수 매 주 문	1	票票	やや品不足	やや品不足			2月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや 困難	やや困難	やや困難	やや困難	困難
	1月	ı	ı	14H Bid	やや品不足	やや品不足	1	ı	押	やや品不足	やや品 不足	票	やや品不足	1	元	やや品不足	やや品 不足			月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	困難
	12月	ı	ı	(viii) (a)	票	票	Ì	ı	神	票	수수 유 不足	수수 유구도	선수 品 不足	1	景運	선수 매 不足	やや品不足			12月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや 困難	やや困難	やや困難	やや困難	困難
	月11	ı	1	1mi and	やや品不足	やや品不足	1	1	聖理	票票	やや品不足	票票	하수 마 자 도	ı	票運	やや品不足	やや品 不足			11.B	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難
	月01	1	ı	制時	華通	票	ı	ı	押	票票	票運	票票	票運	1	票票	乗	品不足			10月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難
H28	月6	1	ı	押	票票	計	ı	ı	押	票票	計通	景運	수수 유 不足	-	華通	無	수수 유 주 문		H28	9月	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難	やや困難
	8月	1	ı	制品	票票	華通	-	ı	理	票票	票票	票票	やや品不足	-	票票	票	やや品不足			8月	票票	無無	やや困難	元	更	やや困難	華通	華通	華通	やや困難
	Нī	1	ı		票票	計通	1	ı	票票	票票	四日	景通	やや品不足	ı	普通	普通	やや品不足			ЯΊ	軍軍	票票	やや困難	押	計画	普通	景通	普通	普通	やや 困難
	月9	ı	ı	剰	票票	- 最通	1	-	やや品不足	票票	最	票票	やや品不足	-	普通	普通	普通			6月	票票	更無	理	買罪	票通	普通	最	普通	普通	やや困難
		セント	生コンクリート	含	砕 石	再生砕石	アスファルト合材(新材)	アスファルト合材(再生材	異形棒鋼	一形鋼	杉正角•特1等	型枠用合板 塗装品	構造用合板 特類	軽油	陶器瓦		く ラフテレーンクレーン				型枠工	左官	ŁűI	鉄筋工	特殊作業員	普通作業員	軽作業員	運転手(特殊)	運転手(一般)	交通誘導員

熊本地震被災による労働力の需給状況調査

〈復旧事業円滑化官民ネットワーク〉

平成29年10月31日時点

		現 状		今後の見通し
	需給状況	状況分析∙課題	見通し	分析•懸念
解体	普通 ↓ 普通	県外業者の協力で均衡状態	やや 困難	年度末の大型公共工事の発注い かんでは厳しくなる
鳶	や難→や難	組合でのやり取りが厳しく、可能な応援がまれに単発である程度である。 県外も非常に忙しくて、期待できない時期にさしかかっている。 施工予定のズレが発生するので、労務段取りが取りずらい傾向にある。	やや 困難	単発でも応援をもらうしか打つ 手がない。 同時にまめに県外同業者に連絡 を取り少しの空きを期待するほか ない。
瓦	類→や難	やっと緩和しつつある。 市内中心部付近では被害家屋も一割弱の状況になっており各地域に於いても2割程度に減少しつつある。 今後は各地の組合員の状況も落ち着きつつあり、相互の応援体制を整理し補修家屋の修理を一刻も早く予定でいる。	やや 困難	今後の気象状況にもよるが、特別な状況にならない限り、徐々に沈静化していくものと思われる。ただ、新築物件が大変なスピードで建築されており、今後も多忙を極める事により、労働者不足は否めない。
11/16 聞き取り	1月) 明内でも 応急修理 に完了す	屋でそのままとなっているのは全体の1, 要する。 た震災対応が落ち着いてきた地区もありる 理を優先して行っているが、これから寒ら けるかは微妙なところで、件数的には新り を得ない。	そこからの くなり作業	応援もある。 効率が落ちるので、年度末まで
左官	困難 ↓ 困難	熊本県の会員同士で応援のやり 取りをし、対応している。	困難	益々忙しくなり、応援もできな くなると思われる
塗装	困難 ↓ 困難	震災以前からの技能士不足、若 手入職者の減少などにより工事が 有っても受注が難しい状況です。 復旧工事等の影響もあり技能士 が不足しています	困難	民間の復旧工事や新築工事が重なり、技能士不足解消は難しそうです。 今後もしばらくは、このままの 状態が続きそうです。
11/16 聞き取り	ない。 ・応急修理 組合がる	の入職がないため人手は不足しているが! 里については、半壊したマンションの住民 まだあり、このままでは年度末までの完成 同けのガイダンスを実施しているが高卒生 いまう。	民の同意が 成は到底無	得られず工事着工が出来ない管理 理である。

				 今後の見通し
	重 松化四		日洛口	I
	需給状況	────────────────────────────────────	見通し	│ 分析·懸念
板金	困難 ↓ 困難	職人不足。 今後も慢性的に続きます。	困難	仕事の量に対し、職人の数が釣 り合っていない。 今後ますます職人不足になる。
室内	普通 → 困難	各店人材確保に往生している。	困難	躯体工事の遅れも重なり、人材 確保も難しい このまま年度末工事等も重なり 更に厳しくなる模様
11/16 聞き取り	・北海道 <i>/</i> ・遠来組/	物件では大手ハウスメーカーが各地からいらは昨年から来ているようだ。 には、一人5万円程度は掛かり、日当の ら年度末にかけてますます多忙を極める。	折り合いが	付かない。
鉄筋	やや 困難 ↓ 困難	困難としていますが、非常に困 難な状況です。 県内労働者不足が続いている。	困難	困難としていますが、非常に困 難な状況です。 県内労働者不足が続いている。
11/16 聞き取り	後 2 を ・ 地で 今 公 場 あ 後 共 表 、 工 環 り 明 場 に り の に り の り り り り り り り り り り り り り り	どこを探しても応援を出せるところはな3ヶ月は大丈夫かもしれない。ペコンは事前に対応できるかを聞くことが 道路、庁舎、JR熊本駅再開発、マンション 事は各発注者間で発注のタイミングを調整 業部隊と工場作業部隊があるので臨機にありしている。	もなく、「。 ン、防災拠 整してずら	どうにかしてくれるだろう」との感覚 点建設など多数発注される予定。 してもらいたい。
型枠	やや 困難 → 困難	職人の手配が困難な状況であ る。	困難	仕事の量が急激に増え始めた。 飽和状態である。
11/16 聞き取り	完 記 記 記 記 記 記 記 記 は は 発 い は の の の の の の の の の の の の の の の の の の	には一端現場に入るとその現場が終了する物件に入るようにしている。 も物件に入るようにしている。 東北から応援に行っても良いとの話は聞 事がどんどん増えているが、今後どれく 面が上がっても人がいないことにはどう い。 7名の入職があったが今年は0名。地元	くが、実際 らいの仕事 しよ う もな	の必要額まで詰めて話をしたことは 量になるのか見当もつかない。 く、余裕のある工期にして作業する
大工 (工務店)	やや 困難 J 困難	10月度も基礎工事・板金・大工工事について職人不足の状況は変わらず。 着工のずれ込み及び工期延長と色々な問題も発生している。 又特に窯業系サイディングの職人不足が大きく工事の延滞にもなっている。	困難	10月同様、職人不足が大きな課題(大工・左官・内装・外壁)又現場管理者不足も現場遅れて等の要因となっている。


現状 需給状況の「↓」は29年4月末・29年10月末の変化を示すものである。

熊本地震被災による資材・労働力の需給状況

	見通し	ひつ道	むっていっ	緩和	均衡	やや緩和	均衡	かっている	ひっ追	むっていっ		I	ひっ追
	10月	かわいつ道	むっていっ	緩和	均衡	やや緩 和	均衡	均衡	均衡	むちひつ道		I	ひつ追
	9月	均衡	ややひっ迫	緩和	均衡	やや緩和	均衡	均衡	均衡	均衡		Ι	ややひっ追
	8月	均衡		继和	均衡	中分緩和	り	緩和	り	配ってひみ み		_	ややひっ道 ややひっ追 ややひっ追
	7月	均衡		緩和	均衡	やや緩和	均衡	緩和	均衡	配っている		I	東 いっけい
H2 9	6月	均衡	ややひっ追	緩和	均衡	均衡	均衡	緩和	均衡	むっぴっぱ		1	均衡
	5月	均衡	ひっ迫	緩和	均衡	均衡	均衡	やや緩和	均衡	郎 C244		-	郎っぴ
	4月	均衡	更くひみ み	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	東 C244		I	やや緩和
	3月	cがな 道	むらひみみ	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡		ļ	郎 Cがみみ
	2月	で 2 位 が が	ひつ道	緩和	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡		-	原 C22分分
	1月	たわひ 単	ひつ迫	緩和	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡		I	郎 CV2みみ
	12月	で2044 ご	ひっ迫	緩和	均衡	均衡	均衡	かやひっ 道	均衡	均衡		I	緩和
	11月	cかなか 通	ひっ迫	緩和	均衡	均衡	均衡	たわひっ 道	均衡	均衡		ı	緩和
	10月	やや緩和	原 C1244	緩和	均衡	均衡	-	均衡	郎 C12みみ	均衡		I	緩和
H28	9月	必	ややひっ 道	緩和	ややひっ 道	必	ı	均衡	ややひっ 迪	均衡		ı	緩和
	8月	均衡	ひっ迫	緩和	緩和	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	均衡	ひっ迫	緩和
	7月	たわひ 道	ややひっ追	緩和	緩和	均衡	かわひっ 道	均衡			I	ı	やや緩和
	6月	郎 つ ね み	む やひっ追	緩和	緩和	均衡	均衡	均衡			I	ひっ追	均衡
	業種	解体	黨	互	左官	塗装	板金	室内	鉄筋	型枠	大工 (建築連合)	大工 (建築労組)	大工 (工務店)
		H28	A Per Data A	種 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 解体 ややひっ追 当 当 当 当 当 当 5月 6月 7月 8月 9月 10月 職体 ややひっ追 かやひっ追 かやひっ 中やひっ 中へひっ 中へひっ 中へひっ 中へひっ 中へひっ 中へひっ 中へひっ <t< td=""><td># 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 11月 12月 11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 11月 12月 11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10</td><td>様 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 解体 ややひっ追 かやひっ かやひっ かやひっ かやひっ かやひっ かやひっ かんひっ かんのっ かんのっ</td><td>種 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 解体 ややいっぱ ややいっぱ ややいっぱ ややいっぱ からいっぱ かられっぱ からいっぱ かられっぱ かられっぱ<td>様本 ともひっぱ ややひっぱ かやひっぱ ややひっぱ ないが 緩和 緩和</td><td>権 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 解体 ややいっ追 ややいっ追 ややいっ 中やいっ 中へいっ 中やいっ 中へいっ 中へいっ</td><td>種本 たいっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ は いっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ いっぱ かくび いっぱ かくび いっぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いん</td><td># C F</td><td># H28</td><td># 6月 7月 8月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 11月 12月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 11月 12月 11月 12月 1月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 2日 2日</td></td></t<>	# 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 11月 12月 11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 11月 12月 11月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10	様 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 解体 ややひっ追 かやひっ かやひっ かやひっ かやひっ かやひっ かやひっ かんひっ かんのっ かんのっ	種 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 解体 ややいっぱ ややいっぱ ややいっぱ ややいっぱ からいっぱ かられっぱ からいっぱ かられっぱ かられっぱ <td>様本 ともひっぱ ややひっぱ かやひっぱ ややひっぱ ないが 緩和 緩和</td> <td>権 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 解体 ややいっ追 ややいっ追 ややいっ 中やいっ 中へいっ 中やいっ 中へいっ 中へいっ</td> <td>種本 たいっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ は いっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ いっぱ かくび いっぱ かくび いっぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いん</td> <td># C F</td> <td># H28</td> <td># 6月 7月 8月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 11月 12月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 11月 12月 11月 12月 1月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 2日 2日</td>	様本 ともひっぱ ややひっぱ かやひっぱ ややひっぱ ないが 緩和	権 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 解体 ややいっ追 ややいっ追 ややいっ 中やいっ 中へいっ 中やいっ 中へいっ 中へいっ	種本 たいっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ は いっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ は いっぱ いっぱ かくひ いっぱ かくび いっぱ かくび いっぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いんぱ いん	# C F	# H28	# 6月 7月 8月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 11月 12月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 11月 12月 11月 12月 1月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 10月 10月 2日

i														_
<ケーム>		見通し	やや困難	やや困難	やや困難	困	墨	墨	墨	墨	圏		ļ	困難
<復旧事業円滑化官民 ネットワーク>		10月	普通	やや困難	やや困難	困難	困難	困難	困難	困難	困難		I	困難
事業円 滑(9月	やや容易	困難	やや困難	困難	困	困	やや困難	困難	困難		ļ	困難
<復旧:		8月	やや容易	やや困難	困難	困難	困	困	票	困難	羅		ļ	困難
		7月	豊通	やや困難	困難	困難	エ	困	やや容別	困	エ		ļ	困難
	H29	6月	票通	やや 困難	困難	困	エ	エ	やや容易	羅	やや 困難		I	困難
		5月	最通	やや困難	困難	困難	器	器	票票	羅	やや困難		I	困難
		4月	豊通	やや困難	困難	困難	エ	困	無通	やや困難	やや困難		l	やや困難
		3月	票通	困難	困難	困	エ	エ	無	やや 困難	無		I	困難
		2月	最通	困難	困難	困難	エ	エ	羅	やや困難	羅		l	困難
		1月	豊通	困難	困難	困難	困	困	困	やや困難	羅		l	困難
、(5容易)		12月	やや 困難	困難	困難	困難	エ	エ	やや 困難	やや 困難	田		I	困難
や容易、億		11月	やや困難	困難	困難	困難	器	器	やや困難	羅	羅		l	困難
③普通、④やや容易		10月	やや困難	困難	困難	困難	困	ı	票	困	やや困難		l	困難
٠,	H28	9月	やや 困難	困難	困難	困難	困	ı	無	田	更無		l	困難
(① 困難、②やや困難.		8月	藤国みみ	困難	華図	藤国みみ	困難	やや困難	票票	羅堅	要是	要是	羅羅	やや困難
(① 困難,		7月	困難	困難	困難	乗国 やみ	エ	羅	票			I	エ	困難
九		6月		やや困難	華図	万 や 困難	やや困難	おや困難	要是			I	羅羅	困難
(2)労働力	/	種	解体	শ	瓦	左官	染	板金	超内	鉄筋	型枠	大工 (建築連合)	大工 (建築労組)	大工 (工務店)
ت		無										, S	**	

「復旧事業円滑化官民ネットワーク」

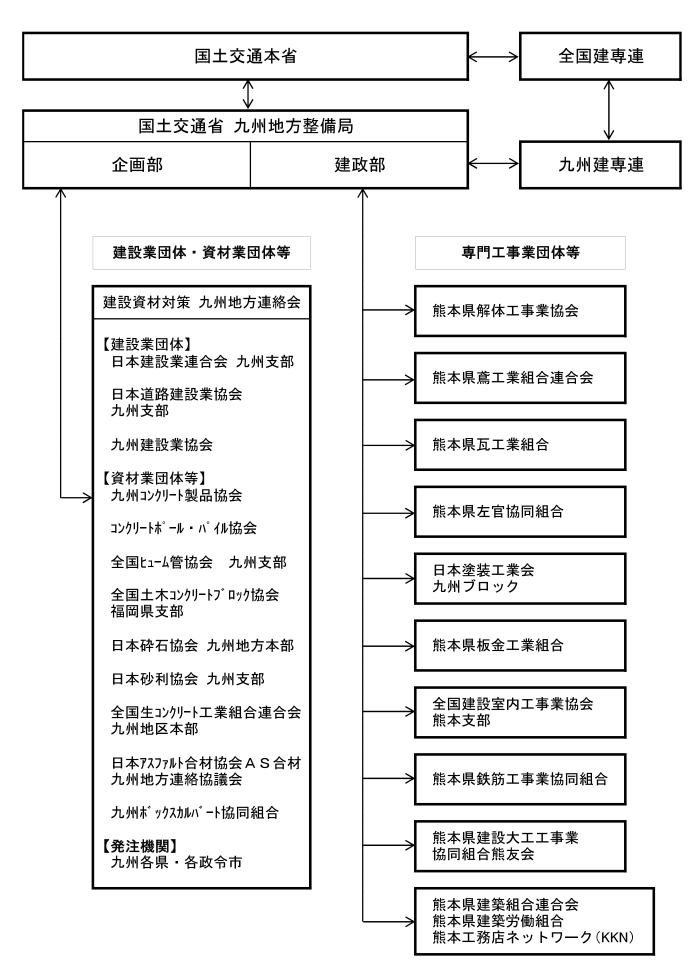

【議題5】

「円滑な施工確保対策について」

- ①国土交通省九州地方整備局
- ②農林水産省九州農政局 · 九州森林管理局
- ③熊本県
- 4)熊本市


熊本地震の復旧・復興事業における 不調不落対策について



国土交通省


Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

熊本地震の復旧・復興事業における不調不落対策について



■国土交通省における取組

- ○より適切な予定価格の設定
- ・『復興係数』の引上げ(阿蘇地域及び上益城地域における土木工事の共通仮設費率の引上げ (1.1→1.4)) →熊本県が発注する工事においても同様の措置を適用
- 地方公共団体への技術指導等の支援
 - ・熊本県が設置する「災害復旧推進チーム」へ九州地方整備局による技術指導等の支援
 - ・砂防等特定工種における見積活用方式や柔軟な設計変更等に関する技術的支援 等
- ○「『営繕積算方式』活用マニュアル【熊本被災地版】」の拡充(発注時に想定していない道路通行止め 等による資機材・建設機械の運搬費の増加分が契約変更の対象であること等を明確化)及び営繕積 算方式の普及・促進




■熊本県における取組(上記以外)


- 本庁・被災振興局(阿蘇・上益城・県央)メンバーで構成する「災害復旧推進チーム」の設置による 事業実施体制の強化
- 工事監理連絡会(三者協議会)、設計変更協議会の定例開催
- 契約変更時の歩掛見積りの徴収

■発注機関等の連携による取組


○ 引き続き、国、熊本県、県内の市町村、建設産業団体等により構成される「熊本地震等復旧・復興工事情報連絡会議」や「復旧事業円滑化官民ネットワーク」を設置し、市町村等の取組み支援や県内の建設資材の価格や需要動向を情報共有等を実施

地域別不調不落の状況と今後の発注見通し




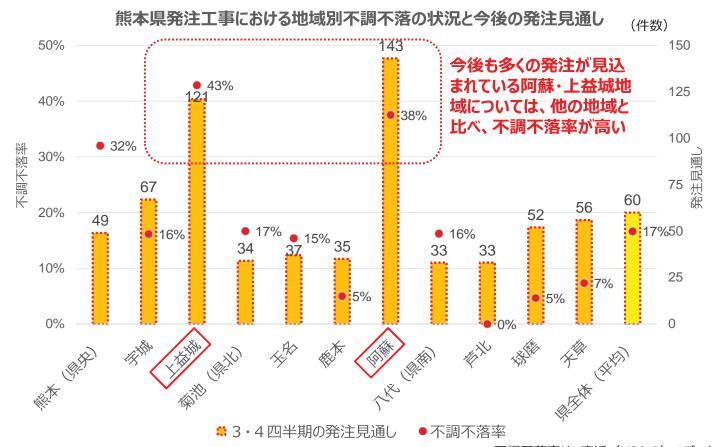


熊本地震による交通条件の変化



主要道路の通行止め等が、建設機械等の運搬にも影響

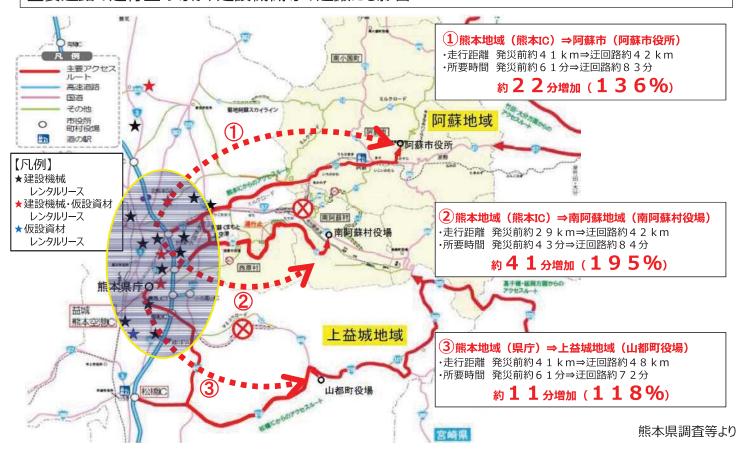

熊本地震における施工確保対策について(1/2)




■国土交通省における主な取組

■四工又進刊に	.のいる土な収組	
5	対策	内容
土木工事積算	復興歩掛	○土工の日当たり作業量が20%低下する補正の設定 【対象工事】 熊本県内発注の土工関係歩掛を使用する工事 【対象期間】 平成29年2月1日以降に契約する工事
	復興係数	○間接工事費の補正 共通仮設費: 1.4倍 (阿蘇・上益城地域)、1.1倍 (その他県内) 現場管理費: 1.1倍 【対象工事】 熊本県内発注の全ての土木工事 【対象期間】 平成29年2月1日以降に契約する工事 ※阿蘇・上益城地域の共通仮設費については、平成29年11月1日以降に契約する工事から適用
営繕工事積算	・小規模改修工事 対応 ・一般管理費の引 き上げ 等	○「営繕積算方式」活用マニュアル(熊本被災地版)を作成し、被災地の実情を踏まえた積算(小規模長期工事における共通仮設費・現場管理費の加算)や一般管理費等率の引上げについて普及・技術的支援 ○発注時に想定していない道路通行止めによる資機材・建設機械の運搬費の増加分が契約変更の対象であること等を明確化し、マニュアルを拡充
労務単価		○被災地労務費モニタリング調査の実施(調査結果に応じた機動的な 単価改訂)
技術的支援		○熊本県が設置する「災害復旧推進チーム」へ九州地方整備局による 技術指導等の支援 ○砂防等特定工種における見積活用方式や柔軟な設計変更等に関す る技術的支援

赤書き: 今回 (H29.10.25) 新たに措置を講じるもの

熊本地震における施工確保対策について(2/2)



■熊本県における主な取組


Ż	対策	内容
土木工事積算	復興歩掛	○土工の日当たり作業量が20%低下する補正の設定 【対象工事】 県内発注の土工関係歩掛を使用する工事 【対象期間】 平成29年2月1日以降に契約する工事
	復興係数	○間接工事費の補正 共通仮設費: 1.4倍(阿蘇・上益城地域)、1.1倍(その他県内) 現場管理費: 1.1倍 【対象工事】 県内発注の全ての土木工事 【対象期間】 平成29年2月1日以降に契約する工事 ※阿蘇・上益城地域の共通仮設費については、平成29年11月1日以降に契約する工事から適用
設計変更		○契約変更時の歩掛見積りの徴収
実施体制		○本庁・被災振興局((阿蘇・上益城・県央)メンバーで構成する「災害復旧推進チーム」の設置による事業実施体制の強化○工事監理連絡会(三者協議会)、設計変更協議会の定例開催

赤書き: 今回(H29.10.25) 新たに措置を講じるもの

■発注機関等の連携による取組


- 国、熊本県、県内の市町村、建設産業団体等により構成される「**熊本地震等復旧・復興工事情報連絡会議**」 や「**復旧事業円滑化官民ネットワーク**」を設置し、市町村等の取組み支援や県内の建設資材の価格や需要 動向等を情報共有
- 国土交通省及び熊本県において、土工・コンクリート工の施工状況等を調査し歩掛等の改定について検討

【参考】大規模地震災害における復興係数・復興歩掛



		東日本大震災	熊本地震
	適用時期	H26.2.3	H29.2.1
省印及米	対象工種	全ての土木工事	全ての土木工事
復興係数 間接工事費(共通仮	対象地域	被災3県	熊本県内
設費、現場管理費)を 補正 	補正率	共通仮設費: <u>1.5</u>	共通仮設費: <u>1.1</u> 今回 <u>1.4</u> (<u>M29.11.1~)</u> (阿蘇·上益城)
		現場管理費: <u>1.2</u>	現場管理費: <u>1.1</u>
	適用時期	H25.10.1	H29.2.1
復興歩掛	対象工種	土工、コンクリート工 (32工種)	土工 (3工種)
土工関係の歩掛の日当 たり標準作業量を補正	対象地域	被災3県	熊本県内
	補正率	土工:標準作業量を <u>20%低減</u> コンクリート工:標準作業量を <u>10%低減</u>	土工:標準作業量を <u>20%低</u> <u>減</u>

熊本県における各地域振興局の管内

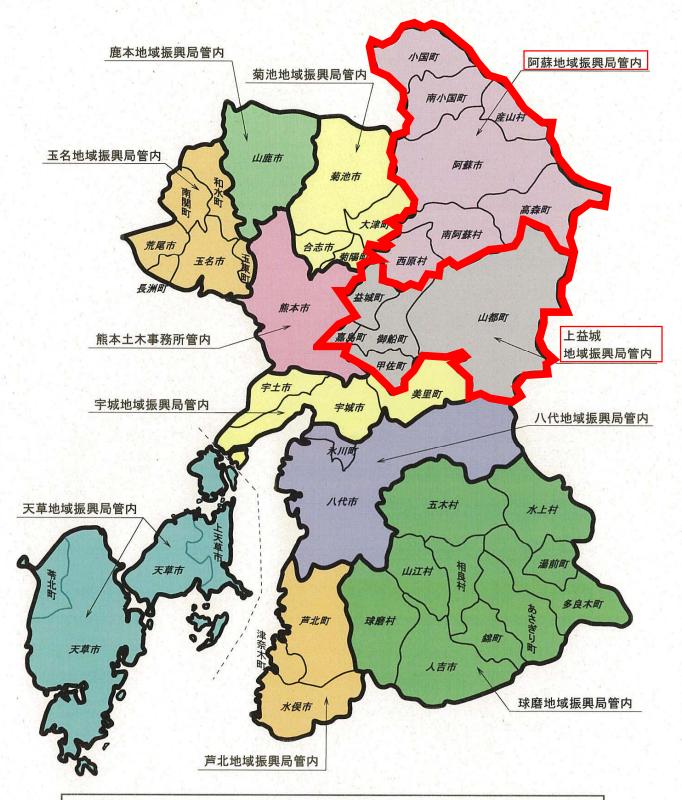

※平成25年4月1日以降、熊本県におきましては「広域本部体制」となっております。


〇県央広域本部管内:熊本土木事務所管内、宇城地域振興局管内、上益城地域振興局管内

〇県北広域本部管内:菊池地域振興局管内、玉名地域振興局管内、鹿本地域振興局管内、阿蘇地域振興局管内

〇県南広域本部管内:八代地域振興局管内、芦北地域振興局管内、球磨地域振興局管内

〇天草広域本部管内:天草地域振興局管内

『営繕積算方式』活用方式マニュアル【熊本被災地版】の拡充



- 熊本地震の被災地における公共建築工事の円滑な施工確保のために、**復旧工事の特徴を捉えた** 『営繕積算方式』活用マニュアル【熊本被災地版】を作成。(H29.1)
- 今般、公共建築工事の復旧工事が本格化している被災地の実情を踏まえ、以下の取組について、 当該マニュアルを拡充し、地方公共団体等に対して普及・促進を図る。

1. 適切な契約変更の実施

被災地の実情:道路の被災により運搬ルートが迂回を強いられる場合がある

- > 道路通行止め等による資機材・建設機械の運搬費の増加分が契約変更の対象であること等を明確化
 - ※ 当初想定していた地域(工事現場と同一の県内等)からの調達であっても、道路通行止め等により 工事現場までの運搬距離が大きく変わった場合、契約変更の対象であることを明記
- 上記の場合を含め、遠隔地からの資材・労務確保等に要する費用の契約変更について、 手続きの流れを明確化

2. 受発注者相互の業務の効率化 被災地の実情: 小規模改修工事でも書類作成に多くの時間が割かれている

- ▶ 工事書類の簡素化、作成の効率化に向けた取組を明確化
 - ※ 契約図書で明示した**書類について「何をどこまで省略するか」を受発注者間で協議**すること、 及び**発注者が施工計画書の作成例を受注者に提示**する取組を明記

公共建築相談窓口



相談窓口について

○官庁営繕部では、公共建築に関する技術的な相談を広く受け付けるための窓口を開設

〇平成14年度から、公共建築に関する窓口を以下に統一的に設置

九州地方整備局 営繕部 計画課

課長補佐(092-476-3535)

保全指導·監督室 室長補佐(092-476-3539)

能本営繕事務所


技術課長(096-335-6122)

鹿児島営繕事務所

技術課長(099-222-5188)

談 者 等 相

- 〇平成28年度は、**2.602件**の相談に対応 (平成27年度は2.488件の相談を受け付け)
- 〇公共機関からの相談が全体の約8割。



相談内容等

- 〇主な相談内容
 - •企画•予算措置
 - ・発注・実施(設計、積算、入札手続き、工事監理)

 - 官庁営繕に関する技術基準の運用等
- ○情報提供可能な直轄営繕工事の取組
 - 適正な予定価格の設定方法
 - 適切な工期設定の考え方
 - ■適切な設計変更
 - 施工時期の平準化等



円滑な施工確保対策について

九州農政局では、復旧・復興工事等の確実な執行を図るため、入札・契約手続きの実施に当 たっては、復旧・復興係数の導入などの対策を実施。

	項目	実施概要
-	復旧・復興係数の導入	平成29年2月1日以降に入札手続きを開始する工事等を対象に、熊本地震の復旧・復興事業等における積算方法(土工関係歩掛の20%補正や共通仮設費率・現場管理費に補正係数1.1を乗じる)に関する試行を開始。 更に、平成29年11月1日以降に入札手続きを開始する、阿蘇及び上益城地域で実施される工事を対象に、共通仮設費率に補正係数1.4を乗じることとする追加対策を実施。
Ø	: 適切な発注ロットの設定	地域企業の活用に配慮しつつ、地域の実情に応じて、発注ロットの大型化を図り、建設技術者の一層の効率的な活用を推進。
က	3 工事積算方法の見直し	施工箇所が複数あり、その点在箇所が1km程度を超え、複数の施工箇所がある工事について、 工事個所毎に間接工事費の算出を可能とした。
4	- 簡易エ型適用範囲の拡大	技術提案を求めない総合評価落札方式(簡易エ型)の適用範囲を拡大し、入札手続きに要する 期間を短縮。
Ŋ	5 適切な設計変更	遠隔地から労務者や資材調達が必要となった場合、掛り増し経費を反映した設計変更を行うことを可能とした。
9	う入札参加要件の緩和	入札参加条件として求める施工実績については、「工種」のみを条件とし、施工規模を求めない こと。また、技術者に求める施工実績について、「土工」等の大括りな工種設定を推進。
7	, 見積活用方式の適用	標準積算と実績価格の乖離が想定される工事については、「見積活用方式」を活用すること。 (当該入札に参加する者から、当該入札に係る工事の全部または一部の見積りを徴収し、適正な予定価格を定めることを可能とした。)
00	3 適切な工期の確保	余裕期間の設定、準備期間(40日)の確保など、適切な工期の確保を推進
တ	・その街	・発注予定情報の一元化・メールマガジンによる調達情報の発信

шК	
腨	
畑	
יבם	
Ипп	
甽	
·-	
箑	
/	
нх	
ĮΧ	
₩	
К	
٠.	
٠.	
K H	
H	
H	
٠.	
一世	
一世	
一世	
本県土:	
本県土:	
本県土:	
一世	

Ц	Į
Ž,	$\stackrel{\sim}{\times}$
严	7
6	S
£	3
اد	Ũ
č	$\bar{\ }$
7	2
Ļ	K
Ŀ	Щ
F	Ŧ
Ų	Ę
7	7
7	S
₩	₩
H	4
in	ų.
) III	
o	<u> </u>
×	₹
8.木间一六分之事《明油卜事人按卜好历人七分人的给	ľ
N	G
+	_
?	<u>ر</u>
7	ï
÷	
Ш	Ľ
k	4
ή.	<u>י</u> נט:

	+	
	人和制度	施工催保対策(○国の対策を適用、●県独目の対策)
第1弾 (H28.10~) ①入札参加機会の拡大 ②発注のスピード化	- ①発注標準の見直し	○遠隔地からの建設資材・仮設材の調達に伴う設計変更(H28.10~) 遠隔地から資材を調達する場合は輸送に係る費用を設計変更で対応 〇地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更 (H28.10~) 地域外からの確保に必要な旅費、交通費、宿泊費について設計変更で対応 ●発注機関による見積り徴収又は特別調査による単価設定(H28.11~) 設定単価がない資材等について、見積もりで決定できる範囲を拡大 ○スライド条項の適切な活用の徹底(既存制度活用の徹底) ●現場代理人の常駐義務の緩和(H28.11~)
第2弾 (H29.2~) ③隣接区域からの入札参加の促進 ・予定価格の適切な設定	- ①②条件付き一般競争入札の発注ランク、総合評価等の見直し(営繕) ①BC等級:指名 → 一般競争(価格競争) ① (1) 参加資格要件を「当該ランク」から「当該ランク以上」に拡大 ②A1・A2ランク: 単なる修繕工事については総合評価を行わない - ①入札参加資格の要件緩和(営繕) 単なる修繕工事の一般競争入札の参加資格では、企業の施工実績を問わない 単なる修繕工事の一般競争入札の参加資格では、企業の施工実績を問わない 報名名修繕工事の一般競争入札の参加資格では、企業の施工実績を問わない 被災地域において、指名企業を隣接振興局へ拡大する等の地域要件の見直し	○「復興歩掛」の導入(H29.2~) 復興歩掛:土工 日当たり20%低減、 ○「復興係数」の導入(H29.2~) 復興係数:共通仮設費1.1、現場管理費1.1 ○設計 労務単価の改定(H29.3~) H29は3月に前倒し改定 ○営繕積算方式等の活用(H29.2~) 被災地の実情を踏まえた積算マニュアルの作成・活用
第3弾 (H29.8~) (H29.8~) (神となからの建設企業の参加促進 (の入札事務の迅速化・簡素化 ・資材価格等の上昇への対応	- (4発注ロットの見直し 合併することが可能な工事は合併方式とし1工事として発注 合併することが可能な工事は合併方式とし1工事として発注 - ⑤被災地域の入札方法の見直し(土木一式) 被災3地域(熊本、阿蘇、上益城)における入札方式の見直し (A2等級 1回目:地域振興局内の一般競争、2回目以降:全県下の一般競争) - ⑥総合評価落札方式の見直し(土木一式) 3億円未満の工事について一部を除き総合評価の対象外とする 総合評価対象工事についても簡易型の拡大 総合評価対象工事についても簡易型の拡大 (⑥1者入札の取り扱いの見直し 慶災関連等工事の一般競争入札は、当分の間、競争参加資格審査会の審査 を経て原則1者入札可とする。	 ●最新資材単価への設計変更に係る特例措置(H298~) 予定価格算定時に使用した設計単価を、工事契約時点の最新の設計単価に設計変更できることとした。 ●最新積算基準への設計変更に係る特例措置(H298~) 予定価格算定時に使用した積算基準を、工事契約時点の最新の積算基準に設計変更できることとした。 ●クレーン賃料等の市場調査の実施(H29.10~) 九州内同一単価となっているクレーン等の建設機械賃料について、被災地域の市場調査を基に設計単価を設定する。 ○建設資材の見積活用(既存制度) ○施工步掛の見積活用(既存制度) ●工事書類の簡素化(H29.8~) 土木工事15種類:建築工事7種類の工事書類を簡素化 ●発注見通し情報詳細版の公表(H29.7~) ○余裕期間を見込んだ早期契約制の活用(既存制度)
復興係数の引上げ (H29.11~) ・予定価格の適切な設定		○「復興係数」の引上げ(H29.11~) ・対象地域 阿蘇地域及び上益城地域 ・補正内容 <u>共通仮設書:114</u> 、現場管理費:1.1 ※上記の対象地域以外は、共通開設費:1.1、現場管理費:1.1 ※上記の対象地域以外は、共通開設費:1.1、現場管理費:1.1 ・災害復旧推進チーム」の設置(H29.11~) ・災害復旧推進チーム」の設置(H29.11~) ・災害復旧工事を円滑に進めるため、積算や設計変更等に関する課題への対応・選主変通省による技術的支援 ●「設計変更協議会」の設置(H29.12~) ・工事施工段階での様々な課題に対して、受発注者が一体となって円滑かつ迅速な解決を図る。 ●交通誘導員の円滑が確保と効率的活用の取組み(H29.11~) ・交通誘導員の不足に対し、関係機関で情報を共有し課題の解決を図る。

震災関連等工事の円滑な施工に向けた取組(第3弾)

第1 入札制度の見直し

震災関連等工事について、円滑な施工確保のため、見直しを実施。

【基本的な考え方】

- ① 建設企業の技術者不足等への対応
- ② 県内全域からの建設企業の参加促進
- ③ 競争性等を確保しつつ入札事務を迅速化・簡素化

1 発注ロットの見直し

- ・工事箇所が近接し、合併することが可能な工事は、「合併方式*」により1工事として発 注する。
- ※契約は1契約となり、技術者1人を配置。諸経費は施工箇所の距離により、諸経費の全て又は 一般管理費のみを調整

2 被災地域の入札方式の見直し(土木一式)

・被災3地域(熊本・上益城・阿蘇)において、予定価格3千万円以上7千万円未満の震災 関連等工事を、指名競争入札から条件付一般競争入札(価格競争)に変更し、参加地域要 件は初回は施工地域振興局等管内、不調後の再度入札は全県を対象とする。

3 総合評価落札方式の見直し(土木一式)

予定価格が7千万円以上3億円未満の震災関連等工事のうち、競争参加資格に施工実績を 設定しないものは、総合評価を行わない条件付一般競争入札(価格競争)とする。

4 1者入札の取り扱いの見直し

• 震災関連等工事の一般競争入札は、当分の間、競争参加資格審査会の審査を経て、<u>原則</u> 1者入札可とする。ただし、談合情報が寄せられるなど、不自然な入札の増加について、 入札監視委員会からの指摘等があった場合は、1者入札不可とする取扱いに戻す。

第2 施工確保対策及び市町村発注工事への支援

1 「復興係数」の引上げ(H29.11適用)

• 阿蘇地域及び上益城地域において、主要アクセスルートである国道57号や国道445号の通行止めや仮設住居での生活等、交通条件、生活条件等の面で地域の状況が変化し、不調・不落の傾向が続いているため、「復興係数」の引上げを国に要望し、11月以降の工事に適用。

2 災害復旧工事の変更協議の簡素化

・災害復旧事業における「軽微な変更の内容を超えるもの(いわゆる重変)」の変更協議を簡素化し、事務負担の軽減及び変更協議期間の短縮を図るよう国と協議中。


3 市町村工事への支援(H29.10実施)

・市町村の小規模な災害関係工事の大量な発注により不調・不落が発生しており、市町村外の建設企業が工事に参加するよう、建設業界に呼び掛け。併せて、市町村には、遠隔地から参加する建設企業への宿泊場所の確保など環境整備を要請。


第3 実施時期

• 入札制度の見直しは、平成29年8月16日以降に行われる入札公告その他の契約の申込みの誘引を行うものについて適用。

円滑なレスポンスや設計変更協議・適切な設計変更に向けた取組み

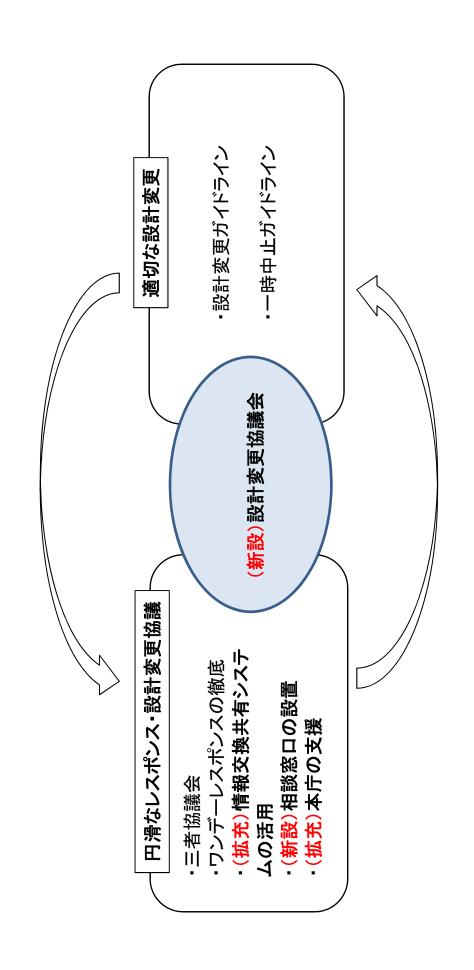


※ 設計変更協議会は、県央広域本部土木部、阿蘇地域振興局土木部に試行的に設置

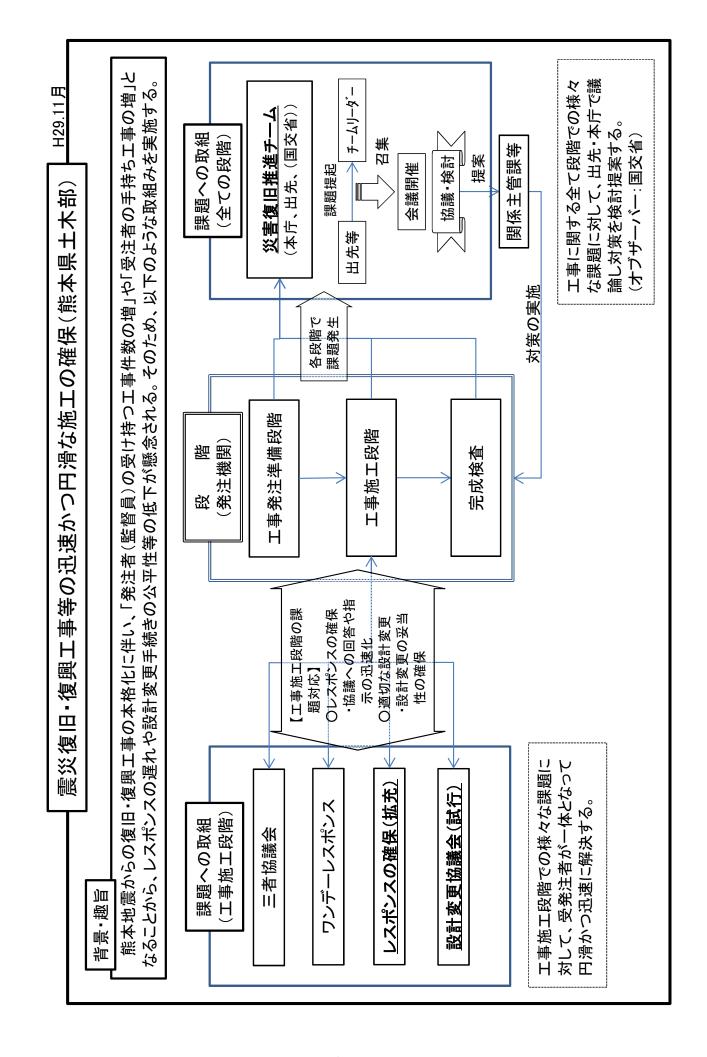

県内市町村における復興係数・歩係の導入状況について



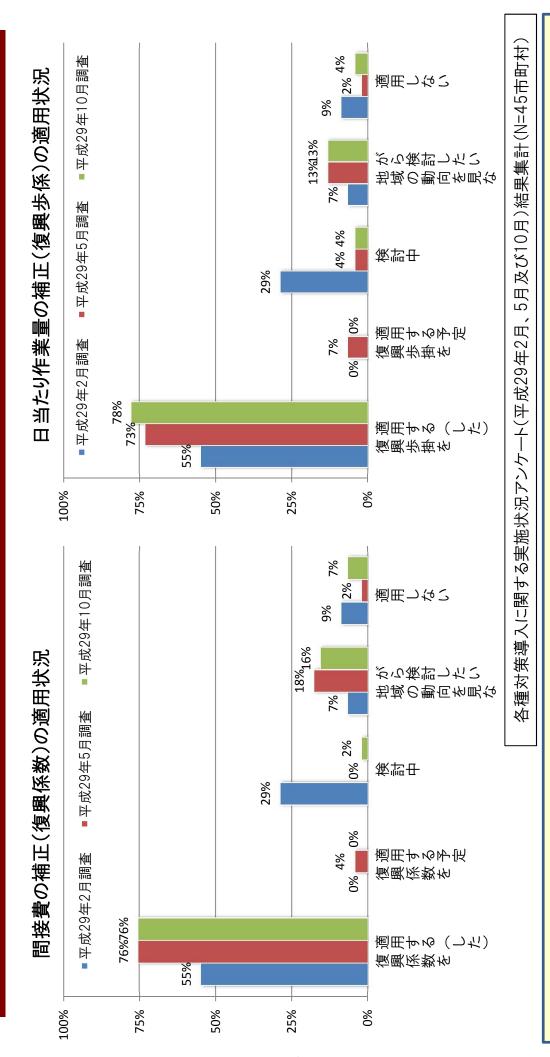


- 復興歩掛及び復興係数を導入する市町村は76%と78%、特に地震被害が大きかった県央・県北地域 の9割以上の市町村で導入している 0
 - 南地域では、導入の可否について検討中が約5割を占めている状況 ... 驰 0

県内市町村における施工確保対策の取り組み状況について(1)






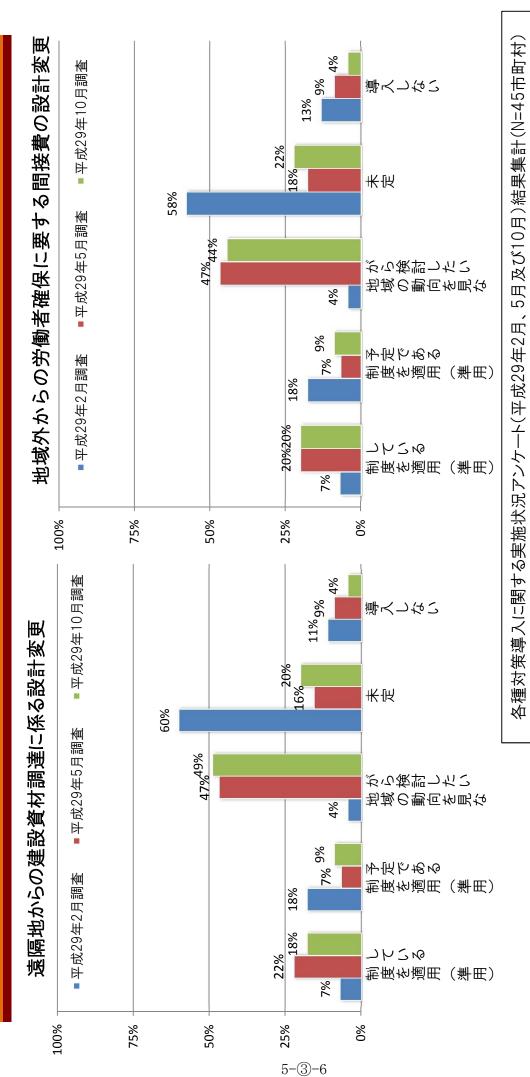

『遠隔地からの建設資材の調達に係る設計変更』について適用(準用)しているが22%から18%へ減少 『地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更』について適用(準用)しているが20%で変更なし 検討中及び未定と回答したのが約7割 したのが約9%から4%へ減少 しないと回答 2つの運用を導入

(V) 県内市町村における施工確保対策の取り組み状況について



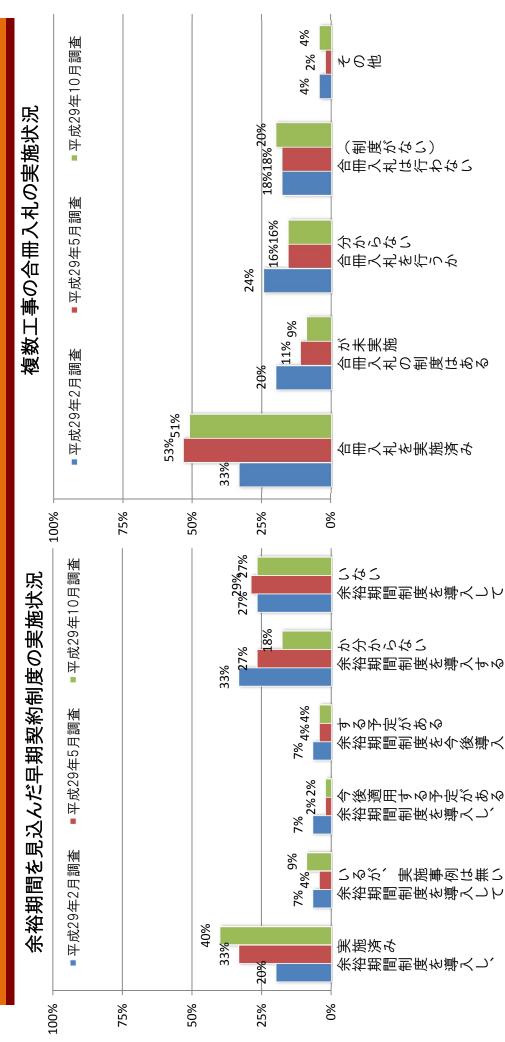

5月及び10月)結果集計(N=45市町村) 各種対策導入に関する実施状況アンケート(平成29年2月、


余裕期間を見込んだ早期契約制度を実施済みが33%から40%へ増加

余裕期間制度の導入について未定もしくは導入していないと回答したのが、56%から45%へ減少

制度はあるが未実施を含めると約6割の市町村で合冊入札 冊入札を実施済みと回答したのは51%、 ᇷ 口 が. が. ŲΠ




現場代理人の常駐義務の緩和の実施状況

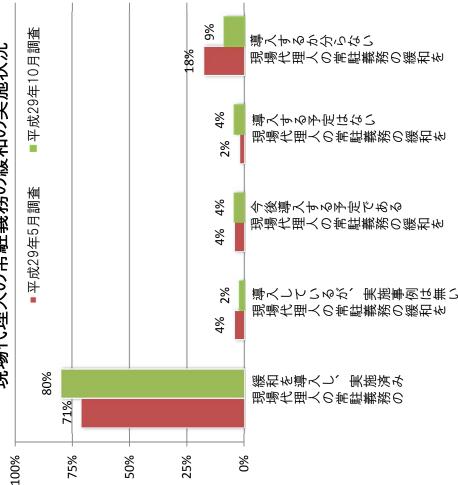

受注者が作成する工事書類の簡素化

簡素化に取り組んでいる。



- 簡素化には取り組まない。
- ■地域の動向を見ながら検討したい。

各種対策導入に関する実施状況アンケート(平成29年5月及び10月)結果集計(N=45市町村)


事書類の簡素化に取り組んでいると回答した市町村が36%、取り組む予定を含めると52% 現場代理人の常駐義務の緩和を導入し、実施済みの市町村が71%から80%へ増加 Н



最新資材等単価への設計変更に係る特例措置

■特例措置を適用(準用)する予定である。 地域の動向を見ながら今後検討したい。 ■特例措置を適用(準用)している。 ■特例措置は導入しない。 未定。 %6 29% 22% % 40%

最新積算基準への設計変更に係る特例措置



- 光泽。
- ■特例措置は導入しない。
- ■地域の動向を見ながら今後検討したい。

各種対策導入に関する実施状況アンケート(平成29年10月)結果集計(N=45市町村)

- 特例措置を適用(準用)していると回答した市町村が両方とも約3割、また、適用(準用)する予定と回 答した市町村が両方とも約1割 未定及び地域の動向を見ながら今後検討を合わせた回答が両方とも62%

熊本市における入札不調不落への取り組み

- 1 入札契約面からの対策 : H28.6~順次実施
 - ① 発注規模の調整 : (H28.6.10~)
 - ・可能なものについては、案件を抱き合わせて、案件数を減らす調整を開始。
 - ② 発注スケジュールの調整 : (H28.9.30~)
 - ・同一業種、同一ランク案件についての同時大量発注(公告・指名)を避け る調整を開始。
 - ③ 手持制限等の緩和 : (H28.9.30~)
 - •1つの業者が同じ時期に保有することができる案件数、あるいは、そのうち 総合評価落札方式による案件数を緩和。

舗装A 「2本 (うち総合評価1本)まで」を「2本 (うち総合評価2本)まで」に緩和

土木A「3本(うち総合評価2本)まで」を「4本(うち総合評価3本)まで」に緩和

管A「2本(うち総合評価2本)まで」を「4本(うち総合評価3本)まで」に緩和

杭「1本まで」を「3本まで」に緩和

さく井「1本まで」を「2本まで」に緩和

解体工事業「1本まで」を「2本まで」に緩和

- ・現場代理人の常駐義務について、熊本県発注工事との兼任を可能とする緩 和。
- ④ J V 案件の基準額の変更 : (H28.10.31~)
 - ・基準額を上げ、必要業者数を少なくするとともに、1 社あたりの金額が高くなることによる受注意欲の向上を図る。

土木 2社JV:1.5億以上 ⇒ 2億以上

3社JV:3億以上 ⇒ 4億以上

建築 2社JV:2.4億以上 ⇒ 4億以上

3社JV: 4. 8億以上 ⇒ 6億以上

ランクなし 2社 J V: 0.3億以上 ⇒ 0.5億以上

3社JV:0.6億以上 ⇒ 1億以上

※建築・杭については、申請者による J V 数選択方式(単独施工可能)

- ⑤ 総合評価一般競争入札の発注標準額の変更
 - ・業種・ランクごとに定めている基準額を引き上げ、対象件数を絞って実施
- ⑥ 指名競争入札における上位ランク業者への指名拡大

2-1 設計積算面からの対策 (土木): H29.1.4~実施

- ① 工事入札手続き段階
 - ・施工箇所が点在する工事については、工事箇所毎に経費を積算する方法を 可能とする。
- ② 設計変更段階
 - ・遠隔地(県外)からの建設資材調達に要する費用については、設計変更を 行なう。
 - ・地域外(県外)からの労働者確保に要する費用については、設計変更を行なう。
- ③ 円滑な施工確保対策として「復興歩掛・復興係数」の適用を行う。
 - ・復興歩掛 土工関係歩掛の作業日当り標準作業量が20%低下
 - ・復興係数 土木工事標準積算基準に基づき歳出した間接工事費(共通仮設費・現場管理費)に 1.1 の補正係数を乗じる

2-2 設計積算面からの対策(営繕): H29.4.1~実施

- ① 円滑な施工確保対策として『営繕積算方式』活用マニュアル【熊本被災地版】 の適用
 - ・遠隔地からの資材・労務確保に要する費用の増額変更対応 ほか
- 3 工事施工体制面からの対策 : H29.1.11~実施
 - ① 発注工事における余裕工期の積極的な設定の推進

【議題6】

「関係機関が抱える課題について」

• 熊本県建設業協会

熊本地震災害の復旧・復興事業の推進について

一般社団法人熊本県建設業協会

昨年 4 月の震災からこれまでの間、熊本地震からの復旧・復興工事が「オール熊本」での体制で円滑に実施できるよう、国及び熊本県におかれましては、本「情報連絡会議」の立ち上げを皮切りに、被災地における適正な予定価格の設定のための復興歩掛・復興係数の設定や入札制度の見直しによる復興工事の円滑化対策等を数次にわたり実施して頂きましたことに感謝申し上げます。

更に本年11月からは、復興・復旧工事の加速を図るため、国土交通省による阿蘇・上益城地域の「復興係数」の引上げや熊本県への技術指導等の支援行われるとともに、県による市町村の支援を強化等、発注機関一体となって、取り組んで頂きますことに重ねて感謝いたします。

平成29年度も下半期に入り、被災地域においては、復興・復旧工事も昨年からの繰越工事を中心に現場が稼働し始め、本年度復興・復旧工事の本格的発注が行われていますが、被災地外における通常予算の工事の発注と相まって、被災地域における下請事業者や建設労働者、交通誘導員等の不足が顕在化しつつあります。

先に熊日新聞で熊本地震の復旧工事を巡り、業者間で下請代金の未払いや遅延が発生しているとの記事が掲載されました。主に公費解体に係る下請が大部分のようですが、建設業協会としても、別添通知により、下請を含む施工体制の十分な確保、安全管理等の徹底及び通常取引が無い事業者との契約における書面契約の徹底について会員に周知したところです。

地域建設業として使命感をもち、復旧・復興工事の受注の積極的に対応していくこととしておりますが、過去に経験したことのない復旧事業費の円滑な受注を行っていくには、専門事業者や下請業者の確保が不可欠になります。下記事項について、発注機関に特段のご配慮頂きますようお願いいたします。

1 発注時における専門事業者の需給状況のヒヤリングについて

年度の下半期に入り、国・県・市町村の発注が重なり、専門業者を必要とする工事においては、その確保が困難になり不調の原因になります。発注機関においても、現場の施工を担う専門事業者の需給動向等のヒヤリングを実

施して頂き、併せて発注の平準化も検討いただきたい。

2 発注の優先順位の一層の徹底について

昨年からの繰越工事が本格稼働するなかで、重複発注が行われ、着手待ちの状況が発生しないよう、現場の進捗状況を踏まえた発注をお願いしたい。

熊 建 協 発 第 1 4 5 号 平成 2 9 年 1 1 月 6 日

各支部・部会長 様

一般社団法人 熊本県建設業協会 会 長 橋 口 光 徳

下請契約及び下請代金支払の適正化等の徹底について

時下、益々ご清栄のことと御慶び申し上げます。

さて、11 月 2 日付の熊日新聞の報道によると、熊本地震の復旧工事を巡り、 業者間で代金未払や遅延が相次いでおり、県外を含む下請け業者十数社が「被 害者の会」を結成し、代金支払いを巡り発注者や元請業者に管理強化を求める としています。今回は、公費解体のみならず道路や河川工事でも未払い事例が あるとされています。

熊本地震からの復旧・復興工事については、受注業者の適正利益の確保のため、復興係数の嵩上げや設計変更の適正化等の本会の要望に対し、11月1日から新たな対策が講じられたところであり、受注事業者としても、災害復旧・復興工事の施工に当たっては、法令等の遵守と適正化が求められています。

下請契約及び下請代金の支払いの適正化については、既に平成28年11月30日付で熊本県土木部長及び環境生活部長から別添のとおり、その適正化について依頼があっております。今回の代金未払いの事案については、県外事業者も多数含まれているとともに、今後、更に下請事業者不足が継続することも予想されます。つきましては、下記項目について所属各会員において確実に実施されますよう、再度、貴支部会員の皆様へご周知いただきますようお願いします。

記

1 施工管理の徹底について

施工体制については、直接の契約関係がある下請業者のみならず、工事施工にあたるすべての建設業者を監督するため施工体制台帳等の整備を行い、

工事現場における施工体制の十分な確保や安全管理等の一層の徹底に努めること。また、通常取引していない事業者との契約については、着工前の書面による契約を徹底するとともに、具体的工事内容、支払方法等を明示することを徹底すること。

2 下請代金の支払いについて

下請契約における代金の支払いは、正当な理由なく長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払われないことが無いよう留意すること。下請業者の支払い(賃金等)についても、元請としての責任が問われることがあるので支払の確認を行うこと。

また、長期に亘る工事期間の延長等による資金確保については、下請セーフティネット債務保証(債権譲渡)や代理受領などの制度の活用も検討されたい。

以 上

【議題7】

「下請契約及び下請代金支払の適正化 並びに施工管理の徹底等について」

循社第1528号 監第730号 平成29年11月28日

熊本県建設産業団体連合会会長
一般社団法人熊本県解体工事業協会代表理事 様

熊本県環境生活部長 熊本県土木部長

下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について(通知) 平素から本県の環境行政及び建設業行政の推進をはじめとした県政の推進及び熊本地震からの 復旧・復興につきまして、多大なる御協力、御尽力を賜り感謝申し上げます。

さて、標記につきましては、かねてより貴団体所属の皆様への周知をお願いしているところですが、今月1日には、熊本地震で被災した家屋の解体工事や道路、河川の復旧工事等を巡り、県外を含む下請業者によって「被害者の会」が結成されるなど、工事代金の不払いや支払遅延等、業者間のトラブルに関する相談が後を絶たない状況であり、下請負人へのしわ寄せが依然として存在するとの指摘がなされているところです。

このような状況は、災害復旧等に係る工事が本格化していく中で復旧・復興への遅れが懸念されるばかりではなく、労働者への適切な賃金水準が確保できなくなるなど、建設産業が持続的な発展を遂げるうえでの阻害要因になりかねません。

つきましては、建設業法(以下「法」という。)等の関係法令や建設企業が守るべき下請取引上のルールを示した「建設業法令遵守ガイドラインー元請負人と下請負人の関係に係る留意点ー」等を遵守するほか、下記事項に十分留意し、下請契約における請負代金の設定及び適切な代金の支払い等、元請下請取引の適正化並びに施工管理のより一層の徹底に努められますよう、貴団体所属の皆様に対し、改めて周知していただきますようお願いします。

記

1 見積りについて

- (1)下請代金の設定については、施工責任範囲、施工条件等を反映した合理的なものとするため、 書面による見積依頼及び法施行令第6条で定める見積期間の設定、明確な経費内訳による見積 書の提出、それらを踏まえた双方の協議等の適正な手順を徹底すること。
- (2) 見積条件の提示に当たっては、下請契約の具体的内容(法第19条第1項により請負契約書に記載することが義務付けられている事項のうち、請負代金の額を除く全ての事項)を提示すること。

2 契約について

- (1)建設工事の契約の締結については、法第19条に基づき、当該建設工事の着工前の書面による契約を徹底することとし、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容による契約書を用いて、具体的な工事内容、適正な請負代金及び支払方法、着工及び完工の時期等を明示すること。
- (2) 請負代金の出来高払を行うに当たり、下請代金の支払時に建設廃棄物等の処理費用や一方的 に提供・貸与した安全衛生保護具等の労働災害防止対策に要する費用等を相殺する(いわゆる 赤伝処理)場合には、当該事項の具体的内容を、請負契約の両当事者の対等な立場における合 意に基づき、契約書面に明記すること。
- (3) 請負代金を決定する際、下請負人と十分な協議をせず、又は下請負人の協議に応じることなく、元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に提示し、その額で下請負人に契約を締結させる行為(いわゆる指値発注)を行うことがないよう留意すること。
- (4) 当初の契約どおり工事が進行せず、工事内容に変更が生じ、工期又は請負代金に変更が生じる場合には、双方の協議等の適正な手順により、変更工事の着工前に書面による契約をもってこれを変更すること。

3 下請代金の支払について

(1)下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。

また、元請負人が注文者から部分払(出来高払)や完成払を受けた時は、法第24条の3第1項に基づき、出来形に対して注文者から支払を受けた金額の割合に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、できる限り短い期間内に支払わなければならないことにも留意すること。特に、特定建設業者においては、注文者から支払を受けたか否かにかかわらず、建設工事の完成を確認した後、下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から起算して50日以内で、できる限り短い期間内に下請代金の支払を行うよう留意すること。

- (2)全ての元請負人は下請負人に対し、下請代金の支払をできる限り現金払により行うこと。現金払と手形払を併用する場合には、下請負人に対する支払条件を改善し、支払代金に占める現金の比率を高めることに留意すること。特に、労働者の雇用の安定を図る上で重要であることから、少なくとも労務費相当分を現金払とするよう支払条件を設定すること。
- (3) 前払金を受領した場合には、法第24条の3第2項に基づき、下請負人に対して必要な費用を前払金として適正に支払うよう配慮すること。
- (4)下請代金の支払保留については、工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しが終了した後に、 正当な理由なく長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わないことがないよう留 意すること。
- (5) 手形期間については、120日以内とすることは当然として、できる限り短い期間とすること。また、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めること。

4 施工管理の徹底について

(1)発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、公共工事においては下請契約を締結したとき、民間工事においては下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事は6,0

- 00万円)以上となるときは、契約書等の写しなど定められた書類を添付した施工体制台帳及 び施工体系図の作成、工事現場ごとの備え置き等を義務づけられており、これを徹底すること。 また、公共工事の受注者は、施工体制台帳の写しを発注者に提出すること、施工体系図を工 事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げることとされているので、併せて徹底 すること。
- (2) 施工体制台帳を作成しなければならない場合における建設業者は、施工体制台帳を的確かつ速やかに作成するため、施工に携わる下請負人の把握に努め、これらの下請負人に対し速やかに再下請負通知書を提出するよう指導するとともに、自ら施工体制台帳の作成に必要な情報の把握に努めること。
- (3) 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、法第24条の6において、下請負人が建設業法その他関係法令に違反しないよう指導に努めるものとされていることを踏まえ、下請負人が法第19条、第24条の3、第24条の5等の規定及び労働基準法等の建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち一定の規定等に違反しないよう指導に努めること。

循社第1528号 監第730号 平成29年11月28日

各市町村長 様

熊本県環境生活部長 熊本県土木部長

公共工事における施工管理の徹底等について(通知)

このことについて、工事代金の不払いや支払遅延等、業者間のトラブルに関する相談が後を絶たない状況であり、今月1日には、熊本地震で被災した家屋の解体工事や道路、河川の復旧工事等を巡り、県外を含む下請業者によって「被害者の会」が結成されるなど、民間工事のみならず県や市町村が発注した工事に係る相談も寄せられているところです。

このような状況を踏まえ、今般、別添のとおり業界団体を通じて建設企業に対する指導の徹底を図ったところではありますが、各市町村におかれましても、特に下記事項に十分留意し、公共工事における施工管理のより一層の徹底に努められますよう、発注担当部局の職員に対し、改めて周知していただきますようお願いします。

記

1 施工体制台帳等の作成について

公共工事の受注者は、下請契約を締結したときは契約書等の写しなど定められた書類を添付した施工体制台帳及び施工体系図の作成、工事現場ごとの備え置き等を義務づけられているため、受注者に対する周知を徹底すること。また、施工体制台帳の写しを発注者に提出すること、施工体系図を工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げることとされているので、併せて徹底すること。

2 施工体制の確認について

公共工事の発注者は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられているため、施工体制台帳や施工体系図を適切に活用することにより現場の施工体制を確認すること。

建設業法(抜粋)

(下請負人に対する特定建設業者の指導等)

- 第24条の6 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
- 2 前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を 営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む 者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるも のとする。
- 3 第一項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。

(建設工事の請負契約の内容)

- 第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
 - 一 工事内容
 - 二 請負代金の額
 - 三 工事着手の時期及び工事完成の時期
 - 四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
 - 五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しく

- は一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方 法に関する定め
- 七 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関す る定め
- 九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法 並びに引渡しの時期
- 十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約 金その他の損害金
- 十四 契約に関する紛争の解決方法
- 2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを 変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互 に交付しなければならない。
- 3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で 定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用 する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定によ る措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。こ の場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定 による措置を講じたものとみなす。

(下請代金の支払)

第24条の3 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後 における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請 負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該 下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から 一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

2 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、 労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適 切な配慮をしなければならない。

(特定建設業者の下請代金の支払期日等)

- 第24条の5 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、前条第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあっては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
- 2 特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかったときは前条第二項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
- 3 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
- 4 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金を第一項の規定により定められた支払期日又は第二項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかったときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、前条第二項の申出の日から起算して五十日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

【議題8】

「暴力団排除対策について」

• 熊本県警察本部

熊本県暴力団排除条例 第13条 第14条 公共工事における措置 契約全般 契約 締結 暴力団 暴力団密接関係者 建設工事 総称して 資材搬入 元請負人等 二次 契約 · · · 以下 下請負人 下請負人 元請負人 役務の提供 一次 資材納入等 締結 下請負人 契約者 県と契約した者、 一次 二次 三次 下請負人 下請負人 下請負人 暴力団 暴力団密接関係者 誓約書提出(例) 契約の締結 下請負人 元請負人 (受注者) (発注者) 誓約書 人 提出 暴力団員ではない!! 誓約書を5年間保管 暴力団密接関係者ではない!! 県は、元請負人等に報告、資料の提出を求める。 報告(例) 下請負人 不当要求 元請負人等 資材納入等契約者 発見 県 報告 (発注者) (受注者) 暴力団 下請負人 元請負人等 資材納入等契約者 判明 (発注者) (受注者) 暴力団密接関係者 暴力団と知っていて 発注者 入札に参加させないこと 契約した場合 ができる。

罰則多

罰則

- ○誓約書を提出しなかった元請負人等
- 〇契約書を5年間保管しなかった元請負人等

5万円以下の過料

県の求めに対し、

〇報告をしない元請負人等

○資料を提出しない元請負人等

○報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をした元請負人等

〇虚偽の資料を提出した元請負人等

20万円以下の罰金

第13条(公共工事における措置) に規定する範囲

